

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

PROYECTO: K010 MIES-Implementación de entornos seguros y protectores en la atención del servicio de Desarrollo Infantil Integral a niño/as de 12 A 36 meses

Líder del Proyecto:	Cáceres Aucatoma, Pavlov (pavlov.caceres@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mendizábal Molina, Luis Javier	Programas Relacionados:	
Titular:	Salamea Ortuño, Carolina Elizabeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387203	TIR:	47.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	24,859,434.19
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,940,288.32
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	06/12/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Cáceres Aucatoma, Pavlov	Fecha del siguiente Hito:	30/12/2022

DATOS GENERALES

Descripción

De acuerdo a la proyección del INEC para el año 2021 la población total del Ecuador de 17'510.643 de habitantes con una población infantil de 12 a 60 meses de edad (0 a 5 años) es de 1'731.473 niños y niñas y representan el 9,88%. A octubre de 2021 el MIES ha atendido en sus diferentes modalidades a 288.837 niñas/os de 12 a 36 meses de edad, por lo que se obtiene una demanda insatisfecha estimada de 112.322 niñas y niños que deben ser atendidos con los servicios que el MIES presta.

Considerando la variable de pobreza, del total de niñas y niños menores de 6 años de edad, casi dos tercios (68,28%) del total se ubica en condición de pobreza, por tanto constituyen un grupo prioritario de atención por parte del Estado, que en el caso de Desarrollo Infantil cae su rectoría en el Ministerio de Inclusión Económica y Social

La atención a los niños y niñas de 12 a 36 meses no es considerada por los padres y madres de los sectores vulnerables como una prioridad, es así que solo el 30% de dicha población de niños/as asiste a los Centros de Desarrollo Infantil. El estudio longitudinal 2003-2008 de Norbert Shady y María C Araujo aplicado en el Ecuador considerando niveles de pobreza, explica que: el 19% de los niños de extrema pobreza, comparando con el 9% de los niños de economía promedio, tienen de 1,5 a 2 años de retraso en su desarrollo cerebral. Consecuentemente esto implica un atraso en su progresión escolar.

Por tanto, los factores asociados que más influyen negativamente en el Desarrollo Integral de las niñas y niños ecuatorianos en sus primeros años son: la falta de educación inicial y las condiciones de pobreza, que vinculan un conjunto de aspectos deficitarios para toda la familia.

En este contexto, el MIES encaminado a cerrar las brechas de desigualdad, presentó el Proyecto "Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención del Servicio de Desarrollo Infantil Integral a niños/as de 12 a 36 meses", con CUP 102800000.0000387203", el cual obtuvo Dictamen de Prioridad, emitido por la Secretaria Nacional de Planificación, mediante oficio No. SNP-SPN-2021- 1170-OF de 20 de diciembre de 2021, por un valor de USD \$ 8'421.041,80 para el período (2022-2024), a ser financiados con recursos fiscales y/o crédito externo o según sea la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Proyecto está alineado a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 a las metas 5.1.1. Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos y a la Meta 6.4.1. Reducir 6 puntos porcentuales la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 2 años y al objetivo estratégico Institucional de Incrementar el acceso y calidad de los servicios de Inclusión Social con énfasis prioritaria y la población que se encuentra en pobreza y vulnerabilidad.

El Objetivo General del Proyecto es mejorar la calidad de la atención directa en Desarrollo Infantil de 3700 niñas y niños de 12 a 36 meses de edad en sectores vulnerables mediante la implementación de espacios seguros y protectores con mobiliario especializado en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Pichincha, El Oro y Sucumbios.

El Proyecto está compuesto por los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

Descripción

- Atender a 1000 niñas y niños de sectores vulnerables mediante la construcción de 10 centros de desarrollo infantil con diseño especializado y 2700 niñas y niños mejoran las condiciones de atención en 27 Centros infantiles intervenidos en rehabilitación y mantenimiento.

- Atender a 1000 niñas y niños con equipamiento y mobiliario especializado en los Centros de Desarrollo Infantil.

Beneficios Cualitativos

a) Al 2022 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación en espacios especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

b) Al 2022 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación con equipamiento especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

c) Al 2022 - 2000 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

d) Al 2023 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación en espacios especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

e) Al 2023 - 500 niños y niñas recibiendo los servicios de desarrollo infantil integral y alimentación con equipamiento especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

f) Al 2023 - 100 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

g) Al 2024 - 600 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

Tipo de Beneficiario

La población objetivo del presente proyecto será de 3700 niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, de los cuales 1000 niños/as corresponde a 10 CDI construidos (2022 y 2023) 5 cada año; 2000 niños/as a CDI de mantenimiento y 700 niños/as restantes corresponden a 7 CDI que serán intervenidos con rehabilitación integral.

Restricciones

Alcance: Atender a 1000 niñas y niños de sectores vulnerables mediante la construcción de 10 centros de desarrollo infantil con diseño especializado y 2700 niñas y niños mejoran las condiciones de atención en 27 Centros infantiles intervenidos en rehabilitación y/o mantenimiento.

Tiempo: Al 2024, 3700 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral mediante la implementación de espacios seguros y protectores con mobiliario especializado en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Pichincha, El Oro y Sucumbíos.

Al finalizar el Proyecto, 10 Centros Infantiles construidos de acuerdo a los estándares de calidad aprobados por el MIES

Al 2022 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación en espacios especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

Al 2022 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación con equipamiento especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

Al 2022 - 2000 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

Al 2023 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación en espacios especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

Al 2023 - 500 niños y niñas recibiendo el servicios de desarrollo infantil integral y alimentación con equipamiento especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

Al 2023 - 100 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

Al 2024 - 600 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

Recursos: El presente proyecto debe contar con los recursos pertinentes:

i) Personal técnico y especializado en diferentes áreas de administración de proyecto

ii) Tiempo para iniciar la fase preparatoria, procesos precontractuales, contractuales del proyecto.

iii) recursos monetarios que aseguren la ejecución de las nuevas construcciones, mantenimiento y equipamiento, en los tiempos adecuados para la correcta administración y ejecución del mismo.


Restricciones

Costo: El Proyecto requiere una inversión de USD 8.421.041,80 a fin de cumplir con la planificación de la construcción y equipamiento de 10 CDI para el año 2024 además de rehabilitación y mantenimiento de impermeabilización de cubiertas de 27 CDI a nivel nacional, mismos que serán posibles, siempre que se cuente con la asignación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 31.11 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

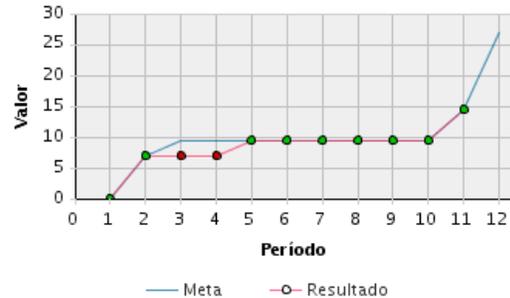

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	0 %	7 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	14 %	27 %
	Avance real acumulado											
	0 %	7 %	7 %	7 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	14 %	
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2022 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CODIFICADO: USD \$ 996.448,52 CERTIFICADO: USD \$ 771.490,62 COMPROMETIDO: USD \$ 97.252,11 DEVENGADO: USD \$ 97.252,11 LOGROS * Dictamen favorable para la Certificaciones Plurianuales para la construcción de los 5 CDI y de 12 mantenimientos de los CDI ubicados en la Zona 2. * Se solicita el Inicio de proceso y publicación en el SOCE de la CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICOS: SANTA ELENA - LOS GIRASOLES; ESMERALDAS - LOS ALMENDROS; y DURAN - ORAMAS GONZALES. * Se solicita el Inicio de proceso y publicación en el SOCE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA * Se inicia la ejecución de los contratos de mantenimientos de cubiertas de 5 CDIs ubicados en las Zonas: Zona 6 (1 CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI) y Zona 5 (1CDI). * Se tiene la Ficha Técnica del mobiliario, a ser colocado en los CDI Emblemáticos, para su aprobación por parte de la Dirección de Desarrollo Infantil y poder remitir a las Zonas donde se ejecutarán los mismos. NUDOS CRÍTICOS * Falta la actualización de Estudios e Ingenierías por parte de la Dirección de Infraestructura para la contratación de 2 CDIs (Quito y Guayaquil).	Cáceres Aucatoma, Pavlov	06/12/2022 - 04:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Demora en las respuestas internas de Compras Públicas para la revisión de los expedientes y publicación de los procesos en el Portal de Compras Públicas - SOCE de los procesos de Construcción y Mantenimiento de los CDI Emblemáticos.</p> <p>*Para una ejecución directa de los CDI Emblemáticos desde las Coordinaciones Zonales, se requiere incrementar los montos delegados como Autorizadores de Gasto.</p> <p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</p> <p>Durante este período, la Gerencia plantea la reducción del PAI 2022, por el monto de USD 750.091,93; por lo que el nuevo Presupuesto Codificado es de USD 996.448,52. Una vez que se cuenta con los expedientes completos validados por la Dirección de Infraestructura se solicita a la Dirección de Compras se continúe con el trámite respectivo para el inicio de proceso para la contratación y publicación en el SOCE de la CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICOS: SANTA ELENA - LOS GIRASOLES; ESMERALDAS - LOS ALMENDROS; y DURAN - ORAMAS GONZALES.</p> <p>Con respecto a los mantenimientos de cubiertas de los CDIs se inicia la etapa contractual de 5 procesos de contratación: MCS-MIES-DDG-02-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE CHORDELEG por el monto de USD. 25.024,28; MCS-MIES-DDG-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE PIRINCAY DE LA DDG por el monto de USD 20.934,31; MCS-MIES-DDG-03-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE GUACHAPALA DE LA DDG por el monto de USD 21.331,82; MCO-MIES-CZ6-02-2022 - MANTENIMIENTO 2022 DEL CDI EMBLEMATICO HUAYNA CAPAC USD 24.584,67; y, MCO-CZ5-MIES-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VIRGEN DEL CARMÉN por el monto de USD 22.284,76.</p> <p>Se recomienda iniciar los estudios de implantación e ingenierías, por parte de las unidades de infraestructura Zonales, de los cinco CDI programados por el Proyecto para el año 2023. Procurar que los procesos de Construcción se realicen directo desde las Zonales, como se plantea la compra del mobiliario.</p>		
<p>Noviembre 2022</p> <p>Durante este período, se obtiene el Dictamen favorable de Certificación Plurianual por parte de la SNP y el MEF, para los procesos de contratación de los nuevos CDI, por lo que se gestiona la documentación y expediente a fin de dar inicio con los procesos de contratación de 3 de los 5 CDI de los cuales se tienen estudios completos (LOS ALMENDROS, LOS GIRASOLES y ORAMAS GONZÁLEZ); con respecto a los estudios de los 2 CDI (Quito y Guayaquil) deberán ser elaborados por la Dirección de Infraestructura en aplicación al Acuerdo Ministerial 042.</p> <p>Se realiza la contratación de los procesos de los mantenimientos de los siguientes CDIs: MCS-MIES-DDG-02-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE CHORDELEG por el monto de USD. 25.024,28; MCS-MIES-DDG-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE PIRINCAY DE LA DDG por el monto de USD 20.934,31; MCS-MIES-DDG-03-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE GUACHAPALA DE LA DDG por el monto de USD 21.331,82; MCO-MIES-CZ6-02-2022 - MANTENIMIENTO 2022 DEL CDI EMBLEMATICO HUAYNA CAPAC USD 24.584,67; MCO-CZ5-MIES-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VIRGEN DEL CARMÉN por el monto de USD 22.284,76.</p> <p>En base al seguimiento del proceso de contratación del CDI de la Zona 8 (Sagrado Corazón de Jesús); la Coordinación Zonal indica que no publicara el proceso, razón por la cual el recurso no se ejecutará el presente período fiscal.</p> <p>Se obtiene el Dictamen favorable de Certificación Plurianual por parte de la SNP y el MEF, para el proceso de los mantenimientos de 12 CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD 266.986,30; por lo que se gestiona la documentación y expedientes a fin de dar inicio con los procesos de contratación en el Portal de Compras Públicas. Se estima que los procesos serán adjudicados a fin del mes de diciembre del presente año.</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>01/12/2022 - 05:33 PM</p>
<p>Octubre 2022</p> <p>Durante este período, se realiza la actualización del Cronograma Valorado y se gestiona ante el MEF y la SNP para la obtención del Dictamen Favorable para la emisión de la Certificación Plurianual a fin de contar con los recursos para lanzar los procesos de contratación de la construcción de los 5 CDI. De manera coordinada con la Dirección de Infraestructura, se finaliza los Estudios y Diseños (Planos, APUs, Especificaciones) de 3 CDIs (LOS ALMENDROS, LOS GIRASOLES y ORAMAS GONZÁLEZ); y, se inicia el proceso de contratación de la consultoría de mecánica de suelos para los estudios de 2 CDI (Quito y Guayaquil).</p> <p>Se realiza la publicación en el SOCE de los procesos de contratación de los mantenimientos de los siguientes CDIs: MCS-MIES-DDG-02-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE CHORDELEG por el monto de USD. 25.024,28;</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>07/11/2022 - 11:50 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MCS-MIES-DDG-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE PIRINCAY DE LA DDG por el monto de USD 20.934,31; MCS-MIES-DDG-03-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE GUACHAPALA DE LA DDG por el monto de USD 21.331,82; MCO-MIES-CZ6-02-2022 - MANTENIMIENTO 2022 DEL CDI EMBLEMATICO HUAYNA CAPAC USD 24.584,67; MCO-CZ5-MIES-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VIRGEN DEL CARMÉN por el monto de USD 22.284,76. Se encuentra pendiente de subir el proceso en el SOCE del CDI de la Zona 8 (Sagrado Corazón de Jesús). Además, envió a la SNP la solicitud de dictamen favorable para obtener la Certificación Plurianual para continuar con los procesos de contratación de los mantenimientos de 12 CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD 266.986,30.</p> <p>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CODIFICADO: USD \$ 1.746.540,45 CERTIFICADO: USD \$ 169.815,95 COMPROMETIDO: USD \$ 87.177,49 DEVENGADO: USD \$ 87.177,49</p> <p>LOGROS * La Gerencia envió a la SNP la solicitud de dictamen favorable para la emisión de 2 Certificaciones Plurianuales para la construcción de los 5 CDI y de 12 mantenimientos de los CDI ubicados en la Zona 2. * Se cuenta con 3 de los 5 estudios y diseños de los CDIs a construirse (Esmeraldas, La Libertad y Durán). * Se realiza la publicación de los procesos en el SOCE, para la contratación de los mantenimientos de cubiertas de 5 CDIs ubicados en las Zonas: Zona 6 (1 CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI) y Zona 5 (1CDI). * Inicio de los procesos de contratación de mecánica de suelos para la construcción de 2 (CDI) Emblemáticos (Quito y Guayaquil).</p> <p>NUDOS CRITICOS * Falta la actualización de Estudios e Ingenierías para la contratación de 2 CDIs (Quito y Guayaquil). * Aprobación de la Certificación Plurianual para las contratación de los CDIs. * Aprobación de la Certificación Plurianual para los procesos de los mantenimientos de los 12 CDIs ubicados en la Zona 2. * Demora en las respuestas internas de Compras Públicas y en especial las externas del MEF.</p>		
<p>Septiembre 2022 Durante este período, se realiza una reforma de disminución al PAI 2022 por un monto de USD \$ 884.530,61, correspondiente al Grupo de gasto 73, 75 y 84; rubros considerados para financiar implantación y adaptabilidad de predios, fiscalización y administración de obras, construcción y adquisición de equipamiento y mobiliario especializado para los CDI, mismos que se liberan porque no se ejecutarán en el presente período fiscal. En aplicación al Decreto ejecutivo 489 y Acuerdo Ministerial 042, en el cual se delega a la Gerencia del Proyecto IESPASDII, estar a cargo de la fase preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación, se realiza la gestión ante el MEF y la SNP para la obtención del Dictamen Favorable para la emisión de la Certificación Plurianual a fin de contar con los recursos para lanzar los procesos de contratación de la construcción de los 5 CDI. Con respecto a los mantenimientos de cubiertas de los CDIs, se realizó el seguimiento en las Zonas y Distritos para que se certifiquen los montos transferidos y se proceda con el proceso precontractual, según el siguiente detalle: Zona 6, CDI HUAYNA CAPAC, por el monto de USD \$ 24.584,67; Zona 6, Distrito Gualaceo, CDI CHORDELEG; CDI PIRINCAY; CDI GUACHAPALA por USD \$ 67.290,47; Zona 8 CDI TODA UNA VIDA por un monto de USD \$ 47.010,49 y Zona 5, Distrito Milagro CDI VIRGEN DEL CARMEN por un monto de USD \$ 22.306,23. Además, se inicia con la gestión para obtener la Certificación Plurianual para continuar con los procesos de contratación de los mantenimientos de 12 CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD.\$ 266.986,30.</p> <p>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CODIFICADO: USD \$ 2'631.071,06 CERTIFICADO: USD \$ 143.051,50 COMPROMETIDO: USD \$ 76.426,95 DEVENGADO: USD \$ 76.426,95</p> <p>LOGROS * Inicio de la Fase Preparatoria de los procesos de contratación para la construcción de los 5 CDIs: la Gerencia del Proyecto IESPASDII realizó los Informes de Necesidad, Certificación CATE, Definición de tipo de Proceso; actualmente, se envió a la Dirección de Infraestructura para</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>07/10/2022 - 08:19 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>que realicen los estudios, presupuestos y términos de referencia a fin de continuar con el trámite de los procesos de contratación.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Transferencia de recursos a las Zonas y Distritos por el monto de USD 161.191,86; para la contratación de mantenimientos de cubiertas de 6 CDIs ubicados en las siguientes Zonas: Zona 6 (1 CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI), Zona 8 (1CDI) y Zona 5 (1CDI). * Inicio de los procesos de contratación para la actualización de estudios arquitectónicos y mecánica de suelos para la construcción de (CDI) Emblemáticos (Quito y Guayaquil) *Aprobación de la ubicación propuesta de los logos de la imagen de UNICEF "Máximo" en las paredes de los CDI a ser construidos. <p>NUDOS CRÍTICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tiempos cortos para la actualización de Estudios, Ingenierías y procesos de las fases preparatoria, precontractual y contractual para la contratación de los 5 CDIs. * Aprobación de la Certificación Plurianual para las contratación de los CDIs. * Aprobación de la Certificación Plurianual para los procesos de los mantenimientos de los 12 CDIs ubicados en la Zona 2. * Para iniciar los procesos de construcción, se necesita que la Dirección de Infraestructura MIES, realice la actualización de estudios y presupuestos correspondientes a la construcción de los 5 CDIs; lo que conlleva a un incremento de tiempos para la ejecución de las obras. *Demora en las respuestas internas de Compras Públicas y en especial las externas del MEF. 		
<p>Agosto 2022</p> <p>Durante este período, se realiza una reforma de disminución al PAI 2022 por un monto de USD \$ 1.309.217,25, correspondiente al Grupo de gasto 75 por el pago de planillas de obras de los 5 CDIs a contratarse en el presente período fiscal y Grupo de gasto 73 rubro de Viáticos; así también, en base al Decreto Ejecutivo No. 489 de 12 de julio de 2022 se emite el Acuerdo Ministerial No. 042 de 18 de agosto de 2022, en el cual se define que la Gerencia del Proyecto IESPÁSDII estará a cargo de la Fase Preparatoria, Precontractual y Contractual de los procesos de contratación para la construcción de los 5 CDI; por lo que de manera inmediata se realizó los Informes de Necesidad (nuevo formato) y la solicitud de Certificación CATE, insumos que se requieren la Dirección de Infraestructura para elaborar los Términos de Referencia de los 5 CDIs a contratarse este año. Por otro lado, afín de asegurar los recursos se plantea la obtención de la Certificación Plurianual, para lo cual se ha solicitado al MEF la Certificación de Recursos como requisito para su envío a la SNP.</p> <p>Con respecto a los mantenimientos de cubiertas de los CDIs, se realizó el seguimiento en las Zonas y Distritos para que se certifiquen los montos transferidos y se proceda con el proceso precontractual, según el siguiente detalle: Zona 6, CDI HUAYNA CAPAC, por el monto de USD \$ 24.584,67; Zona 6, Distrito Gualaceo, CDI CHORDELEG; CDI PIRINCAY; CDI GUACHAPALA por USD \$ 67.290,47; Zona 8 CDI TODA UNA VIDA por un monto de USD \$ 47.010,49 y Zona 5, Distrito Milagro CDI VIRGEN DEL CARMEN por un monto de USD \$ 22.306,23. Además se realiza la certificación de recursos en Planta Central para atender los mantenimientos de 12 CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD.\$ 266.986,30.</p> <p>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</p> <p>Agosto 2022</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 2'631.071,06</p> <p>CERTIFICADO: USD \$ 74.389,17</p> <p>COMPROMETIDO: USD \$ 66.530,70</p> <p>DEVENGADO: USD \$ 66.530,70</p> <p>LOGROS Agosto 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> * Armonización de recursos del PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por del Proyecto. * En base al Decreto Presidencial No. 489 se realizó la emisión del Acuerdo Ministerial No. 042 de 18 de agosto de 2022, delegación de atribuciones procesos constructivo a la Gerencia IESPASDII. * Inicio con los procesos de la Fase Preparatoria para la contratación de los 5 CDI. (Esmeraldas, Santa Elena, Guayas (Monte Sinai), Duran y Pichincha) * Transferencia de recursos a las Zonas y Distritos para la contratación de mantenimientos de cubiertas de los CDIs: Zona 6 (1 CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI), Zona 8 (1CDI), Zona 5 (1CDI) y Zona 2 (12 CDI) <p>NUDOS CRÍTICOS Agosto 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tiempos cortos para la actualización de Estudios, Ingenierías y procesos de las fases preparatoria, precontractual y contractual para la contratación de los 5 CDIs. * Aprobación de Certificación Plurianual para las contratación de los CDIs. * Ejecución de los mantenimientos de los 12 CDIs ubicados en la Zona 2 en paquete puede dificultar su ejecución por la logística de su ejecución, adjudicación y Fiscalización. * Para iniciar los procesos de construcción, se necesita que la Dirección de Infraestructura MIES, realice la actualización de estudios y presupuestos correspondientes a la construcción de los 5 CDIs; lo que conlleva a un incremento de tiempos para la ejecución de las obras. 	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>08/09/2022 - 02:41 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio 2022</p> <p>Durante este período, se realiza la reformas de transferencia de recursos del proyecto hacia las Zonas con el fin de atender las obras de mantenimientos de los CDIs de la Zona 6 y Zona 8; además se realiza la certificación de recursos en Planta Central para atender los mantenimientos de 12 CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD.\$ 266.986,30. En relación al proceso de construcción de los 5 CDI, se cuenta con el Decreto Ejecutivo 489 de 12 de julio de 2022; en el cual se define que las atribuciones para el proceso constructivo estará a cargo de la Dirección de Infraestructura del MIES; por lo que el Proyecto solicito de manera inmediata a la Dirección de Infraestructura, realizar la actualización de estudios de suelos y presupuestos de los 5 CDIs a construirse el presente año fiscal.</p> <p>Ejecución Presupuestaria</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 3'940,288,32 CERTIFICADO: USD \$ 0,00 COMPROMETIDO: USD \$ 55.303,96 DEVENGADO: USD \$ 55,303,96</p> <p>HITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aprobación de Reformas para transferencia de recursos a las Zonas para los mantenimientos de mitigación de filtraciones de agua lluvia. * Iniciar los procesos de contratación de rehabilitación y mantenimiento de los CDI. * Actualización de estudios de suelos y presupuestos de construcción de obras para los 5 Centros de Desarrollo Infantil. <p>LOGROS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Armonización de recursos del PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por del Proyecto. * Certificación de recursos en Planta Central para atender los mantenimientos de los CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD.\$ 266.986,30. * Transferencia de recursos a la Zona 6 (1CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI) y Zona 8 (1CDI) <p>Julio 2022</p> <p>Durante este período, se realizan las gestiones pertinentes ante las autoridades, para contar con la emisión del Decreto Ejecutivo 489, el mismo que define las atribuciones de la construcción de obras de infraestructura a favor del MIES; por lo que el Proyecto ha solicitado a la Dirección de Infraestructura iniciar con los procesos de actualización de suelos y presupuestos de las obras. Adicionalmente, se encuentran trasladado a las zonas el recurso para iniciar los procesos de contratación del mantenimiento de los CDIs; así también, se encuentra certificado el presupuesto referencial para dar mantenimiento a 12 CDIs de la Zona 2.</p> <p>Se recomienda que luego de contar con los presupuestos referenciales de Obra, se inicie con el proceso de certificación plurianual que permitirá que las obras se contraten el presente periodo fiscal.</p>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>08/08/2022 - 05:30 PM</p>
<p>Junio 2022</p> <p>Durante este período, el MEF aprueba las reformas al PAPP en función de la planificación y ejecución de los componentes del Proyecto. De manera conjunta con los Técnicos de la Dirección de Infraestructura y bajo la supervisión de la Subsecretaría, se realizan visitas a los CDI de atención directa y se inicia con la transferencia de recursos a las Zonas para la contratación de los mantenimientos de los CDI.</p> <p>Proyecto Arrastre Construcción CDI Emblemáticos</p> <p>En el marco del proceso de cierre y liquidación del Proyecto CDI, cuya ejecución corresponde al período 2012-2021; se remite al MTOP para su revisión, el Informe de liquidación financiera del Proyecto de arrastre correspondiente a los contratos de construcción de los años anteriores (2012; 2013; 2014 y 2015) que no fueron liquidados contablemente por el Co-ejecutor (SECOB). Además, se inicia el análisis de los trámites pendientes para proceder con el proceso de cierre de Convenios Internacionales MIES-MTOP.</p> <p>Ejecución presupuestaria</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 3'940,288,32 CERTIFICADO: USD \$ 0,00 COMPROMETIDO: USD \$ 45.151,72 DEVENGADO: USD \$ 45.151,72</p> <p>Principales HITOS</p>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>06/07/2022 - 02:49 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Aprobación de Reformas para transferencia de recursos a las Zonas para los mantenimientos de mitigación de filtraciones de agua lluvia. * Iniciar los procesos de contratación de rehabilitación y mantenimiento de los CDI. LOGROS * Armonización de recursos del PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por del Proyecto. * Diseño para impermeabilización de cubiertas en el patio central en los CDI. * Transferencia de recursos a la Zona 6 (1CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI) y Zona 8 (1CDI) ALERTAS * No existe el Decreto Ejecutivo que permitirá la ejecución de la construcción de los 5 CDI de manera directa desde el Proyecto IESPASDII-MIES. * Mientras no se cuente con el Decreto Ejecutivo que defina la competencia de las construcciones de los CDIs; se corre el riesgo de una baja ejecución en el Proyecto, lo que implica que posteriormente los recursos sean retirados por parte del MEF. * Debido al tiempo transcurrido será necesario plantear la solicitud de una Certificación Plurianual para la construcción de los CDIs, para lo cual se debe gestionar ante el MEF la autorización de incremento al "techo presupuestario" del MIES. * Posible demanda de los contratistas adjudicados para la construcción de los CDIs Quevedo y Jaramijo (Proyecto Arrastre CDI Emblemáticos) NUDOS CRITICOS * Inicio de vigencia del Decreto Ejecutivo que permitirá la ejecución de la construcción de los 5 CDI de manera directa desde el Proyecto IESPASDII-MIES * Para iniciar los procesos de construcción, se necesita la reformar el Estatuto Orgánico Institucional del MIES, que defina las competencias de ejecución de las construcciones de los CDIs; lo que conlleva a un incremento de tiempos para la ejecución de las obras. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Durante este período, en base a las directrices emitidas por las autoridades se avanzado con la actualización del proyecto por el cambio de competencias de la construcción de los CDI a cargo del MIES-Proyecto IESPASDII. En base a las visitas técnicas de los CDI de atención directa y se inicia con la transferencia de recursos a las Zonas para gestionar los procesos de contratación de los mantenimientos de los CDI. Se recomienda que en base a la emisión del Decreto Ejecutivo, las gestione ante los Entes Rectores la actualización del Dictamen de Prioridad del proyecto. Se recomienda que la ejecución de los 5 CDI del Proyecto sean ejecutados por el MTOP, a fin de optimizar tiempos.</p> <p>Proyecto Arrastre Construcción CDI Emblemáticos Los 2 CDI del Proyecto de Arrastre deberán ser ejecutados por el MTOP, por ser firmados antes de la emisión del posible Decreto Presidencial que transfiere las construcciones al MIES.</p>		
<p>Mayo 2022 Durante este período, el MEF realizó la asignación de recursos con un organismo y correlativo en fuente ejecutable; por lo que se plantean las primeras reformas al PAPP en función de la planificación y ejecución de los componentes del Proyecto. De manera conjunta con los Técnicos de la Dirección de Infraestructura y bajo la supervisión de la Subsecretaría, se realizan visitas a los CDI de atención directa a fin de determinar los CDI que necesitan se realice el proceso de mantenimiento de impermeabilización de cubiertas. En el marco del proceso de cierre y liquidación del Proyecto CDI, cuya ejecución corresponde al período 2012-2021; se inició con Mesas de trabajo interinstitucionales entre el MIES y el MTOP, a fin de determinar los montos solicitados por el MTOP para la liquidación de contratos de años anteriores (2012; 2013; 2014 y 2015) que no fueron liquidados contablemente por el Co-ejecutor (SECOB). Además, se inicia el análisis de los trámites pendientes para proceder con el proceso de liquidación y cierre de Convenios Internacionales MIES-MTOP. Ejecución Presupuestaria: CODIFICADO: USD \$ 3'940,288,32 CERTIFICADO: USD \$ 0,00 COMPROMETIDO: USD \$ 35.255,47 DEVENGADO: USD \$ 35.255,47 Alertas: * Iniciar a nivel del Ejecutivo, los procesos administrativos y legales para viabilizar la elaboración del Decreto Ejecutivo que permitirá la ejecución de la construcción de los 5 CDI de manera directa desde el Proyecto IESPASDII-MIES. * Mientras no se cuente con el Decreto Ejecutivo que defina la competencia de las construcciones de los CDIs; se corre el riesgo de una baja ejecución en el Proyecto, lo que implica que posteriormente los recursos sean retirados por parte del MEF. * Debido al tiempo transcurrido será necesario plantear la solicitud de una Certificación Plurianual para la construcción de los CDIs, para lo cual se debe gestionar ante el MEF la autorización de incremento al "techo presupuestario" del MIES.</p>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>06/06/2022 - 02:55 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>HITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Asignación de fuente (organismo y correlativo) con recursos ejecutables en el Grupo de Gasto 75 y 73 por parte del MEF, afin de iniciar la ejecución de los componentes del Proyecto. * Iniciar los procesos de contratación de rehabilitación y mantenimiento de los CDI. * Proceso de Transferencia de recursos a la zona 6, para la impermeabilización de 4 CDIs emblemáticos. <p>LOGROS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Armonización de recursos del PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por del Proyecto. * Evaluación de rubros a ejecutarse para proceder con la impermeabilización de cubiertas de CDI. * Propuestas de mejora en la impermeabilización de cubiertas de CDI "modelo 2012" * Elaborado presupuesto para la intervención y mantenimiento de 4 CDIs en la Zona 6, Provincia del Azuay. 		
<p>Abril 2022</p> <p>Durante este período, se continúa solicitando a la Dirección Financiera para que realice las insistencias al MEF, para la asignación de recursos con un organismo y correlativo en fuente ejecutable afin de cumplir con la planificación y ejecución de los componentes del Proyecto. Además, se solicitó al MTOP remitir los cronogramas y presupuestos para la ejecución de obra y fiscalización, insumo necesario para iniciar con los procesos precontractuales de la construcción de los CDI. Así también de manera conjunta con los Técnicos de la Dirección de Infraestructura y bajo la supervisión de la Subsecretaría, se realizan visitas a los CDI de atención directa a fin de determinar los CDI que necesitan se realice el proceso de mantenimiento de impermeabilización de cubiertas.</p> <p>En base a la disposición de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, en el cual solicita se inicie con el proceso de cierre y liquidación del Proyecto CDI, cuya ejecución corresponde al período 2012-2021; se inició con Mesas de trabajo interinstitucionales entre el MIES y el MTOP, a fin de determinar los montos solicitados por el MTOP para la liquidación de contratos de años anteriores (2012; 2013; 2014 y 2015) que no fueron liquidados contablemente por el Co-ejecutor (SECOB).</p> <p>HITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Asignación de fuente (organismo y correlativo) con recursos ejecutables en el Grupo de Gasto 75 y 73 por parte del MEF, afin de iniciar la ejecución de los componentes del Proyecto. * Iniciar los procesos de contratación de rehabilitación y mantenimiento de los CDI. <p>LOGROS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Armonización de recursos del PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por del Proyecto. * Evaluación de rubros a ejecutarse para proceder con la impermeabilización de cubiertas de CDI. * Propuestas de mejora en la impermeabilización de cubiertas de CDI "modelo 2012" <p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> * Durante este período, en base a las directrices emitidas por las autoridades se procede con la actualización del proyecto por cambio de competencia de la construcción de los CDI a cargo del MIES-Proyecto IESPASDII. * La Gerencia continúa con el seguimiento e insistencias a la Dirección Financiera para que realice la gestión ante el MEF, a fin de que asigne el presupuesto con fuente de financiamiento en recursos ejecutables. * Se han realizado visitas técnicas de manera conjunta con los técnicos de Infraestructura en los CDI de atención directa, para evaluar la intervención del mantenimiento de cubiertas a fin de determinar los presupuestos requeridos. <p>* Se recomienda, que a través de la Dirección Financiera se gestione ante el MEF la asignación de recursos ejecutables por el monto de USD \$ 3'823.005,84 que representa el 97% del presupuesto codificado del proyecto para el ejercicio fiscal 2022, correspondientes al Grupo de Gasto 73 (Bienes y Servicios para inversión) y Grupo de Gasto 75 (Obras Públicas); necesarios para iniciar con los procesos administrativos, técnicos, legales y financieros para la contratación de estudios de implantación, fiscalización, gastos administrativos y ejecución de obras, entre otros; de conformidad a lo establecido en el Proyecto.</p> <p>* Se recomienda que en el CDI seleccionado por la Gerencia, como piloto para la implementación de rubros destinados a mitigar las filtraciones de agua lluvia en cubiertas, se coordine con los Distritos para disponer a los Técnicos de Infraestructura Zonales la ejecución e inicio de procesos precontractuales (Informes de necesidad, Términos de referencia, Especificaciones técnicas y presupuestos referenciales, etc).</p>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>06/05/2022 - 08:35 AM</p>
<p>Marzo 2022</p> <p>Ejecución Presupuestaria</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 3'940,288,32</p> <p>CERTIFICADO: USD \$ 0,00</p> <p>COMPROMETIDO: USD \$ 14.118,16</p>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>05/04/2022 - 05:54 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DEVENGADO: USD \$ 14.118,16</p> <p>Durante este período, en base a la planificación del Proyecto se ha realizado la gestión con Coordinaciones Zonales y las Direcciones Distritales solicitando la revisión del estado de las escrituras de los predios donde va a construirse los nuevos CDI y que se mantenga al día los pagos de las obligaciones como impuesto predial, entre otros ante los GADs, de igual manera se solicito al MTOP remitir los insumos necesarios para iniciar con la elaboración de un Convenio de Cooperación Interinstitucional.</p> <p>La Gerencia ha gestionado con la Dirección Financiera para que se realice el acercamiento con el MEF, a fin de que asigne el presupuesto con fuente de financiamiento en recursos ejecutables. Se recomienda en el CDI seleccionado por la Gerencia, como piloto para la implementación del redireccionamiento de las descargas de agua lluvia en la cubierta (humedades), se coordine con la Dirección de Infraestructura para la ejecución e inicio de procesos precontractuales.</p>		
<p>Febrero 2022</p> <p>Durante este período se solicito al MEF que se viabilice la asignación de recursos con un organismo y correlativo en fuente ejecutable afin de cumplir con la planificación y ejecución de los componentes del Proyecto. Además, se solicitó al MTOP remitir los cronogramas y presupuestos para la ejecución de obra y fiscalización, insumo necesario para iniciar con la elaboración del Convenio Interinstitucional MIES-MTOP. Así también de manera conjunta con los Técnicos de la Dirección de Infraestructura y bajo la supervisión de la Subsecretaría, se iniciara con el proceso para la rehabilitación y mantenimiento de impermeabilización de cubiertas de 1 CDI piloto "Desmon Dalton".</p> <p>Ejecución Presupuestaria Febrero 2022</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 3'940.288,32 CERTIFICADO: USD \$ 0,00 COMPROMETIDO: USD \$ 9.298,68 DEVENGADO: USD \$ 9.298,68</p> <p>HITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Asignación de recursos ejecutables por parte del MEF afin de iniciar la ejecución de los componentes del Proyecto. * Viabilizar la elaboración del Convenio Interinstitucional MIES- MTOP para la construcción de los 5 CDI en el presente período fiscal 2022. * Iniciar los procesos de contratación de rehabilitación y mantenimiento de los CDI. * Contratación del Gerente del Proyecto. <p>LOGROS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Armonización Matriz PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por el Proyecto. * Evaluación de rubros a ejecutarse para proceder con la impermeabilización de cubiertas de CDI piloto. <p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</p> <p>El proyecto no cuenta con recursos de organismo y correlativo en fuente ejecutable lo que conlleva a que los procesos para la construcción de los CDI nuevos no se ejecuten. Se recomienda en el CDI, seleccionado por la Gerencia como piloto para la implementación de reformas de diseño de cubierta (impermeabilizar) se coordine con la Dirección de Infraestructura para la ejecución e inicio de procesos precontractuales.</p> <p>Se recomienda realizar la contratación del Gerente del Proyecto, quien será Responsable de la coordinación y el cumplimiento del Proyecto aprobado por la SNP.</p>	<p>Salamea Ortuño, Carolina Elizabeth</p>	<p>04/03/2022 - 11:22 AM</p>
<p>Enero 2022</p> <p>Durante este período se obtuvo el Acuerdo Ministerial con el cual el Proyecto es declarado como Emblemático.</p> <p>El MEF asigno el presupuesto de USD 3'940.288,32 ,con un organismo y correlativo no ejecutable (9999/9999) lo que conlleva a retardar la planificación y ejecución de los componentes del Proyecto.</p> <p>En base a la planificación del Proyecto se ha realizado la gestión con Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales solicitando la revisión del estado de las escrituras de los predios donde va a construirse los CDI y se mantenga al día los pagos de las obligaciones como impuesto predial, entre otros ante los GADs, de igual manera se solicito al MTOP remitir los insumos necesarios para iniciar con la elaboración de un Convenio Interinstitucional.</p>	<p>Salamea Ortuño, Carolina Elizabeth</p>	<p>10/02/2022 - 03:04 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se recomienda gestionar con la Dirección de Planificación y la Dirección Financiera realizar el acercamiento con el MEF, a fin de que asigne el presupuesto con fuente de financiamiento en recursos ejecutable.</p> <p>Se recomienda en el CDI, seleccionado por la Gerencia como piloto para la implementación de reformas de diseño de cubierta (impermeabilizar) se coordine con la Dirección de Infraestructura para la ejecución e inicio de procesos precontractuales.</p> <p>Se recomienda que en base al Art. 2 del Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2022-001 se realice todos los trámites correspondientes para el proceso de contratación y posesión del Gerente del Proyecto, quien será administrativa, civil y penalmente responsable de los actos y hechos inherentes a su cargo.</p>		

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Definir y ratificar de los CDI por ejecutar por parte de las autoridades.	9-Entregables Formales	15/02/2022		15/02/2022		Sí	1.5
2	DEFINICIÓN: Gestión para calificar el Proyecto con Carácter Emblemático	9-Entregables Formales	15/02/2022		15/02/2022		Sí	2.0
3	EJECUCION: Presupuesto 2022 asignado.	9-Entregables Formales	15/02/2022		15/02/2022		Sí	1.0
4	DEFINICIÓN: Programación para el Mantenimiento y Rehabilitación de los CDI de Atención Directa.	5-Entregables Intermedios	25/02/2022		25/02/2022		Sí	2.5
5	DEFINICIÓN: El MEF debe realizar la asignación de recursos ejecutables para la construcción de los CDI	5-Entregables Intermedios	30/03/2022		18/05/2022		Sí	2.5
6	EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		30/11/2022		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Estudios y Diseños 2022	5-Entregables Intermedios	30/12/2022	30/12/2022			No	12.5
8	PLANEACIÓN: Asignación de recursos ejecutables 2023	9-Entregables Formales	30/03/2023	30/03/2023			No	16.5
9	EJECUCIÓN: Estudios y Diseños 2023	9-Entregables Formales	30/05/2023	30/05/2023			No	5.0
10	EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2023	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	5.0
11	EJECUCIÓN: Ejecución de obras 2022	9-Entregables Formales	30/07/2023	30/07/2023			No	5.0
12	PLANEACIÓN: Asignación de recursos 2024	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	16.5
13	EJECUCIÓN: Estudios y Diseños 2024	5-Entregables Intermedios	30/05/2024	30/05/2024			No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2024	9-Entregables Formales	30/06/2024	30/06/2024			No	5.0
15	EJECUCIÓN: Ejecución de obras 2023	9-Entregables Formales	30/07/2024	30/07/2024			No	5.0
16	EJECUCIÓN: Ejecución de obras 2024	9-Entregables Formales	30/11/2024	30/11/2024			No	5.0
17	CIERRE: Elaborar informe de gestión 2024	9-Entregables Formales	30/12/2024	30/12/2024			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
1	Número de Centros Infantiles con equipamiento y mobiliario implementado		0.00 %	2	0	01/01/2022	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,940,288.32 **
Costo Total:	8,421,041.80
Total Devengado:	97,252.11
% Costo Total Devengado:	1.15 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 1.15 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	996,448.52	0.00	996,448.52
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Ppto. Codificado	0.00	996,448.52	0.00	996,448.52
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	3,940,288.32	0.00	3,940,288.32
Ppto. Devengado	0.00	97,252.11	0.00	97,252.11
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	3,940,288.32	0.00	3,940,288.32
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	2.47 %	0.00 %	2.47 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	15,767.28	9,298.68	15,767.28	9,298.68	58.97 %		0.24 %
Mar	8,513.64	4,819.48	24,280.92	14,118.16	58.15 %		0.36 %
Abr	7,883.64	11,241.06	32,164.56	25,359.22	78.84 %		0.64 %
May	1,677,638.43	9,896.25	1,709,802.99	35,255.47	2.06 %		0.89 %
Jun	7,883.64	9,896.25	1,717,686.63	45,151.72	2.63 %		1.15 %
Jul	8,513.64	10,152.24	1,726,200.27	55,303.96	3.20 %		1.40 %
Ago	2,161,264.69	11,226.74	3,887,464.96	66,530.70	1.71 %		1.69 %
Sep	8,513.64	9,896.25	3,895,978.60	76,426.95	1.96 %		1.94 %
Oct	7,883.64	10,750.54	3,903,862.24	87,177.49	2.23 %		2.21 %
Nov	8,413.64	10,074.62	3,912,275.88	97,252.11	2.49 %		2.47 %
Dic	28,012.44		3,940,288.32				
Total	3,940,288.32	97,252.11					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la eficiencia de los servicios que promueven el desarrollo integral de niñas y niños de 1 a 3 años de edad MEDIANTE la generación procesos de fortalecimiento técnico-metodológico, de capacitación, control, acompañamiento y evaluación de la gestión del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Asociado al Problema - Retraso en las construcciones CAUSARÍA una inadecuada ejecución y prestación del servicio de desarrollo infantil	2022.05.16_MIES-CGAF-DF-2022-0815-M_Resp_DF_Asignación_de_recursos_organismo_y_correlativo.pdf	10/11/2022
2	Asociado al problema Retraso el mantenimiento de los CDI de Atención Directa CAUSARÍA edificaciones en mal estado	2022.05.16_MIES-CGAF-DF-2022-0815-M_Resp_DF_Asignación_de_recursos_organismo_y_correlativo.pdf	10/11/2022
3	ASOCIADO HITO 1: Definir y ratificar de los CDI por ejecutar por parte de las autoridades.	CERTIFICADO_DE_PREDIOS_MAXIMA_AUTORIDAD.pdf	11/02/2022
4	ASOCIADO HITO 1: Definir y ratificar de los CDI por ejecutar por parte de las autoridades.	Certificación_Predios_10_-_2024_(1)-signed.pdf	11/02/2022
5	ASOCIADO HITO 2: Gestión para calificar el Proyecto con Carácter Emblemático	Acuerdo_ministerial_declarando_emblematicos_proyectos_mies_02_2022.pdf	11/02/2022
6	ASOCIADO HITO 3: Presupuesto 2022 asignado	Acuerdo_Ministerial_MIES-2022-003_de_12_de_enero_de_2022.pdf	11/02/2022
7	ASOCIADO HITO 3: Presupuesto 2022 asignado	Acuerdo_MIES-2022-005_de_25_de_enero_de_2022.pdf	11/02/2022
8	ASOCIADO HITO 4: Programación para el Mantenimiento y Rehabilitación de los CDI de Atención Directa.	2022.03.18_MIES-CGAF-DI-2022-0162-M_Solicitud_de_presupuesto_y_plan_de_acción_para_el_Mantenimiento_de_los_CDI_de_atención_directa.pdf	08/09/2022
9	ASOCIADO HITO 5 - DEFINICIÓN: El MEF debe realizar la asignación de recursos ejecutables para la construcción de los CDI	2022.05.16_MIES-CGAF-DF-2022-0815-M_Resp_DF_Asignación_de_recursos_organismo_y_correlativo.pdf	10/11/2022
10	ASOCIADO HITO 6 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	2022.10.14_RESOLUCIÓN_DE_INICIO_MANTENIMIENTO_CDI_2022.pdf	10/11/2022
11	ASOCIADO HITO 6 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	2022.10.14_RESOLUCIÓN_DE_INICIO_MANTENIMIENTO_CDI_2022_DELEG.pdf	10/11/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	ASOCIADO HITO 6 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	2022.10.14_RESOLUCIÓN_DE_INICIO_MANTENIMIENTO_	10/11/2022
13	ASOCIADO HITO 6 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	2022.10.04_RESOLUCIÓN_D_EINICIO_MANTENIMIENTO_	10/11/2022
14	ASOCIADO HITO 6 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	2022.10.25_RESOLUCIÓN_DE_INICIO_MANTENIMIENTO_DIS_MILAGRO.pdf	10/11/2022
15	Asociado RIESGO - NACIONAL. Económico. La falta de financiamiento CAUSARIA el retraso del cumplimiento de las metas planificadas en el Proyecto	2022.05.16_MIES-CGAF-DF-2022-0815-M_Resp_DF_Asignación_de_recursos_organismo_y_correlativo.pdf	10/11/2022
16	Asociado RIESGO - NACIONAL. Económico. La falta de financiamiento CAUSARIA el retraso del cumplimiento de las metas planificadas en el Proyecto	Cedula_Presupuestaria_Proyecto_006_con_corte_16_d_ema	10/11/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chicaiza Toapanta, Wilson Alfonso	Analista de Proyecto de Inversión 3 - Proceso Financiero	Analista de Proyectos de Inversión 3	wilson.chicaiza@inclusion.gob.ec	0992563725
Cáceres Aucatoma, Pavlov	Gerente del Proyecto IESPASDII	Gerente Proyecto	pavlov.caceres@inclusion.gob.ec	
Torres Pilatuña, Klever Rolando	Analista de Proyecto de inversión 3 - Seguimiento Constructivo	Analista de Proyecto de Inversión 3 - Proceso constructivo	klever.torres@inclusion.gob.ec	0984443258
Vega Manobanda, Ximena Alexandra	Asistente de Proyecto	Asistente de Proyecto de inversión	ximena.vega@inclusion.gob.ec	0980457849
Zumba Chicaiza, Bertha Cecilia	Analista de Proyecto de Inversión 3 - Proceso Planificación y Presupuesto	Analista de Proyecto de Inversión	bertha.zumba@inclusion.gob.ec	0985970593
