

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Discapacidades**

**Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad**

**PROYECTO: K002** MIES-Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa.

Líder del Proyecto:			
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	
Titular:	González Cuero, Mónica Delia	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	1.16
CUP:	102800000.0000.383964	TIR:	27.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	886,685.48
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,700,000.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	25/11/2021 - 25/11/2024
Fecha de última actualización:	06/01/2023	Fecha de Fin Base:	25/11/2024
Modificado por:	León Suqui, Fernando David	Fecha del siguiente Hito:	29/12/2022


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
El proyecto busca fortalecer la inclusión social a personas cuidadoras de personas con discapacidad, con la implementación de un modelo de apoyo integral, con el fin de mejorar la calidad de cuidado, autocuidado y las condiciones de vida del cuidador y disminuir el síndrome de sobrecarga del cuidador mediante el fortalecimiento de sus capacidades para mejorar la calidad de cuidado a personas con discapacidad severa.
<b>Beneficios Cualitativos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con el fortalecimiento de las capacidades de las personas cuidadores principales y suplentes, se reduce la sobrecarga del cuidador y se mejora la calidad en el cuidado a personas con discapacidad severa.</li> <li>- Con la certificación de las personas cuidadores principales y suplentes, se obtendrá un fortalecimiento en el el cuidado de personas con discapacidad severa obteniendo un tiempo de respiro.</li> </ul>
<b>Tipo de Beneficiario</b>
La población objetivo del proyecto está basada en el número de asistentes del cuidado de usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara que asciende a un total de 22.548 personas entre principales y suplentes del cuidado de las personas con discapacidad severa.
<b>Restricciones</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alcance: Será beneficiarios solo los cuidadores principales y suplentes de las personas usuarias que reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara.</li> <li>- Tiempo: Tiene una duración de 5 años, por la pandemia de la COVID-19 no se ha ejecutado.</li> <li>- Recursos: Es necesario contar con el Modelo de Redes de Apoyo a las personas con discapacidad atendidas por el MIES y sus familias.</li> <li>- Costo: No se puede exceder los recursos definidos por la fuente de financiamiento.</li> </ul>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 37.37 %  
 Fecha de Inicio: 25/11/2021 Fecha de Fin: 25/11/2024

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

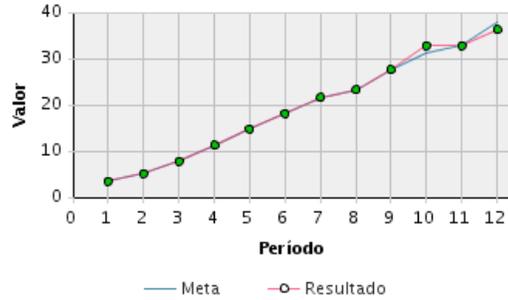

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	3 %	5 %	8 %	11 %	15 %	18 %	22 %	23 %	28 %	31 %	33 %	38 %
	Avance real acumulado											
	3 %	5 %	8 %	11 %	15 %	18 %	22 %	23 %	28 %	33 %	33 %	36 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de diciembre de 2022:</p> <p>01. El presupuesto actual del proyecto de inversión en el grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es de US\$73.408,48 correspondiente a los procesos de contratación programados para el ejercicio fiscal 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria acumulada de enero al 31 de diciembre de 2022 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US \$36.414,34 equivalente al 49,61% sobre el presupuesto ejecutable de US\$73.408,48.</p> <p>03. Se validó por parte de la Dirección Financiera la reforma Nro. MIES-VIS-FGICPDS-RP-2022-009, de manera que el codificado al 31 de diciembre establece un remanente de US \$73.408,48.</p> <p>04. Con corte al 31 de diciembre de 2022, se mantiene el avance físico del proyecto en el 2% dado que se encuentran operando los consultores especialistas legal y de adquisiciones.</p> <p>05. Con documento Nro. CAN/CEC-1400/2022 de 23 de diciembre 2022, se otorgó la No Objeción del BID a la lista corta propuesta por el CTES para la contratación de la Consultoría del Modelo de Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad.</p> <p>León Suqui, Fernando David 06/01/2023 - 03:29 PM</p>	León Suqui, Fernando David	06/01/2023 - 03:33 PM
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de noviembre de 2022:</p> <p>01. El presupuesto actual del proyecto de inversión en el grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es de US\$325.804.69 correspondiente a los procesos de contratación programados para el ejercicio fiscal 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria acumulada de enero al 30 de noviembre de 2022 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US \$32.130,30 equivalente al 9,86% sobre el presupuesto ejecutable de US\$325.804,69.</p> <p>03. El 28 de noviembre de 2022 con memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-1390-M, la Coordinación de Planificación aprobó la Reforma Nro. 9, la misma que plantea una reducción de codificado de US\$252.396,21, de manera que el nuevo monto codificado es de US\$73.408,48, sin embargo al 30 de noviembre de 2022 no se evidenció el nuevo saldo codificado en ESIGEF.</p> <p>04. Con corte al 31 de octubre de 2022, se mantiene el avance físico del proyecto en el 2% dado que se encuentran operando los consultores especialistas legal y de adquisiciones.</p> <p>05. Una vez obtenida la No Objeción del BID a la fase preparatoria de la contratación de la Consultoría del Modelo de Redes, se procedió a la publicación de expresiones de interés en las páginas del MIES y el SERCOP, sin embargo no se obtuvo expresiones de interés en el plazo correspondiente, de manera que con memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0235-O de 29 de noviembre de 2022 se informó al BID la decisión del MIES de ampliar el período de recepción de expresiones de interés hasta el próximo 08 de diciembre de 2022.</p>	León Suqui, Fernando David	06/01/2023 - 03:29 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>06. Con comunicación del 02 de noviembre de 2022, el BID emitió el visto bueno a los TDR de la Consultoría de Registro, de manera que junto con el área técnica se procederá a diseñar el estudio de mercado que proporcionará el presupuesto preliminar de la consultoría.</p> <p>07. No se realizará la contratación de los consultores especialistas de monitoreo y evaluación; así como el financiero debido a que los perfiles remitidos por los oferentes no cumplieron con las especificaciones de los TDR constantes en los modelos de invitación/3CVs que cuentan con no objeción por parte del Banco Interamericano de Desarrollo.</p>		
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de septiembre 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria mensual de septiembre de 2022 es de US\$4.284,04 equivalente al 0,94% del presupuesto total y corresponde al pago de los servicios de la consultoría de los especialistas legal y adquisiciones. Además, se tienen comprometido un valor de US\$40.698,37.</p> <p>03. Con corte 30 de septiembre el proyecto tiene un cumplimiento económico del 5,16%, lo que corresponde a una ejecución de US\$23.562,22; sobre el monto codificado de US\$456.690,42.</p> <p>04. La Gerencia se encuentra a la espera de la respuesta de parte de la Coordinación Administrativa Financiera sobre los avales y certificaciones presupuestarias para la contratación de la: "Consultoría Técnica Especializada para Diseñar y Validar el Modelo de Gestión y el Esquema de Incentivos del Modelo de Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad atendidas por el MIES y sus familias".</p> <p>05. El proceso de contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, se están realizando ajustes a los términos de referencia en conjunto con la consultora externa del BID Cinthia Rosero.</p> <p>06. El proceso de contratación de la Línea Base, se solicitó apoyo y soporte al BID para la elaboración de los términos de referencia, se está por definir las fechas para realizar avances en el documento preliminar.</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>28/10/2022 - 08:36 AM</p>
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de agosto 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria mensual de agosto de 2022 es de USD 4.284,04 equivalente al 0,94% del presupuesto total y corresponde al pago de los servicios de la consultoría de los especialistas legal y adquisiciones. Además, se tienen comprometido un valor de USD 40.698,37.</p> <p>03. La ejecución presupuestaria acumulada a agosto de 2022 es de USD 19.278,18 equivalente al 4,22% del presupuesto total y corresponde al pagos de los servicios de la consultoría de los especialistas legal y adquisiciones.</p> <p>04. Respecto al proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos, se envió los términos de referencia, la invitación de expresiones de interés y la solicitud de propuestas al BID para contar con la correspondiente no objeción.</p> <p>05. El proceso de contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, se están realizando ajustes a los términos de referencia en conjunto con la consultora externa del BID Cinthia Rosero.</p> <p>06. El proceso de contratación de la Línea Base, se solicitó apoyo y soporte al BID para la elaboración de los términos de referencia, se está por definir las fechas para realizar avances en el documento preliminar.</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>22/09/2022 - 05:28 PM</p>
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de julio 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria mensual de julio de 2022 es de USD 4.284,04 equivalente al 0,59% del presupuesto total y corresponde al pago de los servicios de la consultoría del especialista legal. Además, se tienen comprometido un valor de USD 40.698,37.</p> <p>03. La ejecución presupuestaria acumulada a julio de 2022 es de USD 14.994,14 equivalente al 2,06% del presupuesto total y corresponde al pagos de los servicios de la consultoría del especialista legal.</p> <p>04. El proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos, se envió el pedido para la actualización de proformas en razón de los cambios a los términos de referencia, en lo que respecta al plazo de 180 días a 210 días.</p> <p>05. El proceso de contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, hay una versión preliminar de los términos de referencia que fueron enviados el 26 de julio de 2022 a la consultora externa Ma. Elena Ramirez del BID.</p> <p>06. El proceso de contratación de la Línea Base, se solicitó apoyo y soporte al BID para la elaboración de los términos de referencia, se está por definir las fechas para realizar avances en el documento preliminar.</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>25/08/2022 - 11:08 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de junio 2022:</p> <p>01. Postulación del proyecto de inversión denominado: "Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa" para la proforma presupuestaria del Plan Anual de Inversiones - PAI 2023.</p> <p>02. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2022.</p> <p>03. Se realizó y se aprobó los informes del segundo trimestre de 2022 de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo.</p> <p>04. La ejecución presupuestaria acumulada en el grupo de gasto 73 con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 10.710,10 equivalente al 1,47% del presupuesto total, no incluye los USD 970.464,20*.</p> <p>05. El proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos tuvo un avance hasta la calificación de las expresiones de interés, sin embargo, se tuvo que declarar el proceso en desierto, conforme Comunicación del BID Nro. CAN/CEC-647. Se está reestructurando los términos de referencia, para el nuevo proceso de contratación.</p> <p>06. Los términos de referencia de la contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, están siendo reestructurados conforme las recomendaciones realizadas por el BID.</p> <p>07. Los términos de referencia de la contratación de la línea base, se encuentran en proceso de reestructuración, conforme las sugerencias realizadas por el BID, la Subsecretaría de Discapacidades, se encuentran realizando los ajustes.</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>13/07/2022 - 04:04 PM</p>
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de mayo 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria mensual de mayo de 2022 es de USD 2.142,02 equivalente al 0,29% del total (no incluye los USD 970.464,20.) y corresponde al pago de los servicios de la consultoría del especialista legal del mes de mayo 2022.</p> <p>03. La ejecución presupuestaria acumulada en el grupo de gasto 73 con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 8,568.08 equivalente al 1,17% del presupuesto total, no incluye los USD 970.464,20.</p> <p>04. El 31 de mayo de 2022, se firmó el contrato con el consultor individual, especialista de adquisiciones como parte del equipo ejecutor de la operación CP Nro. 4634 OC/EC - L1236.</p> <p>05. Recepción de expresiones de interés para el proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos.</p> <p>06. Los términos de referencia de la contratación de la línea base, fueron devueltos por el BID con observaciones y se encuentran realizando los ajustes la Subsecretaría de Discapacidades.</p> <p>07. El 19 de mayo de 2022, mediante memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0346-M se solicitó la reducción presupuestaria por USD 970.464,20 con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable. Al 31 de mayo de 2022, conforme reporte del ESIGEF la reforma se encuentra plantea, y se encuentra en estado consolidado.</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>21/06/2022 - 06:53 PM</p>
<p>Hitos cumplido correspondiente al mes de abril 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2022.</p> <p>02. El 26 de abril de 2022 mediante Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0302-M se remitió la programación de los desembolsos actualizados para el ejercicio fiscal 2022, considerando el flujo de caja de la operación L1236.</p> <p>03. Se tiene la "No objeción" a los términos de referencia y el estudio de mercado para el proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos.</p> <p>04. Se realizó la resolución administrativa Nro. FAISDI-MIES-001-002-2022-CP4634-DD de fecha 05 de abril de 2022, con la declaración de desierto del proceso de contratación del especialista de adquisiciones.</p> <p>05. Se tiene estructurado los términos de referencia de la contratación de la línea base, y se remitió al BID para la "No Objeción".</p> <p>06. La ejecución presupuestaria mensual en abril de 2022 es de USD 2.142,02 equivalente al 0,13% y correspondiente al pago de los servicios de la consultoría del especialista legal correspondiente al mes de marzo 2022.</p> <p>07. La ejecución presupuestaria acumulada es en el grupo de gasto 73 con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 6.426,06 equivalente al 0,38% del presupuesto total.</p> <p>08. Se mantiene en fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 el valor ejecutable por USD 729.535,80. Sin embargo, con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable por el monto de USD 970.464,20.</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>10/05/2022 - 06:59 PM</p>
<p>Hitos cumplido correspondiente al mes de marzo 2022:</p> <p>1.- Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2022.</p>	<p>León Suqui, Fernando David</p>	<p>11/04/2022 - 08:46 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- Se elaboró y se aprobó los informes de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo del primer trimestre del 2022.</p> <p>3.- Se realizó el proceso para la contratación del especialista de adquisiciones, sin embargo, por una error de cálculo en la calificación no se pudo tener una terna, por lo tanto, no se obtuvo la "No Objeción" del BID y se declarará en desierto. Se prevé un nuevo proceso de contratación y se estima tener la contratación hasta el 01 de mayo de 2022.</p> <p>4.-El 03 de marzo 2022 se verificó en el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF la reforma DIS 50 y AMP 51 por el valor de USD 1.700.000,00 en estado aprobado, en función de lo siguiente: en fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 se tiene un valor ejecutable por USD 729.535,80. Pero con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable por el monto de USD 970.464,20.</p> <p>5. El 22 de marzo de 2022 mediante Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0206-M se remitió el detalle de los desembolsos actualizados para el ejercicio fiscal 2022, con la información en el formato establecido considerando los respectivos flujos de caja de las operaciones actualizadas a la fecha.</p> <p>6.- La ejecución presupuestaria en el grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 4.284,04 equivalente al 7% del presupuesto de la actividad 07 que tiene un monto de USD 57.577,52. La erogación antes mencionada representa el pago de los servicios de la consultoría del especialista legal correspondiente al mes de enero y febrero de 2022.</p>		
<p>Hitos cumplido correspondiente al mes de febrero 2022:</p> <p>1. El 10 de febrero de 2022 se realizó el seguimiento a la reforma planteada con Nro. MIES-VIS-FGICPDS-2022-01, y solicitado mediante el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF Nro. DIS 50 y AMP 51 por el valor de USD 1.7 millones para el proyecto de discapacidad severa. Asimismo, se realizó una insistencia el 15 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0032-O dirigido a la Subsecretaria de Presupuesto, Olga Núñez y a la Directora de Egresos no Permanentes, Tatiana Calán. La reforma se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.</p> <p>2. El 10 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MSP-MSP-2022-0450-O la Gerencia de Financiamiento Exerno del Ministerio de Salud Pública - MSP, solicitó se informe sobre desembolsos, suscripción de contratos y pagos realizados. Al respecto, el 11 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0027-O se remitió información sobre un contrato suscrito (especialista de legal), asimismo, se informó que no se ha realizado ningún pago ni desembolso hasta la presente fecha, por parte del Ministerio de Inclusión Económica y social - MIES.</p> <p>3. El 24 de febrero de 2022 mediante documento Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0036-O se solicitó al Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF el primer desembolso de recursos del Contrato de Préstamo Nro. 4634/OC-EC L1236 por un valor de USD 100.000,00 dólares.</p> <p>4. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 28 de febrero de 2022.</p>	León Suqui, Fernando David	11/03/2022 - 08:08 AM
<p>Hitos cumplido correspondiente al mes de enero 2022:</p> <p>1- El 27 de enero de 2022 se remitió el Plan Anual de la Política Pública - PAPP del proyecto de "Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa", para el ejercicio fiscal 2022.</p> <p>2. El 31 de enero de 2022 se realizó la reforma Nro. MIES-VIS-FGICPDS-2022-01 para ajustar la planificación y el presupuesto con el organismos 2002 y correlativo 5086.</p>	León Suqui, Fernando David	03/03/2022 - 11:05 AM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p><b>5- PROYECTO. * General.</b> Retraso en el proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos CAUSARÍA la demora en la contratación de los demás procesos programados</p>	14/10/2022		40 %	50	20	1/1
<p><b>5- PROYECTO. * General.</b> Demora en la solicitud y entrega de las certificaciones presupuestarias plurianuales CAUSARÍA el retraso en la contratación del equipo de gestión</p>	14/10/2022		40 %	50	20	1/1
