

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Protección Especial
Dirección de Servicios de Protección Especial

PROYECTO: K013 MIES-Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional

Líder del Proyecto:	TENORIO ARISMENDI, SALOMON (salomon.tenorio@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jurado Velastegui, Estefany Malena	Programas Relacionados:	
Titular:	Chala Angulo, Sonia Catherine	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	1.12
CUP:	102800000.0000.387151	TIR:	20.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	882,718.48
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,000,000.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	09/01/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Suárez Salazar, Patricio Arturo	Fecha del siguiente hito:	31/12/2022

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", busca mejorar la una propuesta de intervención sobre la alta prevalencia de prácticas familiares, sociales, culturales e institucionales de vulneración sistemática de los derechos humanos a las personas en el ciclo de vida, con particular énfasis en la generación de condiciones reales para el ejercicio efectivo de los derechos a las niñas, niños y adolescentes, procurando la permanencia familiar y/o su reinserción en el menor tiempo posible, el disfrute de los servicios sociales básicos para el desarrollo humano, de forma progresiva, pero sostenida. Las niñas, niños y adolescentes que, por diversas situaciones contrarios a su propia voluntad, se encuentran en situaciones de riesgo o vulneración de sus derechos y que por ello pueden estar o están privados de su medio familiar, requieren de una especial protección por parte de las entidades del poder público.

Componentes. En el proyecto de inversión se desarrollan los siguientes componentes:

Componente 1. Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD #s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas modelos de atención establecido por el MIES

Componente 2. Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos

Componente 3. Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa de Acogimiento Institucional y sus procesos adyacentes

Componente 4. Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial

Beneficios Cualitativos

Atención a los niños, niñas y adolescentes mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes.

Fortalecimiento de los servicios de Protección Especial con calidad y calidez que cumplan el modelo de atención y las normas técnicas, ofreciendo los servicios de acogimiento institucional y modalidades alternativas.

Mejoramiento permanente en la calidad de los servicios, de las unidades de atención directa en la modalidad de acogimiento institucional.

Tipo de Beneficiario

Niños, niñas y adolescentes que estén en situación de riesgo o vulneración de sus derechos. Al 2025 se atenderá a 15.574 niñas, niños y adolescentes, vulnerados en sus derechos a través del acceso a servicios de protección especial de acuerdo a la norma técnica correspondiente a cada modalidad de atención

Restricciones

Tiempo: El proyecto tendrá una duración de cuatro años.

Costo total asignado para el proyecto es USD 96.418.857,76 (Noventa y seis millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y siete 76/100 dólares)

Alcance: El Proyecto se ejecutará a nivel nacional.


Recursos Humanos: Técnicos contratados para la ejecución del proyecto a nivel nacional.

Recursos Materiales: Materiales de oficina y Equipos Tecnológicos necesarios para la ejecución del proyecto"

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 25.53 %

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

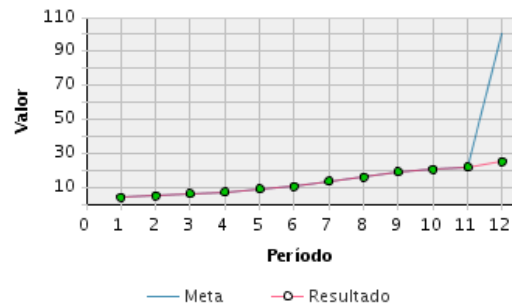

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	4 %	5 %	6 %	7 %	9 %	10 %	14 %	16 %	19 %	20 %	22 %	100 %
	Avance real acumulado											
	4 %	5 %	6 %	7 %	9 %	10 %	14 %	16 %	19 %	20 %	22 %	25 %
2022	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2022: AL MES DE NOVIEMBRE SE MANTIENE UN CODIFICADO DE USD 17.908.013,33, DEVENGADO USD 13.658.429,15, CON UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 76,27%. SE SUSCRIBE 117 CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA EN LAS MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y ACOGIMIENTO FAMILIAR, CON UNA COBERTURA EN LAS MODALIDADES ANTES MENCIONADAS DE 3.397 USUARIOS, A LA FECHA SE FINANCIAN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO EN LA MODALIDAD ALTERNATIVA DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR. SE HA ASIGNADO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN EL GRUPO DE GASTO 840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN SE ENCUENTRA PRE COMPROMETIDO, CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTRO Y CON AVAL EMITIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Suárez Salazar, Patricio Arturo	09/01/2023 - 10:36 AM
NOVIEMBRE 2022: AL MES DE NOVIEMBRE SE MANTIENE UN CODIFICADO DE USD 18.923.752,07, DEVENGADO USD 12.912.705,98, CON UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 68,24%. SE SUSCRIBE 130 CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA EN LAS MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y ACOGIMIENTO FAMILIAR, CON UNA COBERTURA EN LAS MODALIDADES ANTES MENCIONADAS DE 3.397 USUARIOS, A LA FECHA SE FINANCIAN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO EN LA MODALIDAD ALTERNATIVA DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR. SE HA ASIGNADO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN EL GRUPO DE GASTO 840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN SE ENCUENTRA PRE COMPROMETIDO, CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTRO Y CON AVAL EMITIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Suárez Salazar, Patricio Arturo	06/12/2022 - 11:22 AM
OCTUBRE 2022: PASS Al mes de octubre se mantiene un codificado de USD 18.923.752,07, devengado USD 10.974.059,65, con un avance en la ejecución del proyecto de 57,99. Se suscribe 121 convenios de cooperación técnica - económica en las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar,	Suárez Salazar, Patricio Arturo	06/12/2022 - 11:22 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar, con una cobertura en las modalidades antes mencionadas de 3.427 usuarios. Se ha asignado a las unidades operativas desconcentradas los recursos solicitados para equipamiento y mobiliario en el Grupo de Gasto 840000 Bienes de Larga Duración se encuentra pre comprometido, con autorización del Ministro y con aval emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.		
SEPTIEMBRE 2022: Al mes de septiembre se mantiene un codificado de USD 19.073.752,07, devengado USD 7.972.753,47, con un avance en la ejecución del proyecto de 41,80%. Se suscribe 115 convenios de cooperación técnica - económica en las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar, con una cobertura en las modalidades antes mencionadas de 3.277 usuarios. Se ha asignado a las unidades operativas desconcentradas los recursos solicitados para equipamiento y mobiliario en el Grupo de Gasto 840000 Bienes de Larga Duración se encuentra pre comprometido, con autorización del Ministro y con aval emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el valor de \$ 103.764,19. Presupuesto en proceso de certificación \$ 45.352,84. Las unidades de atención del Distrito Metropolitano de Quito tienen un presupuesto de \$ 42.000 que no logran ejecutar. Para atender las adecuaciones de mobiliario y equipamiento de la unidad de atención, considerado en el Compromiso Ministerial para la re - inauguración de la Casa Hogar Infante Femenino, en la ciudad de Guayaquil por el valor de \$ 28.882,97 a ser ejecutado	Suárez Salazar, Patricio Arturo	24/10/2022 - 09:14 AM
AGOSTO 2022: Al mes de agosto se mantiene un codificado de USD 19.073.752,07, devengado USD 7.601.993,45, con un avance en la ejecución del proyecto de 39,86%. Se tiene suscrito 107 convenios de cooperación técnica - económica de las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar, con una cobertura en las modalidades antes mencionadas de 3.277 usuarios. Se ha asignado a las unidades operativas desconcentradas los recursos solicitados para equipamiento y mobiliario en el Grupo de Gasto 840000; se están realizando las gestiones ante la máxima autoridad para la aprobación y solicitud de aval al Ministerio de Economía y Finanzas. De igual manera, se han realizado las gestiones con la Dirección de Infraestructura y las coordinaciones zonales y direcciones distritales para la asignación y ejecución del presupuesto destinado para las adecuaciones de las unidades de atención directa: Hilando Nuestros Sueños, Casa Hogar Infante Femenino, Casa Hogar Guayaquil, Casa Hogar Campi de Yoder, Casa Hogar Enríquez Gallo. Se está financiado desde la gerencia para la suscripción de convenios de Apoyo Familiar y Custodia Familia, con el propósito de dar continuidad a los servicios hasta diciembre 2022.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	13/09/2022 - 11:45 AM
JULIO 2022 En el mes de julio se tiene suscrito 104 convenios de cooperación técnica - económica de las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar, con una cobertura en las modalidades antes mencionadas de 3.511 usuarios. Se ha asignado a las unidades operativas desconcentradas los recursos solicitados para equipamiento y mobiliario en el Grupo de Gasto 840000; se están realizando las gestiones ante la máxima autoridad para la aprobación y solicitud de aval al Ministerio de Economía y Finanzas. De igual manera, se han realizado las gestiones con la Dirección de Infraestructura y las coordinaciones zonales y direcciones distritales para la asignación y ejecución del presupuesto destinado para las adecuaciones de las unidades de atención directa: Hilando Nuestros Sueños, Casa Hogar Infante Femenino, Casa Hogar Guayaquil, Casa Hogar Campi de Yoder, Casa Hogar Enríquez Gallo. Ante el requerimiento realizado por la entidad cooperante Aldeas Infantiles SOS - Ecuador, para que se proceda con los respectivos desembolsos de los convenios suscritos con el MIES en las modalidades de gasto de inversión, desde la Gerencia de Protección Especial se convocó a reuniones de trabajo con cada dirección distrital con la entidad cooperante y los funcionarios del área técnica, administrativa y financiera relacionada, para establecer compromisos y tratar de dar solución urgente a los problemas de liquidez de la entidad cooperante.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	15/08/2022 - 08:58 AM
JUNIO 2022: El proyecto se ejecuta de acurdo al codificado de USD 20.000.000,00, con un devengado USD 5.607.131,72 alcanza un ejecución del 28,04%. Con corte al 30 de junio 2022. Se re planifica los convenios de la modalidad alternativa de atención APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR, para ser financiados con recursos BID, para el segundo semestre del año 2022, son 17 convenios con una cobertura de 660 niños niñas y adolescentes. A la espera de asignación de cuota por el Ministerio de Finanzas, para realizar los desembolsos y pagos de los convenios suscritos 2022. Por servicios prestados y garantías	Suárez Salazar, Patricio Arturo	06/07/2022 - 03:14 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
En el mes de junio 2022 se distribuye recursos financieros para la potenciación de las casas de acogida de atención directas, y brindar un mejor servicio de calidad y calidez en los centros		
MAYO 2022: El proyecto se ejecuta de acuerdo al codificado de USD 20.000.000,00, con un devengado USD 3.560.347,65, alcanza un ejecución del 17,80%. Con corte al 31 de mayo 2022. Se re planifica los convenios de la modalidad alternativa de atención APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR, para ser financiados con recursos BID, para el segundo semestre del año 2022, son 17 convenios con una cobertura de 660 niños niñas y adolescentes. A la espera de asignación de cuota por el Ministerio de Finanzas, para realizar los desembolsos y pagos de los convenios suscritos 2022. En el mes de mayo 2022 se distribuye recursos financieros para la potenciación de las casas de acogida de atención directas, y brindar un mejor servicio de calidad y calidez en los centros, según memorando Nro. MIES-SPE-FSPPECV-0067.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	31/05/2022 - 11:51 AM
ABRIL 2022: SEGÚN PAPP PRESENTADO MES DE ABRIL 2022, EL ÍTEM EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ES EL 780204- TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO, EN ESPERA DE LA REFORMA MIES-SPE-GPEPE-RP-2022-001. LA PRESENTE REFORMA SE PLANTEA A FIN DE: * LIQUIDAR A PERSONAS DESVINCULADAS DEL PROYECTO, PARA LO CUAL SE REASIGNARÁ EL PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO PARA EL PROGRAMA 55 ACTIVIDADES 04, GRUPO 99 A PLANTA CENTRAL, CZ1, CZ3, CZ5 Y CZ8; SEGÚN MEMORANDOS NRO. MIES-CZ-1-1102-M, MIES-CZ-3-2022-1599-M, MIES-CZ-5-2022-2938-M, MIES-CZ-8-2022-2314-M, MIES-CGAF-DATH-2022-0345-M, MIES-CGAF-DATH-2022-0560-M Y CGAF-DATH-2022-0605-M. * SE REASIGNA FONDOS A EOD 4000 PARA EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO EN EL 2021 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-4-2022-4742-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2022, EMITIDO POR EL COORDINADOR ZONAL 4 DEL MIES, CON LA INFORMACIÓN DEL ANEXO 7.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	05/05/2022 - 03:34 PM
MARZO 2022: Se continúa con la prestación de servicios bajo convenios de cooperación técnico económico, se reporta asistencia, las unidades de atención continúan prestando los servicios por ende no se han cerrado, ni paralizado los servicios, a pesar de la falta de asignación de recursos financieros, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para la realización de los primeros desembolsos a cooperantes, el día 29 de marzo 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas, asigna correlativo y organismo en la estructura programática del programa 55 inversión, para la continuidad del proceso de suscripción de convenios, a la fecha se gestiona la suscripción de 77 convenios de cooperación técnico económico en el proyecto	Suárez Salazar, Patricio Arturo	08/04/2022 - 08:39 AM
FEBRERO 2022: Se continúa con la prestación de servicios bajo convenios de cooperación técnico económico, se reporta asistencia, las unidades de atención continúan prestando los servicios por ende no se han cerrado, ni paralizado los servicios, a pesar de la falta de asignación de recursos financieros, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para la realización de los primeros desembolsos a cooperantes	Suárez Salazar, Patricio Arturo	15/03/2022 - 04:28 PM
Enero 2022 Para el desarrollo del proyecto en el periodo 2022, se ha programado las siguientes coberturas en, ACOGIMIENTO FAMILIAR 60, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.721, y en APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR. 1.780 niños, niñas y adolescentes, con un total de 3.561 nna, que accederán los servicios de protección especial en el periodo indicado. En este mes la suscripción de convenios está desarrollando de acuerdo a la programación establecida, con la observación que hasta el cierre de este informe no se dispone de correlativo ni organismo en la estructura programática del proyecto según el sistema de administración financiera e-Sigef, del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad encargada de la asignación de los recursos, para los respectivos desembolsos a los cooperantes, (no existe financiamiento), cabe señalar que los servicios descritos la atención a los usuarios no se paraliza, para no vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, motivo por el cual se reporta la asistencia total del programa 55, proyecto 0002.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	15/03/2022 - 01:56 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. El incumplimiento en el lineamiento de la pre liquidación mensual como establece el convenio de cooperación técnico económico CAUSARIA un retraso en los desembolsos y a la óptima ejecución presupuestaria	02/03/2022	María Dolores Quishpe Samaniego	50 %	80	40	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Hito 1: INICIO: Dictamen de prioridad proyecto de inversión Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional	4-Inicio de Trabajo	03/01/2022		03/01/2022		Sí	2.0
2	Hito 2: EJECUCIÓN: Ficha de costos de los servicios de protección especial, fichas de costos validadas por la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	5-Entregables Intermedios	31/01/2022		31/01/2022		Sí	2.0
3	Hito 3: EJECUCIÓN: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2022.	5-Entregables Intermedios	25/02/2022		25/02/2022		Sí	1.0
4	Hito 4: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura a nivel nacional, del proyecto de inversión	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	1.0
5	Hito 5: INFORME: proceso de esclarecimiento legal a nivel nacional, sobre las acciones realizadas en beneficio de los nna que han sido vulnerados sus derechos.	5-Entregables Intermedios	29/04/2022		29/04/2022		Sí	1.0
6	Hito 6: Informe de ejecución presupuestaria del Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa	5-Entregables Intermedios	25/05/2022		25/05/2022		Sí	2.0
7	Hito 7: EJECUCIÓN: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	1.5
8	Hito 8: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la ficha técnica SIPEIP del proyecto de inversión.	5-Entregables Intermedios	20/07/2022		20/07/2022		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	Hito 9: EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	5-Entregables Intermedios	29/07/2022		27/07/2022		Sí	1.5
10	Hito 10: EJECUCION: Informe de la ejecución presupuestaria de los servicios básicos y alimentación de las unidades de atención directa.	5-Entregables Intermedios	17/08/2022		17/08/2022		Sí	1.5
11	Hito 11: EJECUCIÓN: Informe técnico - financiero realizado a las unidades de atención en Acogimiento Institucional	5-Entregables Intermedios	31/08/2022		31/08/2022		Sí	1.0
12	Hito 12: INFORME: esclarecimiento legal a nivel nacional	5-Entregables Intermedios	01/09/2022		01/09/2022		Sí	1.5
13	Hito 13: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del segundo desembolso a nivel nacional	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.5
14	Hito 14: EJECUCION: Informe de Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos del proyecto de inversión	5-Entregables Intermedios	28/10/2022		28/10/2022		Sí	1.5
15	Hito 15: EJECUCIÓN: Informe Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial	5-Entregables Intermedios	25/11/2022		25/11/2022		Sí	1.5
16	Hito 16: EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2022 de la Gerencia, presentado.	5-Entregables Intermedios	28/12/2022		28/12/2022		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN PROYECTO 2023-2025	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	75.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de NNA que acceden en la modalidad de acogimiento institucional y modalidades alternativas por convenio.		95.39 %	3,561	3,397	01/01/2022	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,000,000.00 **
Costo Total:	96,418,857.76
Total Devengado:	7,972,753.47
% Costo Total Devengado:	8.27 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 8.27 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
Ppto. Codificado	0.00	19,073,752.07	0.00	19,073,752.07
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		-19,073,752.07		
Programado a Devengar	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
Ppto. Devengado	0.00	7,972,753.47	0.00	7,972,753.47
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	39.86 %	0.00 %	39.86 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

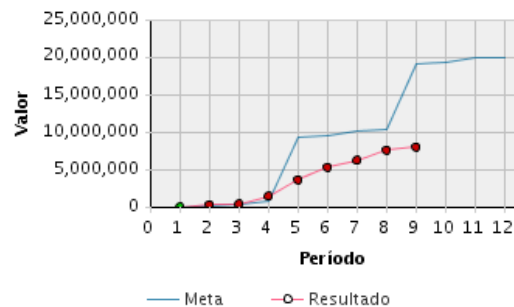

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	150,519.42	239,590.24	150,519.42	239,590.24	159.18 %		1.20 %
Mar	150,519.42	124,868.47	301,038.84	364,458.71	121.07 %		1.82 %
Abr	481,052.75	1,015,682.52	782,091.59	1,380,141.23	176.47 %		6.90 %
May	8,551,114.97	2,185,149.81	9,333,206.56	3,565,291.04	38.20 %		17.83 %
Jun	150,519.42	1,720,564.42	9,483,725.98	5,285,855.46	55.74 %		26.43 %
Jul	591,533.75	893,115.00	10,075,259.73	6,178,970.46	61.33 %		30.89 %
Ago	150,519.42	1,369,075.13	10,225,779.15	7,548,045.59	73.81 %		37.74 %
Sep	8,881,648.30	424,707.88	19,107,427.45	7,972,753.47	41.73 %		39.86 %
Oct	261,000.42		19,368,427.87				
Nov	481,052.75		19,849,480.62				
Dic	150,519.38		20,000,000.00				
Total	20,000,000.00	7,972,753.47					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la calidad y eficiencia de los Servicios de Protección Especial MEDIANTE la actualización de normas técnicas y modelos de atención, capacitación, asistencia técnica, esclarecimiento legal y seguimiento a la implementación de la política pública de protección especial

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1. 2022-08-04 Anexo 14. Informe mod Reduc PAI 2022 Proy Inversion Fortacimiento SPE 926k-signed-signed-signed	1. 2022-08-04_Anexo_14._Informe_mod_Reduc_PAI_2022_Pro_Inversion_Fortacimiento_SPE_926k-signed-signed-signed.pdf	31/10/2022
2	2. 2022-08-05 Anexo 13- Modific internas - PROY INVERSION FORTALECIMIENTO dismin 926k-signed-signed-1-signed	2. 2022-08-05_Anexo_13- Modific internas - _PROY_INVERSION_FORTALECIMIENTO_dismin_926k-signed-signed-1-signed.pdf	31/10/2022
3	3. 2022-09-21 Anexo 14. Informe mod Reduc PAI 2022 Proy Inversion Fortacimiento SPE 150k-signed-signed-sogned	3. 2022-09-21_Anexo_14._Informe_mod_Reduc_PAI_2022_Pro_Inversion_Fortacimiento_SPE_150k-signed-signed-sogned.pdf	31/10/2022
4	4. 2022-09-21_anexo_13- modific internas - _proy_inversion_fortalecimiento_dismin_150k-signed-1-signed-signed	4. 2022-09-21_anexo_13- modific internas - _proy_inversion_fortalecimiento_dismin_150k-signed-1-signed-signed.pdf	31/10/2022
5	ASOCIACION Hito 11: Informe técnico - financiero realizado a las unidades de atención en Acogimiento Institucional	B_2..pdf	05/09/2022
6	ASOCIACION Hito 12: INFORME esclarecimiento legal a nivel nacional.	B.1..pdf	05/09/2022
7	ASOCIACION Hito 13: Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del segundo desembolso a nivel nacional	B.3..pdf	06/10/2022
8	ASOCIACION Hito 14: Informe de Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos del proyecto de inversión	B.4..pdf	31/10/2022
9	ASOCIACION Hito 15: Informe Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial.	B.5.pdf	01/12/2022
10	ASOCIACION Hito 16: Informe de Gestión 2022 de la Gerencia, presentado.	B.6..pdf	09/01/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	ASOCIACION Hito 1: Dictamen de prioridad proyecto de inversión Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional	A.1..pdf	11/03/2022
12	ASOCIACION Hito 2: EJECUCIÓN: Ficha de costos de los servicios de protección especial, fichas de costos validadas por la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	A.2..xls	11/03/2022
13	ASOCIACION Hito 4: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura a nivel nacional, del proyecto de inversión	A._4.-signed.pdf	08/04/2022
14	ASOCIACION Hito 5: INFORME: proceso de esclarecimiento legal a nivel nacional, sobre las acciones realizadas en beneficio de los nna que han sido vulnerados sus derechos.	A.5..pdf	07/07/2022
15	ASOCIACION Hito 5: INFORME: proceso de esclarecimiento legal a nivel nacional, sobre las acciones realizadas en beneficio de los nna que han sido vulnerados sus derechos.	A.5.1.pdf	07/07/2022
16	ASOCIACION Hito 7: Hito 7: EJECUCIÓN: :Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	A._7-signed.pdf	08/07/2022
17	ASOCIACION Hito 8: Informe de seguimiento a la ficha técnica SIPEIP del proyecto de inversión.	A.8..pdf	18/08/2022
18	ASOCIACION Hito 9: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto.	A.9.pdf	29/08/2022
19	ASOCIACIÓN Hito 3: EJECUCIÓN: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2022.	A.3..pdf	11/03/2022
20	ASOCIACIÓN Hito 6: Informe de ejecución presupuestaria del Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa	A.6..rar	07/07/2022
21	ASOCIACIÓN Hito 6: Informe de ejecución presupuestaria del Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa	A.6.1.pdf	07/07/2022
22	REPORTE 2022 V09-01-2023	2022_Project_Highlights_2023_1_9.pdf	09/01/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
TENORIO ARISMENDI, SALOMON	Líder	GERENTE	salomon.tenorio@inclus ion.gob.ec	3983100 ext 6055
