

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Discapacidades

Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad

PROYECTO: K004 MIES-Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES.

Líder del Proyecto:	Sarzos, Luis (luis.sarzos@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JEIMY SUGEY	Programas Relacionados:	
Titular:	Chamba Revilla, Miro Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387167	TIR:	23.65 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	7,959,744.68
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,704,136.09
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	04/01/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Sarzos, Luis	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto de inversión se plantea con la finalidad de fortalecer la gestión que la Subsecretaría realiza para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus redes de apoyo, a través de servicios institucionalizados con los Centros Diurnos de desarrollo Integral para personas con discapacidad, Centros de Referencia y Acogida y Atención en el Hogar y la Comunidad para personas con discapacidad, además del seguimiento a la gestión y proceso de corresponsabilidad de los beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, así como a las personas responsables del cuidado a ser atendidas bajo la modalidad de Comités de Personas Responsables del Cuidado.

Beneficios Cualitativos

- Contribuir a la construcción de un sistema integral de servicios adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad que aporte a mejorar su calidad de vida.
- Elevar los niveles de autonomía e independencia de las personas con discapacidad, para su inclusión social y económica, a través del desarrollo de sus habilidades.
- Gestionar las acciones que permitan fortalecer los círculos de apoyo a personas con discapacidad; y, la actoría de las personas responsables del cuidado.
- Desarrollar estrategias para el cuidado y la atención a personas con discapacidad a través de talento humano

Tipo de Beneficiario

Personas con discapacidad de 18 a 64 años, once meses y veintinueve días; con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad, tal como se indica en la misión de la Subsecretaría de Discapacidades Acuerdo Ministerial 030, de 16 de junio de 2020.

Usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, - Personas con discapacidad grave, muy Grave y completa en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

- Personas con Enfermedades Catastróficas, Raras y Huérfanas en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

- Niños, Niñas y Adolescentes menores de 18 años viviendo con VIH-SIDA en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

Tal como se indica en el Acuerdo Ministerial 033, de 21 de mayo de 2021.


Restricciones

Recursos: déficit en el número de personal técnico contratado para la ejecución de los componentes, debido a la disminución de recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 25.53 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

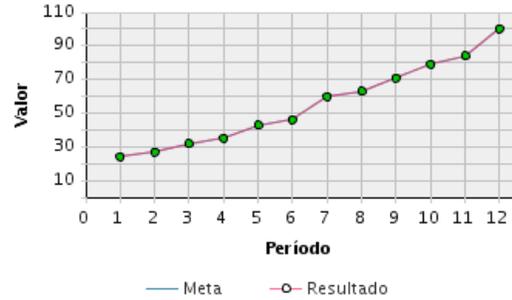

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	24 %	27 %	32 %	35 %	43 %	46 %	60 %	63 %	71 %	79 %	84 %	100 %
	Avance real acumulado											
	24 %	27 %	32 %	35 %	43 %	46 %	60 %	63 %	71 %	79 %	84 %	100 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2022: en este mes se ha ejecutado el 92,11 del presupuesto asignado para el proyecto, además de que existen 117 convenios suscritos que se encuentran brindando servicios.	Sarzosa, Luis	04/01/2023 - 09:06 PM
NOVIEMBRE 2022: en este mes se ha ejecutado el 75,85 del presupuesto asignado para el proyecto, además de que existen 117 convenios suscritos que se encuentran brindando servicios.	Sarzosa, Luis	05/12/2022 - 08:05 PM
OCTUBRE 2022: en este mes se cuenta con una ejecución del 70.33%, y la firma de 117 convenios.	Sarzosa, Luis	07/11/2022 - 09:09 AM
SEPTIEMBRE 2022: en este mes se cuenta con una ejecución del 57.74%, y la firma de 117 convenios.	Sarzosa, Luis	05/10/2022 - 07:51 AM
AGOSTO 2022: en este mes se cuenta con una ejecución del 54.87%, y la firma de 117 convenios.	Sarzosa, Luis	01/09/2022 - 03:27 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de julio se cuenta con una ejecución del 45, 81%, y la firma de 117 convenios	Sarzosa, Luis	05/08/2022 - 10:47 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de junio se cuenta con una ejecución del 45, 81%, y la firma de 117 convenios	Obando Ortiz, Zoila Gabriela	05/08/2022 - 09:26 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de junio se cuenta con una ejecución del 36, 89%, y la firma de 116 convenios	Sarzosa, Luis	05/07/2022 - 11:57 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP:	Sarzosa, Luis	05/07/2022 - 11:53 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de mayo se cuenta con una ejecución del 26, 74%, y la firma de 113 convenios		
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de abril se cuenta con una ejecución del 10, 20%, y la firma de 68 convenios	Sarzosa, Luis	06/05/2022 - 08:09 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de marzo se cuenta con una ejecución del 20%,	Pozo Fierro, Gabriela Alexandra	06/04/2022 - 12:32 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de febrero cuanta con una ejecución del 13%.	Sarzosa Mossot, Luis Alberto	05/03/2022 - 09:22 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00.	Sarzosa Mossot, Luis Alberto	04/02/2022 - 03:19 PM

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición. Dictamen de prioridad, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/01/2022		05/01/2022		Sí	6.0
2	Planificación: Fichas de Costos, entregadas	5-Entregables Intermedios	05/01/2022		05/01/2022		Sí	6.0
3	Planificación: Matriz de Microplanificación, entregado	5-Entregables Intermedios	13/01/2022		13/01/2022		Sí	6.0
4	Planificación: Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2022, entregado	5-Entregables Intermedios	31/01/2022		31/01/2022		Sí	6.0
5	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria enero, entregado	5-Entregables Intermedios	07/02/2022		07/02/2022		Sí	1.0
6	Ejecución: Informe de cobertura mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2022		10/02/2022		Sí	1.0
7	Ejecución: Informe y ficha al mes enero de la gerencia	5-Entregables Intermedios	10/02/2022		10/02/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	sobre la ejecución del proyecto, entregado							
8	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	07/03/2022		07/03/2022		Sí	1.0
9	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	09/03/2022		09/03/2022		Sí	1.0
10	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	09/03/2022		09/03/2022		Sí	1.0
11	Ejecución: Informe de cobertura mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2022		10/03/2022		Sí	1.0
12	Ejecución: Informe y ficha al mes febrero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2022		10/03/2022		Sí	1.0
13	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.0
14	Ejecución: Informe de cobertura mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	11/04/2022		11/04/2022		Sí	1.0
15	Ejecución: Informe y ficha al mes marzo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/04/2022		11/04/2022		Sí	1.0
16	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/05/2022		05/05/2022		Sí	3.0
17	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria abril, entregado	5-Entregables Intermedios	05/05/2022		05/05/2022		Sí	1.0
18	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	09/05/2022		09/05/2022		Sí	1.0
19	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	09/05/2022		09/05/2022		Sí	1.0
20	Ejecución: Informe de cobertura mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2022		10/05/2022		Sí	1.0
21	Ejecución: Informe y ficha al mes abril de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2022		10/05/2022		Sí	1.0
22	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	05/06/2022		05/06/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	Ejecución: Informe de cobertura mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	10/06/2022		10/06/2022		Sí	1.0
24	Ejecución: Informe y ficha al mes mayo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/06/2022		10/06/2022		Sí	1.0
25	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	1.0
26	Ejecución: Informe consolidado del segundo desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	1.0
27	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria junio, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	1.0
28	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	1.0
29	Ejecución: Informe de cobertura mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	1.0
30	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	4.0
31	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	4.0
32	Ejecución: Informe y ficha al mes junio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	1.0
33	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria julio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/08/2022		05/08/2022		Sí	1.0
34	Ejecución: Informe de cobertura mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	11/08/2022		11/08/2022		Sí	1.0
35	Ejecución: Informe y ficha al mes julio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/08/2022		11/08/2022		Sí	1.0
36	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/09/2022		05/09/2022		Sí	3.0
37	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	05/09/2022		05/09/2022		Sí	1.0
38	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso	5-Entregables Intermedios	07/09/2022		07/09/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de información al Aplicativo Alfresco							
39	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	07/09/2022		07/09/2022		Sí	1.0
40	Ejecución: Informe y ficha al mes agosto de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	12/09/2022		12/09/2022		Sí	1.0
41	Ejecución:Informe de cobertura mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	12/09/2022		12/09/2022		Sí	1.0
42	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	1.0
43	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	0.0
44	Ejecución: Matriz proforma presupuestaria 2023, entregada	5-Entregables Intermedios	07/10/2022		07/10/2022		Sí	5.0
45	Ejecución:Informe de cobertura mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		11/10/2022		Sí	1.0
46	Ejecución:Informe y ficha al mes septiembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		11/10/2022		Sí	1.0
47	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	07/11/2022		07/11/2022		Sí	1.0
48	Ejecución:Informe de cobertura mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2022		10/11/2022		Sí	1.0
49	Ejecución:Informe y ficha al mes octubre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2022		10/11/2022		Sí	1.0
50	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	22/11/2022		09/11/2022		Sí	1.0
51	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	22/11/2022		09/11/2022		Sí	1.0
52	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/12/2022		05/12/2022		Sí	1.0
53	Ejecución:Informe de cobertura mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	12/12/2022		12/12/2022		Sí	1.0
54	Ejecución:Informe y ficha al mes noviembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	12/12/2022		12/12/2022		Sí	1.0
55	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	al 2021 a nivel nacional, entregado							
56	Ejecución:Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	1.0
57	Ejecución:Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	4.0
58	Ejecución:Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	1.0
59	Ejecución:Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	1.0
60	Ejecución:Informe de cobertura mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	1.0
61	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	3.0
62	Ejecución:Informe y ficha al mes diciembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Unidades en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad		98.14 %	377	370	01/01/2022	Ene-Jun
2	Número de personas que acceden a las modalidades de atención para personas con discapacidad del MIES GASTO INVERSIÓN		97.39 %	11,310	11,015	01/01/2022	Noviembre
3	Número de convenios suscritos en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad		99.15 %	117	116	01/01/2022	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,704,136.09 **
Costo Total:	42,164,298.74
Total Devengado:	3,567,893.40
% Costo Total Devengado:	8.46 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 8.46 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	42,164,298.74	0.00	42,164,298.74
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		42,164,298.74		
Programado a Devengar	0.00	4,704,136.09	0.00	4,704,136.09
Ppto. Devengado	0.00	3,567,893.40	0.00	3,567,893.40
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	4,704,136.09	0.00	4,704,136.09
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	75.85 %	0.00 %	75.85 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

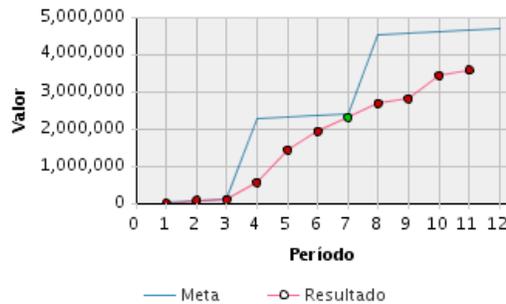

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	40,867.36	0.00	40,867.36	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	40,867.36	67,218.69	81,734.72	67,218.69	82.24 %		1.43 %
Mar	40,867.36	35,191.75	122,602.08	102,410.44	83.53 %		2.18 %
Abr	2,144,561.26	459,618.34	2,267,163.34	562,028.78	24.79 %		11.95 %
May	41,785.25	868,786.12	2,308,948.59	1,430,814.90	61.97 %		30.42 %
Jun	40,867.36	503,968.72	2,349,815.95	1,934,783.62	82.34 %		41.13 %
Jul	41,908.42	374,275.83	2,391,724.37	2,309,059.45	96.54 %		49.09 %
Ago	2,144,561.26	361,684.22	4,536,285.63	2,670,743.67	58.88 %		56.77 %
Sep	41,127.36	139,762.05	4,577,412.99	2,810,505.72	61.40 %		59.75 %
Oct	42,987.36	612,427.50	4,620,400.35	3,422,933.22	74.08 %		72.76 %
Nov	42,868.41	144,960.18	4,663,268.76	3,567,893.40	76.51 %		75.85 %
Dic	40,867.33		4,704,136.09				
Total	4,704,136.09	3,567,893.40					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

11	Incrementar la eficiencia en la atención contribuyendo a la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias MEDIANTE la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las modalidades de atención en el marco del enfoque social e inclusivo.
----	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO_01	A.1.pdf	04/09/2022
2	ASOCIACIÓN HITO_10	A.10.pdf	04/09/2022
3	ASOCIACIÓN HITO_11	A.11.pdf	04/09/2022
4	ASOCIACIÓN HITO_11.1	A.11.1.pdf	04/09/2022
5	ASOCIACIÓN HITO_12	A.12.pdf	04/09/2022
6	ASOCIACIÓN HITO_13	B.1.pdf	04/09/2022
7	ASOCIACIÓN HITO_14	B.2.pdf	04/09/2022
8	ASOCIACIÓN HITO_15	B.3.pdf	04/09/2022
9	ASOCIACIÓN HITO_15	B.3.1.pdf	04/09/2022
10	ASOCIACIÓN HITO_16	B.4.pdf	04/09/2022
11	ASOCIACIÓN HITO_16	B.5.pdf	04/09/2022
12	ASOCIACIÓN HITO_17	B.6.pdf	04/09/2022
13	ASOCIACIÓN HITO_19	B.7.pdf	04/09/2022
14	ASOCIACIÓN HITO_2	A.2.rar	04/09/2022
15	ASOCIACIÓN HITO_20	B.8.pdf	04/09/2022
16	ASOCIACIÓN HITO_21	B.9.pdf	04/09/2022
17	ASOCIACIÓN HITO_21	B.9.1.pdf	04/09/2022
18	ASOCIACIÓN HITO_22	C.1.pdf	04/09/2022
19	ASOCIACIÓN HITO_23	C.2.pdf	04/09/2022
20	ASOCIACIÓN HITO_24	C.3.pdf	04/09/2022
21	ASOCIACIÓN HITO_24	C.3.1.pdf	04/09/2022
22	ASOCIACIÓN HITO_25	C.4.pdf	04/09/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	ASOCIACIÓN HITO_26	C.5.pdf	04/09/2022
24	ASOCIACIÓN HITO_27	C.6.pdf	04/09/2022
25	ASOCIACIÓN HITO_28	C.7.pdf	04/09/2022
26	ASOCIACIÓN HITO_29	C.8.pdf	04/09/2022
27	ASOCIACIÓN HITO_3	A.3.zip	04/09/2022
28	ASOCIACIÓN HITO_30	C.9.pdf	04/09/2022
29	ASOCIACIÓN HITO_31	D.1.pdf	04/09/2022
30	ASOCIACIÓN HITO_32	D.2.pdf	04/09/2022
31	ASOCIACIÓN HITO_32	D.2.1.pdf	04/09/2022
32	ASOCIACIÓN HITO_33	D.3.pdf	04/09/2022
33	ASOCIACIÓN HITO_34	D.4.pdf	04/09/2022
34	ASOCIACIÓN HITO_35	D.5.pdf	04/09/2022
35	ASOCIACIÓN HITO_35	D.5.1.pdf	04/09/2022
36	ASOCIACIÓN HITO_36	D.6.pdf	19/09/2022
37	ASOCIACIÓN HITO_37	D.7.pdf	19/09/2022
38	ASOCIACIÓN HITO_38	D.8.pdf	13/10/2022
39	ASOCIACIÓN HITO_39	D.9.pdf	13/10/2022
40	ASOCIACIÓN HITO_4	A.4.rar	04/09/2022
41	ASOCIACIÓN HITO_40	E.1.pdf	19/09/2022
42	ASOCIACIÓN HITO_40	E.1.1.pdf	19/09/2022
43	ASOCIACIÓN HITO_41	E.2.pdf	13/10/2022
44	ASOCIACIÓN HITO_42	E.3.pdf	07/11/2022
45	ASOCIACIÓN HITO_43	E.3.pdf	07/11/2022
46	ASOCIACIÓN HITO_44	E.4.zip	07/11/2022
47	ASOCIACIÓN HITO_44	E.4.1.pdf	07/11/2022
48	ASOCIACIÓN HITO_45	E.5.pdf	07/11/2022
49	ASOCIACIÓN HITO_46	E.6.pdf	07/11/2022
50	ASOCIACIÓN HITO_46	E.6.1.pdf	07/11/2022
51	ASOCIACIÓN HITO_47	E.7.pdf	15/11/2022
52	ASOCIACIÓN HITO_48	E.8.pdf	15/11/2022
53	ASOCIACIÓN HITO_49	E.9.pdf	15/11/2022
54	ASOCIACIÓN HITO_49	E.9.1.pdf	15/11/2022
55	ASOCIACIÓN HITO_5	A.5.pdf	04/09/2022
56	ASOCIACIÓN HITO_50	F.1.pdf	25/11/2022
57	ASOCIACIÓN HITO_51	F.2.pdf	30/11/2022
58	ASOCIACIÓN HITO_52	F.3.pdf	20/12/2022
59	ASOCIACIÓN HITO_53	F.4.pdf	20/12/2022
60	ASOCIACIÓN HITO_54	F.5.pdf	14/12/2022
61	ASOCIACIÓN HITO_54.1	F.5.1.pdf	14/12/2022
62	ASOCIACIÓN HITO_6	A.6.pdf	04/09/2022
63	ASOCIACIÓN HITO_6.1	A.6.1.pdf	04/09/2022
64	ASOCIACIÓN HITO_7	A.7.pdf	04/09/2022
65	ASOCIACIÓN HITO_8	A.8.pdf	04/09/2022
66	ASOCIACIÓN HITO_9	A.9.pdf	04/09/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Camacho, Katherine Camacho	Analista	Analista	katherine.camacho@inclusion.gob.ec	6045
Gonzalez, Andrea	Analista	Analisa de la Gerencia de Discapacidades	andrea.gonzalez@inclusion.gob.ec	
Jimenez Luna, Stefany	Analista	Analista	stefany.jimenez@inclusion.gob.rc	6045
Pozo, Gabriela	Analista	Analista Gerencia Proyecto Discapacidad	gabriela.pozo@inclusion.gob.ec	0984016434
Sarzosa Mossot, Luis Alberto	Líder de proyecto	Gerente de Proyecto	luis.sarzosa@inclusion.gob.ec	
