

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Discapacidades

Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad

PROYECTO: K002 MIES-Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa.

Líder del Proyecto:			
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	
Titular:	Hurtado García, Ximena Sofía	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	1.16
CUP:	102800000.0000.383964	TIR:	27.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	886,685.48
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	133,563.58
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	25/11/2021 - 25/11/2024
Fecha de última actualización:	08/01/2025	Fecha de Fin Base:	25/11/2024
Modificado por:	Jara Viera, Edison Vinicio	Fecha del siguiente Hito:	29/03/2024

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto busca fortalecer la inclusión social a personas cuidadoras de personas con discapacidad, con la implementación de un modelo de apoyo integral, con el fin de mejorar la calidad de cuidado, autocuidado y las condiciones de vida del cuidador y disminuir el síndrome de sobrecarga del cuidador mediante el fortalecimiento de sus capacidades para mejorar la calidad de cuidado a personas con discapacidad severa.

Beneficios Cualitativos

- Con el fortalecimiento de las capacidades de las personas cuidadores principales y suplentes, se reduce la sobrecarga del cuidador y se mejora la calidad en el cuidado a personas con discapacidad severa.
- Con la certificación de las personas cuidadores principales y suplentes, se obtendrá un fortalecimiento en el el cuidado de personas con discapacidad severa obteniendo un tiempo de respiro.

Tipo de Beneficiario

La población objetivo del proyecto está basada en el número de asistentes del cuidado de usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara que asciende a un total de 22.548 personas entre principales y suplentes del cuidado de las personas con discapacidad severa.


Restricciones

- Alcance: Será beneficiarios solo los cuidadores principales y suplentes de las personas usuarias que reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara.
- Tiempo: Tiene una duración de 5 años, por la pandemia de la COVID-19 no se ha ejecutado.
- Recursos: Es necesario contar con el Modelo de Redes de Apoyo a las personas con discapacidad atendidas por el MIES y sus familias.
- Costo: No se puede exceder los recursos definidos por la fuente de financiamiento.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 25/11/2021 Fecha de Fin: 25/11/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

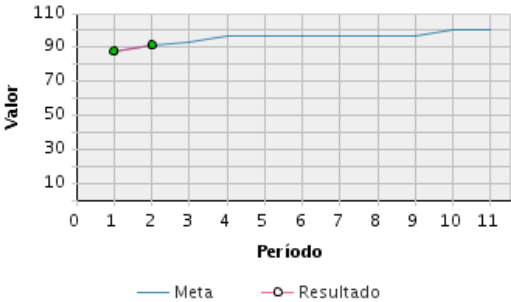

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2024	Avance programado acumulado											
	88 %	91 %	93 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	100 %	100 %	0 %
	Avance real acumulado											
	88 %	91 %										
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE Se armoniza el presupuesto codificado del eSIGEF con el PAPP correspondiente al mes de octubre. Elaboración del Plan Anual de la Política Pública para su ejecución en el ejercicio fiscal 2025.	Jara Viera, Edison Vinicio	08/01/2025 - 01:53 PM
NOVIEMBRE Se mantiene reuniones de trabajo con la finalidad de determinar el proceso con el cual se realizará la actividad de capacitación a cuidadores principales y de apoyo a personas con discapacidad. Se armoniza el presupuesto codificado del eSIGEF con el PAPP correspondiente al mes de octubre.	Jara Viera, Edison Vinicio	08/01/2025 - 01:49 PM
25. Para el mes de octubre de 2024, se enviaron a pago, a 44.275 usuarios del BLGL, se registran 3 certificados por solidaridad humana, se atendieron a 147 requerimientos ciudadanos.	Hurtado García, Ximena Sofía	12/11/2024 - 09:09 AM
OCTUBRE Se mantiene reuniones de trabajo con el BID para el seguimiento de ejecución de actividades, revisión de cartera, y supervisión financiera. Se armoniza el PAPP con el presupuesto codificado en el ESIGEF. Se revisa términos de referencia para la contratación de servicios de especializados. Se solicita a la Subsecretaria de Protección Especial la definición de las actividades a ser ejecutadas en el presente ejercicio fiscal, MIES-VIS-FAISDI-2024-1242-M.	Jara Viera, Edison Vinicio	05/11/2024 - 04:20 PM
SEPTIEMBRE Se mantiene reuniones de trabajo con la Secretaria Nacional de Planificación para realizar la reprogramación del cronograma valorado por ampliación de plazo de un ejercicio fiscal. Se actualiza el documento proyecto, cronograma valorado y flujos económicos y se remite a la Secretaria Nacional de Planificación Se gestiona el pago de los consultores individuales Se armoniza el PAPP con el presupuesto codificado en el ESIGEF. Obtención de la reprogramación del cronograma valorado constante en oficio	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 05:08 PM
AGOSTO Se mantiene reuniones con la Secretaria Nacional de Planificación respecto a la actualización del dictamen de prioridad y se define que se tiene que realizar la reprogramación del cronograma valorado por ampliación de plazo de un ejercicio fiscal. Se actualiza el documento proyecto, cronograma valorado y flujos económicos y se remite a la Dirección de Planificación e Inversión para la revisión correspondiente Se gestiona el pago de los consultores individuales Se armoniza el PAPP con el presupuesto codificado en el ESIGEF.	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 05:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO Se remite a la coordinación de planificación las observaciones realizadas al documento proyecto para la ampliación de plazo Se gestiona el pago de los consultores individuales Se mantiene reuniones con la Dirección de Planificación e Inversión para la actualización y obtención del Dictamen de prioridad por actualización del proyecto, se realiza las actualizaciones en la informes de justificación y actualización del cronograma valorado Aprobación del POA por parte del BID, mediante comunicado O-CAN/CEC-667/2024 Se define las actividades a ser ejecutadas en el ejercicio fiscal 2024.	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 04:56 PM
JUNIO Se remite a la coordinación de planificación la revisión del documento proyecto para la ampliación de plazo Se gestiona el pago de los consultores individuales Se mantiene reuniones con la Dirección de Planificación e Inversión para la actualización y obtención del Dictamen de prioridad por actualización del proyecto, se trabaja en la informes de justificación y actualización del cronograma valorado	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 04:41 PM
MAYO .Se gestiona el pago del contrato de la Consultoría de Redes, en el marco de la revisión previa aprobación del producto 2.2 de la consultoría. Se remite a la coordinación de planificación la revisión del documento proyecto para la ampliación de plazo Se gestiona el pago de los consultores individuales	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 04:27 PM
ABRIL Se cuenta con asignación de presupuesto en organismo y correlativo BID. .Se han efectuado acciones conjuntas con el administrador del contrato de la Consultoría de Redes, en el marco de la revisión previa aprobación del producto 2.2 de la consultoría. Se realiza los acercamientos ante la SNP para la ampliación del proyecto del inversión	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 04:25 PM
MARZO .La ejecución presupuestaria acumulada a marzo el grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de USD 0,00 equivalente al 0,00% sobre el presupuesto ejecutable de USD 48.574,62. .Se han efectuado reuniones en el BID para que, en el marco de la ejecución del proceso de adquisiciones, se procure encontrar el procedimiento más idóneo para dar inicio al proceso preparatorio para la contratación de la Consultoría de Registro de Cuidadores. .Se han efectuado acciones conjuntas con el administrador del contrato de la Consultoría de Redes, en el marco de la revisión previa aprobación del producto 2.2 de la consultoría. Se gestiona incremento al PAI para la asignación del organismo y correlativo del BID	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 04:25 PM
Resumen Ejecutivo Gestión al 29 de febrero de 2024 .La ejecución presupuestaria acumulada al 29 de febrero de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de USD 0,00 equivalente al 0,00% sobre el presupuesto ejecutable de USD 48.574,62. .Con corte al 29 de febrero de 2024, el avance físico del proyecto es de 15% (PEP), en razón de la suscripción del contrato para la ejecución de la consultoría para el establecimiento del modelo de gestión y el esquema de incentivos del modelo de redes de apoyo de personas con discapacidad, la suscripción de los contratos de los especialistas de gestión y el avance registrado en años anteriores, así como la entrega de informes de los referidos especialistas. .Se han efectuado reuniones en el BID para que, en el marco de la ejecución del proceso de adquisiciones, se procure encontrar el procedimiento más idóneo para dar inicio al proceso preparatorio para la contratación de la Consultoría de Registro de Cuidadores. .Se han efectuado acciones conjuntas con el administrador del contrato de la Consultoría de Redes, en el marco de la revisión previa aprobación del producto 2.2 de la consultoría. .Se prevé efectuar una enmienda al contrato de la Consultoría de Redes, a fin de ampliar el plazo de ejecución contractual, puesto que se ha determinado que a fin de mejorar la calidad del producto 3 y en consecuencia los resultados de la consultoría, es imperativo incluir aspectos que mejoren los resultados del trabajo a realizar. Se recomienda: .Obtener la certificación presupuestaria para la ejecución de pagos de los especialistas de gestión del proyecto. .Proceder con los pagos al equipo de gestión del proyecto.	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 04:23 PM
Resumen Ejecutivo Gestión al 31 de enero de 2024	Salazar Carrillo, Anabel Cecilia	15/03/2024 - 08:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* Durante el presente mes de enero se logró postular el proyecto para PAI 2024, considerando un monto de USD 519.409,37; monto suficiente para ejecutar las actividades proyectadas en el año. * Al corte de 31 de enero de 2024, el MEF no ha asignado organismo y correlativo, razón por la cual no arranca el proyecto generando una demora considerable. * El monto postulado es suficiente para la ejecución de las actividades establecidas para el presente año. * El avance físico según herramienta PEP a la fecha es del 14%.		
Resumen Ejecutivo Gestión al 31 de diciembre de 2023 .La ejecución presupuestaria acumulada al 31 de diciembre de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de USD 48.574,62 equivalente al 16,09% sobre el presupuesto ejecutable de USD 301.723,10. (Codificado ESIGEF al 31 de diciembre de 2023), correspondiente en su mayoría al primer pago de la Consultoría de Redes. .Con corte al 31 de diciembre, el avance físico del proyecto es de 15% (ficha seguimiento), en razón de la suscripción del contrato para la ejecución de la consultoría para el establecimiento del modelo de gestión y el esquema de incentivos del modelo de redes de apoyo de personas con discapacidad, la suscripción de los contratos de los especialistas de gestión y el avance registrado en años anteriores. .El nuevo proceso de contratación de la consultoría de registro se encuentra en fase preparatoria, a la fecha se lograron recibir 5 expresiones de interés, las mismas que se encuentran en proceso de revisión, sin embargo, debido a que no se logró lanzar el proceso de contratación, será necesario la generación de una nueva certificación presupuestaria anual una vez que se haya obtenido el presupuesto PAI 2024. .El 20 de diciembre de 2023, se suscribieron los contratos de los especialistas de gestión del proyecto. Se recomienda: .Generar una planificación adecuada a la realidad, para que, durante el año 2024, se logre optimizar la ejecución presupuestaria, para ello será importante proceder con la actualización del dictamen de prioridad del proyecto, el mismo que deberá establecer una extensión de plazo y una reprogramación de metas. .Gestionar ante el MEF, la posibilidad de contratar todo el equipo de gestión del proyecto, el mismo que se detalla en el acápite correspondiente del reglamento operativo del proyecto ROP.	Salazar Carrillo, Anabel Cecilia	29/02/2024 - 12:09 PM
Resumen de gestión al 30 de noviembre de 2023: . La ejecución presupuestaria acumulada al 30 de noviembre de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de USD 48.574,62 equivalente al 13,32% sobre el presupuesto ejecutable de USD 364.767,90. (Codificado ESIGEF al 30 de noviembre de 2023), correspondiente en su mayoría al primer pago de la Consultoría de Redes. . Se ha iniciado un nuevo proceso preparatorio (evaluación de expresiones de interés por parte de la comisión de evaluación, designada por la Subsecretaría de Discapacidades), para la contratación de la consultoría de registro de cuidadores y asistentes de cuidado, debido al rechazo de la totalidad de las propuestas presentadas lo que conllevaría a la declaratoria de procedimiento desierto del primer proceso. Se debería iniciar la fase precontractual antes de la finalización del presente año. . Se ha logrado obtener la certificación presupuestaria anual y plurianual para dar inicio al proceso de contratación directa de los especialistas de gestión del proyecto (legal y adquisiciones). Se recomienda: . Una vez que el MEF ejecute el valor devengado del producto 2.1 de la consultoría de redes por un monto de USD 19.684,70, se deberá realizar una justificación de gastos y posteriormente la solicitud de desembolso al BID para el fondeo del proyecto. . Dar continuidad a la etapa preparatoria con la evaluación de las expresiones de interés recibidas, solicitud de no objeción al Banco y demás documentación habilitante, para llegar a la etapa precontractual de la consultoría de registro de cuidadores y asistentes de cuidado de personas con discapacidad severa.	Dávila Cueva, María Gabriela	02/01/2024 - 09:22 AM
Resumen de gestión al 31 de octubre de 2023: .La ejecución presupuestaria acumulada al 31 de octubre de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de USD 28.889,92	Dávila Cueva, María Gabriela	19/12/2023 - 03:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
equivalente al 7,92% sobre el presupuesto ejecutable de USD 364.767,90. (Codificado ESIGEF al 31 de octubre de 2023). .Con corte al 31 de octubre, el avance físico del proyecto es de 13%, en razón de la suscripción del contrato para la ejecución de la consultoría para el establecimiento del modelo de gestión y el esquema de incentivos del modelo de redes de apoyo de personas con discapacidad, este avance corresponde a la ejecución física de metas establecidas en años anteriores. .Se realizó la gestión en la Secretaría de Planificación para obtener el dictamen favorable para la obtención de la certificación presupuestaria plurianual para la contratación de los especialistas de gestión legal y adquisiciones, obteniéndose el mismo con oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2023-1016-OF de 11 de octubre de 2023. .Se generó la segunda justificación de gastos del proyecto, proceso que fue socializado con el MEF. Se recomienda: .Cerrar el proceso de contratación de la consultoría de registro de cuidadores, la misma que se encuentra en proceso de evaluación de la contratación. .Proceder a generar la primera parte del segundo pago de la consultoría de redes, a fin de proceder a fondear el proyecto y dar continuidad a los pagos correspondientes.		
Resumen de gestión al 30 de septiembre de 2023: . La ejecución presupuestaria acumulada al 30 de septiembre de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de USD 28.889,92 equivalente al 7,92% sobre el presupuesto ejecutable de USD 364.767,90. (Codificado ESIGEF al 30 de septiembre de 2023). . Con corte al 31 de septiembre, el avance físico del proyecto es de 13%, en razón de la suscripción del contrato para la ejecución de la consultoría para el establecimiento del modelo de gestión y el esquema de incentivos del modelo de redes de apoyo de personas con discapacidad. . Se logró realizar el desembolso correspondiente al primer pago de la consultoría para el diseño del modelo de gestión y el esquema de incentivos del modelo de redes de apoyo a personas con discapacidad severa. Se recomienda: . Que la Subsecretaría de Discapacidades y el Administrador del Contrato para la elaboración de la consultoría para el diseño de esquema de incentivos y modelo de gestión del modelo de redes, tiendan puentes de apoyo con la Firma Consultora para gestionar de manera más eficiente la entrega y pago de los productos. . Dar celeridad al proceso precontractual de la consultoría de registro, a fin de lograr la suscripción del mismo para el mes de noviembre y el primer pago a inicios del próximo año. . Efectuar las gestiones necesarias para fondear el proyecto con un segundo desembolso del BID, esto con la finalidad de contar con los recursos para el segundo pago de la consultoría para el diseño de esquema de incentivos y modelo de gestión del modelo de redes.	León Suqui, Fernando David	06/11/2023 - 01:10 PM
Hitos cumplidos a agosto de 2023: .La ejecución presupuestaria acumulada al 31 de agosto de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de USD 4.284,04 equivalente al 1,17% sobre el presupuesto ejecutable de USD 364.767,90. (Codificado ESIGEF al 31 de agosto de 2023). .Con corte al 31 de agosto de 2023, el avance físico del proyecto es de 13%, en razón de la suscripción del contrato para la ejecución de la consultoría para el establecimiento del modelo de gestión y el esquema de incentivos del modelo de redes de apoyo de personas con discapacidad. .Se ha obtenido la certificación de actividad para la contratación de las consultorías de apoyo técnico para la gestión del programa. .Se ha obtenido la certificación presupuestaria anual y plurianual para la contratación de la consultoría de registro. .Se ha entregado el informe semestral con corte al mes de junio al BID, en cumplimiento a lo establecido en el contrato de préstamo. se recomienda: .Que la Subsecretaría de Discapacidades y el Administrador del Contrato para la elaboración de la consultoría de esquema de incentivos y modelo de gestión del modelo de redes, tiendan puentes de apoyo con la Firma Consultora para gestionar de manera más eficiente la entrega y pago de los productos.	León Suqui, Fernando David	03/10/2023 - 09:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Gestionar con la Subsecretaría de Discapacidades la entrega de los TDR para la contratación del especialista técnico de apoyo para la gestión del proyecto. .Dar celeridad al proceso precontractual de la consultoría de registro, a fin de lograr la suscripción del mismo para el mes de noviembre y el primer pago a inicios del próximo año.		
Hitos cumplidos a julio de 2023: .La ejecución presupuestaria acumulada al 31 de julio de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de USD 4.284,04 equivalente al 1,17% sobre el presupuesto ejecutable de USD 364.767,90. (Codificado ESIGEF al 31 de julio de 2023). .Con corte al 31 de julio de 2023, el avance físico del proyecto es de 13%, en razón de la suscripción del contrato para la ejecución de la consultoría para el establecimiento del modelo de gestión y el esquema de incentivos del modelo de redes de apoyo de personas con discapacidad. .Se ha obtenido la certificación de actividad para la contratación de la consultoría de registro de personas responsables y suplentes de cuidado. .Se ha efectuado el registro del compromiso del contrato de la consultoría para el diseño del esquema de incentivos y modelo de gestión del modelo de redes de apoyo de personas con discapacidad severa.	León Suqui, Fernando David	06/09/2023 - 12:04 PM
Hitos cumplidos a junio de 2023: .El 21 de junio de 2023 se suscribió el contrato para la ejecución de la consultoría para el diseño del modelo de gestión y el esquema de incentivos del modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad severa. .Se ha obtenido el dictamen favorable por parte de la Subsecretaría de Planificación, para la emisión de la Certificación Presupuestaria Plurianual, a fin de efectuar las contrataciones de la consultoría de registro y especialistas de apoyo técnico. Adicionalmente, se presentan los siguientes resultados: .La ejecución presupuestaria acumulada al 30 de junio de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US\$4.284,04 equivalente al 1,17% sobre el presupuesto ejecutable de US\$364.767,90. (Codificado ESIGEF al 30 de junio de 2023). .Con corte al 30 de junio de 2023, el avance físico del proyecto es de 13%, en razón de la suscripción del contrato para la ejecución de la consultoría para el establecimiento del modelo de gestión y el esquema de incentivos del modelo de redes de apoyo de personas con discapacidad.	León Suqui, Fernando David	09/08/2023 - 08:42 AM
Hitos cumplidos a mayo de 2023: . La ejecución presupuestaria acumulada al 31 de mayo de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US\$4.284,04 equivalente al 1,17% sobre el presupuesto ejecutable de US\$364.767,90. (Codificado ESIGEF al 31 de mayo de 2023). . Con corte al 31 de mayo de 2023, no se presenta avance físico del proyecto. . Se ha cerrado el proceso de negociación para la contratación de la consultoría para el diseño del modelo de gestión y esquema de incentivos del Modelo de Redes de Apoyo de personas con discapacidad, se espera suscribir el contrato a inicios del mes de junio del presente año.	León Suqui, Fernando David	03/07/2023 - 10:41 AM
Hitos cumplidos a abril de 2023: 01. La ejecución presupuestaria acumulada al 30 de abril de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US\$4.284,04 equivalente al 1,17% sobre el presupuesto ejecutable de US\$364.767,90. (Codificado ESIGEF al 30 de abril de 2023). 02. Con corte al 30 de abril de 2023, no se presenta avance físico, debido a que se espera iniciar con las contrataciones a partir del mes de mayo de 2023. 03. Se han recibido 8 expresiones de interés de firmas interesadas para la ejecución de la "Consultoría Técnica Especializada Encargada de Desarrollar, Implementar y Ejecutar el Proceso Metodológico para Identificar, Seleccionar y Registrar en el Sistema Informático Institucional a Personas Principales y Suplentes del Cuidado de Personas con Discapacidad", lo que permitirá dar continuidad al proceso preparatorio con la generación de la lista corta y solicitud de propuesta para No Objeción del BID. 04. Se aprobó la reforma al PAPP que plantea destinar recursos a la actividad 7.5 del contrato de préstamo, para la contratación de las Consultorías de Apoyo Técnico para la Gestión del Programa.	León Suqui, Fernando David	06/06/2023 - 08:30 AM
Hitos cumplidos a marzo de 2023:	León Suqui, Fernando David	09/05/2023 - 12:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
01. La ejecución presupuestaria acumulada al 31 de marzo de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US\$4.284,04 equivalente al 1,17% sobre el presupuesto ejecutable de US\$364.767,90. (Codificado ESIGEF al 31 de marzo de 2023). 02. Se ha publicado la invitación de solicitud de expresiones de interés a fin de generar la lista corta de firmas interesadas para la ejecución de la Consultoría técnica especializada encargada de desarrollar, implementar y ejecutar el proceso metodológico para identificar, seleccionar y registrar en el sistema informático institucional a personas principales y suplentes del cuidado de personas con discapacidad. 03. Se han obtenido certificaciones de actividad y presupuestarias para el pago de honorarios de los especialistas de gestión del proyecto (legal y adquisiciones), correspondiente al mes de diciembre de 2022. 04. Se realizó el pago por servicios generados por los especialistas de gestión del proyecto (legal y adquisiciones) correspondiente al mes de diciembre de 2022. 05. El CTES, se encuentra en proceso de evaluación de la oferta remitida por la firma Kronos Consulting Group, en el marco del proceso de contratación de la Consultoría para el diseño del modelo de gestión y esquema de incentivos del Modelo de Redes de asistentes de cuidado de personas con discapacidad.		
Hitos cumplidos a febrero de 2023: 01. La ejecución presupuestaria acumulada al 28 de febrero de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US\$0,00 equivalente al 0,00% sobre el presupuesto ejecutable de US\$364.767,90. (Codificado ESIGEF al 28 de febrero de 2023). 02. Con corte al 28 de febrero de 2023, no se presenta un avance físico, debido a que se espera iniciar con las contrataciones a partir del mes de marzo de 2023, el avance físico general del proyecto del 2%, mismo que fue reportado en el informe del mes de diciembre de 2022. 03. Se han obtenido certificaciones de actividad y presupuestarias para el pago de honorarios de los especialistas de gestión del proyecto (legal y adquisiciones), correspondiente al mes de diciembre de 2022. 04. Se han obtenido certificaciones de actividad, avales y certificaciones presupuestarias para ejecutar la contratación de la consultoría de Modelo de Redes y Esquema de Incentivos de Asistentes de Cuidado de Personas con Discapacidad Severa. 05. Se ha obtenido la No objeción del BID al documento de solicitud de oferta a remitirse a la firma que quedó primera en el orden de prelación de la lista corta para la contratación de la consultoría de Modelo de Redes y Esquema de Incentivos. 06. Mediante correo electrónico de 27 de febrero de 2023, se realizó la invitación a la Firma Consultora Kronos Consulting Cia. Ltda., primera en orden de prelación en la lista corta aprobada por el BID, a presentar su propuesta para el proceso de contratación. 07. Se ha obtenido el presupuesto referencial para la contratación de la Consultoría de Registro de Personas con Discapacidad.	León Suqui, Fernando David	25/04/2023 - 09:34 AM
Hitos cumplidos a enero de 2023: 01. La ejecución presupuestaria acumulada de enero al 31 de enero de 2023 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US\$0,00 equivalente al 0,00% sobre el presupuesto ejecutable de US\$364.767,90. (Codificado ESIGEF al 31 de enero de 2022). 02. Con corte al 31 de enero de 2023, no se presenta un avance físico, debido a que se espera iniciar con las contrataciones a partir del mes de marzo de 2023, el avance físico general del proyecto del 2%, mismo que fue reportado en el informe del mes de diciembre de 2022. 03. Se ha obtenido la certificación PAPP para la contratación de la consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión y el esquema de incentivos del "Modelo de Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad Atendidas por el MIES, y sus Familias".	León Suqui, Fernando David	07/03/2023 - 04:52 PM
Hitos cumplidos correspondiente al mes de octubre de 2022: 01. El presupuesto actual del proyecto de inversión en el grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es de US\$325.804,69 correspondiente a los procesos de contratación programados para el ejercicio fiscal 2022. 02. La ejecución presupuestaria acumulada de enero al 31 de octubre de 2022 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US\$27.846,26 equivalente al 8,55% sobre el presupuesto ejecutable de US\$325.804,69. 03. Con corte al 31 de octubre de 2022, se mantiene el avance físico del proyecto en el 2% dado que se encuentran operando los consultores especialistas legal y de adquisiciones. 04. Una vez obtenida la No Objeción del BID a la fase preparatoria de la contratación de la Consultoría del Modelo de Redes, se procedió a la publicación de expresiones de interés en las páginas del MIES y el SERCOP.	León Suqui, Fernando David	19/01/2023 - 09:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
05. El proceso para generar la versión final de los TDR de la Consultoría de Registro se encuentra en su fase culminante, de manera que una vez completadas las acciones para obtener los TDR finales, se solicitará al BID la No Objeción a los TDR y a las Solicitudes de Propuesta. 06. Dado que la Gerencia ha obtenido las certificaciones presupuestarias y avales para la contratación de los Consultores Especialistas Financiero y de Monitoreo y Evaluación, se requiere proceder con la contratación de los referidos consultores para contar con sus servicios hasta antes del cierre del presente ejercicio fiscal.		
Hitos cumplidos correspondiente al mes de diciembre de 2022: 01. El presupuesto actual del proyecto de inversión en el grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es de US\$73.408,48 correspondiente a los procesos de contratación programados para el ejercicio fiscal 2022. 02. La ejecución presupuestaria acumulada de enero al 31 de diciembre de 2022 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US \$36.414,34 equivalente al 49,61% sobre el presupuesto ejecutable de US\$73.408,48. 03. Se validó por parte de la Dirección Financiera la reforma Nro. MIES-VIS-FGICPDS-RP-2022-009, de manera que el codificado al 31 de diciembre establece un remanente de US \$73.408,48. 04. Con corte al 31 de diciembre de 2022, se mantiene el avance físico del proyecto en el 2% dado que se encuentran operando los consultores especialistas legal y de adquisiciones. 05. Con documento Nro. CAN/CEC-1400/2022 de 23 de diciembre 2022, se obtuvo la No Objeción del BID a la lista corta propuesta por el CTES para la contratación de la Consultoría del Modelo de Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad. León Suqui, Fernando David 06/01/2023 - 03:29 PM	León Suqui, Fernando David	19/01/2023 - 09:40 AM
Hitos cumplidos correspondiente al mes de noviembre de 2022: 01. El presupuesto actual del proyecto de inversión en el grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es de US\$325.804,69 correspondiente a los procesos de contratación programados para el ejercicio fiscal 2022. 02. La ejecución presupuestaria acumulada de enero al 30 de noviembre de 2022 del grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086, es de US \$32.130,30 equivalente al 9,86% sobre el presupuesto ejecutable de US\$325.804,69. 03. El 28 de noviembre de 2022 con memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-1390-M, la Coordinación de Planificación aprobó la Reforma Nro. 9, la misma que plantea una reducción de codificado de US\$252.396,21, de manera que el nuevo monto codificado es de US\$73.408,48, sin embargo al 30 de noviembre de 2022 no se evidenció el nuevo saldo codificado en ESIGEF. 04. Con corte al 31 de octubre de 2022, se mantiene el avance físico del proyecto en el 2% dado que se encuentran operando los consultores especialistas legal y de adquisiciones. 05. Una vez obtenida la No Objeción del BID a la fase preparatoria de la contratación de la Consultoría del Modelo de Redes, se procedió a la publicación de expresiones de interés en las páginas del MIES y el SERCOP, sin embargo no se obtuvo expresiones de interés en el plazo correspondiente, de manera que con memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0235-O de 29 de noviembre de 2022 se informó al BID la decisión del MIES de ampliar el período de recepción de expresiones de interés hasta el próximo 08 de diciembre de 2022. 06. Con comunicación del 02 de noviembre de 2022, el BID emitió el visto bueno a los TDR de la Consultoría de Registro, de manera que junto con el área técnica se procederá a diseñar el estudio de mercado que proporcionará el presupuesto preliminar de la consultoría. 07. No se realizará la contratación de los consultores especialistas de monitoreo y evaluación; así como el financiero debido a que los perfiles remitidos por los oferentes no cumplieron con las especificaciones de los TDR constantes en los modelos de invitación/3CVs que cuentan con no objeción por parte del Banco Interamericano de Desarrollo.	León Suqui, Fernando David	06/01/2023 - 03:29 PM
Hitos cumplidos correspondiente al mes de septiembre 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2022. 02. La ejecución presupuestaria mensual de septiembre de 2022 es de US\$4.284,04 equivalente al 0,94% del presupuesto total y corresponde al pago de los servicios de la consultoría de los especialistas legal y adquisiciones. Además, se tienen comprometido un valor de US\$40.698,37. 03. Con corte 30 de septiembre el proyecto tiene un cumplimiento económico del 5,16%, lo que corresponde a una ejecución de US\$23.562,22; sobre el monto codificado de US\$456.690,42. 04. La Gerencia se encuentra a la espera de la respuesta de parte de la Coordinación Administrativa Financiera sobre los avales y certificaciones presupuestarias para la contratación de la: "Consultoría Técnica Especializada para Diseñar y Validar el Modelo de Gestión y el Esquema de Incentivos del Modelo de Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad atendidas por el MIES y sus familias".	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	28/10/2022 - 08:36 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
05. El proceso de contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, se están realizando ajustes a los términos de referencia en conjunto con la consultora externa del BID Cinthia Rosero. 06. El proceso de contratación de la Línea Base, se solicitó apoyo y soporte al BID para la elaboración de los términos de referencia, se está por definir las fechas para realizar avances en el documento preliminar.		
Hitos cumplidos correspondiente al mes de agosto 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2022. 02. La ejecución presupuestaria mensual de agosto de 2022 es de USD 4.284,04 equivalente al 0,94% del presupuesto total y corresponde al pago de los servicios de la consultoría de los especialistas legal y adquisiciones. Además, se tienen comprometido un valor de USD 40.698,37. 03. La ejecución presupuestaria acumulada a agosto de 2022 es de USD 19.278,18 equivalente al 4,22% del presupuesto total y corresponde al pagos de los servicios de la consultoría de los especialistas legal y adquisiciones. 04. Respecto al proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos, se envió los términos de referencia, la invitación de expresiones de interés y la solicitud de propuestas al BID para contar con la correspondiente no objeción. 05. El proceso de contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, se están realizando ajustes a los términos de referencia en conjunto con la consultora externa del BID Cinthia Rosero. 06. El proceso de contratación de la Línea Base, se solicitó apoyo y soporte al BID para la elaboración de los términos de referencia, se está por definir las fechas para realizar avances en el documento preliminar.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	22/09/2022 - 05:28 PM
Hitos cumplidos correspondiente al mes de julio 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2022. 02. La ejecución presupuestaria mensual de julio de 2022 es de USD 4.284,04 equivalente al 0,59% del presupuesto total y corresponde al pago de los servicios de la consultoría del especialista legal. Además, se tienen comprometido un valor de USD 40.698,37. 03. La ejecución presupuestaria acumulada a julio de 2022 es de USD 14.994,14 equivalente al 2,06% del presupuesto total y corresponde al pagos de los servicios de la consultoría del especialista legal. 04. El proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos, se envió el pedido para la actualización de proformas en razón de los cambios a los términos de referencia, en lo que respecta al plazo de 180 días a 210 días. 05. El proceso de contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, hay una versión preliminar de los términos de referencia que fueron enviados el 26 de julio de 2022 a la consultora externa Ma. Elena Ramirez del BID. 06. El proceso de contratación de la Línea Base, se solicitó apoyo y soporte al BID para la elaboración de los términos de referencia, se está por definir las fechas para realizar avances en el documento preliminar.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	25/08/2022 - 11:08 AM
Hitos cumplidos correspondiente al mes de junio 2022: 01. Postulación del proyecto de inversión denominado: "Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa" para la proforma presupuestaria del Plan Anual de Inversiones - PAI 2023. 02. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2022. 03. Se realizó y se aprobó los informes del segundo trimestre de 2022 de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo. 04. La ejecución presupuestaria acumulada en el grupo de gasto 73 con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 10.710,10 equivalente al 1,47% del presupuesto total, no incluye los USD 970.464,20*. 05. El proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos tuvo un avance hasta la calificación de las expresiones de interés, sin embargo, se tuvo que declarar el proceso en desierto, conforme Comunicación del BID Nro. CAN/CEC-647. Se está reestructurando los términos de referencia, para el nuevo proceso de contratación. 06. Los términos de referencia de la contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, están siendo reestructurados conforme las recomendaciones realizadas por el BID. 07. Los términos de referencia de la contratación de la línea base, se encuentran en proceso de reestructuración, conforme las sugerencias realizadas por el BID, la Subsecretaría de Discapacidades, se encuentran realizando los ajustes.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	13/07/2022 - 04:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Hitos cumplidos correspondiente al mes de mayo 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2022. 02. La ejecución presupuestaria mensual de mayo de 2022 es de USD 2.142,02 equivalente al 0,29% del total (no incluye los USD 970.464,20.) y corresponde al pago de los servicios de la consultoría del especialista legal del mes de mayo 2022. 03. La ejecución presupuestaria acumulada en el grupo de gasto 73 con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 8,568.08 equivalente al 1,17% del presupuesto total, no incluye los USD 970.464,20. 04. El 31 de mayo de 2022, se firmó el contrato con el consultor individual, especialista de adquisiciones como parte del equipo ejecutor de la operación CP Nro. 4634 OC/EC - L1236. 05. Recepción de expresiones de interés para el proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos. 06. Los términos de referencia de la contratación de la línea base, fueron devueltos por el BID con observaciones y se encuentran realizando los ajustes la Subsecretaría de Discapacidades. 07. El 19 de mayo de 2022, mediante memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0346-M se solicitó la reducción presupuestaria por USD 970.464,20 con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable. Al 31 de mayo de 2022, conforme reporte del ESIGEF la reforma se encuentra plantea, y se encuentra en estado consolidado.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	21/06/2022 - 06:53 PM
Hitos cumplido correspondiente al mes de abril 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2022. 02. El 26 de abril de 2022 mediante Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0302-M se remitió la programación de los desembolsos actualizados para el ejercicio fiscal 2022, considerando el flujo de caja de la operación L1236. 03. Se tiene la "No objeción" a los términos de referencia y el estudio de mercado para el proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos. 04. Se realizó la resolución administrativa Nro. FAISDI-MIES-001-002-2022-CP4634-DD de fecha 05 de abril de 2022, con la declaración de desierto del proceso de contratación del especialista de adquisiciones. 05. Se tiene estructurado los términos de referencia de la contratación de la línea base, y se remitió al BID para la "No Objeción". 06. La ejecución presupuestaria mensual en abril de 2022 es de USD 2.142,02 equivalente al 0,13% y correspondiente al pago de los servicios de la consultoría del especialista legal correspondiente al mes de marzo 2022. 07. La ejecución presupuestaria acumulada es en el grupo de gasto 73 con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 6.426,06 equivalente al 0,38% del presupuesto total. 08. Se mantiene en fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 el valor ejecutable por USD 729.535,80. Sin embargo, con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable por el monto de USD 970.464,20.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	10/05/2022 - 06:59 PM
Hitos cumplido correspondiente al mes de marzo 2022: 1.- Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2022. 2.- Se elaboró y se aprobó los informes de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo del primer trimestre del 2022. 3.- Se realizó el proceso para la contratación del especialista de adquisiciones, sin embargo, por una error de cálculo en la calificación no se pudo tener una terna, por lo tanto, no se obtuvo la "No Objeción" del BID y se declarará en desierto. Se prevé un nuevo proceso de contratación y se estima tener la contratación hasta el 01 de mayo de 2022. 4.-El 03 de marzo 2022 se verificó en el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF la reforma DIS 50 y AMP 51 por el valor de USD 1.700.000,00 en estado aprobado, en función de lo siguiente: en fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 se tiene un valor ejecutable por USD 729.535,80. Pero con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable por el monto de USD 970.464,20. 5. El 22 de marzo de 2022 mediante Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0206-M se remitió el detalle de los desembolsos actualizados para el ejercicio fiscal 2022, con la información en el formato establecido considerando los respectivos flujos de caja de las operaciones actualizadas a la fecha. 6.- La ejecución presupuestaria en el grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 4.284,04 equivalente al 7% del presupuesto de la actividad 07 que tiene un monto de USD 57.577,52. La erogación antes mencionada representa el pago de los servicios de la consultoría del especialista legal correspondiente al mes de enero y febrero de 2022.	León Suqui, Fernando David	11/04/2022 - 08:46 AM
Hitos cumplido correspondiente al mes de febrero 2022:	León Suqui, Fernando David	11/03/2022 - 08:08 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. El 10 de febrero de 2022 se realizó el seguimiento a la reforma planteada con Nro. MIES-VIS-FGICPDS-2022-01, y solicitado mediante el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF Nro. DIS 50 y AMP 51 por el valor de USD 1.7 millones para el proyecto de discapacidad severa. Asimismo, se realizó una insistencia el 15 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0032-O dirigido a la Subsecretaria de Presupuesto, Olga Núñez y a la Directora de Egresos no Permanentes, Tatiana Calán. La reforma se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 2. El 10 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MSP-MSP-2022-0450-O la Gerencia de Financiamiento Externo del Ministerio de Salud Pública - MSP, solicitó se informe sobre desembolsos, suscripción de contratos y pagos realizados. Al respecto, el 11 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0027-O se remitió información sobre un contrato suscrito (especialista de legal), asimismo, se informó que no se ha realizado ningún pago ni desembolso hasta la presente fecha, por parte del Ministerio de Inclusión Económica y social - MIES. 3. El 24 de febrero de 2022 mediante documento Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0036-O se solicitó al Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF el primer desembolso de recursos del Contrato de Préstamo Nro. 4634/OC-EC L1236 por un valor de USD 100.000,00 dólares. 4. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 28 de febrero de 2022.		
Hitos cumplido correspondiente al mes de enero 2022: 1- El 27 de enero de 2022 se remitió el Plan Anual de la Política Pública - PAPP del proyecto de "Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa", para el ejercicio fiscal 2022. 2. El 31 de enero de 2022 se realizó la reforma Nro. MIES-VIS-FGICPDS-2022-01 para ajustar la planificación y el presupuesto con el organismos 2002 y correlativo 5086.	León Suqui, Fernando David	03/03/2022 - 11:05 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. No contar con la adjudicación del contrato para la realización de la consultoría técnica para el registro de cuidadores de personas con discapacidad severa, CAUSARÍA, un retraso considerable en el desarrollo del proyecto	15/03/2024	Anabel Cecilia Salazar Carrillo	40 %	80	32	0/0
5- PROYECTO. * General. No contar con la actualización del dictámen de prioridad del proyecto, CAUSARÍA, la suspensión de la ejecución del mismo y consecuentemente su cierre.	29/02/2024	Anabel Cecilia Salazar Carrillo	30 %	100	30	0/0

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 2

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planeación: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan	9-Entregables Formales	27/01/2022		27/01/2022		Sí	1.72

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Anual de la Política Pública 2022).							
2	Ejecución: Elaboración de la reforma presupuestaria en función de los saldos disponibles en el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF (Reforma presupuestaria).	9-Entregables Formales	31/01/2022		31/01/2022		Sí	1.72
3	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de febrero (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de febrero).	9-Entregables Formales	28/02/2022		28/02/2022		Sí	1.72
4	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2021 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	04/03/2022		04/03/2022		Sí	2.64
5	Ejecución: Elaboración de los informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.72
6	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de marzo (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de marzo).	9-Entregables Formales	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.72
7	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de abril (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de abril).	9-Entregables Formales	09/05/2022		09/05/2022		Sí	1.72
8	Ejecución: Consultoría técnica especializada para la planificación, coordinación y ejecución de las adquisiciones y contrataciones / Especialista de adquisiciones (Contrato suscrito con el especialista de adquisiciones).	9-Entregables Formales	31/05/2022		31/05/2022		Sí	1.72
9	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de mayo (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de mayo).	9-Entregables Formales	13/06/2022		13/06/2022		Sí	1.72
10	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023).	9-Entregables Formales	25/06/2022		25/06/2022		Sí	1.72
11	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de	9-Entregables Formales	07/07/2022		07/07/2022		Sí	1.72

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	junio (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de junio).							
12	Ejecución: Elaboración de los informes del segundo trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del segundo trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	10/07/2022		10/07/2022		Sí	1.72
13	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de julio (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de julio).	9-Entregables Formales	16/08/2022		16/08/2022		Sí	1.72
14	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2022 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	01/09/2022		01/09/2022		Sí	2.64
15	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de agosto (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de agosto).	9-Entregables Formales	14/09/2022		14/09/2022		Sí	1.72
16	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de septiembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de septiembre).	9-Entregables Formales	10/10/2022		10/10/2022		Sí	1.72
17	Ejecución: Elaboración de los informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	17/10/2022		17/10/2022		Sí	1.72
18	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de octubre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de octubre).	9-Entregables Formales	09/11/2022		28/10/2022		Sí	1.72
19	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de noviembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de noviembre).	9-Entregables Formales	09/12/2022		09/12/2022		Sí	1.72
20	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de diciembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de diciembre).	9-Entregables Formales	06/01/2023		06/01/2023		Sí	1.72
21	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de diciembre 2022 (Informe de gerencia	9-Entregables Formales	10/01/2023		10/01/2023		Sí	2.87

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)							
22	Ejecución: Elaboración de los informes del cuarto trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del cuarto trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	12/01/2023		12/01/2023		Sí	1.72
23	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2023).	9-Entregables Formales	12/01/2023		12/01/2023		Sí	3.58
24	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de enero 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	10/02/2023		10/02/2023		Sí	3.58
25	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de febrero 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	10/03/2023		10/03/2023		Sí	1.72
26	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de marzo 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	10/04/2023		10/04/2023		Sí	3.58
27	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de abril 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	09/05/2023		09/05/2023		Sí	3.58
28	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de mayo 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	12/06/2023		12/06/2023		Sí	3.58
29	Ejecución: Consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión y el esquema de incentivos del "Modelo Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad" (Contrato suscrito para Modelo Redes y Esquema de Incentivos).	9-Entregables Formales	21/06/2023		21/06/2023		Sí	3.58
30	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de junio 2023 (Informe de gerencia con información financiera,	9-Entregables Formales	14/07/2023		14/07/2023		Sí	3.58

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	adquisiciones, legal y monitoreo)							
31	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de julio 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	09/08/2023		09/08/2023		Sí	2.85
32	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de agosto 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	11/09/2023		11/09/2023		Sí	1.72
33	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de septiembre 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	13/10/2023		13/10/2023		Sí	3.58
34	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de octubre 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	13/11/2023		13/11/2023		Sí	3.58
35	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de Noviembre 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	29/12/2023		29/12/2023		Sí	2.87
36	Ejecución: Equipo de gestión del proyecto contratados (Contratos suscritos, equipo de gestión (especialistas legal y adquisiciones)	9-Entregables Formales	31/12/2023		31/12/2023		Sí	2.87
37	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de Diciembre 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	10/01/2024		10/01/2024		Sí	2.58
38	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (Diciembre 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.0
39	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de Enero 2024 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	29/02/2024		29/02/2024		Sí	3.58
40	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (Enero 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	29/02/2024		29/02/2024		Sí	0.0
41	Informe semestral de gestión BID del proyecto Discapacidad	9-Entregables Formales	29/02/2024		29/02/2024		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Severa (Julio-Diciembre 2023) enviado.							
42	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de Febrero 2024 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	29/03/2024	29/03/2024		▼	No	1.72
43	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (Febrero 2024) aprobada.	9-Entregables Formales	29/03/2024	29/03/2024		▼	No	0.0
44	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de Marzo 2024 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo)	9-Entregables Formales	30/04/2024	30/04/2024		▼	No	3.46
45	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (Marzo 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	30/04/2024	30/04/2024		▼	No	0.0
46	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (abril 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	31/05/2024	31/05/2024		▼	No	0.0
47	Informe de gestión mensual del proyecto Discapacidad Severa (Abril 2024) aprobado.	9-Entregables Formales	31/05/2024	31/05/2024		▼	No	0.0
48	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (Mayo 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	28/06/2024	28/06/2024		▼	No	0.0
49	Informe de gestión mensual del proyecto Discapacidad Severa (Mayo 2024) aprobado.	9-Entregables Formales	28/06/2024	28/06/2024		▼	No	0.0
50	Actualización de dictámen del proyecto aprobado.	9-Entregables Formales	31/07/2024	31/07/2024		▼	No	0.0
51	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (Junio 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	31/07/2024	31/07/2024		▼	No	0.0
52	Informe de gestión mensual del proyecto Discapacidad Severa (Junio 2024) aprobado.	9-Entregables Formales	31/07/2024	31/07/2024		▼	No	0.0
53	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (Julio 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	30/08/2024	30/08/2024		▼	No	0.0
54	Informe de gestión mensual del proyecto Discapacidad Severa (Julio 2024) aprobado	9-Entregables Formales	30/08/2024	30/08/2024		▼	No	0.0
55	Consultoría Técnica Especializada para Diseñar y Validar el Modelo de Gestión y el Esquema de Incentivos del "Modelo de Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad Atendidas por el MIES, y sus familias"; Terminada	9-Entregables Formales	30/09/2024	30/09/2024		▼	No	0.0
56	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (Agosto 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	30/09/2024	30/09/2024		▼	No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
57	Informe de gestión mensual del proyecto Discapacidad Severa (Agosto 2024) aprobado	9-Entregables Formales	30/09/2024	30/09/2024		▼	No	0.0
58	Contrato de consultoría técnica de registro, suscrito.	9-Entregables Formales	31/10/2024	31/10/2024		▼	No	0.0
59	Ejecución: Consultoría de asesoría técnica especializada para el desarrollo de la metodología, para identificar, seleccionar, asignar y registrar a las personas suplentes del cuidado de personas con discapacidad (Contrato suscrito para la consultoría).	9-Entregables Formales	31/10/2024	31/10/2024		▼	No	3.58
60	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (septiembre 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	31/10/2024	31/10/2024		▼	No	0.0
61	Informe de gestión mensual del proyecto Discapacidad Severa (Septiembre 2024) aprobado	9-Entregables Formales	31/10/2024	31/10/2024		▼	No	0.0
62	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (Octubre 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	29/11/2024	29/11/2024		▼	No	0.0
63	Informe de gestión mensual del proyecto Discapacidad Severa (Octubre 2024) aprobado	9-Entregables Formales	29/11/2024	29/11/2024		▼	No	0.0
64	Ficha de seguimiento mensual del proyecto (noviembre 2023) aprobada.	9-Entregables Formales	31/12/2024	31/12/2024		▼	No	0.0
65	Informe de gestión mensual del proyecto Discapacidad Severa (Noviembre 2024) aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2024	31/12/2024		▼	No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO


	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de la consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión y el esquema de incentivos del Modelo Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad Atendidas por el MIES y sus Familias		10,142.86 %	0.7	71	01/01/2024	Febrero
2	Porcentaje de avance del proceso precontractual de la consultoría técnica especializada encargada de desarrollar, implementar y ejecutar el proceso metodológico para identificar, seleccionar y registrar en el sistema informático institucional a personas p		100.00 %	0	0	01/01/2024	Febrero

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	133,563.58 **
Costo Total:	8,770,830.00
Total Devengado:	156,338.56
% Costo Total Devengado:	1.78 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.	


% COSTO TOTAL DEVENGADO



Perfil Económico 2024				
	Años Previos	Año Actual (2024)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,064,767.90	48,574.62	0.00	2,113,342.52
Ppto. Externo Planeado	2,064,767.90	48,574.62	0.00	2,113,342.52
Ppto. Aprobado Inicial	2,064,767.90	48,574.62	0.00	2,113,342.52
Ppto. Codificado	375,131.58	48,574.62	0.00	423,706.20
Ppto. Comprometido	209,021.61	71,349.60	0.00	280,371.21
Planeado - Codificado (2024)		0.00		
Programado a Devengar	2,064,767.90	48,574.62	0.00	2,113,342.52
Ppto. Devengado	84,988.96	71,349.60	0.00	156,338.56
Pagado Real	84,988.96	0.00	0.00	84,988.96
Estimado a fin de año	* 84,988.96	71,349.60	0.00	156,338.56
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,979,778.94	-22,774.98	0.00	1,957,003.96
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 4.12 %	146.89 %	0.00 %	7.40 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2024

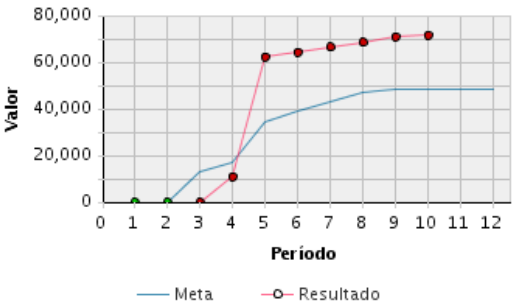

Presupuesto Mensual 2024							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2024							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	12,852.12	0.00	12,852.12	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	4,284.04	10,710.10	17,136.16	10,710.10	62.50 %		22.05 %
May	17,301.12	51,428.82	34,437.28	62,138.92	180.44 %		127.92 %
Jun	4,284.04	2,142.02	38,721.32	64,280.94	166.01 %		132.33 %
Jul	4,284.04	2,142.02	43,005.36	66,422.96	154.45 %		136.74 %
Ago	4,284.04	2,142.02	47,289.40	68,564.98	144.99 %		141.15 %
Sep	1,285.22	2,142.02	48,574.62	70,707.00	145.56 %		145.56 %
Oct	0.00	642.60	48,574.62	71,349.60	146.89 %		146.89 %
Nov	0.00		48,574.62				
Dic	0.00		48,574.62				
Total	48,574.62	71,349.60					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la eficiencia en la gestión de protección al cuidado de las Personas con Discapacidad MEDIANTE la aplicación de la normativa legal

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	w1. Informe Gerencia julio 2023 L1236, asociado al hito 31	InformeGerencia_DISCSEV_Julio2023-signed-signed-signed.pdf	09/08/2023
2	A0 - Actualizacion Dictamen Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0904-OF	A0_-_Actualizacio	03/03/2022
3	A0 - Proyecto Discapacidad Severa 2021-11-23	A0_-_Proyecto_Discapacidad_Severa_2021-11-23.pdf	03/03/2022
4	A0 - Saldo Inicial Discapacidad Severa	A0_-_Saldo_Inicial_Discapacidad_Severa.pdf	03/03/2022
5	AA1. Informe Gerencia noviembre 2023 L1236, asociado al hito 35	informe_de_gerencia_discapacidad_severa_noviembre2023-signed-signed-signed_final.pdf	02/01/2024
6	AB1. Contratos Especialistas de Gestión legal y adquisiciones asociados al ITEM 36	CONTRATO_ESP_Disc.zip	02/01/2024
7	AC1. Informe Gerencia diciembre 2023 L1236, asociado al hito 37	Informemensual_discsev_dic.pdf	29/02/2024
8	AC2. Ficha Seguimiento Gerencia diciembre 2023 L1236, asociado al hito 38	Ficha_Técnica_Disc._Severa_diciembre_23-signed-signed-signed.pdf	29/02/2024
9	AD1. Informe de seguimiento / situación Gerencia del proyecto / Enero 2024, asociado al ítem 39	Informe_Sitaci3n_4634_DiscSev-signed.pdf	13/03/2024
10	AD2. Ficha de seguimiento del proyecto / Enero 2024, asociado al ítem 40	Ficha_Técnica_Disc._Severa_(Enero_2024)-signed-signed-signed_(1).pdf	13/03/2024
11	AD3. Memorando MIES-VIS-FAISDI-2024-0011-O de 29 de febrero 2023, envío de informe semestral al BID, asociado al ítem 41	MIES-VIS-FAISDI-2024-0011-O_envioinforme_semestralBID_29-2-2024.pdf	13/03/2024
12	B1 - PAPP Discapacidad Severa 2022-01-31 Asociación al hito Nro. 01.	A1_-_PAPP_Discapacidad_Severa_2022-01-31.xlsb	25/02/2022
13	B2 - Reforma MIES-VIS-FGICPDS-2022-01 Asociación al hito Nro. 02	A2_-_Reforma_MIES-VIS-FGICPDS-2022-01.xlsx	25/02/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	B3 - Informe Financiero DisSev Febrero 2022 Asociación al hito Nro. 03.	A3 - _Informe_Financiero_DisSev_Febrero_2022-signed.pdf	09/03/2022
15	B4 - Informe Gestio#n 2do Semestre 2021 - L1236 Asociación al hito Nro. 04	A4 - _Informe_Gestio	09/03/2022
16	C1 - Informe Financiero DisSev Marzo 2022 Asociación al hito Nro. 06.	C1 - _Informe_Financiero_DisSev_Marzo_2022-signed.pdf	05/04/2022
17	C2 - Cierre de Riesgo - No Objecio#n TDR Modelo de Redes Asociación al hito Nro. 18.	C2 - _Riesgo_-_No_Objecio	05/04/2022
18	C3 - Informe Legal L1236 1er Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 05	C3 - _Informe_Legal_L1236_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	05/04/2022
19	C4 - Informe Adquisiciones L1236 1er Trimestre Asociación al hito Nro. 05.	C4 - _Informe_Adquisiciones_L1236_1er_Trimestre-signed.pdf	06/04/2022
20	C5 - Informe Seguimiento y Monitoreo L1236 1er Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 05	C5 - _Informe_SegMonitoreo_L1236_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	06/04/2022
21	D1 - Informe Financiero DisSev Abril 2022 Asociación al hito Nro. 07	Informe_Financiero_DisSev_Abril_2022-signed.pdf	09/05/2022
22	E1 - Informe Financiero DisSev Mayo 2022 Asociación al hito Nro. 09	E1 - _Informe_Financiero_DisSev_Mayo_2022-signed.pdf	13/06/2022
23	F1 - Envío proforma presupuestaria PAI 2023 Asociación al hito Nro. 10.	F1 - _MIES-VIS-FAISDI-2022-0431-M_Respuesta_Envio_PAI_2023.pdf	12/07/2022
24	F2 - Proforma presupuestaria PAI 2023 Discapacidad Severa Asociación al hito Nro. 10.	F2 - _Discapacidad_Severa_Proforma_PAI_2023.zip	12/07/2022
25	F3 - Informe financiero DisSev Junio 2022 Asociación al hito Nro. 11.	F3 - _Informe_Financiero_DisSev_Junio-signed.pdf	12/07/2022
26	F4 - Informe legal L1236 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F4 - _Informe_Legal_L1236_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
27	F5 - Informe Seguimiento y Monitoreo L1236 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F5 - _Informe_SegMonitoreo_L1236_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
28	F6 - Informe Adquisiciones L1236 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F6 - _Informe_Adquisiciones_L1236_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
29	G1 - Informe Financiero DisSev Julio 2022 Asociación al hito Nro. 13.	G1 - _Informe_Financiero_DisSev_Julio_2022-signed.pdf	17/08/2022
30	H1 - Informe Gestio#n 1er Semestre 2022 - L1236 - Asociado al hito Nro. 14.	H1 - _Informe_Gestio	15/09/2022
31	H2 - Informe Financiero DisSev Agosto 2022 - Asociado al hito Nro. 15.	H2 - _Informe_Financiero_DisSev_Agosto_2022-signed.pdf	15/09/2022
32	I1. Informe Financiero DisSev Septiembre 2022 - Asociado al hito Nro. 16.	InformeFinancieroL1236-09-2022.pdf	17/10/2022
33	I2. Informe Monitoreo y Evaluación DisSev 3er trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 17.	Informe_SegMonitoreo_L1236_3er_Trimestre_2022-signed-signed.pdf	20/10/2022
34	I3. Informe Legal DisSev 3er trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 17.	INFORMECP4634-L1236-3ertrim_2022.pdf	20/10/2022
35	I4. Informe Adquisiciones DisSev 3er trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 17	InformeTrimestralL1236jul-sep-2022.pdf	20/10/2022
36	J1. Informe Financiero DisSev Octubre 2022 - Asociado al hito Nro. 18.	InformeFinancieroL1236_10-2022-signed.pdf	28/10/2022
37	k1. Informe Financiero DisSev Noviembre 2022 - Asociado al hito Nro. 19	Informe_Financiero_DiscaSev_Noviembre-signed-signed.pdf	19/12/2022
38	l1. Informe Financiero DisSev Diciembre 2022 - Asociado al hito Nro. 20	Informe_Financiero_DiscaSev_Diciembre-signed-signed.pdf	06/01/2023
39	m1. Informe Monitoreo y Evaluación DisSev 4to trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 22	InformeSeguimiento_4totrimestre2022_L1236-signed.pdf	12/01/2023
40	m2. Informe Legal DisSev 4to trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 22	INFORME_LEGAL_CUARTO_TRIMESTRE_CP_4634_-_L1236-signed-signed.pdf	19/01/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
41	m3. Informe Adquisiciones DisSev 4to trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 22	Informe_Trimestral_adquisiciones_L-1236_190123-signed-signed.pdf	20/01/2023
42	n1. Informe Gerencia Diciembre 2022 L1236, asociado al hito 21	InformeGerenciaDiscapacidadSeveraDIC-signed.pdf	23/02/2023
43	o1. Informe Gerencia Enero 2022 L1236, asociado al hito 24	InformeGerencia_DISCSEV_Enero2023-signed-signed-signed.pdf	23/02/2023
44	p1. Informe Gerencia Febrero 2022 L1236, asociado al hito 25	InformeGerencia_DISCSEV_Febrero2023-signed_(1)-signed.pdf	17/03/2023
45	r1. Informe Gerencia Marzo 2023 L1236, asociado al hito 26	informeGerencia_discsev_marzo2023-signed-signed_firmado_(1).pdf	26/04/2023
46	s1. Informe Gerencia Abril 2023 L1236, asociado al hito 27	InformeGerencia_DISCSEV_Abril2023-signed_1-signed.pdf	09/05/2023
47	t1. Informe Gerencia mayo 2023 L1236, asociado al hito 29	Informe_GerenciaDISCSEV_Mayo2023-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
48	u1. Contrato_consultoríaREDES_21-6-2023, asociado a hito 28	CONTRATO_MODELO_DE_REDES.pdf	03/07/2023
49	v1. Informe Gerencia junio 2023 L1236, asociado al hito 30	InformeGerencia_DISCSEV_Junio2023-signed-signed-signed.pdf	14/07/2023
50	X1. Informe Gerencia agosto 2023 L1236, asociado al hito 32	informe_gerencia_discapacidad_sev_agosto_2023-signed-signed-signed0910113001694637682.pdf	28/09/2023
51	Y1. Informe Gerencia septiembre 2023 L1236, asociado al hito 33	Informe_Gerencia_Disc_Sev_septiembre_2023-signed-signed-signed.pdf	13/10/2023
52	Z1. Informe Gerencia octubre 2023 L1236, asociado al hito 34	InformeGerencia_DISCSEV_Octubre2023-signed-signed-signed.pdf	13/11/2023
53	ñ1. PAPP asociado al hito 23	MIES-CGPGE-DPI-2023-0008-M_recepcionPAPP_autorizado_2023.pdf	23/02/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Díaz Medina, Daniel Fernando	Analista del Proyecto de Inversión de Discapacidad Severa	Analista	fernando.diaz@inclusio n.gob.ec	0995741079
Salazar Carrillo, Anabel Cecilia	Líder del Proyecto de Inversión de Discapacidad Severa	Gerente de Proyecto 3	anabel.salazar@inclusi on.gob.ec	
