

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral**  
**Dirección de Servicios de Atención Domiciliar**

**PROYECTO: K003** Fortalecimiento, ampliación e innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura.

Líder del Proyecto:	Pérez Ruales, Nicole Alexandra (nicole.perez@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jalón Garces, Alba Lorena	Programas Relacionados:	IE-MT-MISION TERNURA
Titular:	Romero Guayasamín, Pablo Efraín	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.383775	TIR:	46.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	214,811,888.16
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	45,979,773.32
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2019 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	27/02/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Palma Arias, Andrea Margarita	Fecha del siguiente Hito:	29/02/2020

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones en la calidad de los servicios de desarrollo infantil a través de las modalidades CDI, CNH y CCRA para niñas y niños de 0 a 3 años de edad y mujeres gestantes, mediante estrategias de articulación intersectorial y el involucramiento de la familia para el Desarrollo Infantil Integral lo que permitirá mejorar la priorización de los mismos e incrementar año tras año, usuarios en la modalidad CCRA, enfocada al fortalecimiento del tejido social a través de consejerías grupales y apoyos nutricionales en zonas de alta dispersión, emergencia o vulnerabilidad. Para conseguir los objetivos planteados se han establecido los siguientes componentes:

1. Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil.
2. Calidad de la Gestión de Servicios de Desarrollo Infantil.
3. Marco Normativo e Institucional para la Primera Infancia.
4. Personal técnico - operativo capacitado para cubrir la nueva cobertura de los Servicios de Desarrollo Infantil.
5. Evaluación del Proyecto.

**Beneficios Cualitativos**

Mejorar la calidad estructural y de procesos de los servicios de desarrollo infantil.

**Tipo de Beneficiario**

\*Niños menores de 3 años y madres gestantes, que se encuentran en áreas focalizadas y en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que residan en zonas de menor consolidación y zonas de mayor dispersión geográfica y poblacional, o que atraviesan situaciones de emergencia o requieren de atención prioritaria (96 cantones priorizados).

\* Técnicos de Desarrollo Infantil Integral a nivel nacional.

**Restricciones**

Alcance: A nivel nacional

Tiempo: El tiempo de ejecución es limitado por el número de personal asignado al proyecto.


Costo: Falta de asignación presupuestaria

Recursos: Personal limitado para la ejecución del proyecto / Rotación de funcionarios y analistas.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 22.45 %  
 Fecha de Inicio: 01/02/2019 Fecha de Fin: 31/12/2023

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

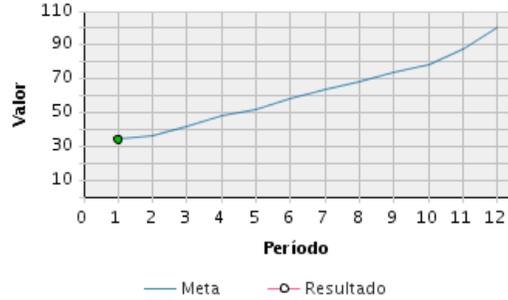

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	34 %	36 %	42 %	48 %	52 %	58 %	64 %	68 %	74 %	78 %	88 %	100 %
	Avance real acumulado											
	34 %											
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Enero 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Reuniones situacionales para establecer la planificación del año 2020 del proyecto considerando el Acuerdo Ministerial 001 emitido por el MEF, en el que se establece que en los proyectos con financiamiento externo el monto del IVA se incluya en los recursos del préstamo</li> <li>.Revisión y propuesta del organigrama del equipo de gestión (fiduciario) de todos los convenios (préstamos y ATNs) con fondos BID.</li> <li>.Elaboración de informe semestral de progreso del contrato de préstamo 4607 (período 01 de julio al 31 de diciembre de 2019) anexos (PEP, PMR, Flujo de caja, PA, Plan Financiero y Matriz de Riesgos).</li> <li>.Definición de la planificación PAPP 2020 del Proyecto con base en techo presupuestario aprobado</li> <li>.Informe institucional para el MEF sobre la ejecución presupuestaria y avances físicos del proyecto.</li> <li>.Informe semestral para reporte al SIPeP sobre avances físicos del Proyecto Mision Ternura.</li> <li>.Elaboración de instrumentos para el Plan Anual Comprometido (PAC) 2020 e insumos GPR-establecimiento de hitos e indicadores para el 2020.</li> <li>.Regularización de reporte de resumen ejecutivo, ejecución presupuestaria, reporte de hitos del último trimestre de 2019.</li> <li>.Revisión de la metodología de la evaluación del impacto del préstamo 4607 a fin de iniciar la medición de la línea base.</li> <li>.Gestiones pertinentes para dar seguimiento al pago de los valores devengados de anticipos de procesos de licitación y contratación realizados en el 2019.</li> <li>.Asesoría a los equipos de las Subsecretarías para elaboración de los TDRs de los equipos técnicos (figura de consultoría).</li> <li>.Propuesta de acuerdo ministerial para delimitar la autorización de gasto dependiendo de las fuentes de financiamiento para que en cada proyecto se tenga claramente establecidas las atribuciones y responsabilidades de cada autoridad delegada, lo que mejoraría la articulación y ejecución de los mismos.</li> <li>.Gestiones para iniciar los procesos precontractuales para la contratación del equipo ejecutor, equipo técnico y auditoría externa.</li> </ul>	Palma Arias, Andrea Margarita	12/02/2020 - 03:35 PM
<p>Diciembre 2019</p> <p>Culminación de los procesos de licitación pública internacional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Licitación Pública Internacional LPI01 para la adquisición de 2016 KITS de material didáctico CDI y 4939 KITS para CNH.</li> <li>2.Licitación Pública Internacional LPI02 para la adquisición de 2016 KITS de material impreso y 4939 CNH.</li> </ol>	Palma Arias, Andrea Margarita	07/01/2020 - 03:03 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Contratación de 4 consultores, los cuales tienen como objetivo 1. Capacitación en protección de derechos NNA 2. Elaborar propuestas de normativas para protección de derechos de NNA en el marco del contrato de préstamo 4607 3. Mecanismos en participación ciudadana 4. Construcción de implementación del sistema de información de igualdad y no discriminación con prioridad en protección integral NNA, los consultores procedieron con la entrega de los productos establecidos en los TDRs.</p> <p>Entrega de los productos de la consultoría para elaborar la Ley de Política de la Primera Infancia por un valor de \$ 35.000,00</p> <p>Contratación de talleres de capacitación en consulta nacional a niños, niñas y adolescentes realizados en noviembre y diciembre.</p> <p>En el mes de diciembre se devengó un presupuesto total de: \$3.028.212,25</p> <p>Información tomada del informe de fin de gestión del Ing. Carlos Caicedo Valladares remitido mediante Memorando Nro. MIES-SDII-FAISDI-2019-0228-M de fecha 31 de diciembre de 2019</p>		
<p><b>NOVIEMBRE 2019:</b>                      Avance en la ejecución de los procesos de licitación pública internacional                      1.Licitación Pública Internacional LPI01 para la adquisición de 2016 KITS de material didáctico CDI y 4939 KITS para CNH.                      2.Licitación Pública Internacional LPI02 para la adquisición de 2016 KITS de material impreso y 4939 CNH.</p> <p>Contratación de 4 consultores, los cuales tienen como objetivo 1. Capacitación en protección de derechos NNA 2. Elaborar propuestas de normativas para protección de derechos de NNA en el marco del contrato de préstamo 4607 3. Mecanismos en participación ciudadana 4. Construcción de implementación del sistema de información de igualdad y no discriminación con prioridad en protección integral NNA, actualmente los consultores están entregando productos para proceder al pago.</p> <p>En el mes de noviembre se devengó un presupuesto total de: \$1.498.008,28</p> <p>Información tomada del informe de fin de gestión del Ing. Carlos Caicedo Valladares remitido mediante Memorando Nro. MIES-SDII-FAISDI-2019-0228-M de fecha 31 de diciembre de 2019</p>	Palma Arias, Andrea Margarita	07/01/2020 - 02:33 PM
<p><b>OCTUBRE 2019.</b> Avance en la ejecución de los procesos de licitación pública internacional (LPI 01 y LPI 02) para el equipamiento e impresión de material para los CDI y CNH a nivel nacional.</p>	Palma Arias, Andrea Margarita	06/01/2020 - 12:02 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2019.</b> El proyecto se enfoca a la sistematización de datos para el Informe mensual de seguimiento a la ejecución enmarcadas al Modelo de Gestión territorial establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.</p>	López Moreta, José Luis	14/10/2019 - 02:34 PM
<p><b>AGOSTO 2019.</b> Elaboración de Término de Referencia para realizar la impresión de material didáctico; pliegos aprobados por parte del BID respecto a los insumos para la normativa nacional de niños, niñas y adolescentes, e Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria; todas estas acciones enmarcadas al Modelo de Gestión territorial establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.</p>	López Moreta, José Luis	14/10/2019 - 02:33 PM
<p><b>JULIO 2019:</b> El proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y continuar con la consecución de los hito previstos para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil, adicional se presenta a la Dirección de Seguimiento el Informe mensual a la ejecución presupuestaria.</p>	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:29 PM
<p><b>JUNIO 2019:</b> Elaboración de Términos de Referencia para realizar la contratación de los especialistas del equipo de gestión del proyecto BID "Inversión en Calidad de los Servicios" y elaboración de Términos de Referencia para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil en aplicación al Modelo de Gestión territorial en función a lo establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.</p>	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:29 PM
<p><b>MAYO 2019:</b> Consecución de procesos para avanzar en la realización de los Términos de Referencia para la Impresión de material didáctico y/o curricular.</p>	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:28 PM
<p><b>ABRIL 2019:</b> Elaboración y envío de Términos de Referencia para la Adquisición de material didáctico CDI y CNH los cuales son procesos de Licitación Pública Internacional.</p>	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:28 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2019: La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), emite el Dictámen de Prioridad al Proyecto y se presenta a la Dirección de Seguimiento el Informe mensual a la ejecución presupuestaria.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:27 PM
FEBRERO 2019: Se obtuvo la aprobación del PAPP del proyecto, en las partidas presupuestarias y se redistribuyó a cada Entidad Operativa Desconcentrada (EOD), para el arranque del proyecto.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:27 PM
ENERO 2019: El proyecto realizo acciones para la asignación de recursos presupuestarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, al proyecto.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:26 PM
JULIO 2019: El proyecto realiza las acciones para contar con un espacio presupuestario y continuar con la consecución de los hito previstos para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil	López Moreta, José Luis	12/08/2019 - 03:06 PM
JUNIO 2019: Con el objetivo de garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, el proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y empezar procesos de contratación	López Moreta, José Luis	11/07/2019 - 04:37 PM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. Político.</b> Demoras en la asignación y/o no asignación de presupuesto en fuente BID y de contrapartida necesarios para iniciara ejecución del Programa CAUSARIA retraso en la consecución de los productos planificados, lo cual afecta el desempeño del Programa	12/02/2020	Nicole Alexandra Pérez Ruales	80 %	90	72	0/1
<b>2- NACIONAL. * General.</b> Las adquisiciones no cumplen los requisitos de calidad en la elaboración de TDR, especificaciones técnicas y/o formulación de pliegos, esto CAUSARIA que el mercado no responda efectivamente a licitaciones y afecta la calidad de productos	12/02/2020	Nicole Alexandra Pérez Ruales	70 %	80	56	0/1
<b>2- NACIONAL. Social / Laboral.</b> La capacidad de la ejecución vulnerada por calidad y experticia técnica lo que CAUSARIA que los requerimientos técnicos sean deficientes en la formulación del alcance de actividades, lo que afecta la calidad de pliegos y productos del Programa.	12/02/2020	Nicole Alexandra Pérez Ruales	60 %	60	36	0/1
<b>2- NACIONAL. Político.</b> No se concreta o se retrasa la aprobación de las iniciativas y normas legales relacionadas al CONA lo que CAUSARIA que las inversiones realizadas a través del Programa como insumos al CONA perderían relevancia.	12/02/2020	Nicole Alexandra Pérez Ruales	70 %	50	35	0/1
<b>2- NACIONAL. * General.</b> Retraso en levantamiento de información implementación CAUSARÍA el desarrollo del mismo	04/02/2020	Nicole Alexandra Pérez Ruales	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 5

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Elaboración de proyecto	4-Inicio de Trabajo	01/02/2019		01/02/2019		Sí	2.0
2	PLANEACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto, elaborado	4-Inicio de Trabajo	08/02/2019		08/02/2019		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Dictamen de prioridad del proyecto, aprobado	9-Entregables Formales	04/03/2019		04/03/2019		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	11/03/2019		11/03/2019		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de material didáctico para equipar las unidades de CDI y CNH, aprobado	5-Entregables Intermedios	18/04/2019		18/04/2019		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la contratación al equipo de Gestión para la Gerencia del Proyecto Misión Ternura, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/06/2019		05/06/2019		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil, elaborados	5-Entregables Intermedios	13/06/2019		13/06/2019		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	03/07/2019		03/07/2019		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	02/08/2019		02/08/2019		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la impresión de material didáctico y/o curricular desarrollado, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/08/2019		22/08/2019		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Informe de insumos para la normativa nacional de niños, niñas y adolescentes, elaborados	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	04/09/2019		04/09/2019		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	03/10/2019		03/10/2019		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	06/11/2019		06/11/2019		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la capacitación al personal técnico operativo de CDI y/o CNH, aprobado	4-Inicio de Trabajo	21/11/2019		21/11/2019		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
16	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a las asistencias , aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2019		22/12/2019		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	29/02/2020	29/02/2020			No	2.0
19	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	31/03/2020	31/03/2020			No	2.0
20	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)	9-Entregables Formales	31/03/2020	31/03/2020			No	2.0
21	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/03/2020	31/03/2020			No	2.0
22	EJECUCIÓN: Adquirir material didáctico para los servicios de desarrollo infantil - unidades CDI, CNH, CCRA. (Informe de recepción de material didáctico para los servicios de desarrollo infantil;- unidades CDI,CNH,CCRA)	9-Entregables Formales	30/04/2020	30/04/2020			No	2.0
23	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/04/2020	30/04/2020			No	2.0
24	EJECUCIÓN: Elaborar las reformas al Reglamento Operativo Proyecto (ROP) - Contrato de préstamo EC-L1235. (Reglamento Operativo Proyecto (ROP) -Contrato de préstamo EC-L1235 reformado)	9-Entregables Formales	30/04/2020	30/04/2020			No	2.0
25	EJECUCIÓN: Contratar al equipo técnico y de gestión para la operación del contrato de préstamo 4607/OC-EC. (Informe de contratación del equipo técnico y de gestión)	9-Entregables Formales	31/05/2020	31/05/2020			No	2.0
26	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/05/2020	31/05/2020			No	2.0
27	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	30/06/2020	30/06/2020			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
28	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)	9-Entregables Formales	30/06/2020	30/06/2020			No	2.0
29	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/06/2020	30/06/2020			No	2.0
30	EJECUCIÓN: Contratar el diseño y ejecución de la encuesta de línea de base levantada en campo. (Informe de contratación/ licitación del proceso)	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	2.0
31	EJECUCIÓN: Elaboración del Informe semestral de progreso (Formato BID). (Informe semestral de progreso(Formato BID))	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	2.0
32	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	2.0
33	EJECUCIÓN: Adquirir material didáctico para los servicios de desarrollo infantil - unidades CDI, CNH, CCRA. (Informe de recepción de material didáctico para los servicios de desarrollo infantil;- unidades CDI,CNH,CCRA)	9-Entregables Formales	31/08/2020	31/08/2020			No	2.0
34	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/08/2020	31/08/2020			No	2.0
35	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	2.0
36	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	2.0
37	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	2.0
38	EJECUCIÓN: Adquirir guías de actividades y metodología de trabajo a las intervenciones de CDI-BID (kit de material impreso para unidades de atención). (Informe de recepción de guías de actividades y metodologías de trabajo a las intervenciones de CDI-BID)	9-Entregables Formales	31/10/2020	31/10/2020			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/10/2020	31/10/2020			No	2.0
40	EJECUCIÓN: Contratar el diseño de modelo y contenidos de acompañamiento y mejora continua de calidad. (Informe de contratación/ licitación del proceso)	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	2.0
41	EJECUCIÓN: Contratar el diseño del nuevo modelo de cooperación y gestión entre MIES proveedores de servicios (cooperantes por convenio). (Informe de contratación/ licitación del proceso)	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	2.0
42	EJECUCIÓN: Contratar el diseño y desarrollo de un sistema web de monitoreo, gestión y rendición de cuentas. (Informe de contratación/ licitación del proceso)	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	2.0
43	EJECUCIÓN: Contratar equipamiento tecnológico para los servicio de desarrollo infantil CDI (incluyendo servicios conexos como instalación y mantenimiento). (Informe de contratación/ licitación del proceso)	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	2.0
44	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	2.0
45	EJECUCIÓN: Contratar una propuesta técnica de contenidos al CONA. (Documento de propuesta técnica de contenidos al CONA)	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.0
46	EJECUCIÓN: Elaboración de contenidos y metodologías de trabajo de CDI. (Documento de contenidos y metodologías de trabajo de CDI)	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.0
47	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.0
48	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.0
49	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.0
50	EJECUCIÓN: Realizar informe final de ejecución del proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.0

**HITOS**

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2020. (Documento compilado de los resultados obtenidos del proyecto a nivel nacional )							

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1 Porcentaje de implementación del sistema de evaluación, seguimiento y monitoreo de la gestión de los servicios de desarrollo infantil integral.		-	-	-	01/07/2020	-
2 Porcentaje de documentos generados como propuesta del nuevo marco normativo e institucional para la primera infancia		-	-	-	01/07/2020	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	45,979,773.32 **
Costo Total:	214,689,779.55
Total Devengado:	20,736,114.63
% Costo Total Devengado:	9.66 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 9.66 %

**Perfil Económico 2020**

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	22,412,639.84	26,201,981.84	0.00	<b>48,614,621.68</b>
Ppto. Externo Planeado	4,954,165.53	0.00	0.00	<b>4,954,165.53</b>
Ppto. Aprobado Inicial	27,376,805.37	0.00	0.00	<b>27,376,805.37</b>
Ppto. Codificado	27,366,805.37	0.00	0.00	<b>27,366,805.37</b>
Ppto. Comprometido	10,339,206.71	0.00	0.00	<b>10,339,206.71</b>
Planeado - Codificado (2020)		26,201,981.84		
Programado a Devengar	50,546,084.52	26,201,981.84	0.00	<b>76,748,066.36</b>
Ppto. Devengado	19,777,791.48	958,323.15	0.00	<b>20,736,114.63</b>
Pagado Real	10,330,926.56	0.00	0.00	<b>10,330,926.56</b>
Estimado a fin de año	* 19,777,791.48	0.00	0.00	<b>19,777,791.48</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	30,768,293.04	26,201,981.84	0.00	<b>56,970,274.88</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 39.13 %	3.66 %	0.00 %	<b>27.02 %</b>
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020**



**Presupuesto Mensual 2020**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	1,535,311.32	958,323.15	1,535,311.32	958,323.15	62.42 %		3.66 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,535,311.31		3,070,622.63				
Mar	1,576,489.03		4,647,111.66				
Abr	1,840,719.71		6,487,831.37				
May	1,575,119.71		8,062,951.08				
Jun	4,091,919.71		12,154,870.79				
Jul	1,836,573.71		13,991,444.50				
Ago	2,927,279.36		16,918,723.86				
Sep	1,591,919.71		18,510,643.57				
Oct	2,819,234.60		21,329,878.17				
Nov	1,948,888.98		23,278,767.15				
Dic	2,923,214.69		26,201,981.84				
<b>Total</b>	<b>26,201,981.84</b>	<b>958,323.15</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la promoción del desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 3 años de edad MEDIANTE la generación de procesos de fortalecimiento técnico, metodológico, de acompañamiento y evaluación de la gestión del servicio.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO Nro 11	Pliegos_NO_objeccion_BID_Consulta_NNA_27_sept_2019_hito	27/09/2019
2	ASOCIACIÓN HITO Nro 14	Informe_financiero_ene-oct_2019.pdf	07/01/2020
3	ASOCIACIÓN HITO Nro. 10	Especificaciones_Técnicas.pdf	30/09/2019
4	ASOCIACIÓN HITO Nro. 12	Informe_ejecucion_presupuestaria_agosto_2019.pdf	27/09/2019
5	ASOCIACIÓN HITO Nro. 13	Informe_de_ejecucion_presupuestaria_sept_2019.pdf	03/10/2019
6	ASOCIACIÓN HITO Nro. 15	TDRs_Capacitacion_a_Juntas.pdf	09/12/2019
7	ASOCIACIÓN HITO Nro. 16	Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.xlsx	27/12/2019
8	ASOCIACIÓN HITO Nro. 2	Matriz_PAPP_Inversion_2019_FORTALECIMIENTO_MT_26	07/08/2019
9	ASOCIACIÓN HITO Nro. 3	oficio_de_prioridad_senplades-2018-1410-of.pdf	07/08/2019
10	ASOCIACIÓN HITO Nro. 4	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
11	ASOCIACIÓN HITO Nro. 5	PLiegos_LPI001_CDI_CNH_26_jul_2019.docx	08/08/2019
12	ASOCIACIÓN HITO Nro. 6	hito_contratacion_personal_gerencia.rar	08/08/2019
13	ASOCIACIÓN HITO Nro. 7	contratacion_de_personal.rar	08/08/2019
14	ASOCIACIÓN HITO Nro. 8	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
15	ASOCIACIÓN HITO Nro. 9	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
16	Cédulas presupuestarias	Cedulas_presupuestarias_-_oct-nov-dic_2019.pdf	07/01/2020
17	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria-Ene- Dic 2019	Informe_financiero_ene-dic_2019.pdf	07/01/2020
18	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria-Ene- Nov 2019	Informe_financiero_ene-nov_2019.pdf	07/01/2020

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Báez Pérez, Blanca Marina	Lider del proyecto	Analsita de Servicios de Atención Domiciliar	blanca.baez@inclusion.gob.ec	
