

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Protección Especial
Dirección de Servicios de Protección Especial

PROYECTO: K013 MIES-Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional

Líder del Proyecto:	Quishpe Samaniego, María Dolores (maria.quishpe@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jurado Velastegui, Estefany Malena	Programas Relacionados:	
Titular:	Bueno Aguilar, Jacqueline Del Carmen	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	1.12
CUP:	102800000.0000.387151	TIR:	20.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	882,718.48
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,000,000.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	04/03/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	López Moreta, José Luis	Fecha del siguiente Hito:	25/02/2022

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", busca mejorar la una propuesta de intervención sobre la alta prevalencia de prácticas familiares, sociales, culturales e institucionales de vulneración sistemática de los derechos humanos a las personas en el ciclo de vida, con particular énfasis en la generación de condiciones reales para el ejercicio efectivo de los derechos a las niñas, niños y adolescentes, procurando la permanencia familiar y/o su reinserción en el menor tiempo posible, el disfrute de los servicios sociales básicos para el desarrollo humano, de forma progresiva, pero sostenida. Las niñas, niños y adolescentes que, por diversas situaciones contrarios a su propia voluntad, se encuentran en situaciones de riesgo o vulneración de sus derechos y que por ello pueden estar o están privados de su medio familiar, requieren de una especial protección por parte de las entidades del poder público.

Componentes. En el proyecto de inversión se desarrollan los siguientes componentes:

Componente 1. Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD #s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas modelos de atención establecido por el MIES

Componente 2. Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos

Componente 3. Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa de Acogimiento Institucional y sus procesos adyacentes

Componente 4. Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial

Beneficios Cualitativos

Atención a los niños, niñas y adolescentes mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes.

Fortalecimiento de los servicios de Protección Especial con calidad y calidez que cumplan el modelo de atención y las normas técnicas, ofreciendo los servicios de acogimiento institucional y modalidades alternativas.

Mejoramiento permanente en la calidad de los servicios, de las unidades de atención directa en la modalidad de acogimiento institucional.

Tipo de Beneficiario

Niños, niñas y adolescentes que estén en situación de riesgo o vulneración de sus derechos. Al 2025 se atenderá a 15.574 niñas, niños y adolescentes, vulnerados en sus derechos a través del acceso a servicios de protección especial de acuerdo a la norma técnica correspondiente a cada modalidad de atención

Restricciones

Tiempo: El proyecto tendrá una duración de cuatro años.

Costo total asignado para el proyecto es USD 96.418.857,76 (Noventa y seis millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y siete 76/100 dólares)

Alcance: El Proyecto se ejecutará a nivel nacional.


Recursos Humanos: Técnicos contratados para la ejecución del proyecto a nivel nacional.

Recursos Materiales: Materiales de oficina y Equipos Tecnológicos necesarios para la ejecución del proyecto"

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 4.45 %

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

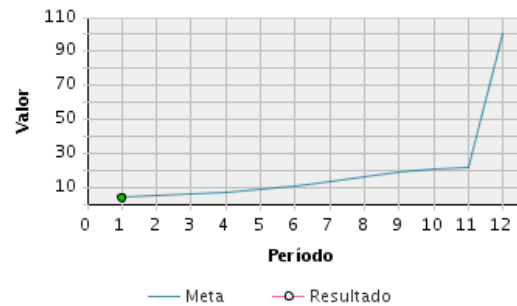

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	4 %	5 %	6 %	7 %	9 %	10 %	14 %	16 %	19 %	20 %	22 %	100 %
	Avance real acumulado											
	4 %											
2022	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2022	López Moreta, José Luis	02/03/2022 - 11:22 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. El incumplimiento en el lineamiento de la pre liquidación mensual como establece el convenio de cooperación técnico económico CAUSARIA un retraso en los desembolsos y a la óptima ejecución presupuestaria	02/03/2022	María Dolores Quishpe Samaniego	50 %	80	40	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Hito 1: INICIO: Dictamen de prioridad proyecto de inversión Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional	4-Inicio de Trabajo	03/01/2022		03/01/2022		Sí	2.0
2	Hito 2: EJECUCIÓN: Ficha de costos de los servicios de protección especial, fichas de costos validadas por la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	5-Entregables Intermedios	31/01/2022		31/01/2022		Sí	2.0
3	Hito 3: EJECUCIÓN: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2022.	5-Entregables Intermedios	25/02/2022	25/02/2022			No	1.0
4	Hito 4: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura a nivel nacional, del proyecto de inversión	5-Entregables Intermedios	31/03/2022	31/03/2022			No	1.0
5	Hito 5: INFORME: proceso de esclarecimiento legal a nivel nacional, sobre las acciones realizadas en beneficio de los nna que han sido vulnerados sus derechos.	5-Entregables Intermedios	29/04/2022	29/04/2022			No	1.0
6	Hito 6: Informe de ejecución presupuestaria del Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa	5-Entregables Intermedios	25/05/2022	25/05/2022			No	2.0
7	Hito 7: EJECUCIÓN: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022	30/06/2022			No	1.5
8	Hito 8: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la ficha técnica SIPEIP del proyecto de inversión.	5-Entregables Intermedios	20/07/2022	20/07/2022			No	1.5
9	Hito 9: EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	5-Entregables Intermedios	29/07/2022	27/07/2022			No	1.5
10	Hito 10: EJECUCION: Informe de la ejecución presupuestaria de los servicios básicos y alimentación de las unidades de atención directa.	5-Entregables Intermedios	17/08/2022	17/08/2022			No	1.5
11	Hito 11: EJECUCIÓN: Informe técnico - financiero realizado a las unidades de atención en Acogimiento Institucional	5-Entregables Intermedios	31/08/2022	31/08/2022			No	1.0
12	Hito 12: INFORME: esclarecimiento legal a nivel nacional	5-Entregables Intermedios	01/09/2022	01/09/2022			No	1.5
13	Hito 13: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del segundo desembolso a nivel nacional	5-Entregables Intermedios	30/09/2022	30/09/2022			No	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	Hito 14: EJECUCION: Informe de Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos del proyecto de inversión	5-Entregables Intermedios	28/10/2022	28/10/2022			No	1.5
15	Hito 15: EJECUCIÓN: Informe Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial	5-Entregables Intermedios	25/11/2022	25/11/2022			No	1.5
16	Hito 16: EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2022 de la Gerencia, presentado.	5-Entregables Intermedios	28/12/2022	28/12/2022			No	3.0
17	EJECUCIÓN PROYECTO 2023-2025	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	75.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de NNA que acceden en la modalidad de acogimiento institucional y modalidades alternativas por convenio.		-	-	-	01/01/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,000,000.00 **
Costo Total:	96,418,857.76
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	150,519.42		150,519.42				
Mar	150,519.42		301,038.84				
Abr	481,052.75		782,091.59				
May	8,551,114.97		9,333,206.56				
Jun	150,519.42		9,483,725.98				
Jul	591,533.75		10,075,259.73				
Ago	150,519.42		10,225,779.15				
Sep	8,881,648.30		19,107,427.45				
Oct	261,000.42		19,368,427.87				
Nov	481,052.75		19,849,480.62				
Dic	150,519.38		20,000,000.00				
Total	20,000,000.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la calidad y eficiencia de los Servicios de Protección Especial MEDIANTE la actualización de normas técnicas y modelos de atención, capacitación, asistencia técnica, esclarecimiento legal y seguimiento a la implementación de la política pública de protección especial

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Quishpe Samaniego, María Dolores	Líder	Gerente Proyecto Emblemático de Protección Especial	maria.quishpe@inclusio n.gob.ec	3983100 ext.6055
