

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional
Dirección de Población Adulta Mayor

PROYECTO: K004 MIES-Sostenibilidad de los servicios gerontológicos y ampliación de la cobertura con un enfoque en el envejecimiento activo, digno y saludable "Envejeciendo juntos"

Líder del Proyecto:	Toapanta Cuascota, Martha Susana (martha.toapanta@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Muñoz Astudillo, María de Lourdes	Programas Relacionados:	
Titular:	Toapanta Cuascota, Martha Susana	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387169	TIR:	25.61 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1.13
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	35,000,000.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	04/03/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	López Moreta, José Luis	Fecha del siguiente Hito:	10/03/2022

DATOS GENERALES

Descripción

Fortalecer los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores a través de la implementación de centros y unidades de atención que cuenten con personal técnico capacitado para la prestación de servicios con calidad y calidez.
 Diseñar estrategias de protección y promoción para fomentar la participación de las personas adultas mayores en espacios de intervención que permitan su sostenimiento afectivo.
 Implementar metodologías de Seguimiento y Monitoreo de los Servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores, para conocer los resultados de la intervención en territorio y fortalecer los servicios.

Beneficios Cualitativos

- 73.903 personas adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad recibirán servicios de atención y cuidado a través de cuatro modalidades de atención: Centros Gerontológicos Residenciales, Centros de Atención Diurna, Espacios de Socialización y de Encuentro y Atención Domiciliaria, a través de estos servicios se logra una atención preventiva para la población lo que disminuye considerablemente la probabilidad de que la persona adulta mayor incurra en gastos como los de salud, alimentación, cuidado, etc., evitando egresos y gastos económicos que afecten sus condiciones limitadas y vulnerables e impidiendo un mayor riesgo de su condición.
- 73.903 personas adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad participarán de un proyecto integral que los apoye en su cuidado, buscando la participación y corresponsabilidad familiar y comunitaria, que también impacta en la reducción de gastos en asuntos relacionados y que promueve la solidaridad y los lazos de integración e inclusión social
- El proyecto contará con un contingente profesional capacitado en servicios específicos, lo cual ocasionará que el adulto mayor cuente con una mejor condición de vida.
- Se establecerán lazos de integración entre adultos mayores que favorece su asociatividad, interrelación y mejoramiento de su calidad de vida.

Tipo de Beneficiario

- .Personas adultas mayores en condiciones de pobreza extrema en las localidades de intervención del proyecto.
- .Talento humano contratado para implementación local del proyecto y modalidades de atención.
- .Las familias de las personas adultas mayores serán partícipes y beneficiarios del proyecto.


Restricciones

- Alcance: El diseño de un módulo de seguimiento para la ejecución del proyecto
- Costo: No se contempla presupuesto
- Tiempo: Año 2022
- Recursos: Equipo técnico limitado

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 4.45 %

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

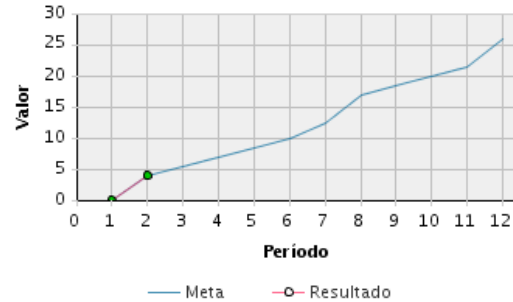

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	0 %	4 %	6 %	7 %	8 %	10 %	12 %	17 %	18 %	20 %	22 %	26 %
	Avance real acumulado											
	0 %	4 %										
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2022: La data oficial registra una cobertura de 115.277 PAM; sin embargo con Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0056-M de 17.02.2022 la Sra. Directora de Población Adulta Mayor solicita el registro de información en la herramienta GPR conforme el escenario presentado en el informe de coberturas correspondiente al mes de enero de 2022, en este sentido y una vez verificada la información se determina una cobertura de 62.918 PAM en todas las modalidades de atención del tipo de gasto inversión y se registra un devengado de \$0,00	López Moreta, José Luis	17/02/2022 - 02:34 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de capacitación al equipo técnico CAUSARÍA el retraso en los procesos de seguimiento y monitoreo del impacto de las intervenciones realizadas en territorio	09/02/2022	Martha Susana Toapanta Cuascota	30 %	10	3	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Bolívar
2	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Archidona
3	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Alausi
4	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
5	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
6	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
7	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
8	Zona 8 - DMG > Guayas > Durán

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
9	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	(Definición) Dictamen de prioridad del proyecto	9-Entregables Formales	10/02/2022		01/02/2022		Sí	1.5
2	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	17/02/2022		10/02/2022		Sí	0.75
3	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	17/02/2022		10/02/2022		Sí	0.75
4	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	5-Entregables Intermedios	17/02/2022		15/02/2022		Sí	1.0
5	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/03/2022	10/03/2022			No	0.75
6	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/03/2022	10/03/2022			No	0.75
7	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/04/2022	11/04/2022			No	0.75
8	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/04/2022	11/04/2022			No	0.75
9	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/05/2022	10/05/2022			No	0.75
10	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/05/2022	10/05/2022			No	0.75
11	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/06/2022	10/06/2022			No	0.75
12	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/06/2022	10/06/2022			No	0.75
13	(Ejecución) Informe ejecución primer desembolso	5-Entregables Intermedios	11/07/2022	11/07/2022			No	1.0
14	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/07/2022	11/07/2022			No	0.75
15	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/07/2022	11/07/2022			No	0.75
16	(Ejecución) Informe de transferencia monetaria para la construcción del Centro Gerontológico Colta	5-Entregables Intermedios	10/08/2022	10/08/2022			No	3.0
17	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/08/2022	10/08/2022			No	0.75
18	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/08/2022	10/08/2022			No	0.75
19	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	12/09/2022	12/09/2022			No	0.75
20	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	12/09/2022	12/09/2022			No	0.75
21	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/10/2022	10/10/2022			No	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/10/2022	10/10/2022			No	0.75
23	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/11/2022	10/11/2022			No	0.75
24	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/11/2022	10/11/2022			No	0.75
25	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	12/12/2022	12/12/2022			No	0.75
26	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	12/12/2022	12/12/2022			No	0.75
27	(Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	2.0
28	(Ejecución) Informe ejecución segundo desembolso	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
29	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/01/2023	10/01/2023			No	0.75
30	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/01/2023	10/01/2023			No	0.75
31	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023	31/01/2023			No	1.0
32	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/02/2023	10/02/2023			No	0.75
33	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/02/2023	10/02/2023			No	0.75
34	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/03/2023	10/03/2023			No	0.75
35	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/03/2023	10/03/2023			No	0.75
36	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/04/2023	10/04/2023			No	0.75
37	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/04/2023	10/04/2023			No	0.75
38	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/05/2023	10/05/2023			No	0.75
39	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/05/2023	10/05/2023			No	0.75
40	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	12/06/2023	12/06/2023			No	0.75
41	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	12/06/2023	12/06/2023			No	0.75
42	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/07/2023	10/07/2023			No	0.75
43	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/07/2023	10/07/2023			No	0.75
44	(Ejecución) Informe ejecución primer desembolso	5-Entregables Intermedios	17/07/2023	17/07/2023			No	1.0
45	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/08/2023	10/08/2023			No	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
46	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/08/2023	10/08/2023			No	0.75
47	(Ejecución) Informe de ejecución construcción del Centro Gerontológico Colta	5-Entregables Intermedios	16/08/2023	16/08/2023			No	3.0
48	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/09/2023	11/09/2023			No	0.75
49	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/09/2023	11/09/2023			No	0.75
50	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/10/2023	10/10/2023			No	0.75
51	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/10/2023	10/10/2023			No	0.75
52	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/11/2023	10/11/2023			No	0.75
53	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/11/2023	10/11/2023			No	0.75
54	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/12/2023	11/12/2023			No	0.75
55	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/12/2023	11/12/2023			No	0.75
56	(Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	2.0
57	(Ejecución) Informe ejecución segundo desembolso	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
58	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/01/2024	10/01/2024			No	0.75
59	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/01/2024	10/01/2024			No	0.75
60	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024	31/01/2024			No	1.0
61	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	12/02/2024	12/02/2024			No	0.75
62	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	12/02/2024	12/02/2024			No	0.75
63	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/03/2024	11/03/2024			No	0.75
64	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/03/2024	11/03/2024			No	0.75
65	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/04/2024	10/04/2024			No	0.75
66	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/04/2024	10/04/2024			No	0.75
67	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/05/2024	10/05/2024			No	0.75
68	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/05/2024	10/05/2024			No	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
69	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/06/2024	10/06/2024			No	0.75
70	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/06/2024	10/06/2024			No	0.75
71	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/07/2024	10/07/2024			No	0.75
72	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/07/2024	10/07/2024			No	0.75
73	(Ejecución) Informe ejecución primer desembolso	5-Entregables Intermedios	31/07/2024	31/07/2024			No	1.0
74	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	12/08/2024	12/08/2024			No	0.75
75	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	12/08/2024	12/08/2024			No	0.75
76	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/09/2024	10/09/2024			No	0.75
77	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/09/2024	10/09/2024			No	0.75
78	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/10/2024	10/10/2024			No	0.75
79	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/10/2024	10/10/2024			No	0.75
80	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/11/2024	11/11/2024			No	0.75
81	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/11/2024	11/11/2024			No	0.75
82	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/12/2024	10/12/2024			No	0.75
83	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/12/2024	10/12/2024			No	0.75
84	(Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0
85	(Ejecución) Informe ejecución segundo desembolso	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
86	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/01/2025	10/01/2025			No	0.75
87	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/01/2025	10/01/2025			No	0.75
88	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	5-Entregables Intermedios	31/01/2025	31/01/2025			No	1.0
89	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/02/2025	10/02/2025			No	0.75
90	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/02/2025	10/02/2025			No	0.75
91	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/03/2025	10/03/2025			No	0.75
92	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/03/2025	10/03/2025			No	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
93	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/04/2025	10/04/2025			No	0.75
94	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/04/2025	10/04/2025			No	0.75
95	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/05/2025	10/05/2025			No	0.75
96	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/05/2025	10/05/2025			No	0.75
97	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/06/2025	10/06/2025			No	0.75
98	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/06/2025	10/06/2025			No	0.75
99	(Ejecución) Informe ejecución primer desembolso	5-Entregables Intermedios	10/07/2025	10/07/2025			No	1.0
100	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/07/2025	10/07/2025			No	0.75
101	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/07/2025	10/07/2025			No	0.75
102	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/08/2025	11/08/2025			No	0.75
103	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/08/2025	11/08/2025			No	0.75
104	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/09/2025	10/09/2025			No	0.75
105	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/09/2025	10/09/2025			No	0.75
106	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/10/2025	10/10/2025			No	0.75
107	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/10/2025	10/10/2025			No	0.75
108	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/11/2025	10/11/2025			No	0.75
109	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/11/2025	10/11/2025			No	0.75
110	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/12/2025	10/12/2025			No	0.75
111	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/12/2025	10/12/2025			No	0.75
112	(Ejecución) Informe ejecución segundo desembolso	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
113	(Ejecución) Informe final de ejecución de proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2025	31/12/2025			No	4.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de personas que se matriculan en los procesos de capacitación, formación continua y certificación por competencias		-	-	-	01/01/2022	-
2	Número de actividades realizadas de sensibilización y promoción de la participación social de las personas adultas mayores		-	-	-	01/01/2022	-
3	Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de centros gerontológicos residenciales - INVERSIÓN		91.37 %	753	688	01/01/2022	Enero
4	Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de centros gerontológicos de atención diurna -INVERSIÓN		130.76 %	3,150	4,119	01/01/2022	Enero
5	Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de espacios de socialización y de encuentro con y sin alimentación - INVERSIÓN		100.25 %	24,408	24,468	01/01/2022	Enero
6	Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de atención domiciliaria con y sin discapacidad - INVERSIÓN		84.49 %	39,819	33,643	01/01/2022	Enero


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	35,000,000.00 **
Costo Total:	157,079,713.69
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	157,079,713.69	0.00	157,079,713.69
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
Ppto. Codificado	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		122,079,713.69		
Programado a Devengar	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	859,874.99	0.00	859,874.99	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	860,643.50		1,720,518.49				
Mar	875,751.74		2,596,270.23				
Abr	12,874,902.02		15,471,172.25				
May	860,643.50		16,331,815.75				
Jun	1,767,925.60		18,099,741.35				
Jul	12,447,977.42		30,547,718.77				
Ago	927,876.78		31,475,595.55				
Sep	860,643.50		32,336,239.05				
Oct	860,643.50		33,196,882.55				
Nov	613,355.84		33,810,238.39				
Dic	1,189,761.61		35,000,000.00				
Total	35,000,000.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
10	Incrementar el acceso y la calidad de la atención de la población adulta mayor MEDIANTE la generación de políticas públicas, normativas técnicas, modelos de atención y gestión de las modalidades del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO A1: (Definición) Dictamen de prioridad del proyecto	MIES-MIES-2021-2456-EXT_(Dictamen_de_prioridad).pdf	01/02/2022
2	HITO A2: (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	INFORME_EJECUCIÓN_MENSUAL_ENERO_2022_ENVEJECIMIENTO_JUNTOS-signed-signed.pdf	17/02/2022
3	HITO A3: (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	formato_informe_coberturas_enero_2022_sgi-signed.pdf	17/02/2022
4	HITO A4: (Planeación) PAPP del proyecto aprobado	MIES-CGPGE-DPI-2022-0095-M_(Entrega_PAPP).pdf	17/02/2022
5	RIESGO A1 2022	Copia_de_Anexo_Ficha_de_Riesgos_Proyecto_FCE8_2022-convertido-signed-signed.pdf	01/02/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Toapanta Cuascota, Martha Susana	Líder	Directora de Población Adulta Mayor	martha.toapanta@inclus ion.gob.ec	
