

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Protección Especial
Dirección de Servicios de Protección Especial

PROYECTO: K013 MIES-Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional

Líder del Proyecto:	Defaz Caizaluiza, Diego Fernando (diego.defaz@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Flores Brandt, David Eduardo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	1.12
CUP:	102800000.0000.387151	TIR:	20.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	882,718.48
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	39,465,810.75
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	30/12/2024	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Cuesta Herrera, Byron Daniel	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", busca mejorar la intervención sobre la alta prevalencia de prácticas familiares, sociales, culturales e institucionales de vulneración sistemática de los derechos humanos a las personas en el ciclo de vida, con particular énfasis en la generación de condiciones reales para el ejercicio efectivo de los derechos a las niñas, niños y adolescentes, procurando la permanencia familiar y/o su reinserción en el menor tiempo posible, el disfrute de los servicios sociales básicos para el desarrollo humano, de forma progresiva, pero sostenida. Las niñas, niños y adolescentes que, por diversas situaciones contrarias a su propia voluntad, se encuentran en situaciones de riesgo o vulneración de sus derechos y que por ello pueden estar o están privados de su medio familiar, requieren de una especial protección por parte de las entidades del poder público.

Componentes. En el proyecto de inversión se desarrollan los siguientes componentes:

Componente 1. Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD #s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas modelos de atención establecido por el MIES

Componente 2. Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos

Componente 3. Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa de Acogimiento Institucional y sus procesos adyacentes

Componente 4. Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial

Beneficios Cualitativos

Atención a los niños, niñas y adolescentes mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes.

Fortalecimiento de los servicios de Protección Especial con calidad y calidez que cumplan el modelo de atención y las normas técnicas, ofreciendo los servicios de acogimiento institucional y modalidades alternativas.

Mejoramiento permanente en la calidad de los servicios, de las unidades de atención directa en la modalidad de acogimiento institucional.

Tipo de Beneficiario

Niños, niñas y adolescentes que estén en situación de riesgo o vulneración de sus derechos. Al 2025 se atenderá a 15.574 niñas, niños y adolescentes, vulnerados en sus derechos a través del acceso a servicios de protección especial de acuerdo a la norma técnica correspondiente a cada modalidad de atención

Restricciones

Tiempo: El proyecto tendrá una duración de cuatro años.

Costo total asignado para el proyecto es USD 96.418.857,76 (Noventa y seis millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y siete 76/100 dólares)

Alcance: El Proyecto se ejecutará a nivel nacional.


Recursos Humanos: Técnicos contratados para la ejecución del proyecto a nivel nacional.

Recursos Materiales: Materiales de oficina y Equipos Tecnológicos necesarios para la ejecución del proyecto"

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 75.56 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

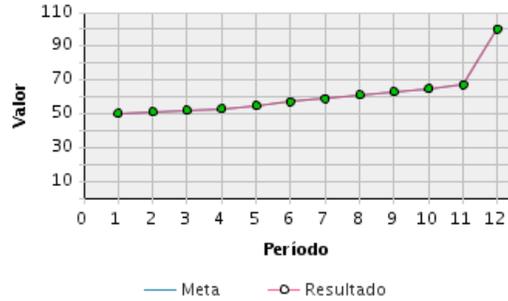

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2024	Avance programado acumulado											
	50 %	51 %	52 %	53 %	55 %	57 %	59 %	61 %	63 %	65 %	67 %	100 %
	Avance real acumulado											
	50 %	51 %	52 %	53 %	55 %	57 %	59 %	61 %	63 %	65 %	67 %	100 %
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Noviembre 2024</p> <p>Al 30 de noviembre el Proyecto de Fortalecimiento de los servicios de prevención y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional presentó una ejecución del 51.3%, de un codificado de USD 15.663.685,87 el MIES ha devengado 8.039.231,87.</p> <p>A la misma fecha, con presupuesto de inversión se encuentran activos 147 convenios de cooperación técnico - económico; en las modalidades de Acogimiento Institucional, Apoyo Familiar y Custodia Familiar y Acogimiento Familiar, con una cobertura de atención de 2.994 niñas, niños y adolescentes atendidos y restituidos sus derechos con presupuesto de inversión.</p>	Cuesta Herrera, Byron Daniel	10/12/2024 - 11:49 AM
<p>Octubre 2024</p> <p>Al 30 de octubre de 2024 el presupuesto codificado del Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional, es de USD. 15.663.685,87 y el MIES ha devengado USD. 5.423.298,54; alcanzando una ejecución del 34.62%.</p> <p>Con presupuesto de gasto de inversión se han generado 79 convenios de cooperación técnico - económico; de acuerdo al siguiente detalle: 2 convenios corresponden a la modalidad de Acogimiento Familiar, 36 a la modalidad de Acogimiento Institucional y 41 Apoyo Familiar y Custodia Familiar. Adicionalmente, al mes de octubre se registran 19 convenios en estado finalizado.</p> <p>El Proyecto de Protección Especial, atiende a una cobertura de 2.511 niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o en riesgo, en las modalidades de atención; 15 en Acogimiento Familiar, 1.061 en Acogimiento Institucional y 1.435 en Apoyo Familiar y Custodia Familiar.</p>	Cuesta Herrera, Byron Daniel	11/11/2024 - 04:34 AM
<p>SEPTIEMBRE 2024</p> <p>Al 30 de septiembre el proyecto: "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional", ha suscrito 79 convenios de cooperación técnico - económico en las modalidades de atención de Acogimiento Institucional, Apoyo Familiar y Custodia Familiar, Acogimiento Familiar - Familias Acogientes; con una cobertura de 2.701</p>	Cuesta Herrera, Byron Daniel	08/10/2024 - 02:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>niñas, niños y adolescentes; en 93 unidades de atención, con su presupuesto asignado para la ejecución del servicio por USD. 6.130.279,09.</p> <p>Por otra parte, se ha realizado un análisis y revisión de los convenios de cooperación técnico-económica correspondientes a los años 2022 y 2023, del proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", programa 55 de Protección Especial; se determina que al 30 de septiembre de 2024 se encuentran por liquidar 197 convenios de cooperación técnico - económico; 53 del año 2022 y 144 convenios por liquidar del año 2023.</p>		
<p>AGOSTO .</p> <p>Durante agosto, el proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial, en el ciclo de vida, a nivel nacional" ha continuado brindando atención de calidad a grupos prioritarios en situación de vulneración de derechos. Los servicios incluyen Acogimiento Familiar, Apoyo Familiar, y Acogimiento Institucional para niños y adolescentes. La Gerencia ha trabajado en mantener la continuidad de estos servicios, cumpliendo con los derechos de los beneficiarios y priorizando la coordinación con las direcciones distritales brindando el seguimiento y soporte financiero, en la ejecución, compromiso y devengo de ejecución presupuestaria. En ese sentido, se recalca que la Gerencia ha implementado acciones para mejorar la ejecución presupuestaria y asegurar la sostenibilidad de la protección especial, financiada con gasto de inversión.</p>	<p>Cuesta Herrera, Byron Daniel</p>	<p>08/10/2024 - 02:21 PM</p>
<p>JULIO 2024</p> <p>En el marco de sus competencias, la Gerencia del Proyecto ha realizado las acciones necesarias para la continuidad de la prestación de los servicios financiados con gasto de inversión, además se brindo el seguimiento oportuno a las diferentes direcciones zonales y distritales, mediante reuniones periódicas, además se ejecutó la suscripción de convenios financiados con gasto de inversión en las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar.</p>	<p>Flores Brandt, David Eduardo</p>	<p>05/08/2024 - 12:21 PM</p>
<p>En el marco de sus competencias, la Gerencia del Proyecto ha realizado las acciones necesarias para la continuidad de la prestación de los servicios financiados con gasto de inversión. Además se debe insistir a los Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales en el cumplimiento y liquidación de convenios de cooperación técnicos económicos de manera mensual, con el propósito de no tener novedades, debido a la no ejecución de saldos.</p>	<p>Cuesta Herrera, Byron Daniel</p>	<p>05/08/2024 - 11:39 AM</p>
<p>MAYO 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seguimiento para la suscripción de convenios de cooperación técnica con GADs, OSC, Entidades Religiosas y Entidades Públicas, así como también revisión de cobertura y ejecución presupuestaria a nivel nacional. 2) En el marco de sus competencias, la Gerencia del Proyecto ha realizado las acciones necesarias para la continuidad de la prestación de los servicios. 3) Gestión y Fortalecimiento de las unidades de atención de las modalidades de los servicios de Protección Especial. 4) Articulación de las reformas presupuestarias pertinentes las mismas en el sistema financiero e-SIGEF por lo que se ha dispuesto a las entidades operativas procedan con la elaboración de los documentos necesarios para solicitar el aval correspondiente previo al trámite pertinente para iniciar con el proceso de suscripción de convenios correspondientes al año fiscal 2024 5) Control y seguimiento del personal contratado para la ejecución del proyecto, al 31 de mayo del 2024, se registran según reporte de Gestión de Talento Humano, 91 servidores públicos. 	<p>Arrieta Garcés, Camila Judith</p>	<p>12/06/2024 - 08:28 AM</p>
<p>ABRIL 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seguimiento para cierres de convenios pendientes de liquidación de los años 2022 y 2023. 2) Seguimiento para la suscripción de convenios de cooperación técnica con GADs, OSC, Entidades Religiosas y Entidades Públicas, así como también revisión de cobertura y ejecución presupuestaria a nivel nacional. 3) En el marco de sus competencias, la Gerencia del Proyecto ha realizado las acciones necesarias para la continuidad de la prestación de los servicios. 	<p>Arrieta Garcés, Camila Judith</p>	<p>10/05/2024 - 08:48 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4) Gestión y Fortalecimiento de las unidades de atención de las modalidades de los servicios de Protección Especial.</p> <p>5) Reformas presupuestarias al PAPP, considerando los techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas en los grupos de gastos 78 y 73.</p> <p>6) Control y seguimiento del personal contratado para la ejecución del proyecto, al 30 de abril del 2024, se registran según reporte de Gestión de Talento Humano, 89 servidores públicos.</p>		
<p>MARZO 2024</p> <p>1) Gestión, para cierre de convenios que están pendientes de liquidación 2022,2023.</p> <p>2) En el marco de sus competencias, la Gerencia del Proyecto ha realizado las acciones necesarias para la continuidad de la prestación de los servicios financiados con gasto de inversión.</p> <p>3) Generación de nuevos formatos de convenios para Entidades Públicas, con formas de pago (Prestación de servicios y Desembolsos)</p> <p>4) Repostulación del presupuesto del proyecto dentro del Plan Anual de Inversiones 2024 por un monto de USD 11.608.845,96</p> <p>5) Se han Generado 140 convenios, financiados con gasto corriente</p>	<p>Gonzaga Salazar, Carla Sofia</p>	<p>10/04/2024 - 11:25 AM</p>
<p>FEBRERO 2024</p> <p>1) Gestión, para cierre de convenios que están pendientes de liquidación desde el año 2014.</p> <p>2) Reformar el presupuesto y actividad del proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional" de acuerdo a las directrices emitidas por la Dirección de Planificación e Inversión.</p> <p>3) Seguimiento de Convenios finalizados del 2023</p> <p>4) Repostulación del presupuesto del proyecto dentro del Plan Anual de Inversiones 2024 por un monto de USD 11.611.333,16</p> <p>Observación: Se continua con la prestación de servicios bajo convenios de cooperación técnico económico, se reporta asistencia, las unidades de atención continúan prestando los servicios por ende no se han cerrado, ni paralizado los servicios, a pesar de la falta de asignación de recursos financieros, por parte del Ministerio de Económica y Finanzas.</p>	<p>Gonzaga Salazar, Carla Sofia</p>	<p>14/03/2024 - 05:58 PM</p>
<p>ENERO 2024</p> <p>1) Desarrollo, Revisión y Aprobación de la Ficha de costo 2024</p> <p>2) Desarrollo y Actualización del Plan Anual de Política Pública 2024</p> <p>3) Desarrollo de Formatos Firmas para convenios 2024</p> <p>4) Revisión y gestión de la contratación de personal del proyecto 2024</p> <p>5) Gestión y articulación con la Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Talento Humano y Dirección Financiera el trámite correspondiente para la renovación de los contratos de servicios ocasionales de los funcionarios constantes en la nómina al 31 de diciembre de 2023:</p> <p>Observación: Hasta el cierre de este informe no se dispone de correlativo ni organismo en la estructura programática del proyecto según el sistema de administración financiera e-Sigef, del Ministerio de Económica y Finanzas, entidad encargada de la asignación de los recursos, para los respectivos desembolsos a los cooperantes, (no existe financiamiento), cabe señalar que el servicio de atención a los usuarios no se paraliza, para no vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.</p>		
<p>DICIEMBRE 2023</p> <p>1) Atención a 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar.</p> <p>2) Atención a 1840 NNA en apoyo y custodia familiar</p> <p>3) Atención a 1431 NNA en acogimiento institucional</p> <p>4) Atención a 15 NNA en acogimiento institucional trata de personas</p> <p>5) Ejecución presupuestaria de 14.825.071,36 que corresponde al 86,22%</p> <p>6) 362 Convenios</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>08/01/2024 - 10:23 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2023</p> <p>1) Atención a 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar. 2) Atención a 1840 NNA en apoyo y custodia familiar 3) Atención a 1476 NNA en acogimiento institucional 4) Gestión de 5 Adendas de convenios que terminaron en Octubre 5) Ejecución presupuestaria de 13.620.840,72 que corresponde al 78,01% 6) 105 Convenios en estado Generado formato</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>07/12/2023 - 01:18 PM</p>
<p>OCTUBRE 2023</p> <p>1) Atención a 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar. 2) Atención a 1930 NNA en apoyo y custodia familiar 3) Atención a 1476 NNA en acogimiento institucional 4) Gestión de 31 Adendas de convenios que terminaron en Octubre 5) Ejecución presupuestaria de 12.649740,09 que corresponde al 70,98% 6) 51 Convenios en estado Generado formato</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>06/11/2023 - 02:57 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2023</p> <p>1) Atención a 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar. 2) Atención a 1750 NNA en apoyo y custodia familiar 3) Atención a 1323 NNA en acogimiento institucional 4) Gestión de 72 Adendas de convenios que terminaron en Septiembre 5) Ejecución presupuestaria de 11.589.691,03 que corresponde al 64,65% 6) 97 Convenios en estado Generado formato</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>04/10/2023 - 09:48 AM</p>
<p>Ajuste al Resumen Ejecutivo que antecede, debido al incumplimiento de metas que originalmente estaba programado</p> <p>1) Atención a 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar. 2) Atención a 1690 NNA en apoyo y custodia familiar 3) Atención a 1476 NNA en acogimiento institucional 4) Adendas de convenios que terminaron en Agosto 5) Seguimiento de ejecución presupuestaria 6) Seguimiento de ejecución de convenios con cooperantes</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>27/09/2023 - 12:10 PM</p>
<p>AGOSTO 2023, Se realizó lo siguiente:</p> <p>1) Atención a 75 NNA en la modalidad de acogimiento familiar. 2) Atención a 1780 NNA en apoyo y custodia familiar 3) Atención a 1691 NNA en acogimiento institucional 4) Atención a 160 NNA en el servicio de atención y protección emergente. 5) Adendas de convenios que terminaron en Agosto 6) Seguimiento de ejecución presupuestaria 9) Seguimiento de ejecución de convenios con cooperantes</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>27/09/2023 - 09:40 AM</p>
<p>JULIO 2023</p> <p>PARA EL PERIODO 2023, a 75 NNA en la modalidad de acogimiento familiar, a 1780 NNA en apoyo y custodia familiar, a 1691 NNA en acogimiento institucional y a 160 NNA en el servicio de atención y protección emergente.</p> <p>Al 04 DE AGOSTO 2023 se tiene una cobertura del mes de Julio 2023, en Generado Formato Firma 3.316 niñas, niños, y adolescentes que accedieron a los servicios de protección especial en el proyecto de inversión.</p> <p>Con una ejecución por grupo de gasto 71= 50,62%73=00,39%78=51,62%84=3,47% 99=32,62% TOTAL EJECUCIÓN INVERSIÓN=49,56% con corte al 04 de agosto 2023.</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>15/08/2023 - 07:43 AM</p>
<p>JUNIO 2023</p> <p>1.PARA EL PERIODO 2023, a 75 NNA en la modalidad de acogimiento familiar, a 1780 NNA en apoyo y custodia familiar, a 1691 NNA en acogimiento institucional y a 160 NNA en el servicio de atención y protección emergente. Al 30 de junio se tiene una cobertura de 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar, 1840 NNA en la modalidad de apoyo y custodia familiar y 1536 NNA en la modalidad de acogimiento institucional, estas metas no son acumulativas. El exceso de cobertura en la modalidad de apoyo y custodia familiar radica en que, a la fecha del reporte, consta en el sistema SIIMIES un convenio con cobertura de 30 NNA en estado rescindido y un convenio con cobertura de 30 NNA en estado finalizado.</p> <p>2. Se continúa la suscripción y ejecución de convenios en las modalidades de Acogimiento Familiar, Apoyo Familiar y Custodia Familiar y también en Acogimiento Institucional con una cobertura, al 30 de junio de 2023, de 3.436 NNA.</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>07/07/2023 - 04:25 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Al 30 de junio de 2023 se encuentran generado formato en el sistema SIIMIES: 49 convenios en la modalidad de acogimiento institucional, 4 en acogimiento familiar y 46 en apoyo y custodia familiar.</p> <p>4. Se continúa la suscripción y ejecución de convenios en las modalidades de Acogimiento Familiar, Apoyo Familiar y Custodia Familiar y también en Acogimiento Institucional con una cobertura, al 30 de junio de 2023, de 3.436 NNA.</p> <p>5. Al 30 de junio de 2023 se ha codificado en el e-sigef el siguiente detalle presupuestario por grupo de gasto: 71 (\$1.711.888,12), 73 (\$540.347,75), 78 (\$15.481.785,74), 84 (\$97.700,00), 99 (56.195,52), totalizando \$17.887.917,13. A la fecha mencionada se tiene una ejecución presupuestaria del 44,49% (\$7.958.515,85) en los grupos de gasto 71, 73, 78, 84 y 99.</p> <p>6. Debido a las restricciones presupuestarias impuestas desde el MEF no se ha codificado presupuesto para el año 2023 en el componente 4 del proyecto Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial. El 21 de junio de 2023 el Ministerio de Economía y Finanzas efectúa una reducción de \$1.477.827,56 al presupuesto codificado del proyecto, fijándose el mismo en \$17.887.917,13 para el año 2023, cabe destacar que incluso con esta disminución de recursos se ha garantizado la provisión de los servicios financiados con gasto de inversión precautelando el interés superior del niño.</p>		
<p>MAYO 2023</p> <p>1. CONVENIOS de cooperación técnico económico planificados 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 50. ACOGIMIENTO FAMILIAR 5. APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 54. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 4, un total de 113 planificados para la firma de convenios de cooperación técnico económico, y una cobertura de 3.706 nna de cobertura</p> <p>2. CONVENIOS GENERADOS CON CORTE AL 05-06-2023: EMITIDOS 2(dos) con 75 nna de cobertura, GENERACION FORMATO FIRMA 101(ciento uno) con 3.241 nna de cobertura, RESCINDIDO 2(dos) con 90 nna de cobertura, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 0 (cero)</p> <p>Con un total general de 105 convenios, y 3.406 nna de cobertura,</p> <p>3. PRESUPUESTO CODIFICADO: MAYO 2023. USD 19.365.744,69 y devengado de USD 6728597,91 con una ejecución del 34,74 % total del proyecto de inversión.</p> <p>4. Por Grupos Grupo de gasto 71 36,78% de ejecución Grupo de gasto 73 0,05% de ejecución Grupo de gasto 78 35,79% de ejecución Grupo de gasto 84 1,48% de ejecución Grupo de gasto 99 86,45% de ejecución</p> <p>Se gestiona financiamiento para la firma de convenios de cooperación técnico económico para el segundo semestre del año</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>05/06/2023 - 02:06 PM</p>
<p>ABRIL 2023:</p> <p>1. CONVENIOS de cooperación técnico económico planificados 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 50. ACOGIMIENTO FAMILIAR 5. APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 54. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 4, un total de 113 planificados para la firma de convenios de cooperación técnico económico.</p> <p>2. COBERTURA planificada 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.780 niñas, niños y adolescentes, ACOGIMIENTO FAMILIAR 75 nna. APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 1.691nna. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 160 nna, un total de 3.706 planificados para la firma de convenios de cooperación técnico económico.</p> <p>3. Abril 2023 se han ingresado, al sistema SIIMIES, 50 convenios en la modalidad de acogimiento institucional, 4 en acogimiento familiar y 50 en apoyo y custodia familiar, un total 104 convenios de cooperación técnico económico SPE.</p> <p>4. COBERTURA GENERADA ABRIL 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.536 niñas, niños y adolescentes , ACOGIMIENTO FAMILIAR 60 nna , APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 1.780 nna , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 0 , un total de 3.376 nna,</p> <p>5. PRESUPUESTO CODIFICADO: ABRIL 2023. USD 19.365.744,69 y devengado de USD 5.533.449,66 con una ejecución del 28,57% total del proyecto de inversión.</p> <p>.Grupo de gasto 71 29,64% de ejecución .Grupo de gasto 73 0,02% de ejecución .Grupo de gasto 78 29,46% de ejecución .Grupo de gasto 84 0,59% de ejecución</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>05/05/2023 - 10:59 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Grupo de gasto 99 0,00% de ejecución</p> <p>MARZO 2023: 1.CONVENIOS de cooperación técnico económico planificados 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 50, ACOGIMIENTO FAMILIAR 5, APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 54, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 4, un total de 113 planificados para la firma de convenios de cooperación técnico económico. 2.COBERTURA planificada 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.780 niñas, niños y adolescentes , ACOGIMIENTO FAMILIAR 75 nna , APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 1.691nna , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 160 nna , un total de 3.706 planificados para la firma de convenios de cooperación técnico económico. 3. Marzo 2023 se han ingresado, al sistema SIIMIES, 50 convenios en la modalidad de acogimiento institucional, 4 en acogimiento familiar y 50 en apoyo y custodia familiar, un total 104 convenios de cooperación técnico económico SPE. 4.COBERTURA GENERADA MARZO 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.536 niñas, niños y adolescentes , ACOGIMIENTO FAMILIAR 60 nna , APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 1.780 nna , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 0 , un total de 3.376 nna, se debe mencionar que los servicios del proyecto de inversión no se paralizan. 5. PRESUPUESTO CODIFICADO: Marzo 2023. USD 19.365.744,69 y devengado de USD 1.656.211,11 con una ejecución del 11,22% total del proyecto de inversión. .Grupo de gasto 71 22,14% de ejecución .Grupo de gasto 73 0,0% de ejecución .Grupo de gasto 78 10,48% de ejecución .Grupo de gasto 84 0,0% de ejecución</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>05/04/2023 - 10:48 AM</p>
<p>FEBRERO 2023: 1.CONVENIOS de cooperación técnico económico planificados 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 50, ACOGIMIENTO FAMILIAR 5, APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 54, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 4, un total de 113 planificados para la firma de convenios de cooperación técnico económico. 2.COBERTURA planificada 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.780 niñas, niños y adolescentes , ACOGIMIENTO FAMILIAR 75 nna , APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 1.691nna , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 160 nna , un total de 3.706 planificados para la firma de convenios de cooperación técnico económico. 3. Al 28 de febrero de 2023 se han ingresado, al sistema SIIMIES, 47 convenios en la modalidad de acogimiento institucional, 4 en acogimiento familiar y 48 en apoyo y custodia familiar, un total 99 convenios de cooperación técnico económico SPE. 4.COBERTURA GENERADA FEBRERO 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.457 niñas, niños y adolescentes , ACOGIMIENTO FAMILIAR 60 nna , APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 1.720 nna , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 0 , un total de 3.237 nna, se debe mencionar que los servicios del proyecto de inversión no se paralizan. 5. PRESUPUESTO CODIFICADO: al 28 DE FEBRERO 2023. USD 20.045.049,61, con una ejecución del 1,74% total del proyecto de inversión.</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>13/03/2023 - 03:15 PM</p>
<p>ENERO 2023: 1.CONVENIOS de cooperación técnico económico planificados 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 50, ACOGIMIENTO FAMILIAR 5, APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 54, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 4, un total de 113 planificados para la firma de convenios de cooperación técnico económico. 2.COBERTURA planificada 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.780 niñas, niños y adolescentes , ACOGIMIENTO FAMILIAR 75 nna , APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 1.691nna , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 160 nna , un total de 3.706 planificados para la firma de convenios de cooperación técnico económico. 3.CONVENIOS GENERADOS al 31 d enero 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 42, ACOGIMIENTO FAMILIAR 1, APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 42, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 0, un total de 85, generados para la firma de convenios de cooperación técnico económico 4.COBERTURA GENERADA 2023: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.510 niñas, niños y adolescentes , ACOGIMIENTO FAMILIAR 15 nna , APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR 1.327 nna , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE 0 , un total de 2.852nna, se debe mencionar que los servicios del proyecto de inversión no se paralizan. 5.PRESUPUESTO asignado: al 31 de enero 2023. USD 19.752.654,55 6.Con Oficio No. MIES-MIES-2023-0181-O de 7 de febrero de 2023, mediante el cual solicita el aval de transferencia de recursos con la fuente 202, organismo 8888 y correlativo 8888 por USD. 15.765.404,59 7.Mediante Oficio Nro. MEF-SP-2023-0105 Quito, 10 de febrero de 2023; se recibe la: AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN Y APROBACIÓN DE AVALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DEL PROYECTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, por parte de la SUBSECRETARIA DE</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>16/02/2023 - 02:22 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>PRESUPUESTO-MEF, por USD. 15.765.404,59 (Quince Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuatro con 59/100 dólares) con la fuente 202 organismo 8888 y correlativo 8888.</p>		
<p>DICIEMBRE 2022: AL MES DE NOVIEMBRE SE MANTIENE UN CODIFICADO DE USD 17.908.013,33, DEVENGADO USD 13.658.429,15, CON UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 76,27%. SE SUSCRIBE 117 CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA EN LAS MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y ACOGIMIENTO FAMILIAR, CON UNA COBERTURA EN LAS MODALIDADES ANTES MENCIONADAS DE 3.397 USUARIOS, A LA FECHA SE FINANCIAN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO EN LA MODALIDAD ALTERNATIVA DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR. SE HA ASIGNADO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN EL GRUPO DE GASTO 840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN SE ENCUENTRA PRE COMPROMETIDO, CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTRO Y CON AVAL EMITIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>09/01/2023 - 10:36 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2022: AL MES DE NOVIEMBRE SE MANTIENE UN CODIFICADO DE USD 18.923.752,07, DEVENGADO USD 12.912.705,98, CON UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 68,24%. SE SUSCRIBE 130 CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA EN LAS MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y ACOGIMIENTO FAMILIAR, CON UNA COBERTURA EN LAS MODALIDADES ANTES MENCIONADAS DE 3.397 USUARIOS, A LA FECHA SE FINANCIAN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO EN LA MODALIDAD ALTERNATIVA DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR. SE HA ASIGNADO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN EL GRUPO DE GASTO 840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN SE ENCUENTRA PRE COMPROMETIDO, CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTRO Y CON AVAL EMITIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>06/12/2022 - 11:22 AM</p>
<p>OCTUBRE 2022: PASS Al mes de octubre se mantiene un codificado de USD 18.923.752,07, devengado USD 10.974.059,65, con un avance en la ejecución del proyecto de 57,99. Se suscribe 121 convenios de cooperación técnica - económica en las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar, con una cobertura en las modalidades antes mencionadas de 3.427 usuarios. Se ha asignado a las unidades operativas desconcentradas los recursos solicitados para equipamiento y mobiliario en el Grupo de Gasto 840000 Bienes de Larga Duración se encuentra pre comprometido, con autorización del Ministro y con aval emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>06/12/2022 - 11:22 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2022: Al mes de septiembre se mantiene un codificado de USD 19.073.752,07, devengado USD 7.972.753,47, con un avance en la ejecución del proyecto de 41,80%. Se suscribe 115 convenios de cooperación técnica - económica en las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar, con una cobertura en las modalidades antes mencionadas de 3.277 usuarios. Se ha asignado a las unidades operativas desconcentradas los recursos solicitados para equipamiento y mobiliario en el Grupo de Gasto 840000 Bienes de Larga Duración se encuentra pre comprometido, con autorización del Ministro y con aval emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el valor de \$ 103.764,19. Presupuesto en proceso de certificación \$ 45.352,84. Las unidades de atención del Distrito Metropolitano de Quito tienen un presupuesto de \$ 42.000 que no logran ejecutar. Para atender las adecuaciones de mobiliario y equipamiento de la unidad de atención, considerado en el Compromiso Ministerial para la re - inauguración de la Casa Hogar Infante Femenino, en la ciudad de Guayaquil por el valor de \$ 28.882,97 a ser ejecutado</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>24/10/2022 - 09:14 AM</p>
<p>AGOSTO 2022: Al mes de agosto se mantiene un codificado de USD 19.073.752,07, devengado USD 7.601.993,45, con un avance en la ejecución del proyecto de 39,86%. Se tiene suscrito 107 convenios de cooperación técnica - económica de las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar, con una cobertura en las modalidades antes mencionadas de 3.277 usuarios. Se ha asignado a las unidades operativas desconcentradas los recursos solicitados para equipamiento y mobiliario en el Grupo de Gasto 840000; se están realizando las gestiones ante la máxima autoridad para la aprobación y solicitud de aval al Ministerio de Economía y Finanzas. De igual manera, se han realizado las gestiones con la Dirección de Infraestructura y las coordinaciones zonales y direcciones distritales para la asignación y ejecución del presupuesto destinado para las adecuaciones de las unidades</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>13/09/2022 - 11:45 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de atención directa: Hilando Nuestros Sueños, Casa Hogar Infanto Femenino, Casa Hogar Guayaquil, Casa Hogar Campi de Yoder, Casa Hogar Enríquez Gallo. Se está financiado desde la gerencia para la suscripción de convenios de Apoyo Familiar y Custodia Familia, con el propósito de dar continuidad a los servicios hasta diciembre 2022.</p>		
<p>JULIO 2022</p> <p>En el mes de julio se tiene suscrito 104 convenios de cooperación técnica - económica de las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar, con una cobertura en las modalidades antes mencionadas de 3.511 usuarios. Se ha asignado a las unidades operativas desconcentradas los recursos solicitados para equipamiento y mobiliario en el Grupo de Gasto 840000; se están realizando las gestiones ante la máxima autoridad para la aprobación y solicitud de aval al Ministerio de Economía y Finanzas. De igual manera, se han realizado las gestiones con la Dirección de Infraestructura y las coordinaciones zonales y direcciones distritales para la asignación y ejecución del presupuesto destinado para las adecuaciones de las unidades de atención directa: Hilando Nuestros Sueños, Casa Hogar Infanto Femenino, Casa Hogar Guayaquil, Casa Hogar Campi de Yoder, Casa Hogar Enríquez Gallo. Ante el requerimiento realizado por la entidad cooperante Aldeas Infantiles SOS - Ecuador, para que se proceda con los respectivos desembolsos de los convenios suscritos con el MIES en las modalidades de gasto de inversión, desde la Gerencia de Protección Especial se convocó a reuniones de trabajo con cada dirección distrital con la entidad cooperante y los funcionarios del área técnica, administrativa y financiera relacionada, para establecer compromisos y tratar de dar solución urgente a los problemas de liquidez de la entidad cooperante.</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>15/08/2022 - 08:58 AM</p>
<p>JUNIO 2022:</p> <p>El proyecto se ejecuta de acuerdo al codificado de USD 20.000.000,00, con un devengado USD 5.607.131,72 alcanza un ejecución del 28,04%. Con corte al 30 de junio 2022.</p> <p>Se re planifica los convenios de la modalidad alternativa de atención APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR, para ser financiados con recursos BID, para el segundo semestre del año 2022, son 17 convenios con una cobertura de 660 niños niñas y adolescentes.</p> <p>A la espera de asignación de cuota por el Ministerio de Finanzas, para realizar los desembolsos y pagos de los convenios suscritos 2022. Por servicios prestados y garantías</p> <p>En el mes de junio 2022 se distribuye recursos financieros para la potenciación de las casas de acogida de atención directas, y brindar un mejor servicio de calidad y calidez en los centros</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>06/07/2022 - 03:14 PM</p>
<p>MAYO 2022:</p> <p>El proyecto se ejecuta de acuerdo al codificado de USD 20.000.000,00, con un devengado USD 3.560.347,65, alcanza un ejecución del 17,80%. Con corte al 31 de mayo 2022.</p> <p>Se re planifica los convenios de la modalidad alternativa de atención APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR, para ser financiados con recursos BID, para el segundo semestre del año 2022, son 17 convenios con una cobertura de 660 niños niñas y adolescentes.</p> <p>A la espera de asignación de cuota por el Ministerio de Finanzas, para realizar los desembolsos y pagos de los convenios suscritos 2022.</p> <p>En el mes de mayo 2022 se distribuye recursos financieros para la potenciación de las casas de acogida de atención directas, y brindar un mejor servicio de calidad y calidez en los centros, según memorando Nro. MIES-SPE-FSPPECV-0067.</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>31/05/2022 - 11:51 AM</p>
<p>ABRIL 2022:</p> <p>SEGÚN PAPP PRESENTADO MES DE ABRIL 2022, EL ITEM EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA ES EL 780204- TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO, EN ESPERA DE LA REFORMA MIES-SPE-GPEPE-RP-2022-001. LA PRESENTE REFORMA SE PLANTEA A FIN DE:</p> <p>* LIQUIDAR A PERSONAS DESVINCULADAS DEL PROYECTO, PARA LO CUAL SE REASIGNARÁ EL PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO PARA EL PROGRAMA 55 ACTIVIDADES 04, GRUPO 99 A PLANTA CENTRAL, CZ1, CZ3, CZ5 Y CZ8; SEGÚN MEMORANDOS NRO. MIES-CZ-1-1102-M, MIES-CZ-3-2022-1599-M, MIES-CZ-5-2022-2938-M, MIES-CZ-8-2022-2314-M, MIES-CGAF-DATH-2022-0345-M, MIES-CGAF-DATH-2022-0560-M Y CGAF-DATH-2022-0605-M.</p> <p>* SE REASIGNA FONDOS A EOD 4000 PARA EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO EN EL 2021 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-4-2022-4742-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2022,</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>05/05/2022 - 03:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
EMITIDO POR EL COORDINADOR ZONAL 4 DEL MIES, CON LA INFORMACIÓN DEL ANEXO 7.		
<p>MARZO 2022: Se continua con la prestación de servicios bajo convenios de cooperación técnico económico, se reporta asistencia, las unidades de atención continúan prestando los servicios por ende no se han cerrado, ni paralizado los servicios, a pesar de la falta de asignación de recursos financieros, por parte del Ministerio de Económica y Finanzas, para la realización de los primeros desembolsos a cooperantes, el día 29 de marzo 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas, asigna correlativo y organismo en la estructura programática del programa 55 inversión, para la continuidad del proceso de suscripción de convenios, a la fecha se gestiona la suscripción de 77 convenios de cooperación técnico económico en el proyecto</p>	Suárez Salazar, Patricio Arturo	08/04/2022 - 08:39 AM
<p>FEBRERO 2022: Se continua con la prestación de servicios bajo convenios de cooperación técnico económico, se reporta asistencia, las unidades de atención continúan prestando los servicios por ende no se han cerrado, ni paralizado los servicios, a pesar de la falta de asignación de recursos financieros, por parte del Ministerio de Económica y Finanzas, para la realización de los primeros desembolsos a cooperantes</p>	Suárez Salazar, Patricio Arturo	15/03/2022 - 04:28 PM
<p>Enero 2022 Para el desarrollo del proyecto en el periodo 2022, se ha programada las siguientes coberturas en, ACOGIMIENTO FAMILIAR 60, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.721, y en APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR. 1.780 niños, niñas y adolescentes, con un total de 3.561 nna, que accederán los servicios de protección especial en el periodo indicado. En este mes la suscripción de convenios está desarrollando de acuerdo a la programación establecida, con la observación que hasta el cierre de este informe no se dispone de correlativo ni organismo en la estructura programática del proyecto según el sistema de administración financiera e-Sigef, del Ministerio de Económica y Finanzas, entidad encargada de la asignación de los recursos, para los respectivos desembolsos a los cooperantes, (no existe financiamiento), cabe señalar que los servicios descritos la atención a los usuarios no se paraliza, para no vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, motivo por el cual se reporta la asistencia total del programa 55, proyecto 0002.</p>	Suárez Salazar, Patricio Arturo	15/03/2022 - 01:56 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>2- NACIONAL. Económico. Falta de disponibilidad presupuestaria para ejecución de los convenios con los cooperantes, CAUSARIA un retraso en los pagos y a la óptima ejecución presupuestaria.</p>	10/12/2024	Diego Fernando Defaz Caizaluisa	50 %	70	35	0/0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Dictamen de prioridad proyecto de inversión Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional	4-Inicio de Trabajo	03/01/2022		03/01/2022		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	EJECUCIÓN: Ficha de costos de los servicios de protección especial, fichas de costos validadas por la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	5-Entregables Intermedios	31/01/2022		31/01/2022		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2022.	5-Entregables Intermedios	25/02/2022		25/02/2022		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura a nivel nacional, del proyecto de inversión	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: proceso de esclarecimiento legal a nivel nacional, sobre las acciones realizadas en beneficio de los nna que han sido vulnerados sus derechos.	5-Entregables Intermedios	29/04/2022		29/04/2022		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa	5-Entregables Intermedios	25/05/2022		25/05/2022		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	1.5
8	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la ficha técnica SIPEIP del proyecto de inversión.	5-Entregables Intermedios	20/07/2022		20/07/2022		Sí	1.5
9	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	5-Entregables Intermedios	29/07/2022		27/07/2022		Sí	1.5
10	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de los servicios básicos y alimentación de las unidades de atención directa.	5-Entregables Intermedios	17/08/2022		17/08/2022		Sí	1.5
11	EJECUCIÓN: Informe técnico - financiero realizado a las unidades de atención en Acogimiento Institucional	5-Entregables Intermedios	31/08/2022		31/08/2022		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: esclarecimiento legal a nivel nacional	5-Entregables Intermedios	01/09/2022		01/09/2022		Sí	1.5
13	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del segundo desembolso a nivel nacional	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.5
14	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos del proyecto de inversión	5-Entregables Intermedios	28/10/2022		28/10/2022		Sí	1.5
15	EJECUCIÓN: Informe Gestión del Sistema de	5-Entregables Intermedios	25/11/2022		25/11/2022		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial							
16	EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2022 de la Gerencia, presentado.	5-Entregables Intermedios	28/12/2022		28/12/2022		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN: Ficha de costos de los servicios de protección especial, fichas de costos validadas por la máxima autoridad, elaborado.	5-Entregables Intermedios	02/01/2023		02/01/2023		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Ficha de Micro planificación aprobada 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	02/01/2023		02/01/2023		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Ficha PAPP 2023 del Proyecto de Protección Especial entregado a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, elaborado	5-Entregables Intermedios	02/01/2023		02/01/2023		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Habilitación de avales presupuestarios y asignación de recursos a unidades desconcentradas, elaborado.	5-Entregables Intermedios	01/02/2023		01/02/2023		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Informe trimestral de transferencias por pago de la ejecución de convenios de cooperación técnica, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Reporte de cierre y liquidación de convenios de 2022, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión I Trimestre, elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de contratación de mantenimiento de infraestructura de centro de acogida, elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Reporte de adquisiciones de equipamiento para los centros de acogida, elaborado.	5-Entregables Intermedios	25/05/2023		25/05/2023		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Reporte de estado de contrataciones de personal con cargo al Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	25/05/2023		25/05/2023		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de contratación de mantenimiento de infraestructura de centro de acogida, elaborado.	5-Entregables Intermedios	16/06/2023		16/06/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
29	EJECUCIÓN: Informe trimestral de transferencias por pago de la ejecución de convenios de cooperación técnica, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la ficha técnica SIPEIP del proyecto de inversión, elaborado.	5-Entregables Intermedios	20/07/2023		20/07/2023		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión II Trimestre, elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/07/2023		28/07/2023		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Reporte de cierre y liquidación de convenios de 2022, elaborado.	5-Entregables Intermedios	17/08/2023		25/08/2023		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Informe técnico - financiero realizado a las unidades de atención en Acogimiento Institucional, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		27/09/2023		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Informe trimestral de transferencias por pago de la ejecución de convenios de cooperación técnica, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión III Trimestre	5-Entregables Intermedios	27/10/2023		27/10/2023		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN: Informe del registro del devengamiento de los gastos de inversión del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	24/11/2023		24/11/2023		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Informe Anual de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión, entregado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Informe Anual de cumplimiento del PROYECTO 2023-2025	5-Entregables Intermedios	31/12/2023		29/12/2023		Sí	2.0
39	EJECUCIÓN: Ficha de costos año 2024, de los servicios de protección especial financiados con presupuesto del proyecto, fichas de costos validadas por la máxima autoridad, elaborado.	5-Entregables Intermedios	19/01/2024		19/01/2024		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: PAPP inicial 2024 del Proyecto de Protección Especial entregado a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/01/2024		29/01/2024		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Enero 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	09/02/2024		09/02/2024		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance	5-Entregables Intermedios	09/03/2024		09/03/2024		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	del proyecto Febrero 2024, elaborado.							
43	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Marzo 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	10/04/2024		10/04/2024		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Abril 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	09/05/2024		09/05/2024		Sí	2.0
45	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Mayo 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	10/06/2024		10/06/2024		Sí	2.0
46	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Junio 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	09/07/2024		12/07/2024		Sí	2.0
47	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Julio 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	09/08/2024		05/08/2024		Sí	2.0
48	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Agosto 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	09/09/2024		09/09/2024		Sí	2.0
49	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Septiembre 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	09/10/2024		09/10/2024		Sí	2.0
50	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Octubre 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	09/11/2024		09/11/2024		Sí	2.0
51	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Noviembre 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	09/12/2024		09/12/2024		Sí	2.0
52	EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Diciembre 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	19/12/2024		19/12/2024		Sí	2.0
53	EJECUCIÓN: Informe de gestión Anual del proyecto 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2024		30/12/2024		Sí	29.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de NNA que acceden en la modalidad de acogimiento institucional y modalidades alternativas por convenio.		84.79 %	3,531	2,994	01/01/2022	Noviembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	39,465,810.75 **
Costo Total:	96,418,857.76
Total Devengado:	30,798,648.16
% Costo Total Devengado:	31.94 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 31.94 %

Perfil Económico 2024

	Años Previos	Año Actual (2024)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Ppto. Codificado	19,073,752.07	0.00	0.00	19,073,752.07
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2024)		0.00		
Programado a Devengar	33,703,478.75	10,982,310.24	0.00	44,685,788.99
Ppto. Devengado	28,483,500.51	2,315,147.65	0.00	30,798,648.16
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 28,483,500.51	0.00	0.00	28,483,500.51
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	5,219,978.24	10,982,310.24	0.00	16,202,288.48
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 84.51 %	21.08 %	0.00 %	68.92 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2024



Presupuesto Mensual 2024

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2024							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	204,876.12	204,876.12	204,876.12	204,876.12	100.00 %		1.87 %
Mar	135,707.01	135,707.01	340,583.13	340,583.13	100.00 %		3.10 %
Abr	111,545.01	111,545.01	452,128.14	452,128.14	100.00 %		4.12 %
May	117,229.88	117,229.88	569,358.02	569,358.02	100.00 %		5.18 %
Jun	416,587.52	416,587.52	985,945.54	985,945.54	100.00 %		8.98 %
Jul	1,329,202.11	1,329,202.11	2,315,147.65	2,315,147.65	100.00 %		21.08 %
Ago	1,733,432.52		4,048,580.17				
Sep	1,733,432.52		5,782,012.69				
Oct	1,733,432.52		7,515,445.21				
Nov	1,733,432.52		9,248,877.73				
Dic	1,733,432.51		10,982,310.24				
Total	10,982,310.24	2,315,147.65					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la calidad y eficiencia de los Servicios de Protección Especial MEDIANTE la actualización de normas técnicas y modelos de atención, capacitación, asistencia técnica, esclarecimiento legal y seguimiento a la implementación de la política pública de protección especial

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1. 2022-08-04 Anexo 14. Informe mod Reduc PAI 2022 Proy Inversion Fortacimiento SPE 926k-signed-signed-signed	1._2022-08-04_Anexo_14._Informe_mod_Reduc_PAI_2022_Proy_Inversion_Fortacimiento_SPE_926k-signed-signed-signed.pdf	31/10/2022
2	2. 2022-08-05 Anexo 13- Modific internas - PROY INVERSION FORTALECIMIENTO dismin 926k-signed-signed-1-signed	2._2022-08-05_Anexo_13-_Modific_internas_-_PROY_INVERSION_FORTALECIMIENTO_dismin_926k-signed-signed-1-signed.pdf	31/10/2022
3	3. 2022-09-21 Anexo 14. Informe mod Reduc PAI 2022 Proy Inversion Fortacimiento SPE 150k-signed-signed-sognd	3._2022-09-21_Anexo_14._Informe_mod_Reduc_PAI_2022_Proy_Inversion_Fortacimiento_SPE_150k-signed-signed-sognd.pdf	31/10/2022
4	4. 2022-09-21_anexo_13-_modific_internas_-_proy_inversion_fortalecimiento_dismin_150k-signed-1-signed-signed	4._2022-09-21_anexo_13-_modific_internas_-_proy_inversion_fortalecimiento_dismin_150k-signed-1-signed-signed.pdf	31/10/2022
5	ASOCIACION Hito 11: Informe técnico - financiero realizado a las unidades de atención en Acogimiento Institucional	B_2..pdf	05/09/2022
6	ASOCIACION Hito 12: INFORME esclarecimiento legal a nivel nacional.	B.1..pdf	05/09/2022
7	ASOCIACION Hito 13: Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del segundo desembolso a nivel nacional	B.3..pdf	06/10/2022
8	ASOCIACION Hito 14: Informe de Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos del proyecto de inversión	B.4..pdf	31/10/2022
9	ASOCIACION Hito 15: Informe Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial.	B.5.pdf	01/12/2022
10	ASOCIACION Hito 16: Informe de Gestión 2022 de la Gerencia, presentado.	B.6..pdf	09/01/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	ASOCIACION Hito 1: Dictamen de prioridad proyecto de inversión Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional	A.1..pdf	11/03/2022
12	ASOCIACION HITO 21: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2023, elaborado.	C.2..pdf	14/03/2023
13	ASOCIACION HITO 22:Reporte de cierre y liquidación de convenios de 2022.	C.3.-signed.pdf	05/05/2023
14	ASOCIACION Hito 2: EJECUCIÓN: Ficha de costos de los servicios de protección especial, fichas de costos validadas por la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	A.2..xls	11/03/2022
15	Asociación Hito 35: Informe de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión III Trimestre	D.7..pdf	27/10/2023
16	ASOCIACION Hito 37: Informe Anual de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión, entregado.	D9.pdf	29/12/2023
17	ASOCIACION Hito 4: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura a nivel nacional, del proyecto de inversión	A._4.-signed.pdf	08/04/2022
18	ASOCIACION Hito 5: INFORME: proceso de esclarecimiento legal a nivel nacional, sobre las acciones realizadas en beneficio de los nna que han sido vulnerados sus derechos.	A.5..pdf	07/07/2022
19	ASOCIACION Hito 5: INFORME: proceso de esclarecimiento legal a nivel nacional, sobre las acciones realizadas en beneficio de los nna que han sido vulnerados sus derechos.	A.5.1.pdf	07/07/2022
20	ASOCIACION Hito 7: Hito 7: EJECUCIÓN: :Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	A._7-signed.pdf	08/07/2022
21	ASOCIACION Hito 8: Informe de seguimiento a la ficha técnica SIPEIP del proyecto de inversión.	A.8..pdf	18/08/2022
22	ASOCIACION Hito 9: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto.	A.9.pdf	29/08/2022
23	Asociación EJECUCIÓN PROYECTO 2023-2025	D10_gerencia.pdf	12/01/2024
24	ASOCIACIÓN HITO 20: HABILITACIÓN DE AVALES PRESUPUESTARIOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS A UNIDADES DESCONCENTRADAS, ELABORADO.	C.1..rar	24/02/2023
25	ASOCIACIÓN HITO 23 : Informe trimestral de transferencias por pago de la ejecución de convenios de cooperación técnica	C.4.-signed.pdf	25/05/2023
26	ASOCIACIÓN HITO 24 : Informe de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión I Trimestre reporte.	C.5..pdf	29/05/2023
27	ASOCIACIÓN HITO 25 : Reporte del proceso de contratación de mantenimiento de infraestructura de centro de acogida, elaborado.	C.7..pdf	01/06/2023
28	ASOCIACIÓN HITO 27 : Reporte de estado de contrataciones de personal con cargo al Proyecto, elaborado	C.8.xls	10/07/2023
29	ASOCIACIÓN HITO 28 : Reporte del proceso de contratación de mantenimiento de infraestructura de centro de acogida, elaborado.	C.9.pdf	13/07/2023
30	ASOCIACIÓN HITO 29 : Informe trimestral de transferencias por pago de la ejecución de convenios de cooperación técnica, elaborado	D.1.-signed.pdf	13/07/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
31	ASOCIACIÓN HITO 30: Informe de seguimiento a la ficha técnica SIPEIP del proyecto de inversión, elaborado.	D.2..pdf	24/07/2023
32	ASOCIACIÓN HITO 31: Informe de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión II Trimestre.	D.3..pdf	14/08/2023
33	ASOCIACIÓN HITO 32: Reporte de cierre y liquidación de convenios de 2022, elaborado.	D.4..pdf	25/08/2023
34	Asociación Hito 33: Informe técnico - financiero realizado a las unidades de atención en Acogimiento Institucional	D.5..pdf	27/09/2023
35	Asociación Hito 34: Informe trimestral de transferencias por pago de la ejecución de convenios de cooperación técnica	D.6.-signed.pdf	29/09/2023
36	ASOCIACIÓN HITO 36: INFORME DEL REGISTRO DEL DEVENGAMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO	D8.pdf	24/11/2023
37	ASOCIACIÓN Hito 3: EJECUCIÓN: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2022.	A.3..pdf	11/03/2022
38	ASOCIACIÓN HITO 51. Respaldo del Hito correspondiente al Informe de Gestión de Noviembre 2024.	INFORME_OCTUBRE_-_NOVIEMBRE_2024_-_SPE_VF-signed-signed-signed-signed.pdf	10/12/2024
39	ASOCIACIÓN Hito 6: Informe de ejecución presupuestaria del Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa	A.6..rar	07/07/2022
40	ASOCIACIÓN Hito 6: Informe de ejecución presupuestaria del Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa	A.6.1.pdf	07/07/2022
41	ASOCIACIÓN HITO Hito 26: Reporte de adquisiciones de equipamiento para los centros de acogida, elaborado. .	C.6..pdf	31/05/2023
42	ASOCIACIÓN: HITO 17 MICRO PLANIFICACIÓN APROBADA 2023, ELABORADO.	B.7..rar	24/02/2023
43	ASOCIACIÓN: HITO 18 FICHA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, FICHAS DE COSTOS VALIDADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, ELABORADO	B.8.rar	24/02/2023
44	ASOCIACIÓN: HITO 19 PAPP 2023 DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ENTREGADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, ELABORADO	B.9..rar	24/02/2023
45	Asociado Hito 39: EJECUCIÓN: Ficha de costos año 2024, de los servicios de protección especial financiados con presupuesto del proyecto, fichas de costos validadas por la máxima autoridad, elaborado.	E1_fcosto_spe_2024.xls	26/03/2024
46	Asociado hito 40: EJECUCIÓN: PAPP inicial 2024 del Proyecto de Protección Especial entregado a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, elaborado.	E2_PAPP__2024_SPE.rar	26/03/2024
47	Asociado hito 41: EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Enero 2024, elaborado.	F3-signed-signed.pdf	26/03/2024
48	Asociado hito 42: EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Febrero 2024, elaborado.	F4-signed-signed.pdf	26/03/2024
49	Asociado hito 43 EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto Marzo 2024, elaborado.	F5-signed.pdf	10/04/2024
50	Asociado hito 44 EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto abril 2024, elaborado.	F6-signed-signed.pdf	09/05/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
51	Asociado hito 45 EJECUCIÓN: Informe de gestión mensual de avance del proyecto mayo 2024, elaborado.	F7-signed-signed.pdf	12/06/2024
52	Asociado hito 46 EJECUCIÓN: INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MES DE JUNIO	INFORME_GERENCIA_DE_PROYECTO_MES_DE_JUNIO-signed.pdf	12/07/2024
53	Asociado hito 47 EJECUCIÓN: INFORME GERENCIA MES DE JULIO DE 2024	INFORME_GERENCIA_MES_DE_JULIO_DE_2024.docx	05/08/2024
54	INFORME GERENCIA MES DE JULIO 2024	Informe_GPR_gerencia_mes_de_Julio_2024-signed-signed.pdf	06/08/2024
55	INFORME GERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	INFORME_GPR_GERENCIA_MES_DE_AGOSTO_DE_2024-signed-signed.pdf	11/09/2024
56	REPORTE 2022 V09-01-2023	2022_Project_Highlights_2023_1_9.pdf	09/01/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Defaz Caizaluisa, Diego Fernando	Líder	GERENTE DE PROYECTO	diego.defaz@inclusion.gob.ec	0960111875
