

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social

Subsecretaría de Discapacidades

Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad

PROYECTO: K004 MIES-Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES.

Líder del Proyecto:	Sarzos, Luis (luis.sarzos@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Zanafria Minango, Liliana del Rocío	Programas Relacionados:	
Titular:	Zuñiga del Salto, Jaime Eduardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387167	TIR:	23.65 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	7,959,744.68
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,500,000.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	06/05/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Sarzos, Luis	Fecha del siguiente Hito:	09/05/2022

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto de inversión se plantea con la finalidad de fortalecer la gestión que la Subsecretaría realiza para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus redes de apoyo, a través de servicios institucionalizados con los Centros Diurnos de desarrollo Integral para personas con discapacidad, Centros de Referencia y Acogida y Atención en el Hogar y la Comunidad para personas con discapacidad, además del seguimiento a la gestión y proceso de corresponsabilidad de los beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, así como a las personas responsables del cuidado a ser atendidas bajo la modalidad de Comités de Personas Responsables del Cuidado.

Beneficios Cualitativos

- Contribuir a la construcción de un sistema integral de servicios adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad que aporte a mejorar su calidad de vida.
- Elevar los niveles de autonomía e independencia de las personas con discapacidad, para su inclusión social y económica, a través del desarrollo de sus habilidades.
- Gestionar las acciones que permitan fortalecer los círculos de apoyo a personas con discapacidad; y, la actoría de las personas responsables del cuidado.
- Desarrollar estrategias para el cuidado y la atención a personas con discapacidad a través de talento humano

Tipo de Beneficiario

Personas con discapacidad de 18 a 64 años, once meses y veintinueve días; con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad, tal como se indica en la misión de la Subsecretaría de Discapacidades Acuerdo Ministerial 030, de 16 de junio de 2020.

Usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, - Personas con discapacidad grave, muy Grave y completa en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

- Personas con Enfermedades Catastróficas, Raras y Huérfanas en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

- Niños, Niñas y Adolescentes menores de 18 años viviendo con VIH-SIDA en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

Tal como se indica en el Acuerdo Ministerial 033, de 21 de mayo de 2021.


Restricciones

Recursos: déficit en el número de personal técnico contratado para la ejecución de los componentes, debido a la disminución de recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 8.56 %

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

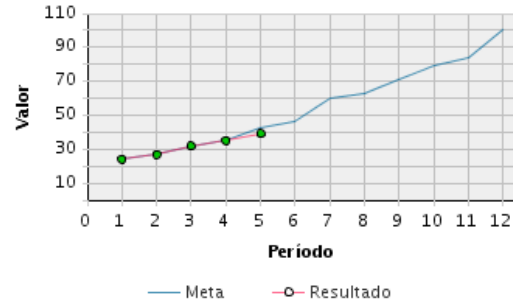

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	24 %	27 %	32 %	35 %	43 %	46 %	60 %	63 %	71 %	79 %	84 %	100 %
	Avance real acumulado											
	24 %	27 %	32 %	35 %	39 %							
	Estado											
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de abril se cuenta con una ejecución del 10, 20%, y la firma de 68 convenios	Sarzosa, Luis	06/05/2022 - 08:09 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de marzo se cuenta con una ejecución del 20%,	Pozo Fierro, Gabriela Alexandra	06/04/2022 - 12:32 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de febrero cuanta con una ejecución del 13%.	Sarzosa Mossot, Luis Alberto	05/03/2022 - 09:22 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00.	Sarzosa Mossot, Luis Alberto	04/02/2022 - 03:19 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General.	02/02/2022		60 %	50	30	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
La falta de asignación presupuestaria para el proyecto de inversión CAUSARÍA el retraso en el cumplimiento de los componentes, objetivos e indicadores propuestos.						

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición. Dictamen de prioridad, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/01/2022		05/01/2022		Sí	6.0
2	Planificación: Fichas de Costos, entregadas	5-Entregables Intermedios	05/01/2022		05/01/2022		Sí	6.0
3	Planificación: Matriz de Microplanificación, entregado	5-Entregables Intermedios	13/01/2022		13/01/2022		Sí	6.0
4	Planificación: Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2022, entregado	5-Entregables Intermedios	31/01/2022		31/01/2022		Sí	6.0
5	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria enero, entregado	5-Entregables Intermedios	07/02/2022		07/02/2022		Sí	1.0
6	Ejecución: Informe de cobertura mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2022		10/02/2022		Sí	1.0
7	Ejecución: Informe y ficha al mes enero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2022		10/02/2022		Sí	1.0
8	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	07/03/2022		07/03/2022		Sí	1.0
9	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	09/03/2022		09/03/2022		Sí	1.0
10	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	09/03/2022		09/03/2022		Sí	1.0
11	Ejecución: Informe de cobertura mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2022		10/03/2022		Sí	1.0
12	Ejecución: Informe y ficha al mes febrero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2022		10/03/2022		Sí	1.0
13	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	Ejecución: Informe de cobertura mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	11/04/2022		11/04/2022		Sí	1.0
15	Ejecución: Informe y ficha al mes marzo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/04/2022		11/04/2022		Sí	1.0
16	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/05/2022		05/05/2022		Sí	3.0
17	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria abril, entregado	5-Entregables Intermedios	05/05/2022		05/05/2022		Sí	1.0
18	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	09/05/2022	09/05/2022			No	1.0
19	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	09/05/2022	09/05/2022			No	1.0
20	Ejecución: Informe de cobertura mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2022	10/05/2022			No	1.0
21	Ejecución: Informe y ficha al mes abril de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2022	10/05/2022			No	1.0
22	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	05/06/2022	05/06/2022			No	1.0
23	Ejecución: Informe de cobertura mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	10/06/2022	10/06/2022			No	1.0
24	Ejecución: Informe y ficha al mes mayo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/06/2022	10/06/2022			No	1.0
25	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	07/07/2022	07/07/2022			No	1.0
26	Ejecución: Informe consolidado del segundo desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022	07/07/2022			No	1.0
27	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria junio, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022	07/07/2022			No	1.0
28	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022	07/07/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
29	Ejecución: Informe de cobertura mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022	13/07/2022			No	1.0
30	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022	13/07/2022			No	4.0
31	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022	13/07/2022			No	4.0
32	Ejecución:Informe y ficha al mes junio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022	13/07/2022			No	1.0
33	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria julio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/08/2022	05/08/2022			No	1.0
34	Ejecución: Informe de cobertura mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	11/08/2022	11/08/2022			No	1.0
35	Ejecución: Informe y ficha al mes julio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/08/2022	11/08/2022			No	1.0
36	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/09/2022	05/09/2022			No	3.0
37	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	05/09/2022	05/09/2022			No	1.0
38	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	07/09/2022	07/09/2022			No	1.0
39	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	07/09/2022	07/09/2022			No	1.0
40	Ejecución: Informe y ficha al mes agosto de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	12/09/2022	12/09/2022			No	1.0
41	Ejecución:Informe de cobertura mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	12/09/2022	12/09/2022			No	1.0
42	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022	05/10/2022			No	1.0
43	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022	05/10/2022			No	0.0
44	Ejecución: Matriz proforma presupuestaria 2023, entregada	5-Entregables Intermedios	07/10/2022	07/10/2022			No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
45	Ejecución:Informe de cobertura mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	11/10/2022	11/10/2022			No	1.0
46	Ejecución:Informe y ficha al mes septiembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/10/2022	11/10/2022			No	1.0
47	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	07/11/2022	07/11/2022			No	1.0
48	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	09/11/2022	09/11/2022			No	1.0
49	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	09/11/2022	09/11/2022			No	1.0
50	Ejecución:Informe de cobertura mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2022	10/11/2022			No	1.0
51	Ejecución:Informe y ficha al mes octubre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2022	10/11/2022			No	1.0
52	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/12/2022	05/12/2022			No	1.0
53	Ejecución:Informe de cobertura mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	12/12/2022	12/12/2022			No	1.0
54	Ejecución:Informe y ficha al mes noviembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	12/12/2022	12/12/2022			No	1.0
55	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
56	Ejecución:Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
57	Ejecución:Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	4.0
58	Ejecución:Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
59	Ejecución:Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
60	Ejecución:Informe de cobertura mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
61	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	3.0
62	Ejecución:Informe y ficha al mes diciembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Unidades en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad		-	-	-	01/01/2022	-
2	Número de personas que acceden a las modalidades de atención para personas con discapacidad del MIES GASTO INVERSIÓN		94.46 %	11,310	10,683	01/01/2022	Marzo
3	Número de convenios suscritos en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad		-	-	-	01/01/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,500,000.00 **
Costo Total:	42,164,298.74
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	42,164,298.74	0.00	42,164,298.74
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		42,164,298.74		
Programado a Devengar	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

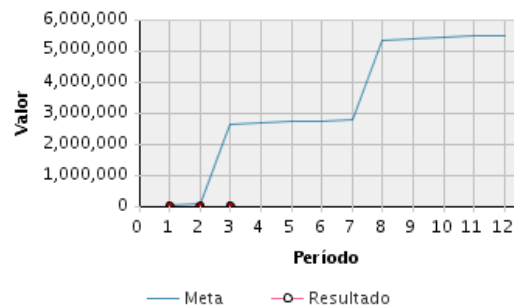

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	43,228.58	0.00	43,228.58	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	43,228.58	0.00	86,457.16	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	2,533,857.13	0.00	2,620,314.29	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	43,228.58		2,663,542.87				
May	43,228.58		2,706,771.45				
Jun	43,228.58		2,750,000.03				
Jul	43,228.50		2,793,228.53				
Ago	2,533,857.11		5,327,085.64				
Sep	43,228.59		5,370,314.23				
Oct	43,228.59		5,413,542.82				
Nov	43,228.59		5,456,771.41				
Dic	43,228.59		5,500,000.00				
Total	5,500,000.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
11	Incrementar la eficiencia en la atención contribuyendo a la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias MEDIANTE la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las modalidades de atención en el marco del enfoque social e inclusivo.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO_01	A_1.pdf	04/02/2022
2	ASOCIACIÓN HITO_10	A_10.pdf	06/04/2022
3	ASOCIACIÓN HITO_11	A_11.pdf	06/04/2022
4	ASOCIACIÓN HITO_11.1	A_11.1.pdf	06/04/2022
5	ASOCIACIÓN HITO_12	A_12.pdf	06/04/2022
6	ASOCIACIÓN HITO_2	A_2.rar	04/02/2022
7	ASOCIACIÓN HITO_3	A_3.zip	04/02/2022
8	ASOCIACIÓN HITO_4	A-4.rar	04/02/2022
9	ASOCIACIÓN HITO_5	A_5.pdf	06/04/2022
10	ASOCIACIÓN HITO_6	A_6.pdf	06/04/2022
11	ASOCIACIÓN HITO_6.1	A_6.1.pdf	06/04/2022
12	ASOCIACIÓN HITO_7	A_7.pdf	06/04/2022
13	ASOCIACIÓN HITO_8	A_8.pdf	06/04/2022
14	ASOCIACIÓN HITO_9	A_9.pdf	06/04/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Camacho, Katherine Camacho	Analista	Analista	katherine.camacho@inclusion.gob.ec	6045
Gonzalez, Andrea	Analista	Analista de la Gerencia de Discapacidades	andrea.gonzalez@inclusion.gob.ec	
Jimenez Luna, Stefany	Analista	Analista	stefany.jimenez@inclusion.gob.ec	6045
Pozo, Gabriela	Analista	Analista Gerencia Proyecto Discapacidad	gabriela.pozo@inclusio n.gob.ec	0984016434

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Sarzosa Mossot, Luis Alberto	líder de proyecto	Gerente de Proyecto	luis.sarzosa@inclusion.gob.ec	
