

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Atención Intergeneracional
Dirección de la Población Adulta Mayor

PROYECTO: K002 MIES - Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 provincias del país

Líder del Proyecto:	López Rodríguez, Juan Domingo (juan.lopez@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Perez Larrea, Nilka Marina	Programas Relacionados:	AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SENPLADES - Implementación interinstitucional de distritos y circuitos priorizados para el buen vivir.
Titular:	Reyes Zambrano, Irene Adriana	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.372205	TIR:	18.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	13,110,748.27
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	38,222,450.43
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	05/06/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	López Rodríguez, Juan Domingo	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2017

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación de la cobertura de atención a personas adultas mayores del país a través de la implementación de servicios de calidad en la atención gerontológica que contemplen acciones e integren actividades tendientes a desarrollar una vejez digna y saludable.

Los componentes del proyecto son:

COMPONENTE 1: Implementar servicios para personas adultas mayores en las modalidades de atención (residencia, diurno, atención domiciliar y espacios alternativos)

COMPONENTE 2: Implementación de un sistema de capacitación para personas que trabajen en la atención de adultos mayores, que incluyen guías de atención y evaluación de las personas mayores de 65 años componente capacitación y formación

COMPONENTE 3: EDUCOMUNICACIÓN con la familia y comunidad en general sobre las situación de las personas adultas mayores

DATOS GENERALES

Descripción

COMPONENTE 4: Sensibilización a la familia y comunidad en general sobre la situación de las personas adulta mayores
COMPONENTE 5: Establecer un sistema de seguimiento y evaluación que permita analizar la situación de atención al adulto mayor

Objetivo general:

Ampliar la cobertura de atención a personas adultas mayores del país a través de la implementación de servicios de calidad de atención gerontológica que contemplen acciones e integren actividades tendientes a desarrollar una vejez digna y saludable.

Objetivo específicos

1. Implementar modalidades de atención integral (residencial, diurna, creciendo con nuestra familia - CNF y Cuidadores Domiciliarios) que fomenten el envejecimiento activo y respondan a las necesidades de cada adulto mayor, sus familias y tengan una pertinencia local y cultural.
2. Generar y mejorar los conocimientos y prácticas que tienen las PAM sobre autocuidado, rescatando sus historias de vida como una estrategia que conduzca a estilos de vida saludables.
3. Fortalecer y mejorar los conocimientos y prácticas de cuidado de las personas que trabajan y/o cuidan a las PAM. Población objetivo: cuidadores y operadores.
4. Sensibilizar y empoderar a la PAM, sus familias y su entorno sobre prácticas y hábitos adecuados de vida que les permitan mejorar y fortalecer la calidad de vida de las PAM.
5. Garantizar el acceso y consumo de alimentos saludables con enfoque de soberanía y derechos de las PAM
6. Contar con información oportuna y pertinente para la toma de decisiones.

Beneficios Cualitativos

Las personas adultas mayores cuentan con servicios de atención gerontológica integral de calidad y viven un proceso de envejecimiento activo digno y saludable.

Tipo de Beneficiario

"Población de adultos mayores
Familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad "

Restricciones


- Tiempo 3 años
- Costo: \$56.549.262,73
- Alcance: nacional
- Población meta: adultos mayores en condiciones de pobreza y pobreza extrema

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 57.23 %

Fecha de Inicio: 01/01/2014

Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

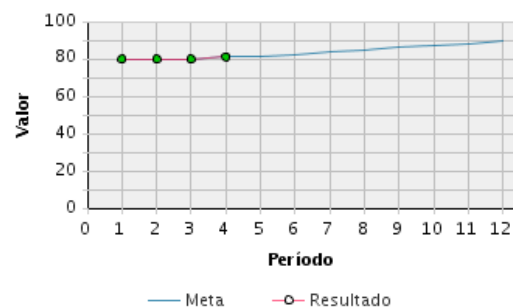

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	80 %	80 %	80 %	81 %	81 %	82 %	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %	90 %
	Avance real acumulado											
	80 %	80 %	80 %	81 %								
	Estado											
	●	●	●	●								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2017 #1 Documento de información del avance de la gestión de la Gerencia para Viceministerio de Inclusión. #1 Informe HITO 73 GPR: Informe de capacitación del Modulo sobre el uso del MOODLE #1 Informe HITO 74 GPR: Informe de convenios suscritos para el año 2017, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión) presentado. #4 Informes ejecutivos elaborados de enero / abril 2017 para subir al Sistema GPR. #1Informe de Supervisión Ejecutiva a la Gobernación de la Provincia de Bolívar -Distrito Guaranda- realizado y emitido a Planificación de la Zona 5. #100% Ingreso de CUR de pagos del año 2016 de los convenios financiados por el proyecto de inversión en el modulo III del SIPeIP. #1 Informe de Transición 2017 de la Gerencia de población Adulta Mayor, elaborado #1 Informe de Transición 2017 de la Subsecretaría Intergeneracional, elaborado. #1 Reforma Presupuestaria para el componente de la Plataforma Virtual, elaborada #Aprobada propuesta de Talleres AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATÍA "CUIDANDO DEL CUIDADOR", para los operadores de los centros y servicios gerontológicos de los Distritos MIES. #1 Documento de observaciones a la Propuesta de articulación de la Dirección de Participación con la Subsecretaría de Atención Intergeneracional relacionada con actividades en territorio elaborado. #4 Fichas de avance del proyecto correspondientes a los meses de enero / abril, elaboradas. 2.GESTIÓN Grupos de gasto en inversión: Grupo 71 Gastos en personal: Codificado 116.835,80Devengado 36,765.21Pagado 36,765.2131.47% Grupo 73Bienes y servicios para Inversión: Codificado 73.399.52Devengado 2,448.09Pagado 2,448.093.34% Grupo 78 Transferencias y Donaciones de Inversión: Codificado 8.992.871.05Devengado 3,979,996.14Pagado 3,899,748.1044.26% Grupo 99 Otros pasivos: Codificado 7.541.69Devengado 7.541.69 Pagado 7.541.69100% Total general: Codificado 9'190.648,.06Devengado 4,026,751.12Pagado 3,946,503.0843.81%	López Rodríguez, Juan Domingo	05/06/2017 - 03:32 PM
ABRIL 2017 .Hitos, indicadores y riesgos para la herramienta GPR, aprobados .Reforma presupuestaria aprobada, por Planificación y Financiero .Observaciones y aportes al Plan Estratégico Institucional del MIES 2014 - 2017 formulados .Informe de Cierre de Gestión de la Gerencia .Casa Abierta "Activos y Positivos" con 350 personas adultas mayores que se benefician de las actividades en centros y servicios de la Dirección Distrital Sur, realizada. .Informes semanales, mensuales de fin de gestión, realizados. Tipo gasto Grupo 71 Codificado 116.835,80 Devengado 32.028.99 Pagado 32.028.99 % 27.41 Grupo 73 Codificado 73.399.52 Devengado 880.09 Pagado 880.09 %1.20 Grupo 78 Codificado 8.992.871.05 Devengado 2.574.940.98 Pagado 2.288.322.76 % 28.63 Grupo 99 Codificado 7.541.69 Devengado 6.160.00 Pagado 6.160.00 % 81.68	López Rodríguez, Juan Domingo	09/05/2017 - 08:02 AM
MARZO 2017 .Elaborada la hoja de ruta, sobre compromisos del Plan Binacional de cooperación en la zona de frontera Ecuador - Colombia. .255 Actas de finiquito, del año 2016 de 500 convenios .Informe de fin de gestión del componente plataforma virtual. .FODA del Proceso de Capacitación Virtual. .Aprobación de la segunda Matriz de Aavales para Coordinación Zonal 6: \$ 2.325.912,87. .Seguimiento de Matriz de Aavales por 6'500.921.10. .Informe de fin de gestión del componente plataforma virtual. .Generación de hitos, indicadores y riesgos para la herramienta GPR .Actualizada la información de convenios 2017 en el Sistema SIPeIP .Tipo gasto. .Grupo 71. Codificado116.835,80.Comprometido 23961.60.Devengado 23961.6. %20.51 .Grupo 73. Codificado 78177,85.Comprometido 880.09.Devengado 880.09. %1.13 .Grupo 78.Codificado 8'989.941,45.Comprometido 2'361.816,59.Devengado 692.493,35. %7.70 .Grupo 99. Codificado 5.692.96.Comprometido 0.00.Devengado 0.00.% 0.00	López Rodríguez, Juan Domingo	09/05/2017 - 07:58 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Total general.Codificado 9'190.648,.06. Comprometido 167587.85.Devengado 53536.00.% 0.59 .El total de convenios firmados, de la Gerencia de Población Adulta Mayor es de 289 convenios. .Realizado el primer desembolso de los convenios del 2017. .Sin información de liquidación de 243 convenios.		
FEBRERO 2017 .Seguimiento a convenios de cooperación suscritos en Direcciones Distritales. .Documento de Aplicación de la Metodología de Costeo Basado en Actividades para los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social para servicios de Población Adulta Mayor. .Fichas técnicas de convenios y cooperantes de los años 2016 y 2017 .Integradas observaciones de la Micro planificación enviados por la SENPLADES .Autorizada excepcionalidad para suscripción de convenio 2017 con el GAD de Nanegal, CZ 9, DD Norte .Subidas a la Plataforma Virtual, 3 unidades del módulo de Desarrollo Personal en el sistema MOODLE. Tipo gasto Grupo 71 Codificado 116.835,80 Comprometido 15894.21 Devengado 15894.21 %13.60 Grupo 73 Codificado 78177,85 Comprometido 0.00 Devengado 0.00 % 0.00 Grupo 78 Codificado 8'989.941,45 Comprometido 150.556,98 Devengado 37.641,79 % 0.42 Grupo 99 Codificado 5.692.96 Comprometido 0.00 Devengado 0.00 %0.00 Total general Codificado 9'190.648,.06 Comprometido 166.461,195 Devengado 3536.00 %0.58 .Contenidos del Modulo de Envejecimiento Positivo, para la capacitación virtual. .Seguimiento en territorio a gestión y compromisos. .Subido a la Plataforma Virtual el Modulo de Desarrollo Personal .Seguimiento para entrega de avales de las Zonas y Distritos. .Respuesta de incremento de cobertura, de la Zona 6 de parte de la señora Ministra.	López Rodríguez, Juan Domingo	09/05/2017 - 07:56 AM
Enero 2017 .Documento de Micro planificación año 2017 de Gerencia de Población adulta mayor. .Informes del evento de "Difusión de Políticas públicas y sensibilización de Derechos de las Personas Adultas Mayores, .Elaboración de informe Anual de GPR. .Elaboración de los hitos 70, 71 y 72 de la herramienta GPR .Difusión de lineamientos para la firma de convenios del año 2017. .Recopilada y validada la matriz de cooperantes 2017. .Informe anual presupuestario, 97.80% en el año 2016. .Informe de capacitación de 728 operadores que participaron en la Plataforma Virtual, Modulo MOODLE. .Entrega de avales desde territorio genera retrasos en suscripción de convenios y transferencias de recursos.	López Rodríguez, Juan Domingo	09/05/2017 - 07:55 AM
DICIEMBRE 2016: .Elaborada de Matriz de Micro planificación, de Cooperantes y Coberturas para el año 2017 de Gerencia de Población adulta mayor de acuerdo a información remitida desde territorio. .Entregado el Documento de contenidos mínimos de Microplanificación año 2017 de Gerencia de Población adulta mayor. .Entrega de Matriz de Microplanificación año 2017 de convenios de cooperación de la Gerencia de Población adulta mayor .Consolidado el informe anual de gestión, de la Gerencia de de Servicios de Población Adulta Mayor .Matriculados 929 operadores de los centros y servicios al modulo Moodle. .Entregado Diseño instruccional del módulo de Desarrollo Personal .Elaborado Diseño Grafico de las tres unidades de Desarrollo Personal para la Plataforma Virtual .Planificado, organizado y ejecutado el Evento de "Difusión de Política Pública y Sensibilización de los Derechos de las Personas Adultas Mayores", el 22 de diciembre del 2016, en la Zona 9, Distritos Norte, Centro y Sur. .Elaboración de lineamientos para los convenios de cooperación del año 2017. .Efectuada la capacitación sobre plataforma MOODLE, a operadores de centros y servicios gerontológicos directos y a través de convenio. .Elaborado resumen ejecutivo, del informe anual de gestión SAI .Enviados todos los documentos e insumos, sobre capacitación virtual de Reinserción Familiar de personas adultas mayores impartida. .Elaboración de Micro y Macrocurriculo para el Modulo de Atención Integral y Cuidado a Personas Adultas Mayores. .Elaborado un guión del evento de sensibilización de derechos y política pública para personas adultas mayores	López Rodríguez, Juan Domingo	10/01/2017 - 09:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Apoyo para actualización e ingreso de información de convenios 2016 Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Ejecución presupuestaria: Asignado \$9.202.814,83, Devengado \$9.000.020,29, Pagado \$8.999.438,19, 97.80% ejecución		
NOVIEMBRE 2016: .Proyecto Reformulado 2017-2019 entregado al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. .Elaboración de Microplanificación año 2017 de Gerencia de Población adulta mayor en conjunto con Dirección de Población Adulta Mayor para entrega a Planta Central .Liquidación de certificación presupuestaria, en el ítem del Viáticos y Subsistencias del Proyecto Emblemático de Adulto Mayor para inyectar en el Grupo de Gasto 99000 y de esta manera poder realizar la reforma para el pago de obligaciones del año anterior del Distrito 15D05 (Tena) autorizado por la máxima autoridad. .Entregado Diseño instruccional del módulo de Moodle para las tres unidades. .Consolidada y enviada la base de datos de operadores para la matriculación en la Plataforma virtual, a las Zonas y Distritos para validación .EntregadaS la tres unidades del Modulo Moodle, para que sea cargada a la plataforma. .Se Matriculan y capacitan en el modulo MOODLE de la Plataforma Virtual 921, operadores de los centros y servicios gerontológicos. .Socializada, la herramienta virtual de aprendizaje de la Plataforma Virtual 43 técnicos de las Zonas y Distritos que apoyaran a los operadores que se capaciten en territorio. .Efectuada conferencia virtual sobre Reinserción Familiar, participaron 39 técnicos y operadores de los centros residenciales directos y a través de convenio de los Distritos del MIES. .Participación en Taller Consular, efectuado por la Embajada Británica, "Módulo Salud Mental- Atención a Personas Adultas Mayores y Protección a Menores", cuyo objetivo fue facilitar un encuentro personal entre las embajadas y entidades públicas encargadas de proveer asistencia a grupos de atención vulnerable. .Elaborada Matriz de seguimiento territorial, a convenios de cooperación del año 2016. .Elaborado informe sobre acciones de Subsecretaría Intergeneracional, referente a políticas de Pueblos Y Nacionalidades para enviar a la Dirección de Participación Ciudadana. .Centro Residencial del Distrito Azogues cooperante del MIES, suscribe convenio de cooperación con universidad Católica de Cañar, para prestación de servicio de medicina general, médico gerontólogo y psiquiatra. .En la Zona 7, el 98% de los convenios del 2016 están liquidados. .En la Zona 6 el cuarto desembolso se encuentra para pago en el Ministerio de Finanzas. .Efectuada la capacitación mediante conferencia de capacitación virtual sobre Reinserción Familiar a 160 operadores de centros residenciales.	López Rodríguez, Juan Domingo	10/01/2017 - 09:45 AM
OCTUBRE 2016: Ejecución presupuestaria al 79.39% .Se cuenta con el 100% de la sistematización de la información de los operadores que participan en la capacitación de la plataforma virtual. .Se elabora los reportes semanales de convenios PAM del año 2016. .Seguimiento de CURS pagados y pendientes de pago Gasto de Inversión. .Elaborado el documento final del proyecto reformulado "AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS" así como los anexos (Guías operativas, fichas de calidad, norma técnica, cronograma valorado, flujo económico y financiero, manual de procesos de permisos de funcionamiento), para solicitud de dictamen de prioridad por parte de Senplades para los años 2017 y 20178 .Elaborada la presentación de institucionalidad para presentación autoridades superior jerárquico del MIES - Subsecretaría Atención Intergeneracional. .Realizado Informe HITO 67 GPR EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto (tercer desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado. .Realizado Informe HITO 68 GPR EJECUCIÓN: Informe de transferencia del cuarto desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado. .Seguimiento a las Coordinación Zonal 7, se realizaron reuniones de trabajo con los técnicos responsables de la Coordinación Zonal y de los Distritos Loja, Calvas, Zamora, Machala y Piñas, con el fin de conocer la situación actual de los centros y servicios gerontológicos que mantienen convenios con el MIES. .Las actas de finiquito del año 2016 correspondientes a la Zona 7, que están en proceso de liquidación se encuentran en jurídico para que el cooperante las firme. .Seguimiento sobre presupuesto para convenios de la Zona 6, realizado. .Seguimiento Coordinación Zonal 1, Distritos Ibarra y Tulcán. .En el Distrito Tulcán, en los convenios de Atención Domiciliaria correspondientes a Mujeres sin Fronteras y FUNDESIG, se logro que presenten la documentación para la liquidación de segundo y tercer desembolso.	López Rodríguez, Juan Domingo	11/11/2016 - 09:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.En el Distrito Tulcán, esta pagado el tercer desembolso de los convenios y solicitado el pago del cuarto desembolso al ministerio de finanzas. .En el seguimiento a la Zona 4, en el Distrito Portoviejo los convenios de los GADS, Pichincha, Olmedo y Santa Ana, se verifica que cumplen con los lineamientos establecidos en la normativa técnica. .En el seguimiento a la Zona 5, se pudo constatar que en el Distrito El Empalme se ha presentado toda la documentación de 10 convenios para la liquidación. . En el Distrito Quevedo 7 de los 10 convenios están liquidados. .Participación en la construcción de las líneas discursivas para la intervención del señor Subsecretario en el evento de Hábitat.		
SEPTIEMBRE, 2016: .Se cuenta con el 95% de la sistematización de la información de los operadores que participan en la capacitación de la plataforma virtual. : Se elabora reporte semanal de convenios del año 2016. .Seguimiento de CURS pagados y pendientes de pago Gasto de Inversión. .Aprobada la propuesta por parte de la Subsecretaria de Atención Intergeneracional y autorizada por la señora Viceministra de Inclusión Social para la realización del evento del el Día Internacional del Adulto Mayor". TDRS elaborados. .Capacitación en proyecto socioeducativo a través de conferencia virtual para técnicos y operadores que atienden y cuidan a las persona adultas mayores en las 9 zonas y 40 distritos. .Realizada la Adaptación diseño grafico e ilustraciones del modulo "Moodle" para la plataforma virtual, .Realizada la Adaptación diseño grafico e ilustraciones del modulo "Desarrollo Personal" para la plataforma virtual. .Revisados con la Subsecretaria de Cambio Institucional, los aportes para la matriz de identificación y valoración de riesgos e identificación de los problemas y evaluación de la ocurrencia e impacto de los mismos, en los Servicios del MIES. .Elaborada la presentación de institucionalidad para presentación autoridades superior jerárquico del MIES - Subsecretaria Atención Intergeneracional. .Elaborada Certificaciones de Actividad y Presupuestarias para personal requerido Plataforma Virtual - Educomunicadora, Administrador de Plataforma. .Elaborada reforma de actividad y presupuestaria para Encuentro Nacional de Difusión de Política Pública y responsabilidad familiar, comunitaria de Adulto Mayor - Procedimiento Viceministerio y Coordinación Planificación .Realizado Informe Ejecutivo GPR Septiembre 2016 .Realizado Informe HITO 65 GPR Informe de cumplimiento Cuarto Desembolso Distritos Priorizados, Joya de los Sachas-Jama-Babahoyo (Circuito La Unión)-Sigchos. .Realizado Banco de Preguntas contratación Analista Financiera Octubre 2016. .Realización de la reunión de las Subsecretarias de Desarrollo Infantil, Protección Especial, Discapacidades y Atención intergeneracional, con los representantes de las organizaciones cooperantes de la Zona 1 y 2, con el fin de socializar y contar con aportes sobre la importancia de promover el conocimiento, análisis y discusión acerca de los servicios que brinda el MIES a través de la suscripción de convenios de cooperación económica. .Realizada la entrevista al Gerente para la elaboración de un video sobre los servicios de atención a las personas adultas mayores en coordinación con la Dirección de Comunicación del MIES y el medio de comunicación el Ciudadano. .En la Zona 1, Distrito Tulcán se mantuvo reuniones con organizaciones cooperantes, con el fin de establecer acuerdos para la suscripción de convenios de cooperación técnica, con el fin de mantener y ampliar cobertura. .Visita a las coordinaciones Zonales 1, 4, 5, 6, 7, y 9 y a sus respectivas Direcciones Distritales con el fin de contar con un diagnostico actualizado sobre el estado situacional de la liquidación de convenios de los años, 2014, 2015, 2016, para determinar acciones que faciliten el cumplimiento de lo estipulado en los convenios de cooperación.	ABARCA DURAN, XIMENA GUADALUPE	19/10/2016 - 04:58 PM
AGOSTO, 2016: Se elabora reporte semanal de convenios del año 2016. Seguimiento de CURS pagados y pendientes de pago Gasto de Inversión. Se sigue realizando el seguimiento para finiquitar los convenios del año 2014 y año 2015 que aun no se encuentran liquidados. En ese sentido se está dando seguimiento a los técnicos en territorio para que se logre la liquidación de los convenios. Seguimiento en territorio	ABARCA DURAN, XIMENA GUADALUPE	19/10/2016 - 04:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Distrito Tulcán: Cooperante Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, 80 PAM Visita domiciliaria Se da cumplimiento con los estándares establecidos en la Norma Técnica de Población Adulta Mayor Distrito Tulcán: Cooperante Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, 100 PAM Visita domiciliaria Se da cumplimiento con los estándares establecidos en la Norma Técnica de Población Adulta Mayor Distrito Tulcán: Cooperante Fundación Mujeres Sin Fronteras, 200 PAM Visita domiciliaria Se da cumplimiento con los estándares establecidos en la Norma Técnica de Población Adulta Mayor Distrito Tulcán: Gobierno Autónomo Parroquial La Concepción, 45 PAM Diurno. Se da cumplimiento con los estándares establecidos en la Norma Técnica de Población Adulta Mayor Programada la visita de seguimiento a territorio para coordinar acciones de trabajo con los Coordinadores Zonales, Directores Distritales y los cooperantes que dan atención en los centros y servicios gerontológicos Aprobada por el Subsecretario de Atención Intergeneracional la Propuesta de de la Actividad "PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES" (Día del adulto mayor) Definidas las fechas para la celebración del día del adulto mayor en Esmeraldas, Calceta, Tena y Quito. Elaborada la propuesta del Hito Comunicacional " Los Jóvenes y el Envejecimiento Positivo Adaptación diseño grafico e ilustraciones del modulo "Moodle" para la plataforma virtual, realizado Articuladas acciones para el evento de celebración del Día del Adulto Mayor en el mes de octubre, entre la Gerencia y la Dirección de Población Adulta Mayor Se cuenta con el 85% de la sistematización de la información de los operadores que participan en la capacitación de la plataforma virtual.1.Se realizo aportes para el desarrollo los componentes referentes al proyecto de inversión para presentar a SENPLADES relacionados con: 1.- Implementar un sistema de capacitación para personas que trabajen en la atención de adultos mayores, que incluyen guías de atención y evaluación de las personas mayores de 65 años componente capacitación y formación. 2.-Talleres y encuentros de sensibilización a la familia y comunidad en general sobre la situación de las personas adultas mayores y el apoyo para la organización y participación social para fortalecer la actoría social de las PAM y redes de cuidadoras/es. Elaboración matriz de Registro de Contratos emitido como requerimiento por SENPLADES para definición presupuesto 2016 y 2017 Elaboración reforma de actividad y presupuestaria para Encuentro Nacional de Difusión de Política Pública y responsabilidad familiar, comunitaria de Adulto Mayor. Elaboración de Propuesta de Capacitación "Directrices para liquidación y cierre de Convenios 2016" Seguimiento financiero, definición saldos disponibles para ejecución presupuestaria tercer cuatrimestre.		
JULIO, 2016: 1.Revisión y corrección de observaciones a la elaboración de la propuesta borrador para el "Taller de capacitación de seguimiento monitoreo y evaluación administrativa y financiera del proyecto de ampliación de coberturas y mejoramiento de los servicios de atención a las personas adultas mayores" 2.Resolución de observaciones al proyecto reformulado integral "Ampliación de cobertura y mejoramiento de los servicios de atención a personas adultas mayores en 24 provincias del país" generadas por el MCDS. 3.Reporte semanal de convenios firmados del año 2016, avance de liquidación de convenios año 2015. Seguimiento de CURS pagados y pendientes de pago Gasto de Inversión y Gasto Corriente 4.Análisis de los convenios firmados hasta diciembre, en base a la aplicación de la norma técnica para la calidad del servicio y las clausulas contractuales. 5.Reporte de alertas sobre primer y segundo desembolso, liquidaciones de los convenios firmados para la prestación de servicios a la población adulta mayor. 6.Se realiza la visita visita de campo al "Albergue Esteros II" para constatar la atención a la población adulta mayor, lamentablemente al momento de la visita no se encontraba la técnica encargada de la población adulta mayor por lo que nos atención Susana Delgado Pillasagua TAF del albergue, En el albergue se encuentran 245 personas de 65 familias, divididas en 4 bloques, 7.Visita a la Fundación Social Cristo Rey, se presta el servicio Diurno, en la cual se realizó una inspección de las instalaciones	ABARCA DURAN, XIMENA GUADALUPE	12/09/2016 - 10:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
8.Se elaboro formato de requerimiento para contratación de Administrador de Plataforma Virtual 9.Se elaboro formato de requerimiento para contratación de Educomunicador de la plataforma virtual 10.Se envió la propuesta del Modelo Pedagógico de capacitación para operadores encargados de la atención a personas adultas mayores, a la encargada de la encargada de el área pedagógica de la Plataforma Virtual de Desarrollo Infantil 11.Se está finalizando la propuesta de malla curricular 12.La Estratégica del Mejoramiento de Talento Humano de Desarrollo Infantil, envió los contenidos digitales de módulo moodle y de Desarrollo Personal a la Gerencia de Adulto Mayor, para la adaptación a la plataforma de capacitación de operadores que atienden a personas adultas mayores. 13.Se está recopilando y sistematizando la información de la base de datos, de los operadores que participaran en la Capacitación de la Plataforma Virtual.		
JUNIO, 2016: 1.Proyecto "AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIASDEL PAÍS" subido al SISTEMA SIPEIP y enviado para revisión del Ministerio Coordinador de lo Social. 2.Elaboración Informes para el Viceministerio por priorización para pago del primero desembolso desde el Ministerio de Finanzas efectuado entre el 21 y 22 de Junio 2016. 3.Elaboración de Informe para el Viceministerio por priorización para pago del Segundo Desembolso. 4.Elaboración Informe de seguimiento presupuestario semanal presupuesto comprometido, devengado y pagado al 30-06-2016. 5.Generación de alertas en liquidación de convenios año 2014 y 2015, por cada una de las zonas y distritos. 6.Generación de alertas por desembolsos no realizados año 2016. 7.Elaboración del Informe Situacional del Asilo "Hermanitas Corazón de María de la Zona 9" por un contingente presentado en el mes de Junio 2016 por la falta del segundo desembolso. 8.Envío de solicitud de habilitación Plataforma Virtual de Adulto Mayor al Director de Tecnologías Para la implementación de plataforma moodle para módulos de capacitación, información, y recreación dirigidos a: Operadores de los centros y servicios, de adultos mayores, Cuidadores de adultos mayores y comunidad, Adultos mayores 9.Aportes para la implementación de una nueva modalidad de atención denominada "Corresponsabilidad Comunitaria" para ser implementada en la Dirección de Población Adulta Mayor. 10.Elaboración de Agendas y metodología para el Taller de Reinserción Familiar, Ficha de Logros y Fichas de Seguimiento. 11.Reunión para coordinación de Implementación para la implementación de plataforma de capacitación. 12.Coordinación de Capacitación para Proceso de Reinserción, Ficha de Logros y Ficha de Seguimiento. 13.Elaboración de Informe sobre alertas por: oLa transferencia del segundo desembolso y la oportunidad con la que el Cronograma determinado por el Ministerio de Finanzas se esté ejecutando. Esto es particularmente importante por dos razones, a saber: #Para los casos de Convenios firmados sólo a 6 meses se hace urgente la necesidad del pago del segundo desembolso, puesto que sólo cumplido ese requerimiento será posible exigir la liquidación del Convenio, y; #Una vez liquidados los Convenios, será posible la verificación y análisis de la existencia de REMANENTES que pudieran ser utilizados para financiar la firma de nuevos convenios de acuerdo al lineamiento y priorización establecidas por las autoridades. 14.Informe sobre la existencia de avales y por pagos solicitados para Convenios firmados a 6 meses, como si los mismos hubiesen sido firmados a 12. El principal inconveniente es que con los convenios a 12 meses se habían programado 4 pagos y en su defecto 2 pagos a los convenios firmados a 6 meses. Esta situación se agrava cuando los cooperantes son GAD'S que no hubieren sido priorizados para el pago del segundo desembolso. A continuación se muestra la información de los Convenios en donde se mantiene ese inconveniente.	ABARCA DURAN, XIMENA GUADALUPE	07/07/2016 - 04:53 PM
MAYO, 2016: # Reformulación integral del Proyecto "AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS" generando el cálculo relacionado al ahorro que le representa al Estado (35 MILLONES DE DÓLARES) la puesta en marcha del proyecto, subido al SISTEMA SIPEIP. #Elaboración Resumen Ejecutivo Proyecto Emblemático Adulto Mayor.	ABARCA DURAN, XIMENA GUADALUPE	07/07/2016 - 03:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
#Elaboración Informes de Viceministerio desembolsos pendientes de pago al 11 Y 31 de Mayo de 2016. #Elaboración del diseño del modelo de atención de las PAM que se encuentran en albergues. #Elaboración Informe de seguimiento presupuestario semanal presupuesto comprometido, devengado y pagado al 20-05-2016. #Elaboración reforma presupuestaria integral Pagos de Arrastres 2015 y Reformulación del PAPP 2016. #Elaboración Certificación Presupuestaria para pago Contrato No. 074-MIES-SG-2015 al Proveedor El Telégrafo por 55 fotografías a \$3,5 cada una, según memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2016-026-M #Preparación de expediente Proceso de Régimen Especial RE - MIES 036-2015 / Contrato No. 074-MIES-SG-2015 Incluyendo documentación completa para ingreso solicitud de pago, con factura No.002-002-000001510 El Telégrafo E.P. #Participación en el grupo de trabajo del MIES para la elaboración de la propuesta técnica de atención integral a personas damnificadas por el desastre e implementación del Bono de Acogida. #Elaboración de instrumentos técnicos para la atención de PAM en el marco de la estrategia de atención integral. #Elaboración del informe de gestión del Proyecto de inversión 2014 - 2015 y febrero - abril 2016. #Reporte diario de avance de firma de convenios del año 2016, avance de liquidación de convenios año 2015, avance de aprobación de avales solicitados al Ministerio de Finanzas relacionados a los convenios del año 2016 #Compendio de documentos habilitantes para firmas de convenios de las Zonas 1-2-3-4-5-6-7-8-9. #Seguimiento a las 9 zonas I a estado de aprobación de avales, desembolsos. #Reporte semanal de avance de firma de convenios del año 2016, avance de liquidación de convenios año 2015, avance de aprobación de avales solicitados al Ministerio de Finanzas relacionados a los convenios del año 2016. #Generación de alertas en la firma de convenios del año 2016, liquidación de convenios año 2014 y 2015, por cada una de las zonas y distritos. #Envío de solicitud de habilitación Plataforma Virtual de Adulto Mayor al Director de Tecnologías. #Para la implementación de plataforma moodle para módulos de capacitación, información, y recreación dirigidos a: .Operadores de los centros y servicios, de adultos mayores, .Cuidadores de adultos mayores y comunidad .Adultos mayores #Aportes para la implementación de una nueva modalidad de atención denominada "Corresponsabilidad Comunitaria" para ser implementada en la Dirección de Población Adulta Mayor. #Elaboración de Agendas y metodología para el Taller de Reinserción Familiar, Ficha de Logros y Fichas de Seguimiento. #Reunión para coordinación de Implementación para la implementación de plataforma moodle. #Coordinación de Capacitación para Proceso de Reinserción, Ficha de Logros y Ficha de Seguimiento.		
ABRIL, 2016: El equipo de la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor", (PAM), durante el mes de Abril 2016, coordinó y ejecutó las siguientes actividades: 1.Presentación del Documento de propuesta de política pública para PAM 2.Presentación en Power Point sobre la propuesta de política pública 3.Reformulación de proyecto de inversión 2017 - 2019 avance en 80%.	ABARCA DURAN, XIMENA GUADALUPE	06/06/2016 - 02:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4.Realización de informes de seguimiento semanal y seguimiento financiero y de cobertura diarios sobre los avances de ejecución de convenios. 5.Realización de 4 Informes semanales de avances y alertas. 7.Elaboración de 7 Documentos de apoyo a la emergencia por Terremoto en 6 provincias afectadas. 8.Ejecución de 2 actividades de capacitación y revisión de documentos. 9. Seguimiento sobre el estado de liquidación de convenios 2015 y firma convenios 2016 de las zonas 6(Distritos: Macas-Gualaceo-Azogues y Cuenca) y la Zona 7 (Distritos Machala-Piñas-Lojas-Calvas y Zamora). 10. Seguimiento y consolidación en matriz sobre el estado de avales de las zonas 6(Distritos: Macas-Gualaceo-Azogues y Cuenca) y la Zona 7 (Distritos Machala-Piñas-Lojas-Calvas y Zamora). 11. Seguimiento al estado de reformas planteadas por los Distritos Loja, Piñas, Zamora y Azogues. 12. Elaboración de informe sobre estado situacional del Centro de Atención Directa Jama Pedernales Zona 4 por terremoto y condiciones generales de Adultos Mayores en Zona de Desastre: Zona 4 (Portoviejo, Chone, Santo Domingo). Zona 1 (Esmeraldas) 13. Seguimiento a la firma de convenios con el 97% de convenios firmados 2016. 14. Seguimiento a la transferencia del primer y segundo desembolso para ejecución de convenios en territorio. 15. Seguimiento indicador GPR de la SAI. 16. Seguimiento al cierre y liquidación de convenios liquidados con actas de finiquito, zonas 1 y 9		
MARZO, 2016: El equipo de la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor", (PAM), durante el mes de Marzo 2016, coordinó y ejecutó las siguientes actividades: 1.Elaboración de presentación y metodología para charla virtual de reinserción familiar 2.Participación en la reelaboración de Contenidos, Sylabus y evaluación para charla virtual sobre reinserción familiar 3.Revisión y aportes de la mediación pedagógica de las guías operativas de Atención Domiciliaria y Espacios Alternativos. 4.Seguimiento sobre el estado de liquidación de convenios 2015 y firma convenios 2016 de las zonas 6(Distritos: Macas-Gualaceo-Azogues y Cuenca) y la Zona 7 (Distritos Machala-Piñas-Lojas-Calvas y Zamora). 5.Seguimiento y consolidación en matriz sobre el estado de avales de las zonas 6(Distritos: Macas-Gualaceo-Azogues y Cuenca) y la Zona 7 (Distritos Machala-Piñas-Lojas-Calvas y Zamora). 6.Apoyo en contenidos para tríptico adulto mayor con enfoque intercultural , 7.Seguimiento ha estado de reformas planteadas por los Distritos Loja, Piñas, Zamora y Azogues. 8.Elaboración de informe sobre estado situacional del Centro de Atención Directa MIEEspacio de Sabiduría-Zona 6. 9.Seguimiento a la firma de convenios de zona 9 el 97% de convenios firmados 2016. 10.Seguimiento indicador GPR de la SAI. 11.Seguimiento al cierre y liquidación de convenios zona 9 97% de convenios liquidados y con actas de finiquito.	ABARCA DURAN, XIMENA GUADALUPE	05/05/2016 - 06:49 AM
FEBRERO 2016: Se realizó el cumplimiento de los siguientes hitos: - 56 (EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2016 en los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión), presentado), - 57 (EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2016, presentado), - 58 (EJECUCIÓN: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado), y - 59 (EJECUCIÓN: PAPP 2016 reformado) Para el desarrollo de los hitos 56 y 57 se realizó el seguimiento y acompañamiento técnico a las coordinaciones zonales y directores distritales que son cubiertos mediante gasto de inversión para la firma de convenios en la prestación de servicio de atención a la población adulta mayor, el cual incluye los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión). En relación a los desembolsos del primer desembolso El PAPP 2016 se lo realizó considerando el incremento presupuestario al inicial asignado a principios de año para el financiamiento del proyecto	ABARCA DURAN, XIMENA GUADALUPE	02/03/2016 - 08:32 AM
ENERO 2016: Durante el mes de Enero se realizó: la verificación de las metas de coberturas por la microplanificación 2016 en los 6 Distritos que se manejan desde inversión y el presupuesto	ABARCA DURAN,	01/03/2016 - 08:45 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
asignado para la ejecución de los servicios en las cuatro modalidades de atención. Por ser un año de restricción fiscal el presupuesto asignado fue reducido en un cincuenta por ciento, no obstante al final del mes de enero, SENPLADES informó un incremento hasta alcanzar el nivel que permitió realizar negociaciones con cooperantes. Todo este proceso de negociación y definición de presupuestos, retrasó la firma de convenios. No obstante se realiza seguimiento para el cierre de convenios 2015 y la obtención de avales para firma de convenios 2016. El Programa Anual de la Política Pública - PAPP 2016 fue consolidado y aprobado por la Sra. Ministra el 15 de Enero 2016.	XIMENA GUADALUPE	
DICIEMBRE 2015: Con el objetivo de alcanzar las metas de cobertura prevista para el 2016, la Gerencia participó de los diversos talleres de microplanificación realizados con el Viceministerio para definir fichas de costos y alcance de coberturas. Así mismo se han coordinado reuniones con cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritales realizando seguimiento de Convenios y cumplimiento de objetivos 2015. En dichas reuniones también se han tratado temas relativos a la definición de lineamientos para la suscripción de convenios para atención a PAM 2016. El resultado final de dichos talleres de microplanificación fue el Informe de Microplanificación 2016, Analizado por Zonas el cuál brinda información relativa a las características propias de la Zona (población total, relación población adulta mayor, % de atención proyecto sobre población total adulta mayor atendida por el MIES; número de adultos mayores en pobreza y pobreza extrema). El propósito es identificar nudos críticos para resolverlos, así como identificar y fortalecer las competencias y habilidades de cada Zona a fin de potenciarlas para el año 2016. Por otra parte en el tema de seguimiento y monitoreo, durante este mes se realizaron visitas a cada una de las Direcciones Distritales para verificar el alcance de cobertura y servicios por cada una. Este seguimiento permitió la identificación de problemas críticos, la verificación de documentación habilitante y la verificación del segundo desembolso 2015. Con esta información como insumo, se realizaron recomendaciones y un plan de mejoras mismo que se planifica hacer seguimiento durante el primer trimestre del 2016. Todos estos insumos y productos han sido informados y presentados por la Subsecretaria al Despacho Ministerial. El día 14 de Diciembre y por solicitud expresa del Despacho Ministerial se realizó una auditoría a la Coordinación Zonal 9, el propósito fue identificar las inconsistencias observadas en el tema de cobertura firmada en Convenios y la real que cada Cooperante sube a la base SIIMIES en Ficha de Usuario. A través de esta auditoría se lograron identificar algunas situaciones anómalas que se están regulando a la fecha y que serán definitivas para la renovación del Convenio 2016. Dichas incongruencias también fueron evidenciadas en la Zona 8, por tanto a la fecha se está planificando el mismo procedimiento de auditoría realizado en la ZONA 9 para ser ejecutado durante el mes de Enero 2016. Durante la segunda y tercera semanas del mes de Diciembre se trabajó con la DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN la definición previa del PAPP 2016, utilizando como insumo los valores reales ejecutados por el 2015. Con este fin, se envió a PLANIFICACIÓN una matriz previa de PAPP 2016. Los días los días 28 y 29 de diciembre del 2015 se participó en la inducción de los "LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - PAPP 2016. Por tanto se ha estado trabajando en el PAPP 2016 definitivo para enviarlo a Planta Central, no obstante se espera definiciones de techos presupuestarios definitivos desde el Ministerio de Finanzas. Mediante este taller se identificó la necesidad de modificar la estructura programática ESIGEF a fin de obtener información por modalidad de servicio. Con ese propósito se solicitó a PLANIFICACIÓN se realizará dicho cambio para el 2016, tanto en estructura PAPP, como en sistema ESIGEF. El día 30 de Diciembre se realiza el Informe Anual 2015 de la Gerencia del Proyecto Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 provincias del país, en ese mismo orden se realiza el Informe Anual de Ejecución Primer y Segundo Desembolso del Proyecto 2015, así como el Informe Anual de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión.	ABARCA DURAN, XIMENA GUADALUPE	29/02/2016 - 10:06 PM
NOVIEMBRE 2015: El equipo de la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor", (PAM), durante el mes de noviembre, colaboró, coordinó y ejecutó las siguientes actividades: .Se colaboró con los analistas financieros y técnicos de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para la validación de datos respecto a la liquidación de los convenios 2014 y para el primer desembolso del año 2015.	Morán Cevallos, Ana Maryté	08/12/2015 - 03:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Se ha efectuado el seguimiento para la ejecución del proceso de elaboración de material educativo (videos de acondicionamiento corporal) dirigido a operadores en el tema del cuidado integral del adulto mayor, el contrato ya se encuentra firmado y se está ejecutando. .Coordinó con los distritos de: Esmeraldas, Tena y Ambato, para la ejecución de los encuentros Interculturales de pueblos y nacionalidades del Ecuador Costa, Sierra y Amazonia que se realizaron en este mes. .Colaboró en el proceso de seguimiento y coordinación con la dirección distrital de Morona Santiago sobre el estado del proceso del "Encuentro de operadores" que se realizará en la ciudad de Macas con la participación de los distritos de Macas, Tena, Orellana, Rumiñahui, Lago Agrio, Puyo, Zamora, Carchi, Ibarra, Esmeraldas. .Elaboración de hoja de ruta para coordinación en casos de personas perdidas y desaparecidas con la Fiscalía y la DINASED, así también se participó en la reunión convocada por el Viceministerio con la presencia de las dos entidades. .Participación en Mesa Técnica para la Unidad de costos y economía del sector convocada por el Director de investigación y análisis de datos de Inclusión del MIES. .Elaboración de matriz de planificación desglosada por tópicos (i) programáticos, (ii) coyunturales, y (iii) de gestión con programación hasta diciembre 2015. .Realización de la ejecución presupuestaria del proyecto de "Ampliación de la cobertura y mejoramiento de los servicios de atención a personas adultas mayores en 24 provincias del país" hasta octubre y planificación hasta diciembre 2015. .Realizó el informe de presupuesto para año 2016 y planificación año 2016. .Generó la matriz de presupuesto por zonas y distritos, la cual mantiene el mismo presupuesto y se considera la misma ficha de costos, la misma cobertura en tres modalidades y distribuyendo la modalidad de atención domiciliar en espacios alternativos. .Entregó las Guías Operativas para revisión de la Subsecretaría y presentación final de la misma. .Elaboró y envió las matrices para la realización de valoración funcional de las personas adultas mayores de los centros y servicios gerontológicos del MIES a nivel nacional. .Realizó la consolidación de la información de los convenios de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la plataforma Alfresco en la matriz con la que se trabajará en el seguimiento en territorio. .Elaboró nueva propuesta de presupuesto ajustado al PAPP, con ajuste según costo de talento humano para el año 2016 del proyecto de adulto mayor y de la dirección de adulto mayor con escenarios, y elaboración de fichas de costos acorde al presupuesto ajustado. .Elaboró la matriz de seguimiento a los convenios de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para levantar información en el seguimiento en territorio, así también se completo, unificó y valido la información con el Esigef .Colaboró y participó el día 23 de noviembre de 2015 en la ciudad del Tena en el "Encuentro Regional Intercultural de Difusión de la Política Pública para el Diseño de las Modalidades de Atención a Población Adulto Mayor de Pueblos y Nacionalidades de la Amazonia Ecuatoriana" con la participación de 140 adultos mayores y representantes de las nacionalidades: Secoya - Siona - Shiwiar - Zápara - Achuar - Shuar - Kichwa Amazonía - Waorani. .Colaboró y participó en el "Encuentro Regional Intercultural de Difusión de la Política Pública para el Diseño de las Modalidades de Atención a Población Adulto Mayor de Pueblos y Nacionalidades de		
OCTUBRE 2015: El equipo de la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM), durante el mes de octubre ejecutó las siguientes actividades: .Se desarrolló el encuentro Intergeneracional con jóvenes y adultos mayores de Dayuma, franja del Yasuní el 17 y 18 de octubre del 2015, con una participación de alrededor de 150 participantes jóvenes y adultos mayores de la Zona de Dayuma. .Colaboró y participó en la realización del "Día por los Derechos del Adulto Mayor", el cual tuvo lugar en la ciudad de Quito en la Estación del Ferrocarril de Chimbacalle, el 19 de Octubre de 2015. En dicho evento participaron aproximadamente 1000 adultos mayores provenientes de la Zona 9: Distritos Norte, Centro y Sur. .Se efectuó el encuentro con Adultos Mayores de Nacionalidad Waorani, Provincia Orellana el 21 de octubre del 2015, con la participación aproximada de 100 adultos mayores. .Se realizó con el equipo técnico de la CZ3 y el Distrito Riobamba el "Encuentro de Fortalecimiento de las Políticas públicas con Operadores de centros y servicios gerontológicos" de los distritos: Riobamba, Latacunga, Ambato, Zona 9 (3 distritos Norte, Centro y Sur), Portoviejo, Manta, Chone, Jama, Santo Domingo, Babahoyo, Quevedo, Guaranda y Azogues; el día viernes 30 de octubre con la participación de un aproximado 712 operadores. .El presupuesto de inversión asignado al Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM) para el ejercicio fiscal 2015 es de USD 13'444.239,83, al 30 de octubre de 2015, se presenta una ejecución del 89,15%. El grupo de gasto 78 "Transferencias y Donaciones de Inversión" presenta una ejecución del 95,43%. Con respecto al grupo de gasto 73 "Bienes y servicios para Inversión" que presenta	Valencia, Bertha Susana	06/11/2015 - 12:38 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
una ejecución de 32,12%. El grupo de gasto 71 "Gastos en personal" presenta una ejecución del 46,74		
AGOSTO 2015: La Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de cobertura y mejoramiento de los servicios a población adulta mayor (PAM)" ha realizado: 1.Par el cumplimiento del Hito 40 se realiza el informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos para la atención a PAM 2015. Resultado de la transferencia hacia cada Dirección Distrital del primer desembolso para el pago de los Convenios suscritos en el año 2015 y el inicio de los pagos correspondientes al segundo desembolso conforme se realiza la liquidación del primer semestre. 2.Par el cumplimiento del Hito 41 se realiza el informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM 2015. El grupo de gasto 78 "Transferencias y Donaciones de Inversión" presenta una ejecución del 81.80% resultado de la transferencia hacia cada Dirección Distrital del primer desembolso para el pago de los Convenios suscritos en el año 2015 y el inicio de los pagos correspondientes al segundo desembolso conforme se realiza la liquidación del primer semestre.	Valencia, Bertha Susana	23/10/2015 - 10:17 AM
SEPTIEMBRE 2015: La Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de cobertura y mejoramiento de los servicios a población adulta mayor (PAM)" ha realizado: 1.Se han desarrollado a la fecha dos de tres encuentros programados, (Puyo 8, 9 y 10 de septiembre con 100 PAM), (Tena 27,28 y 29 de septiembre con 100 PAM), con la finalidad de presentar a los adultos mayores Waorani-Pikenani de manera pedagógica las políticas públicas para la atención de adultos mayores, con una participación aproximada de 200 PAM de las provincias de Pastaza y Napo 2.Se capacitó a través de un taller vivencial para fortalecer las capacidades de los técnicos del MIES, cuidadores y operadores de los servicios de atención gerontológica que trabajan con la población adulta mayor de la zona priorizada de Jama-Pedernales para brindar un trabajo con eficiencia y calidad. 3.El porcentaje de ejecución presupuestaria al 30 de septiembre es: grupo de gasto 78 "Transferencias y Donaciones de Inversión" presenta una ejecución del 95,14%, grupo de gasto 73 "Bienes y servicios para Inversión" que presenta una ejecución de 8,58%, y grupo de gasto 71 "Gastos en personal" presenta una ejecución del 39,78%.	López Bautista, Cristina Elizabeth	21/10/2015 - 12:33 PM
JULIO 2015 En el mes de julio de 2015 la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM) ha realizado visitas de seguimiento para la liquidación del primer desembolso de recursos realizado a todas las Direcciones Distritales Loja, Calvas, Zamora y la zona 4. Se capacitó a 130 operadores de los Centros y Servicios Gerontológicos Directos y de convenio del Distrito Piñas, en temáticas de Derechos, Procedimientos e Instrumentos de valoración, Cuidados Paliativos, Autocuidado y Autoestima. Para esta capacitación se coordinó con el Ministerio de Salud Pública en el auditorio del Municipio de Piñas, los días 23, 24 de julio. Elaboración de directrices para la Microplanificación 2016, fueron enviadas a la Dirección de Planificación, el 26 de julio del 2016. Se revisó del primer borrador del Manual de permisos de funcionamiento para los centros y servicios, martes 30 de julio. Se llegaron acuerdos con la Dirección de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública para establecer los mecanismos de referencia y contrareferencia. Se realizó seguimiento de planes de mejora y se evaluó las solicitudes de los Centros de Milagro, Quevedo, Babahoyo y Guaranda.	Jimenez, Honorio	28/08/2015 - 04:20 PM
JUNIO 2015 En el mes de junio de 2015 la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM) ha realizado visitas de seguimiento y consolidación de cobertura real y presupuestos en los territorios cotejando esta información con la micro planificación 2015 y las coberturas registradas en el sistema SIMIES, previo a la liquidación del primer desembolso de recursos realizado a todas las Direcciones Distritales. Se ha realizado la coordinación de agendas con el territorio, reuniones de trabajo en los Distritos, elaboración de procesos precontractuales, formulación de reformas presupuestarias y cronogramas de programación, procesos previos necesarios a fin de ejecutar las actividades programadas en territorio para el mes de julio de 2015. Se actualizó y reformuló el Proyecto de Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a la Población Adulta Mayor en 24 Provincias del País con proyección al año 2019 Se Ingreso y postuló el Proyecto de Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a la Población Adulta Mayor en 24 Provincias del País en el Sistema SIPeIP de Senplades	Jimenez, Honorio	03/07/2015 - 06:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se efectuó visita de seguimiento a las Zonas 2 y 3. Se realizó una capacitación en educación y formación del modelo de atención y gestión al equipo técnico del MIES; cuidadores y operadores de servicios a personas adultas mayores del distrito priorizado 13D10 cantón Jama. Se ejecuto el Conversatorio Aporte Metodológico para la construcción de la modalidad de atención PAM de Pueblos y Nacionalidades; con dirigentes indígenas de la Sierra y Amazonia.		
MAYO 2015: En el mes de mayo de 2015 la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM) ha concentrado sus esfuerzos en la coordinación de agendas con el territorio, elaboración de Procesos Precontractuales, formulación de Reformas Presupuestarias y cronogramas de programación, procesos previos necesarios a fin de ejecutar la realización de los eventos programados para el mes de junio de 2015, como son: - oSegundo encuentro de operadores para el mejoramiento de la calidad de la atención a Población Adulta Mayor , 3 eventos a realizarse para las provincias de la Costa, Sierra y Amazonía en las ciudades de Machala, Riobamba y Macas - oEncuentro intergeneracional para la vinculación de Jóvenes al mejoramiento de la calidad de la atención de los Servicios de Atención a Población Adulta, eventos a realizarse en las zonas 6 y 9, en las ciudades de Cuenca y Quito. - oEncuentro de Difusión de la Política Pública para el diseño de modalidades de atención a Poblaciones Adulta Mayor de Pueblos nacionalidades del Ecuador, 3 eventos a realizarse para las provincias de la Costa, Sierra y Amazonía en las ciudades de Esmeraldas, Riobamba y Puyo. - oEncuentro para el aporte metodológico de dirigentes a los encuentros regionales para el diseño de la modalidad de Adulto Mayor, evento a realizarse en la zona 3 ciudad de Riobamba. - oEncuentro de Difusión de la Política Pública para la atención y diseño de modalidades a Poblaciones de Pueblos y nacionalidades del Ecuador, 3 eventos a realizarse con las nacionalidades Pikenani en las Provincias de Puyo, tena y El Coca - oCapacitación en educación y formación del modelo de atención y gestión a técnicos -cuidadores y operadores de servicio a personas adultas mayores en zonas priorizadas por Senplades"; 3 eventos a realizarse en las zonas definidas como priorizadas, esto es Babahoyo, Jama, Sigchos y Joya de los Sachas. - oEncuentro de Adultos Mayores y Jóvenes de Pueblos y nacionalidades para el fortalecimiento de las capacidades de interrelación intergeneracional, evento a realizarse en la zona 2, Provincia de Orellana. Además, se ha consolidado la información de coberturas y presupuestos de convenios 2015 a partir de la regularización de las metas de micro planificación del Proyecto en las 40 Direcciones Distritales del Ministerio. Se ha realizado la coordinación Interinstitucional para la Realización del Evento Sudamericano del Adulto Mayor convocado por Unasur. Se efectuó visita de seguimiento a la Zona 1. Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de la gestión del MIES en las Zonas Priorizadas. Se ha formulado un Sistema de seguimiento del Proyecto de Adulto Mayor. El proceso de liquidación de Convenios 2014 presenta un total de convenios liquidados del 91%.	Jimenez, Honorio	02/06/2015 - 04:02 PM
ABRIL 2015: En el mes de abril de 2015 la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM); consolido la información sobre el número de unidades de atención a convenios 2015 a partir de la regularización de las metas de la micro planificación de las 40 Direcciones Distritales del Proyecto. Se han realizado las transferencias de recursos económicos para desembolsos en los convenios en las 24 provincias del país, con un porcentaje de ejecución del 49% a nivel nacional. Realizada y aprobada reforma presupuestaria del proyecto de inversión enviado para aprobación de la Coordinación General de Planificación mediante Memorando Nro. MIES-SAI-2015-0298-M de 30 de abril del 2015. En lo referente a la liquidación de convenios 2014, con corte al 30 de abril de 2015, de un total de 321 convenios, se encuentran liquidados el 82% , manteniendo aún el 18% de los convenios en proceso de liquidación.	Jimenez, Honorio	13/05/2015 - 11:51 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2015: 1. Se efectuó la suscripción de 437 convenios, para proceder a la transferencia de recursos.2. 2. Se Efectuó las transferencias y se cuenta con un reporte actualizado del seguimiento al proceso de ejecución presupuestaria en el sistema Esigef . 3. Con Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2015-0009-M se solicito aprobación de cambio de fecha estimada de Hito 23 y 24	Jimenez, Honorio	06/04/2015 - 09:33 AM
ENERO 2015: 1. Mediante oficio s/n de fecha 14 de enero del 2015 el consultor realiza la entrega del Informe de diagnóstico de la situación de operadores de los servicios de atención a PAM y Plan de Capacitación,. HITO 21 2. No se efectuaron transferencias FEBRERO 2015: 1. Se efectuó la suscripción de 427 convenios, para proceder a la transferencia de recursos.2. 2. Se elaboró el PAPP 2015 para aprobación respectiva. HITO 22. 3. No se efectuaron transferencias.	Jimenez, Honorio	04/03/2015 - 08:59 AM
DICIEMBRE 2015: Con el objetivo de alcanzar las metas de coberturas previstas para el 2015 la Gerencia participó de los talleres de microplanificación realizados con cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritales en los cuales se definieron y acordaron los lineamientos para la suscripción de convenios para atención a PAM. Oficialmente se remite el PAPP 2015 de Planta Central del proyecto. La ejecución global de proyecto alcanza el porcentaje previsto una vez que se ha procedido con la entrega del tercer desembolso a los cooperantes. La consultoría para "Diagnóstico de necesidades de capacitación para operadores de los servicios para PAM" presenta el segundo producto "Plan de Capacitación", el cual ha sido revisado y ajustado en coordinación con la Dirección de Población Adulta Mayor.	Quisintuña Telenchana, María Josefa	23/02/2015 - 12:39 PM
NOVIEMBRE 2014: El contrato para la consultoría que realizará el Diagnóstico de necesidades de capacitación de los operadores de los servicios se suscribió el 17 de Octubre del 2014, se le entregó el primer desembolso contra la entrega de la póliza del buen uso del anticipo, los plazos para entrega de sus productos se definieron con el siguiente esquema: a los 30 días la entrega del Plan de Capacitación y a los 90 días la entrega del Fortalecimiento de Organizaciones Sociales que trabajan con PAM, es decir la entrega del producto final se realizará el 14 de Enero del 2015. En relación al primer producto, la consultora solicita una ampliación de 15 días para la entrega del producto Plan de Capacitación, quedando como nueva fecha de entrega del primer producto el 1 de Diciembre del 2014, este requerimiento lo justifican con el objetivo de tener un mayor tiempo de recolección de información y por ende una mejor representatividad de los datos. Se elimina el hito "Informe de capacitación para operadores de servicios de atención a PAM" ya que todas las actividades relacionada con este componente pasan al 2015 enmarcadas en los resultados obtenidos de la consultoría.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	16/12/2014 - 08:37 AM
OCTUBRE 2014: Se presentó un retraso en la suscripción de acta para adjudicación de la consultoría especializada vinculada al proceso de capacitación debido a que en el área Administrativa se traspapela el expediente, se espera la suscripción el día 7 de Octubre de 2014, con la cual se redefinirán los hitos vinculadas a la misma. Con Memorando Nro. MIES-SAI-2014-0713-M se solicita a las Direcciones Distritales el envío de las copias de los nuevos convenios para atención a Personas Adultas Mayores suscrito durante el segundo semestre del presente año con sus respectivos proyectos, actas de finiquito o convenios modificatorios (adendas), actualmente se continúa receptando esta información para actualizar la base de datos e información, así como también se está realizando el respectivo análisis. La Ficha de proyecto de inversión PAI 2015 ajustada al techo presupuestario definido por SENPLADES, el cual fue aprobado por \$13.481.801,88 y tener un incremento del 12% en relaciona la cobertura 2014, de manera simultánea se definieron lineamientos para la micro planificación a nivel distrital.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	17/11/2014 - 10:00 AM
SEPTIEMBRE 2014: Durante este mes se ha definido la intervención del proyecto para el año 2015 la cual se ha sido presentada a SENPLADES, adicionalmente se cuenta con una planificación territorial a nivel distrito para ampliar cobertura en un 5% más en relación a la cobertura 2014. Se cuenta con una propuesta para incrementar la asignación presupuestaria costo/día/adulto mayor en todas las modalidades de atención. En relación a la contratación de la consultoría especializada, se deberá ajustar el tiempo de implementación de la misma ya que por motivos de orden administrativo, las fechas programadas en especial la la firma la firma del acta de adjudicación presentó un retraso.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	07/10/2014 - 10:50 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2014: Durante el mes de Agosto se realizaron visitas de seguimiento a la implementación de convenios, así como a la ejecución presupuestaria con el objetivo de definir una hoja de ruta para la utilización de los recursos. Se presentó al Viceministerio la propuesta para la entrega y renovación de permisos de funcionamiento a nivel nacional para los servicios a PAM. En el primer semestre existió un recorte presupuestario de \$42.075 USD de la partida 71 del proyecto afectando el presupuesto asignado inicialmente, no se ha procedido a realizar reprogramación presupuestaria ya que se espera que estos recursos sean restituidos.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	30/09/2014 - 01:03 PM
JULIO 2014: Durante este mes la Gerencia del proyecto una vez culminadas las visitas de seguimiento a los convenios de atención a PAM ha procedido a realizar la actualización de la información de los mismos, en especial la referente a cobertura por cada una de las modalidades de atención, adicionalmente se ha realizado un riguroso seguimiento a la liquidación y pago del segundo desembolso a los mismos. La Gerencia se encuentra desarrollando insumos técnicos para la implementación de fondos concursables para el 2015, así como también se han realizado ejercicios técnicos de planificación para la ejecución del proyecto en el 2015 tanto en lo referente a servicios, capacitación, evaluación y seguimiento.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	25/08/2014 - 04:06 PM
JUNIO 2014: Durante este mes se realizaron visitas de seguimiento a los servicios de atención por convenio con el objetivo de confirmar cobertura por modalidades de atención, así como apoyar el proceso de liquidación del primer desembolso, para este trabajo se realizaron capacitaciones al personal técnico y se desarrollaron instrumentos que permitan la recolección de la información más relevante para las situaciones antes mencionadas. Se elaboraron documentos técnicos (Cronograma valorado 2015 e informe de gestión 2014) para proceder con la postulación del proyecto en el SIPEIP, actualmente el proyecto se encuentra postulado para su operación. La ejecución presupuestaria se irá incrementando a medida que a nivel distrital se completen los procesos de liquidación de convenios, probablemente el monto programado a ejecutarse en el mes de Junio se vea afectado y su ejecución se concrete en el mes de Julio. Con respecto al tema comunicacional y los productos planificados en este sentido, cabe señalar que el Dirección de Población Adulta Mayor, la Gerencia del Proyecto y la Dirección de Comunicación del MIES han trabajado en la construcción de una estrategia nacional para la promoción de los derechos de la PAM, la cual se encuentra en aprobación y es la que se utilizará como estrategia marco para todo lo que se produzca en este sentido, con este antecedente el proyecto ha tenido que ajustar las fechas programadas para producir el material planificado	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	22/07/2014 - 11:57 AM
MAYO 2014: Se realizó visitas de seguimiento y evaluación a los servicios de atención a PAM en las zonas de intervención del proyecto, durante este proceso se aplicaron las fichas de calidad para evaluar cumplimiento de la norma técnica, así como para implementar planes de mejora. En coordinación con el Viceministerio, se define el cronograma, proceso e instrumentos para la liquidación del primer desembolso realizado a los convenios.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	23/06/2014 - 08:49 AM
ABRIL 2014: Se realizó la transferencia de recursos para la suscripción de 13 convenios pendientes a nivel nacional, se definió el modelo de seguimiento a convenios de atención a PAM y se realizó la evaluación de gestión trimestral del proyecto.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	28/05/2014 - 11:09 AM
MARZO 2014: Se realizaron mesas de trabajo a nivel nacional con cada una de las zonas, con lo cual se pudieron despejar inquietudes en relación a la suscripción de convenios, así como también determinar los requerimientos presupuestarios existentes. Se realizó una reforma presupuestaria con el objetivo de solventar el tema de los requerimientos existentes, la cual ya ha sido aprobada.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	21/04/2014 - 03:52 PM
FEBRERO 2013: Se construyó la base de datos nacional de convenios de atención a PAM para seguimiento y evaluación, adicionalmente se tiene un 100% de ejecución presupuestaria en los recursos asignados para cumplir con el primer desembolso de los convenios suscritos. Se cuenta con un archivo físico de los convenios firmados a nivel nacional un total de 292 convenios.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	25/03/2014 - 10:02 AM
ENERO 2013: Durante este mes se realizó la suscripción del 100% de los convenios de cooperación para atención a las personas adultas mayores planificados, adicionalmente se ha realizado la consolidación de la información de manera digital y física de los convenios y se cuenta con un reporte actualizado del seguimiento al proceso de ejecución presupuestaria en el sistema Esigef.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	21/02/2014 - 09:54 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
4- ORGANIZACIONAL. * General. El cambio de autoridades CAUSARÍA el retraso de las actividades ya planificadas	08/05/2017	Anna Cristina Ruiz Morales	40 %	70	28	1/3

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
9	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
10	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
11	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
12	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
13	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
14	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
15	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
16	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
17	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
18	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
19	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
20	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	(Planificación) Dictamen de prioridad del proyecto	9-Entregables Formales	03/01/2014		03/01/2014		Sí	2.0
2	(Planificación) Aprobación de convenios a nivel nacional	5-Entregables Intermedios	24/01/2014		24/01/2014		Sí	1.0
3	(Planificación) PAPP del proyecto reprogramado.	9-Entregables Formales	10/02/2014		10/02/2014		Sí	1.0
4	(Ejecución) Base de datos de convenios suscritos, validada.	5-Entregables Intermedios	21/02/2014		21/02/2014		Sí	1.0
5	(Ejecución) Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios de atención a PAM 2014.	5-Entregables Intermedios	24/02/2014		24/02/2014		Sí	1.0
6	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.	5-Entregables Intermedios	04/04/2014		04/04/2014		Sí	1.0
8	(Ejecución) Plan de capacitación para operadores de servicios de atención a PAM.	5-Entregables Intermedios	28/04/2014		28/04/2014		Sí	1.0
9	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.	5-Entregables Intermedios	05/05/2014		05/05/2014		Sí	1.0
10	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.	5-Entregables Intermedios	29/05/2014		29/05/2014		Sí	1.0
11	(Ejecución) Informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios de atención a PAM 2014.	5-Entregables Intermedios	02/07/2014		02/07/2014		Sí	1.0
12	(Ejecución) Informe de la evaluación semestral del proyecto.	9-Entregables Formales	22/07/2014		22/07/2014		Sí	2.0
13	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
14	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.	5-Entregables Intermedios	11/09/2014		11/09/2014		Sí	1.0
15	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.	5-Entregables Intermedios	01/10/2014		01/10/2014		Sí	1.0
16	(Ejecución) Acta de adjudicación del contrato, entregada	5-Entregables Intermedios	14/10/2014		14/10/2014		Sí	2.0
17	(Ejecución) Plan de trabajo, recibido	5-Entregables Intermedios	28/10/2014		28/10/2014		Sí	1.0
18	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		30/10/2014		Sí	1.0
19	(Ejecución) Informe del diagnóstico de la situación de operadores de los servicios de atención a PAM y Plan de Capacitación, entregado	5-Entregables Intermedios	02/12/2014		02/12/2014		Sí	2.0
20	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.	5-Entregables Intermedios	02/12/2014		02/12/2014		Sí	1.0
21	(Ejecución) Informe del Diagnóstico y plan de fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Atención a PAM a nivel nacional., entregado	9-Entregables Formales	15/01/2015		15/01/2015		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: PAPP 2015 para aprobación elaborado	9-Entregables Formales	28/02/2015		28/02/2015		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos de los distritos no priorizados, entregado.	9-Entregables Formales	30/03/2015		06/04/2015		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos en los distritos priorizados de Joya,	9-Entregables Formales	30/03/2015		06/04/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.							
25	EJECUCIÓN: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión para la atención a PAM 2015, entregado	5-Entregables Intermedios	10/04/2015		10/04/2015		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Transferencia de presupuesto a Coordinaciones Zonales para la firma de convenios, realizada.	5-Entregables Intermedios	10/04/2015		10/04/2015		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: PAPP del proyecto reprogramado.	4-Inicio de Trabajo	15/04/2015		15/04/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Informe de la evaluación realizada a los servicios de adulto mayor en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito, elaborado.	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos de los distritos no priorizados, entregado.	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión 2014, entregado.	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Informe de capacitación sobre atención integral al adulto mayor en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Informe del encuentro de Política Pública con los operadores de los servicios de adultos mayores, elaborado.	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Informe del encuentro de Política Pública con los operadores de los servicios de adultos mayores, presentado.	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Informe sobre el lanzamiento de del programa de capacitación para operadores de servicios de adultos mayores, elaborado.	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.	9-Entregables Formales	03/07/2015		03/07/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
36	EJECUCIÓN: Informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM 2015, entregado	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Informe del encuentro con Pueblos y Nacionalidades para el diseño de una modalidad de atención específica, presentado.	9-Entregables Formales	15/07/2015		15/07/2015		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		30/07/2015		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión para la atención a PAM 2015, entregado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM 2015, entregado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Informe del primer Curso sobre atención integral al adulto mayor (Norma Técnica) de los distritos no priorizados.	9-Entregables Formales	21/09/2015		08/10/2015		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Informe del primer Curso sobre atención integral al adulto mayor (Norma Técnica) en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.	9-Entregables Formales	21/09/2015		12/10/2015		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		12/10/2015		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Informe del segundo Curso sobre el manejo de instrumentos y herramientas de atención integral al adulto mayor en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.	9-Entregables Formales	21/10/2015		05/11/2015		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Informe del segundo Curso sobre el manejo de instrumentos y	9-Entregables Formales	21/10/2015		05/11/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	herramientas de atención integral al adulto mayor de los distritos no priorizados.							
46	EJECUCIÓN: Contrato para la elaboración de videos de acondicionamiento corporal, firmado	9-Entregables Formales	10/11/2015		10/11/2015		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los distritos no priorizados, entregado.	9-Entregables Formales	16/11/2015		20/11/2015		Sí	1.0
48	EJECUCIÓN: Informe del monitoreo a los convenios en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Elaboración de PAPP 2016, entregado.	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN: Informe anual de la gestión del proyecto, entregado.	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Informe de transferencia del tercer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM 2015, entregado	5-Entregables Intermedios	15/12/2015		15/12/2015		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Informe Anual de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.	9-Entregables Formales	30/12/2015		30/12/2015		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Acta de entrega-recepción de los videos de acondicionamiento corporal, presentado.	9-Entregables Formales	09/01/2016		09/01/2016		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: Informe consolidado de la liquidación de convenios suscritos en el 2015	9-Entregables Formales	29/01/2016		29/01/2016		Sí	1.0
55	EJECUCIÓN: PAPP 2016, aprobado	9-Entregables Formales	29/01/2016		29/01/2016		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2016 en los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión), presentado	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	1.0
57	EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2016, presentado	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	1.0
58	EJECUCIÓN: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
59	EJECUCIÓN: PAPP 2016 reformado	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	1.0
60	EJECUCIÓN: Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) Primer trimestre, presentado.	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0
61	EJECUCIÓN Informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado	9-Entregables Formales	28/04/2016		28/04/2016		Sí	1.0
62	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto (primer desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM , presentado.	9-Entregables Formales	29/04/2016		29/04/2016		Sí	1.0
63	EJECUCIÓN Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) segundo trimestre, presentado.	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
64	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto (segundo desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.	9-Entregables Formales	29/07/2016		29/07/2016		Sí	1.0
65	EJECUCIÓN: Informe de transferencia del tercer desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.	9-Entregables Formales	29/07/2016		29/07/2016		Sí	1.0
66	EJECUCIÓN Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) tercer trimestre, presentado.	9-Entregables Formales	29/09/2016		29/09/2016		Sí	1.0
67	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto (tercer desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	1.0
68	EJECUCIÓN: Informe de transferencia del cuarto desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	1.0
69	EJECUCIÓN: Informe anual de la gestión del proyecto, presentado	9-Entregables Formales	28/12/2016		25/01/2017		Sí	2.0
70	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto (cuarto desembolso) y cobertura de los convenios	9-Entregables Formales	28/12/2016		28/12/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado							
71	EJECUCIÓN: Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) cuarto trimestre, presentado.	9-Entregables Formales	28/12/2016		28/12/2016		Sí	1.0
72	EJECUCIÓN: PAPP 2017 inicial, aprobado	9-Entregables Formales	04/01/2017		04/01/2017		Sí	1.0
73	EJECUCIÓN: Informe de capacitación del Módulo sobre el uso del MOODLE	9-Entregables Formales	31/01/2017		31/01/2017		Sí	1.0
74	EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2017, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión), presentado	9-Entregables Formales	28/04/2017		28/04/2017		Sí	1.0
75	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento semestral en territorio a los servicios de los convenios suscritos, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión), presentado	9-Entregables Formales	30/06/2017	30/06/2017			No	1.0
76	EJECUCIÓN: Informe de capacitación realizada en el Módulo de Desarrollo Personal, presentado	9-Entregables Formales	31/07/2017	31/07/2017			No	1.0
77	EJECUCIÓN: Informe de transferencia de primero y segundo desembolso a los convenios 2017, realizado.	9-Entregables Formales	31/07/2017	31/07/2017			No	1.0
78	EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en los años 2014 y 2015	9-Entregables Formales	31/08/2017	31/08/2017			No	1.0
79	EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en el año 2016	9-Entregables Formales	29/09/2017	29/09/2017			No	1.0
80	EJECUCIÓN: Informe de capacitación realizada en el Módulo Módulo de Atención Integral	9-Entregables Formales	31/10/2017	31/10/2017			No	1.0
81	EJECUCIÓN: Informe de transferencia de tercer y cuarto desembolso a los convenios 2017, realizado.	9-Entregables Formales	30/11/2017	30/11/2017			No	1.0
82	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento semestral en territorio a los servicios de los convenios suscritos, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión), presentado	9-Entregables Formales	11/12/2017	11/12/2017			No	1.0
83	EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos por 6 meses en el año 2017, presentado	9-Entregables Formales	29/12/2017	29/12/2017			No	1.0
84	EJECUCIÓN: Informe anual de la gestión del proyecto, presentado	9-Entregables Formales	05/01/2018	05/01/2018			No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
85	EJECUCIÓN: PAPP 2018 inicial aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2018	31/01/2018			No	1.0
86	EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en el año 2017, presentado	9-Entregables Formales	29/06/2018	29/06/2018			No	6.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHILANES	Tenelema Taris, Piedad Norma	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/05/2017
2	Supervisión del 27-04-2017	Naranjo, Carlos Guillermo	{PR} - Provincia - PASTAZA	28/04/2017
3	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/10/2016
4	EL PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/11/2016
5	Verificación Atención Personas Adultas	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	22/02/2017
6	Verificación Atención Personas Adultas Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	12/11/2016
7	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	20/03/2017
8	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	26/09/2016
9	REALIZADA 23 DE AGOSTO DE 2016	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	23/08/2016
10	Proyecto en ejecución en la Provincia de orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	13/07/2016
11	K002 MIES AMPLIACIÓN COBERTURA ADULTO MAYOR SE EJECUTA EN TERRITORIO	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24/06/2016
12	El proyecto se ejecuta de manera excelente en la provincia del Guayas, sin embargo en la zona 8 se ejecuta como gasto corriente	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	27/06/2016
13	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	07/06/2016
14	PROYECTO SE EJEUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	17/03/2016
15	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	29/03/2016
16	Verificación del avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	25/05/2016
17	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	21/05/2016
18	Supervisión positiva se pudo obtener información del avance del proyecto de acuerdo al hito 67	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	20/05/2016
19	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	14/05/2016
20	Supervisión negativa - desembolsos no realizados.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/04/2016
21	MIES- Proyecto Ampliación, Mejoramiento de los Servicios a Adultos Mayores se ejecuta positivamente el El Oro.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	28/04/2016
22	PROYECTO SI SE EJECUTO EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	23/04/2016
23	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	14/05/2016
24	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	23/02/2016
25	Adultos Mayores feb quedado	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	29/02/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
26	Adultos Mayores ene	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/01/2016
27	Proyecto: Se ejecuta en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	17/02/2016
28	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	28/01/2016
29	Verificar la ejecución del proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	27/01/2016
30	Supervisión exitosa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	26/01/2016
31	Verificación Mejoramiento Servicios Personas Adultas Mayores Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	20/01/2016
32	supervisión no ejecutada por falta de colaboración del Director MIES Babahoyo	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	29/12/2015
33	Supersión adultos mayores diciembre	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/12/2015
34	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	23/12/2015
35	REALIZADA 26-11-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	26/11/2015
36	Constatación de aplicación Proyecto Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	27/11/2015
37	Proyecto se desarrolla sin novedad en la Provincia de Zamora Chinchipe"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	24/11/2015
38	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	16/11/2015
39	Proyecto en ejecución	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	13/11/2015
40	Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Personas Adultas Mayores	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/10/2015
41	Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 provincias del país	Pabón Caranqui, Paola Verence	{PR} - Provincia - PICHINCHA	30/10/2015
42	Supervisión positiva al trabajo de territorio que se realiza en la provincia del Azuay en el proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/10/2015
43	Supervisión positiva, se cumple de acuerdo a lo planificado	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	22/10/2015
44	Gestionar los proyectos de espacios alternativos que se realizarán terapias ocupacionales, capacitaciones, actividades recreativas, gerontogimnasia,	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/10/2015
45	Proyecto en ejecución en la provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	29/09/2015
46	Supervision positiva sobre la gestion del proyecto en Morona Santiago de acuerdo al hito 42	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	24/09/2015
47	SUPERVISION REALIZADA 24-09-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	24/09/2015
48	SUPERVISION EXITOSA AL CUMPLIMIENTO LA PLANIFICACION EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	25/08/2015
49	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/07/2015
50	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	30/07/2015
51	Supervisión Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 provincias del país	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	17/06/2015
52	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	24/07/2015
53	PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	10/07/2015
54	CONSTATACIÓN ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	26/06/2015
55	Supervisión del proyecto en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	26/06/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
56	Proyecto con mucha importancia en el Cantón Chimbo	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	18/06/2015
57	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/05/2015
58	Ampliar cobertura de servicios a La libertad coordinando con otro gad u otras alternativas al conflicto de la asociacion indicada	Gómez Villao, Pedro Rubén	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/05/2015
59	MIES - Ampliación de Cobertura y mejoramiento de los servicios de Atención a Personas Adultas Mayores cumple con lo programado.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	20/05/2015
60	Supervision positiva se pudo verificar el avance del proyecto conforme al de capacitación para operadores de servicios de adultos mayores en Morona S	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	19/05/2015
61	PROYECTO CON BUENOS BENEFICIOS EN EL CANTÓN ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	18/05/2015
62	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/04/2015
63	PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTÓN LAS NAVES EXISTIENDO ASOCIACIÓN	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/03/2015
64	GAD LIBERTAD NO FIRMO CONVENIO POR TENER PRESUPUESTADO, SE GENERARA ESPACIOS ALTERNATIVOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/03/2015
65	Supervisión del 23-02-2015	Coka Bastidas, Denise María	{PR} - Provincia - PASTAZA	23/02/2015
66	Proyecto en Ejecución	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/01/2015
67	PROYECTO EN CANTÓN ECHEANDIA SE EJECUTA CON NORMALIDAD	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	26/01/2015
68	PROYECTO SIN NINGUNA DIFICULTAD EN EL CANTÓN SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	09/02/2015
69	" Conocer la Planificación del año 2015 en Zamora Chinchipe"	Guamán Cajas, Víctor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	28/01/2015
70	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	23/01/2015
71	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	31/12/2014
72	Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planificado en Orellana.	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	19/12/2014
73	Proyecto cumple según lo planificado	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	11/12/2014
74	Proyecto en Ejecucion.	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	25/11/2014
75	Supervisión para verificar el avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise María	{PR} - Provincia - PASTAZA	26/11/2014
76	CONSTATACIÓN MEJORAMIENTO SERVICIOS ADULTOS MAYORES	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	28/11/2014
77	Informe de las personas que asistieron a la preparación del examen ENES	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	21/11/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de personas adultas mayores en las localidades de intervención del proyecto que acceden a los servicios integrales por convenio.		100.00 %	1	1	01/01/2015	Mayo
2	Porcentaje de cuidadores y operadores de los servicios de atención a las personas adultas mayores, formados y capacitados		142.86 %	0.7	1	01/07/2015	Ene-Mar


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	38,222,450.43 **
Costo Total:	56,549,262.73
Total Devengado:	33,326,870.49
% Costo Total Devengado:	58.93 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 58.93 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	21,629,608.15	0.00	0.00	21,629,608.15
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	29,221,936.38	7,592,324.23	0.00	36,814,260.61
Ppto. Codificado	30,336,794.88	9,190,648.06	0.00	39,527,442.94
Ppto. Comprometido	29,355,485.87	8,452,872.26	0.00	37,808,358.13
Planeado - Codificado (2017)		-9,190,648.06		
Programado a Devengar	31,907,152.42	9,190,648.06	0.00	41,097,800.48
Ppto. Devengado	29,031,802.37	4,295,068.12	0.00	33,326,870.49
Estimado a fin de año	* 29,031,802.37	0.00	0.00	29,031,802.37
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,875,350.05	9,190,648.06	0.00	12,065,998.11
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 90.99 %	46.73 %	0.00 %	81.09 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

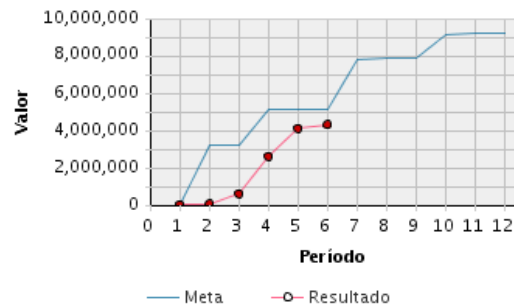

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	9,370.49	3,331.17	9,370.49	3,331.17	35.55 %		0.04 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	3,192,576.75	50,204.83	3,201,947.24	53,536.00	1.67 %		0.58 %
Mar	11,080.01	556,038.59	3,213,027.25	609,574.59	18.97 %		6.63 %
Abr	1,892,546.68	2,004,435.47	5,105,573.93	2,614,010.06	51.20 %		28.44 %
May	23,652.53	1,497,219.04	5,129,226.46	4,111,229.10	80.15 %		44.73 %
Jun	23,580.00	183,839.02	5,152,806.46	4,295,068.12	83.35 %		46.73 %
Jul	2,669,832.49		7,822,638.95				
Ago	12,080.00		7,834,718.95				
Sep	10,579.99		7,845,298.94				
Oct	1,317,551.16		9,162,850.10				
Nov	10,579.98		9,173,430.08				
Dic	17,217.98		9,190,648.06				
Total	9,190,648.06	4,295,068.12					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
8	Incrementar la calidad de la atención para la población adulta mayor MEDIANTE la propuesta de política pública; actualización y socialización de normativa técnica, programas de mejora, modelos de atención y gestión del servicio.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
MIES-003	Atención en Centros Gerontológicos Residenciales
MIES-011	Atención en Centros Gerontológicos de Atención Diurna
MIES-012	Atención Domiciliaria para Personas Adultas Mayores
MIES-013	Atención en Espacios Alternativos de Revitalización, Recreación, Socialización y Encuentro para Personas Adultas Mayores

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1. Año 2014 - HITO 1	MEMOS_DE_APROBACION_CONVENIOS_2014.pdf	21/02/2014
2	1. HITO 1: A3_DICTAMEN PRIORIDAD	DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf	18/03/2014
3	10. Año 2014 - HITO 10 Informe de seguimiento mensual Mayo 2014	INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_MAYO_2014.pdf	29/05/2014
4	11. Año 2014 - HITO 11 Informe de transferencia del Segundo desembolso a los convenios 2014	Informe_de_transferencia_del_segundo_desembolso_presupuesto_2014.pdf	02/07/2014
5	12. Año 2014 - HITO 12 Informe de la evaluación semestral del proyecto	INFORME__SEGUIMIENTO_-_SEMESTRAL_2014.pdf	22/07/2014
6	13. Año 2014 - HITO 13 Informe de seguimiento mensual Julio 2014	INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_JULIO_2014.pdf	31/07/2014
7	14. Año 2014 - HITO 14 Informe de seguimiento mensual Agosto 2014, soporte	INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_AGOSTO_2014.pdf	11/09/2014
8	16. HITO 16 Informe de seguimiento mensual Septiembre 2014	INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_SEPTIEMBRE_2014.pdf	01/10/2014
9	17. HITO 17	ADJUDICACION_CONSULTORIA.jpg	14/10/2014
10	17. HITO 17 Plan de trabajo - consultoría	PLAN_DE_TRABAJO_-_CONSULTORIA.pdf	04/11/2014
11	18. Año 2014 - HITO 18 Informe de seguimiento mensual Octubre 2014	INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_OCTUBRE_2014.pdf	30/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	19. HITO 19 Informe del diagnóstico de la situación de operadores de los servicios de atención a PAM y Plan de Capacitación	oficio-francisco_guarderas_Entrega_del_Plan_de_Capacitacion.jpg	05/12/2014
13	2. Año 2014 - HITO 2 PAPP reformulado	INFORME_REPROGRAMACION_PAPP_2014.pdf	10/02/2014
14	20. Año 2014 - HITO 20 Informe de seguimiento mensual Noviembre 2014	INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_NOVIEMBRE_2014.pdf	02/12/2014
15	3. Año 2014 - HITO 3 Validación de convenios 2014,	VALIDACIÓN_DE_CONVENIOS_2014.pdf	21/02/2014
16	3. HITO 3 Validación de convenios 2014	BASE_DE_DATOS_VALIDACION_DE_CONVENIOS_2014.xls	21/02/2014
17	4. HITO 4 Informe de transferencia del primer desembolso a los convenios 2014	INFORME_DE_TRANSFERENCIA_DEL_1ER_DESEMBOLO_A_LOS_CONVENIOS_2014.pdf	05/03/2014
18	5. Año 2014 - HITO 5 Informe de seguimiento mensual Febrero 2014,	INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_FEBRERO_2014.pdf	05/03/2014
19	7. Año 2014 - HITO 7 Informe de seguimiento mensual Marzo 2014	INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_MARZO_2014.pdf	04/04/2014
20	8. HITO 8 Plan de capacitación	PLAN_DE_CAPACITACION.pdf	28/04/2014
21	9. Año 2014 - HITO 9 Informe de seguimiento mensual Abril 2014	INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_ABRIL_2014.pdf	05/05/2014
22	A1_HITO 21: oficio-francisco_guarderas_Diagnóstico de Organizaciones Sociales	oficio-francisco_guarderas_Diagnóstico de Organizaciones Sociales.pdf	23/01/2015
23	A2_HITO 22: PAPP_2015_APROBADO	PAPP_2015_APROBADO.xls	03/03/2015
24	A3 VERIFICABLE HITO 23	A2.pdf	06/04/2015
25	A4 VERIFICABLE HITO 24	A3.pdf	06/04/2015
26	A5_HITO 25: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión para la atención a PAM 2015	A4_HITO_25_Informe_de_transferencia_del_primer_desembolso_presupuestario_a_los_convenios_firmados_en_los_distritos_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo_circuito_La_Unión_para_la_atención_a_PAM_2015.pdf	06/07/2015
27	A6_HITO 26: Transferencia de presupuesto a Coordinaciones Zonales para la firma de convenios	A5_HITO_26_Transferencia_de_presupuesto_a_Coordinaciones_Zonales_para_la_firma_de_convenios.pdf	06/07/2015
28	A7_HITO 27: PAPP_REFOR_73-78_INVERSION_PROYECTO_ABRIL_2015 (08-05-2015)	PAPP_REFOR_73-78_INVERSION_PROYECTO_ABRIL_2015 (08-05-2015).xlsx	15/08/2015
29	A8_HITO 28: Informe evaluación distritos priorizados	A8_Informe_evaluación_distritos_priorizados.pdf	11/05/2015
30	A9_HITO 29: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión	A7_HITO_28_Informe_de_liquidación_y_cierre_de_los_convenios_suscritos_en_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo_circuito_La_Unión.pdf	16/07/2015
31	Acuerdo de declaratoria de Proyecto emblemático Adulto Mayor (2013.12.27)	(2013.12.27)_ACUERDO_DE_DECLARATORIA_DE_PROYECTO_EMBLEMATICO_ADULTO_MAYOR.pdf	27/03/2015
32	Aprobación reformulación PAPP	MEMORANDO_MIES_SAI_0052_-_2014.pdf	10/02/2014
33	B1_HITO 30: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión	A9_HITO_30_Informe_de_liquidación_y_cierre_de_los_convenios_suscritos_en_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo_circuito_La_Unión.pdf	16/07/2015
34	B2_HITO 32: Informe de capacitación sobre atención integral al adulto mayor en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión	B2_HITO_32_Informe_de_capacitación_sobre_atención_integral_al_adulto_mayor_en_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo_circuito_La_Unión.pdf	16/07/2015
35	B3_HITO 33: Informe del encuentro de Política Pública con los operadores de los servicios de adultos mayores	B3_HITO_33_Informe_del_encuentro_de_Política_Pública_con_los_operadores_de_los_servicios_de_adultos_mayores.pdf	16/07/2015
36	B4_HITO 34: Informe del encuentro de Política Pública con los operadores de los servicios de adultos mayores	B4_HITO_34_Informe_del_encuentro_de_Política_Pública_con_los_operadores_de_los_servicios_de_adultos_mayores.pdf	16/07/2015
37	B5_HITO 35: Informe sobre el lanzamiento de del programa de capacitación para operadores de servicios de adultos mayores	B5_HITO_35_Informe_sobre_el_lanzamiento_de_del_programa_de_capacitación_para_operadores_de_servicios_de_adultos_mayores.pdf	16/07/2015
38	B6_HITO 36: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión	B6_HITO_36_Informe_de_ejecución_del_presupuesto_y_seguimiento_a_los_convenios_mantenidos_en_los_de_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo_circuito_La_Unión.pdf	16/07/2015
39	B7_HITO 37: Informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM	B7_HITO_37_Informe_de_transferencia_del_segundo_desembolso_presupuestario_a_los_convenios_firmados_en_los_distritos_no_priorizados_para_la_atención_a_PAM.pdf	20/08/2015
40	B8_HITO 38: Informe del encuentro con Pueblos y Nacionalidades para el diseño de una modalidad de atención específica	B8_HITO_38_Informe_del_encuentro_con_Pueblos_y_Nacionalidades_para_el_diseño_de_una_modalidad_de_atención_específica.pdf	25/08/2015
41	B9_HITO 39: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión	B9_VERIFICABLE_HITO_39_Informe_de_ejecución_del_presupuesto_y_seguimiento_a_los_convenios_mantenidos_en_los_de_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo_circuito_La_Unión.pdf	25/08/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
42	C1_HITO 40: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos de Joya Sigchos Jama y Babahoyo	C1_HITO_40_Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos de Joya Sigchos Jama y Babahoyo	04/09/2015
43	C2_HITO 41: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM	C2_HITO_41_Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM	04/09/2015
44	C3_HITO 42: Informe del primer Curso sobre atención integral al adulto mayor (Norma Técnica) de los distritos no priorizados	C3_HITO_42_EJECUCIÓN Informe del primer Curso sobre atención integral al adulto mayor (Norma Técnica) de los distritos no priorizados	08/10/2015
45	C4_HITO 43: Informe del primer Curso sobre atención integral al adulto mayor (Norma Técnica) en los distritos priorizados de Joya Sigchos Jama y Babahoyo	C4_HITO_43_EJECUCIÓN Informe del primer Curso sobre atención integral al adulto mayor (Norma Técnica) en los distritos priorizados de Joya Sigchos Jama y Babahoyo	12/10/2015
46	C5_HITO 44: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya Sigchos Jama y Babahoyo	C5_HITO_44_EJECUCIÓN Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya Sigchos Jama y Babahoyo	12/10/2015
47	C6_HITO 45: INFORME JUSTIFICATIVO	E1_HITO_45_INFORME JUSTIFICATIVO.pdf	06/11/2015
48	C7_HITO 46: INFORME JUSTIFICATIVO	E2_HITO_46_INFORME JUSTIFICATIVO.pdf	06/11/2015
49	C8_VERIFICABLE HITO 48	C8_VERIFICABLE_HITO_48_INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	23/02/2016
50	C9_HITO 31: CONTRATO ELABORACION VIDEOS ACONDICIONAMIENTO E INFORME JUSTIFICACION FECHA POSTERIOR	C9_VERIFICABLE_HITO_31_CONTRATO ELABORACION VIDEOS ACONDICIONAMIENTO E INFORME JUSTIFICACION FECHA POSTERIOR	19/01/2016
51	Cronograma valorado para el 2015	A7.xlsx	16/04/2015
52	D1_VERIFICABLE HITO 48	D1_HITO_49_VERIFICABLE Informe Monitoreo Distritos Priorizados	30/11/2015
53	D2_HITO 50: ELABORACIÓN PAPP 2016	D2_HITO_50_VERIFICABLE ELABORACIÓN PAPP 2016.xlsx	15/12/2015
54	D3_HITO 51: EJECUCION Informe anual de la gestión del proyecto final	D3_HITO_51_EJECUCION Informe anual de la gestión del proyecto final	15/12/2015
55	D3_HITO_50: Informe anual de la gestión del proyecto final	D3_HITO_51_EJECUCION Informe anual de la gestión del proyecto final	15/12/2015
56	D4_VERIFICABLE HITO 51	D4_HITO_52_VERIFICABLE Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos priorizados para la atención a PAM	15/12/2015
57	D5_HITO 52: Informe Anual Ejecución Presupuesto Distritos Priorizados	D4_HITO_52_VERIFICABLE Informe Anual Ejecución Presupuesto Distritos Priorizados	30/12/2015
58	D6_HITO 53: ACTA ENTREGA RECEPCIÓN VIDEOS DE ACONDICIONAMIENTO CORPORAL	D6_HITO_53_VERIFICABLE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN VIDEOS DE ACONDICIONAMIENTO CORPORAL	02/07/2016
59	D7_HITO 54: INFORME CONSOLIDADO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS EN EL 2015	D7_HITO_54_VERIFICABLE INFORME CONSOLIDADO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS EN EL 2015	02/07/2016
60	D8_VERIFICABLE_55: PAPP APROBADO 2016	D6_HITO_55_VERIFICABLE PAPP APROBADO 2016.xlsx	01/02/2016
61	D9_HITO 59: PAPP Adulto Mayor REFORMA al 12-febrero-2016-1	D9_VERIFICABLE_HITO_59_PAPP Adulto Mayor REFORMA al 12-febrero-2016-1.xlsx	24/02/2016
62	E1_HITO 56: INFORME CONVENIOS SUSCRITOS EN DISTRITOS PRIORIZADOS JOYA JAMA BABAHOYO Y SIGCHOS	E1_HITO56_VERIFICABLE INFORME CONVENIOS SUSCRITOS EN DISTRITOS PRIORIZADOS JOYA JAMA BABAHOYO Y SIGCHOS	04/03/2016
63	E2_HITO 57: INFORME DE CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL AÑO 2016	E2_HITO_57_VERIFICABLE INFORME DE CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL AÑO 2016	04/03/2016
64	E3_HITO 58: INFORME DE TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO A LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016 PARA LA ATENCIÓN A PAM	E3_HITO_58_VERIFICABLE INFORME DE TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO A LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016 PARA LA ATENCIÓN A PAM	04/03/2016
65	E4_HITO 60: INFORME DE MONITOREO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL 2016 DISTRITOS PRIORIZADOS JOYA JAMA SIGCHOS LA UNION	E4_HITO60_VERIFICABLE INFORME DE MONITOREO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL 2016 DISTRITOS PRIORIZADOS JOYA JAMA SIGCHOS LA UNION	01/03/2016
66	E5_HITO 61: INFORME DE TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO A LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016 PARA LA ATENCIÓN A PAM	E5_HITO61_VERIFICABLE INFORME DE TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO A LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016 PARA LA ATENCIÓN A PAM	06/03/2016
67	E6_HITO 62: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PRIMER DESEMBOLSO) Y COBERTURA DE LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016 PARA LA ATENCIÓN A PAM	E6_HITO62_VERIFICABLE INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PRIMER DESEMBOLSO) Y COBERTURA DE LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016 PARA LA ATENCIÓN A PAM	06/03/2016
68	E7_HITO 63: INFORME DE MONITOREO A LOS CONVENIOS DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS, JOYA DE LOS SACHAS, SIGCHOS, JAMA, BABAHOYO (CIRCUITO LA UNION)	E7_HITO63_VERIFICABLE Informe de monitoreo a los convenios mantenidos en los distritos priorizados para la atención a PAM	07/03/2016
69	E8_VERIFICABLE HITO 64 INFORMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO (SEGUNDO DESEMBOLSO) Y COBERTURA DE LOS CONVENIOS FIRMADOS AL AÑO 2016 ATENCIÓN PAM	E8_HITO_64_EJECUCIÓN Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los distritos priorizados para la atención a PAM	05/03/2016
70	E9_VERIFICABLE HITO 65 INFORME DE TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO A LOS CONVENIOS FIRMADOS 2016 PARA ATENCIÓN AM	E9_HITO_65_EJECUCIÓN Informe de transferencia del tercer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos priorizados para la atención a PAM	05/03/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
71	F1_VERIFICABLE HITO 66_ Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) tercer trimestre, presentado.	F1_VERIFICABLE_HITO_66_Informe_de_monitoreo_a_los_convenios_de_los_distritos_priorizados_tercer_trimestre.docx	09/10/2016
72	F2_HITO 67 EJECUCIÓN Informe de ejecución del presupuesto (tercer desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM	F2_HITO_67_EJECUCIÓN_Informe_de_ejecución_del_presupuesto_(tercer_desembolso)_y_cobertura_de_los_convenios_firmados_el_año_2016_para_la_atención_a_PAM.docx	09/10/2016
73	F3_HITO 68 EJECUCIÓN Informe de transferencia del cuarto desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM	F3_HITO_68_EJECUCIÓN_Informe_de_transferencia_del_cuarto_desembolso_presupuestario_a_los_convenios_firmados_el_año_2016_para_la_atención_a_PAM.docx	09/11/2016
74	F4 HITO 69: Informe anual de la gestión del proyecto, presentado	F4_HITO_69_Informe_anual_de_la_gestión_del_proyecto.docx	25/01/2017
75	F5: Hito 70: EJECUCIÓN: Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) cuarto trimestre, presentado	F5_HITO_70_Informe_de_ejecución_del_presupuesto_(cuarto_desembolso)_y_cobertura_de_los_convenios_firmados_el_año_2016.docx	08/01/2017
76	F5_HITO 70 Informe de ejecución del presupuesto (cuarto desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016	F5_HITO_70_Informe_de_ejecución_del_presupuesto_(cuarto_desembolso)_y_cobertura_de_los_convenios_firmados_el_año_2016.docx	10/01/2017
77	F6_HITO 71 Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados cuarto trimestre	F6_HITO_71_Informe_de_monitoreo_a_los_convenios_de_los_distritos_priorizados_cuarto_trimestre.docx	10/01/2017
78	F7 HITO 72: EJECUCIÓN: Elaboración de PAPP 2017	(2017.01.30)_PAPP_INVERSION_PAM.xlsx	31/01/2017
79	F8 HITO 73: EJECUCIÓN: Informe de capacitación del Módulo sobre el uso del MOODLE	FICHA_HITO_73_COMPLETO.pdf	08/05/2017
80	F9: HITO 74: EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2017, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión), presentado	FICHAS_HITOS_74.pdf	08/05/2017

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	HITO 74
	http://HITO 74

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
López Bautista, Cristina Elizabeth	Coordinadora	Coordinadora del Proyecto emblemático Adulto Mayor	cristina.lopez@inclusion.gob.ec	
López Rodríguez, Juan Domingo	Gerente de Proyecto	Gerente de Proyecto Emblemático Adulto Mayor	juan.lopez@inclusion.gob.ec	3983000
Ruiz Morales, Anna Cristina	Coordinadora	Coordinadora Proyecto emblemático Adulto Mayor	anna.ruiz@inclusion.gob.ec	3983000
