

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

PROYECTO: K003 MIES-Fortalecimiento, ampliación e innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura.

Líder del Proyecto:	Lascano Gomez, Mercedes Liliana (mercedes.lascano@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mendizábal Molina, Luis Javier	Programas Relacionados:	IE-MT-MISION TERNURA
Titular:	Guerrero Ochoa, Leonardo Remigio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.383775	TIR:	46.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	214,811,888.16
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	86,629,641.23
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2019 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	02/06/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Pailacho LLamatumbi, Nora Liliana	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2022

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones en la calidad de los servicios de desarrollo infantil a través de las modalidades CDI, CNH y CCRA para niñas y niños de 0 a 3 años de edad y mujeres gestantes, mediante estrategias de articulación intersectorial y el involucramiento de la familia para el Desarrollo Infantil Integral lo que permitirá mejorar la priorización de los mismos e incrementar año tras año, usuarios en la modalidad CCRA, enfocada al fortalecimiento del tejido social a través de consejerías grupales y apoyos nutricionales en zonas de alta dispersión, emergencia o vulnerabilidad. Para conseguir los objetivos planteados se han establecido los siguientes componentes:

1. Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil.
2. Calidad de la Gestión de Servicios de Desarrollo Infantil.
3. Marco Normativo e Institucional para la Primera Infancia.
4. Personal técnico - operativo capacitado para cubrir la nueva cobertura de los Servicios de Desarrollo Infantil.
5. Evaluación del Proyecto.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la calidad estructural y de procesos de los servicios de desarrollo infantil.

Tipo de Beneficiario

*Niños menores de 3 años y madres gestantes, que se encuentran en áreas focalizadas y en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que residan en zonas de menor consolidación y zonas de mayor dispersión geográfica y poblacional, o que atraviesan situaciones de emergencia o requieren de atención prioritaria (96 cantones priorizados).

* Técnicos de Desarrollo Infantil Integral a nivel nacional.

Restricciones

Alcance: A nivel nacional

Tiempo: El tiempo de ejecución es limitado por el número de personal asignado al proyecto.


Costo: Falta de asignación presupuestaria

Recursos: Personal limitado para la ejecución del proyecto / Rotación de funcionarios y analistas.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 68.02 %

Fecha de Inicio: 01/02/2019

Fecha de Fin: 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

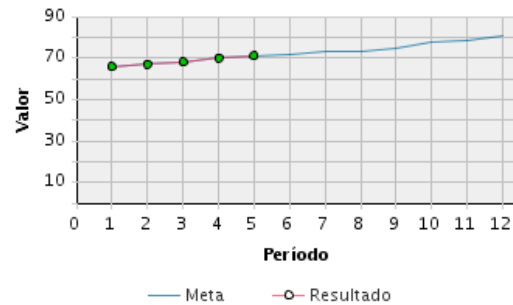

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	66 %	67 %	68 %	70 %	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %	78 %	78 %	80 %
	Avance real acumulado											
	66 %	67 %	68 %	70 %	71 %							
	Estado											
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2022	Pailacho LLamatumbi, Nora Liliana	02/06/2022 - 10:26 AM
Abril 2022: Se elaboraron los Estados Financieros y Conciliaciones correspondientes al mes de marzo de 2022, el valor acumulado invertido alcanza US\$7.468.587,91. Se solicitó el pago de los informes No. 3 del Coordinador, y Especialista (Adquisiciones, Financiera y Monitoreo). También se solicitó el pago, del producto 1, para la firma que realizó la auditoría externa a los Estados Financieros 2021 del Proyecto. La asignación presupuestaria, al 30 de abril de 2022, se mantiene en US\$ 22.504.669,00 con un devengado acumulado de US\$ 5.588.524,80, el cual representa el 24,83%. Se solicitó la Reforma para asignar recursos presupuestarios para la amortización del anticipo entregado a Comunigraf por el contrato denominado: "Impresión de material didáctico y/o curricular para CDI y CNH, Primera Fase". Esta Gerencia procedió a solicitar a las E.O.D. los pagos pendientes de liquidaciones de ex servidores-as del proyecto, a fin de realizar las acciones correspondientes ante la Coordinación General de Planificación para financiar el pago de liquidaciones del personal cesante, por lo que se solicitó la aprobación de la Reforma PAPP Nro. 4 y 5, mediante la cual se distribuye el presupuesto de los saldos disponibles mes de Enero, Febrero y Marzo; y, se solicitó el cambio de componente 5 "Gestión y Evaluación" al componente 4 "Personal Técnico Operativo y Capacitado para Cubrir la Cobertura de los Servicios de Desarrollo Infantil" del grupo de gasto 71, con el objetivo de que guarde concordancia con los componentes del proyecto conforme a la Actualización del dictamen de prioridad del proyecto de inversión emitido por la Secretaría Nacional de Planificación - SNP, el 12 de noviembre de 2021 mediante oficio Nro. SPN-SPN-2021-0841-OF. Se procedió a analizar el total de contrataciones realizadas por las EOD's mediante el subsistema de Presupuesto y Remuneraciones y nómina durante el primer cuatrimestre del año, con el propósito de ejecutar los montos planificados para el financiamiento del equipo técnico de la modalidad de atención Creciendo con nuestros Hijos.	Pailacho LLamatumbi, Nora Liliana	10/05/2022 - 01:17 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se envió a la Subsecretario de Financiamiento Público la información correspondiente al IVA pendiente de registro del ejercicio fiscal 2021 y 2022 (hasta marzo de 2022), también, se informó los valores planificados para el año 2022.		
MARZO 2022 El Proyecto "Fortalecimiento Ampliación e Innovación de los Servicios De Desarrollo Infantil Estrategia Nacional Misión Ternura", en el mes de marzo de 2022 ejecutó un acumulado de USD 4.270.792,10 que corresponde al grupo de gasto 71 y 73, es decir un 18.97% en relación con el valor total codificado. Se envió al Banco Interamericano de Desarrollo el informe de auditoría a los Estados Financieros Auditados del ejercicio 2021, puesto que, la firma auditora externa entregó dicho informe el 18 de marzo de 2022, para que se por cumplido el artículo 7.03 sobre Informes de Auditoría, conforme lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 4607/OC-EC. Se puso en conocimiento en calidad de Administrador de Contrato al Director de Servicios de Atención Domiciliar la información de vencimiento de póliza (ComuniKgraf S.A) para que realice las acciones pertinentes. De Seguros Confianza se recibió la renovación de la póliza CC-0309405 a favor del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, cuyo afianzado es COMUNIKGRAF S.A., con valor asegurado 89.719,50 a partir desde el 08 de marzo de 2022 al 06 de junio de 2022. Con el propósito de realizar un monitoreo sobre el uso eficiente de los recursos asignados para el financiamiento del grupo de gasto 71 se solicitó mediante Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0199-M, de 22 de marzo de 2022, a las Entidades Operativas Desconcentradas el Informe de Unidades Asignadas en la modalidad Creciendo con nuestros Hijos, a fin de focalizar la atención del servicio hacia la población en pobreza y extrema pobreza. Se elaboraron los Estados Financieros y Conciliaciones correspondientes al mes de febrero de 2022. Se gestionó la Certificación PAPP y la certificación presupuestaria 2022 para el contrato de auditoría financiera externa. Esta Gerencia solicitó los pagos pendientes de liquidaciones de ex servidores-as del proyecto, previamente solicitó la aprobación de la Reforma PAPP Nro. 4. También se solicitó el pago de los informes 1 y 2 del Equipo de gestión del Préstamo BID 4607. Con la finalidad que el Distrito del Empalme y la Coordinación Zonal 6 regularicen el registro de la unidad orgánica de las servidoras/es en el sistema SPRYN se solicitó la regularización del personal. Las mismas que acogieron las observaciones dando cumplimiento a la regularización del personal. Se solicitó al Subsecretario de Financiamiento Público la creación o expedición de un instrumento legal que permita un registro y/o movimiento de los recursos que se encuentran en la cuenta y que corresponden al valor del IVA de los bienes adquiridos en ejercicios fiscales de los años 2019, 2020 y 2021.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	05/04/2022 - 01:04 PM
MARZO 2022 El Proyecto en el mes de marzo de 2022 ejecutó un acumulado de USD 4.270.792,10 que corresponde al grupo de gasto 71 y 73, es decir un 18.97% en relación con el valor total codificado. Se envió al Banco Interamericano de Desarrollo el informe de auditoría a los Estados Financieros 2021, puesto que, la firma auditora externa entregó dicho informe el 18 de marzo de 2022. Mediante Memorando Nro. MIES-VIS-FASISDI-0215-M de 24 de marzo de 2022, se puso en conocimiento en calidad de Administrador de Contrato al Director de Servicios de Atención Domiciliar la información de vencimiento de póliza (ComuniKgraf S.A) para que realice las acciones pertinentes. De Seguros Confianza se recibió la renovación de la póliza CC-0309405 a favor del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, con valor asegurado 89.719,50 a partir desde el 08 de marzo de 2022 al 06 de junio de 2022. Para que el Distrito del Empalme y la Coordinación Zonal 6 regularicen el registro de la unidad orgánica de las servidoras/es en el sistema SPRYN se solicitó la regularización del personal. Las mismas que acogieron las observaciones dando cumplimiento a la regularización del personal. Con el propósito de realizar un monitoreo sobre el uso eficiente de los recursos asignados para el financiamiento del grupo de gasto 71 se solicitó con Memorando Nro. MIES-VIS-	Pailacho LLamatumbi, Nora Liliana	05/04/2022 - 12:27 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FAISDI-2022-0199-M, de 22 de marzo de 2022, a las Entidades Operativas Desconcentradas el Informe de Unidades Asignadas en la modalidad Creciendo con nuestros Hijos. Se elaboraron los Estados Financieros y Conciliaciones correspondientes al mes de febrero de 2022. Se gestionó la Certificación PAPP y la certificación presupuestaria 2022 para el contrato de auditoría financiera externa. Esta Gerencia solicitó los pagos pendientes de liquidaciones de ex servidores-as del proyecto, previamente solicitó la aprobación de la Reforma PAPP Nro. 4. También se solicitó el pago de los informes 1 y 2 del Equipo de gestión del Préstamo BID 4607. Al Subsecretario de Financiamiento Público se solicitó la creación o expedición de un instrumento legal que permita un registro y/o movimiento de los recursos que se encuentran en la cuenta y que corresponden al valor del IVA de los bienes adquiridos en ejercicios fiscales de los años 2019, 2020 y 2021.		
FEBRERO 2022: Esta Gerencia procedió a solicitar a las E.O.D. los pagos pendientes de liquidaciones de ex servidores-as del proyecto, a fin de realizar las acciones correspondientes ante la Coordinación General de Planificación para financiar el pago de liquidaciones del personal cesante, por lo que se solicitó la aprobación de la Reforma PAPP Nro. 3, mediante la cual se distribuye el presupuesto de los saldos disponibles mes de Enero, la misma que es aprobada por la Coordinación General de Planificación por un monto de USD. USD. 105.001,12. Al no contar con las directrices en cuanto a la afectación y registro del IVA, en los contratos financiados por multilaterales, se solicitó al Subsecretario de Financiamiento Público "(") se emitan las directrices correspondientes a fin de justificar el IVA frente al organismo multilateral, tomando en consideración que adicionalmente para el ejercicio fiscal 2022, se encuentran programadas contrataciones de bienes y servicios de los contratos de préstamos vigentes de esta Cartera de Estado", con la finalidad de que se reconozca el IVA y así no afecte el cumplimiento de ejecución mínima. Esta Gerencia realizó los procesos pertinentes para la obtención de la certificación a la PAPP del Equipo de Gestión y la correspondiente convalidación de Certificaciones Presupuestarias, a fin de continuar con el trámite de pago de Enero al Equipo de Gestión. El Proyecto "Fortalecimiento Ampliación e Innovación de los Servicios De Desarrollo Infantil Estrategia Nacional Misión Ternura", en el mes de febrero de 2022 se ejecutó USD 2,608, 412.66 que representa el 11.59% que corresponde al grupo de gasto 71. Finalmente, se convalidaron las Certificaciones Presupuestarias Plurianuales del Equipo Ejecutor del Programa, documento habilitante, previo a proceder con los pagos correspondientes.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	08/03/2022 - 08:27 PM
ENERO 2021: Con acuerdo ministerial Nro. MIES-2022-003, el 12 de enero de 2022, el Ministro de Inclusión Económica y Social, aprobó el Plan Anual de la Política Pública (PAPP) del ejercicio fiscal 2022, con un valor de USD 22.504.669,00 dentro del grupo de gasto 71 y 73, por lo que esta Gerencia realizó la Reforma Presupuestaria de la PAPP, con la finalidad de que se asigne un organismo y correlativo ejecutable conforme a la planificación 2022, por lo que el Ministerio de Finanzas el 28 de enero asignó organismo y correlativo ejecutable para el ejercicio 2022 para el grupo de gasto 71. Es importante indicar que estamos a la espera de la aprobación de la reforma web de ingreso del personal del proyecto a nivel nacional; además se debe realizar las acciones pertinentes ante la Dirección de planificación; a fin de que se cuente con un organismo y correlativo ejecutable en el grupo de gasto 73 por monto USD. 44.331,04. Esta Gerencia procedió a solicitar a las E.O.D. los pagos pendientes de liquidaciones ex servidores-as del proyecto, a fin de realizar las acciones correspondiente ante la Coordinación General de Planificación para financiar el pago de liquidaciones de haberes pendientes de pago con el personal cesante, por lo que se sugiere se realice el proceso correspondiente para el incremento de recursos presupuestarios con el objetivo de que las E.O.D cuenten con el presupuesto y cancelen los valores pendientes. En este sentido, la Gerencia está tomando acciones preventivas y correctivas con la finalidad de contar con el 100% de servidores registrados y validados en el sistema de validación de perfiles, por lo que las E.O.D y la Subsecretaría de Desarrollo Infantil deben cumplir con lo solicitado.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	09/02/2022 - 02:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
En cuanto a la programación BID, se envió el Informe Semestral al Banco con las herramientas de planificación actualizadas (PEP y PMR) que contienen las nuevas necesidades de adquisiciones para el ejercicio 2022: equipamiento CDI y CNH y segunda fase de impresiones de normativa de Desarrollo Infantil Integral.		
DICIEMBRE 2021: - Obtención de los avales y certificación presupuestaria plurianual y anual para los procesos de contratación del coordinador y especialistas que conforman el equipo de gestión (financiero, adquisiciones, legal, monitoreo) y la auditoría financiera externa del proyecto. - Elaboración de la etapa precontractual (Resolución de adjudicación, elaboración y suscripción de contratos) del Equipo de Gestión y auditoría financiera externa - Incremento de presupuesto para el grupo de gasto 71 y 99 para el pago de liquidaciones de haberes de ex servidores del proyecto. - Ejecución presupuestaria alcanzada 100% que representa USD\$26.241.861,12	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	12/01/2022 - 05:32 PM
NOVIEMBRE 2021: -Se obtuvo la actualización del dictamen de prioridad de los proyectos de inversión: "Fortalecimiento, ampliación e innovación de los servicios de desarrollo infantil, estrategia nacional Misión Ternura" -Se consiguió el criterio favorable a la certificación presupuestaria plurianual para los procesos de contratación del coordinador y especialistas que conforman el equipo de gestión (financiero, adquisiciones, legal, monitoreo) y la auditoría financiera externa del proyecto. -Se emitieron los comprobantes de avales, certificaciones presupuestarias anuales y plurianuales para los procesos de contratación como: el coordinador y especialistas que conforman el equipo de gestión y la auditoría financiera externa del Contrato de Préstamo BID 4607/OC-EC - L1235. - Elaboración de documentación precontractual de los procesos planificados a contratar para el presente año (Equipo de Gestión y auditoría financiera externa) -Suscripción de la segunda Enmienda LPI 002 "Contratación del servicio de "impresión de material didáctico y/o curricular para CDI y CNH, Primera Fase". -Se solicitó el incremento de presupuesto para el grupo de gasto 71 y 99 para el pago de liquidaciones de haberes de ex servidores del proyecto.	Ortiz Vivas, Ana Lucia	06/01/2022 - 09:36 AM
OCTUBRE 2021: Se realizó los trámites pertinentes ante la Coordinación de Planificación y la Coordinación General Administrativa Financiera, para el pago de liquidaciones de haberes del personal cesante del proyecto de Planta Central y las E.O.D. Cabe acotar que el MEF aprobó mencionada reforma presupuestaria con la finalidad de liquidar a los ex servidores del proyecto. Se solicitó la autorización de pago de la contratación de la LPI 001 MEJORA CALIDAD INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019, a la Coordinación General Administrativa, la misma que se encuentra en estado DEVENGADO, por un valor total de \$ 4.240.324,29. Se realizó la Reforma de la redistribución de recursos presupuestarios grupo de gasto 73, para la contratación del Equipo de Gestión del Contrato de Préstamo 4607OC-EC, conforme a la aprobación del Equipo del Ministerio de Finanzas y Económica, con la finalidad de cumplir con el numeral 4.01 del anexo único del Contrato de Préstamo en relación de la contratación del Equipo Ejecutor, la misma que se encuentra aprobada por el MEF. Actualización y reprogramación de los flujos financieros del proyecto en función a la priorización de las actividades programadas. Mediante comunicación CAN/CEC-1320/2021 de 13 de octubre de 2021, se obtuvo la No Objeción por parte del Banco a los Modelos de Invitación 3CV del Equipo de Gestión del Proyecto: Coordinador EC-L1235, y Especialistas: Financiero, Adquisiciones, Monitoreo y Seguimiento, y Legal. Actualización del proyecto L1235, para la obtención del dictamen de prioridad por parte de la Secretaría Nacional de Planificación. Postulación del proyecto L1235, para la elaboración de la proforma presupuestaria para el Plan Anual de Inversiones 2022 en función del nuevo Plan Nacional de Desarrollo "Creación de Oportunidades" 2021-2025. Se mantuvo una reunión de asistencia técnica con el proveedor de la contratación "LPI 002 MEJORA CALIDAD INFAN-2-LPI-S-LPI-4607-002-2019", para definir el plazo de la segunda entrega con el objeto de continuar con el proceso de la suscripción de la enmienda Nro. 2.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	06/11/2021 - 08:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2021: Se envió el informe de viabilidad para emisión del Acuerdo Ministerial No.006-2021, de 14 de septiembre de 2021, donde la Ministra de Inclusión Social acuerda: Actualizar y reformar la delegación de al/la Gerente del Proyecto "Fortalecimiento Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional Misión Ternura". Obtención de la No Objeción a los TDR'S de la Auditoria Financiera Externa de los ejercicios económicos del 2021 y 2022 Contrato de Préstamo 4607/OC-EC. Envío al BID para No Objeción de las solicitudes de propuesta del Equipo de Gestión (Coordinador y Especialistas: Adquisición, Legal, Financiero y Monitoreo del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC, a fin de obtener la no objeción a los documentos señalados. Se realizaron las gestiones correspondientes para las Certificaciones Plurianuales de las actividades planificadas del proyecto, con la finalidad de dar inicio a las contrataciones de las actividades planificadas del proyecto para el año 2022. Esta Gerencia remitió al BID la enmienda suscrita Nro. 2 del Contratos Nro. INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 para la "Adquisición de Material Lúdico/Didáctico, a fin de continuar con el proceso de la liquidación de la Licitación Internacional 2019. Se han realizado reuniones con Delegados de la Dirección Financiera, a fin de realizar una revisión integral del expediente, para evitar reprocesos previo al pago. Se realizaron las gestiones respectivas con la Dirección de Jama, para el reintegro de servidora en el mes de septiembre ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA, en cumplimiento a la sentencia dentro la Acción de Protección. Se realizó la Reforma de la redistribución de recursos presupuestarios grupo de gasto 73, para la contratación del Equipo de Gestión del Contrato de Préstamo 4607OC-EC, conforme a la aprobación del Equipo del Ministerio de Finanzas y Económica mediante, con la finalidad de cumplir con el numeral 4.01 del anexo único del Contrato de Préstamo en relación de la contratación del Equipo Ejecutor. Esta Gerencia procedió, con los trámites pertinentes ante la Coordinación de Planificación y la Coordinación General Administrativa Financiera, para el pago de liquidaciones de haberes del personal cesante del proyecto de Planta Central y las E.O.D. Actualización y reprogramación de los flujos financieros del proyecto en función a la priorización de las actividades programadas.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	12/10/2021 - 07:41 AM
AGOSTO 2021: . Se autorizó el pago de la Contratación de una Firma Auditora Externa para "Auditar los Estados Financieros y Evaluar el Sistema de Control Interno: Contrato de Préstamo No. 4607/OC-EC "Inversión En Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil (Ec-L1235)" / Ejercicios Fiscales: 2019 Y 2020; y, Convenio de Cooperación No Reembolsable ATN/MG16956-Ec "Violencia Contra La Niñez, la Adolescencia y las Mujeres en Ecuador" / Ejercicios Fiscales: 2019, 2020 Y 2021. . Se realizaron las gestiones correspondientes para las Certificaciones Plurianuales de las actividades planificadas del proyecto, con la finalidad de dar inicio a las contrataciones de las actividades planificadas del proyecto. . Esta Gerencia procedió, con los trámites pertinentes ante la Coordinación de Planificación y la Coordinación General Administrativa Financiera, para el pago de liquidaciones de haberes del personal cesante del proyecto de Planta Central. . Se gestionó ante el MEF y el BID el desembolso de recursos por parte del BID para solicitar el nuevo anticipo de recursos, por un valor de USD\$ 5.051.170,66, con el objetivo de continuar con los trámites correspondientes para la liquidación de las Licitaciones Internacionales adquiridas en el 2019. . Se gestionó la devolución de los recursos ante el MEF por un valor de USD.40.078, 80 en el marco de la ATN MG 16956, en tal virtud esta Gerencia remitió al Banco Interamericano de	Ortiz Vivas, Ana Lucia	09/09/2021 - 03:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Desarrollo BID el comprobante de transferencia al exterior del sector público No TAE101 emitido por Banco Central del Ecuador. . Esta Gerencia remitió al BID la enmienda Nro. 2 del Contratos Nro. INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 para la "Adquisición de Material Lúdico/Didáctico", la misma que emitió la No Objeción mediante CAN/CEC-1070/202, a fin de continuar con el proceso de la liquidación de la Licitación Internacional 2019. . De acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Economía y Finanzas, se remitió a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica la Reforma al PAPP con el respectivo análisis que realizó la Gerencia y las E.O.D de los saldos disponibles; con la finalidad de proceder a financiar los haberes de ex servidores que laboraron en el proyecto. . Se realizaron las gestiones correspondientes para financiar los pagos de remuneraciones y beneficios de Ley del personal de Misión Ternura del mes de agosto a diciembre de 2021 del personal de Planta Central, debido a que se encontraban desfinanciadas por los constantes recortes presupuestarios del MEF. . Se gestionó ante el MEF la autorización para la contratación de la totalidad del Equipo Ejecutor que consta en el Reglamento Operativo del Proyecto: Coordinador EC-L1235, y Especialistas: Legal, Financiero, Monitoreo y Evaluación y Adquisiciones. . Se elaboraron los documentos precontractuales: Informes Técnicos de Necesidad, Informes de Viabilidad, Estudios de Mercado y Términos de referencia del Equipo Ejecutor de la Operación EC-L1235: Coordinador del Componente y Especialistas: Legal, Financiero, Monitoreo y Evaluación y Adquisiciones. . Se elaboró el Documento Estándar para la Selección y Contratación de Auditores / Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC), para contratación de las auditorías financieras externas del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC - ECL1235, correspondiente a los ejercicios económicos de los años: 2021 y 2022.		
JULIO 2021: .Cumplimiento con la Contratación de una Firma Auditora Externa para "Auditar los Estados Financieros y Evaluar el Sistema de Control Interno: Contrato de Préstamo No. 4607/OC-EC "Inversión En Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil (Ec-L1235)" / Ejercicios Fiscales: 2019 Y 2020; y, Convenio de Cooperación No Reembolsable ATN/MG16956-Ec "Violencia Contra La Niñez, la Adolescencia y las Mujeres en Ecuador" / Ejercicios Fiscales: 2019, 2020 Y 2021, en los tiempos establecidos de la cláusula Décima Cuarta del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ MG -16956 -EC, y de conformidad con la comunicación CAN/ CEC/ 980/2021 de 23 de julio de 2021, el Banco Internacional de Desarrollo avala el cumplimiento de la citada cláusula. .Se realizaron las gestiones correspondientes para las Certificaciones a la actividad PAPP del Equipo de Gestión de Adquisición, Financiero y Monitoreo, con la finalidad de gestionar la certificación presupuestaria y dar inicio a la contratación del Equipo de Gestión del proyecto. .Actualización de los documentos que contienen las invitaciones a procesos de selección de consultoría individuales de Equipos Ejecutores del Contrato de Préstamo 4607 OC/EC. .Elaboración de documentación precontractual de Especialista de Adquisiciones del Equipo Ejecutor, a fin de continuar con el proceso de la contratación. .Se realizó las gestiones pertinentes ante la Coordinación General de Planificación, con el objeto de incluir en la estructura programática del sistema ESIGEF el componente "Marco Normativo e Institucional y Programático para la Primera Infancia", el mismo que se encuentra incluido en mencionado sistema, con la finalidad de que esta Gerencia cumpla con los objetivos propuestos. .Se remitió al BID la enmienda Nro. 2 del Contratos Nro. INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 para la "Adquisición de Material Lúdico/Didáctico", la misma que se encuentra en revisión y de la entrega de la No Objeción por parte del BID, a fin de continuar con el proceso de la liquidación de la Licitación Internacional 2019. .Con respecto al Contrato de Calidad INFAN-2-LPI-S-LPI-4607-002-2019 "Impresiones de material didáctico y/o curricular", se envió al BID la Enmienda Nro.2, a fin de que el Banco Interamericano de Desarrollo, remita la No Objeción correspondiente con lo cual se proseguirá con el trámite pertinente de liquidación del contrato en mención. .Se actualizaron las herramientas de gestión del Proyecto, para contar con el Flujo de Recursos para el nuevo desembolso de recursos por parte del BID para solicitar el nuevo anticipo de recursos, por un valor de USD\$ 5.051.170,66 y se generaron reuniones junto con el BID para validar y revisar los formularios de desembolso, con el objetivo de continuar con los trámites correspondientes para la liquidación de las Licitaciones Internacionales adquiridas en el 2019.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	06/08/2021 - 05:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Se remitió al BID el Informe semestral del Contrato de Préstamo BID 4607/OC-EC, en el cual se actualizaron las herramientas de Gestión del BID (PEP, PMR, Flujos de Caja y Matriz de Resultados) generados en el primer semestre del ejercicio 2021. .De acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Economía y Finanzas, se remitió a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica la Programación de la Proforma 2021, de acuerdo a los formatos solicitados, lo que representó que, desde la Gerencia, se realice la coordinación a nivel nacional, previo al envío de la información. .Elaboración de los Términos de Referencia, para contratación de las Auditorías Financieras Externas del Contrato de Préstamo 4607 OC/EC correspondientes a los ejercicios económicos de los años: 2021, 2022, 2023 y 2024, con la finalidad de realizar los trámites respectivos para la contratación de la Auditoría y cumplir con la cláusula 5.02. "Supervisión Financiera del Programa" del Contrato de Préstamo.		
JUNIO 2021: Mediante CAN/CEC 891 de 18 de junio de 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo indicó el cumplimiento de la presentación de los Estados Financieros Auditados de marzo 2019 al 31 de diciembre de 2020 del Contrato de Préstamo BID 4607/OC-EC y que el Banco recibió a satisfacción los informes, levantando la suspensión de futuros desembolsos de los recursos del financiamiento. Se realizó las gestiones correspondientes para la obtención de las Certificaciones presupuestarias del Contrato Nro. INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 para la "Adquisición de Material Lúdico/Didáctico", mismas que fueron emitidas por la Dirección Financiera, para continuar con las gestiones de la enmienda 2 del contrato indicado. De acuerdo a reuniones técnicas mantenidas con el BID, se realizó una actualización a la No Objeción del ROP del Programa, en la cual se generó un acta de reunión con la que el BID aceptó las modificaciones menores realizadas al ROP, para continuar con los procesos de emisión de Acuerdo Ministerial. Se mantuvieron reuniones técnicas con las Administraciones de los Contratos Nro. INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 para la "Adquisición de Material Lúdico/Didáctico" y Calidad INFAN-2-LPI-S-LPI-4607-002-2019 "Impresiones de material didáctico y/o curricular" los días 28 y 29 de junio de 2021, con la finalidad de verificar la información de respaldo previo a solicitar los pagos correspondientes. De acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Economía y Finanzas, se remitió a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica la Programación de la Proforma 2021, de acuerdo a los formatos solicitados, lo que representó que, desde la Gerencia, se realice la coordinación a nivel nacional, previo al envío de la información. Se realizaron las gestiones correspondientes para el cambio de organismo y correlativo ejecutable del grupo de gasto 71 a nivel nacional ante la Coordinación General Administrativa Financiera, para financiar los pagos de remuneraciones y beneficios de ley del personal de Misión Ternura del mes de agosto a diciembre de 2021.	Ortiz Vivas, Ana Lucía	09/07/2021 - 08:47 PM
MAYO 2021: - En el mes de mayo la ejecución acumulada del Proyecto alcanza el 27%, dentro del grupo de gasto 71 a nivel nacional. - Una vez que se cuenta con la Certificación PAPP "ADQUISICIÓN DE MATERIAL LÚDICO/ DIDÁCTICO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL/ CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS PRIMERA FASE. (INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019)", se solicitó a la Administradora de Contrato la documentación de respaldo de la ejecución del contrato para agilizar el proceso de emisión de Certificación Presupuestaria. - Con la finalidad de liquidar las obligaciones generadas de las Licitaciones Públicas Internacionales Nros. LPI-B-LPI-4607-001-2019 y LPI-S-LPI-4607-002-2019, se solicitó la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica el incremento de techos presupuestarios de los Proyectos de Inversión, se realizó la reprogramación de incremento del Proyecto, misma que fue aprobada por el MEF por el valor de USD 5.979.573,49. - Se remitió Reforma Nro. 007 a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica para para la cumplir con la sentencia dentro de la Acción de Protección que sigue en	Ortiz Vivas, Ana Lucía	05/07/2021 - 09:11 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
contra del MIES la Sra. CHAVEZ FARFAN YOHANA YASMIN, signada con la causa Nro. 13204-2020-01578 (Dirección Distrital de Manta). - Se remitió Reforma Nro. 008 a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica para fondar la partida de liquidaciones de años anteriores solicitado por las unidades desconcentradas. - Con respecto a la Contratación de la Auditoría Financiera, se adjudica con la Empresa Pricewater house Coopers del Ecuador Cía. Ltda por un monto de USD \$ 27.000 + IVA , en un plazo de 60 días. - Referente al detalle de gastos grupo 990101202 ejercicio 2020 se remitió a la Gerente de Proyecto Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES, la consolidación de la información.		
ABRIL 2021: El proyecto resalta dos actividades principales en este Mes, que son el Incremento de Techo del Proyecto y el inicio precontractual de la Auditoria de estados Financieros del mismo, actividades que detallamos a continuación: .Mediante Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2021-0190-M, del 01 de abril del 2021, se solicitó a la Coordinación de Planificación la modificación al Plan Anual de la Política Pública - PAPP del Proyecto "Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura", Formulario Nro. 04 de Reforma al PAPP para cubrir pagos de liquidaciones de ex servidores. .Mediante Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2021-0220-M de 14 de abril de 2021, esta Gerencia remitió a la Coordinación General de Planificación "Solicitud de Reprogramación e incremento de recursos del "Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura. .Con Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2021-0232-M de 20 de abril de 2021, se solicitó a la Coordinación General de Planificación y a la Dirección de Planificación, se realicen las gestiones correspondientes ante el Gabinete Sectorial, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas, para contar con el mencionado incremento que permita cumplir con las obligaciones del ejercicio 2019. .Mediante Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2021-0241-M de 22 de abril de 2021, esta Gerencia solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera, se realicen las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para la asignación de recursos en fuente 998, conforme para amortizar los anticipos entregados en el ejercicio 2019. .Con Oficio Nro. STPTV-STPTV-2021-0310-OF de 28 de abril de 2021, el Gabinete Social solicita a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, el requerimiento de incremento de recursos para la liquidación de las Licitaciones Públicas Internacionales, suscritas en el ejercicio 2019, por un monto de USD\$ 5.979.573,49, para que se continúe con el proceso correspondiente ante el MEF. .Mediante Acta Nro.003 de 21 de abril de 2021, los miembros del Comité Técnico de Evaluación, Elección y Adjudicación (CTESA), suscriben el Acta de Apertura de Oferta del Proceso de Contratación. .Con Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2021-0242-M de 22 de abril de 2021, el Presidente del Comité Técnico de Evaluación, Selección y Adjudicación (CTESA), remite a la Gerencia del FAISDI "Notificación del Acta No.004 de Evaluación del proceso de contratación Auditoría Externa CP4607 y ATN16956". .Mediante Acta Nro. 005 de 27 de abril de 2021, el Comité Técnico de Evaluación, Selección y Adjudicación (CTESA), el Apoderado Especial de PWC y el Gerente de Auditoría de PWC, mantienen reunión para Negociar la oferta Económica de la Contratación de la Contratación.	Pérez Ruales, Nicole Alexandra	08/05/2021 - 10:37 PM
MARZO 2021: Se cuenta con Certificación PAPP para la contratación del Equipo de Gestión del Proyecto, se espera la aprobación de los Términos de Referencia por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, para solicitar la emisión de la Certificación Presupuestaria y realizar el inicio del proceso de Contratación. Se remitió Reforma Nro. 003 a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica para fondar la partida de liquidaciones de años anteriores, para viabilizar el pago de	Ortiz Vivas, Ana Lucia	06/04/2021 - 10:37 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
liquidaciones de ex funcionarios del Proyecto a nivel nacional, conforme lo requerido por la Dirección de Administración de Talento Humano. Mediante Oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2021-0024-O de 8 de marzo de 2021, se remitió al BID el alcance a la justificación de gastos reportada mediante Oficio Nro. MIES-SDII-FAISDI-2020-0027-O de 30 de abril de 2020. Se cuenta con la Certificación PAPP y las Certificaciones Presupuestarias Nro. 167 y 168 emitidas en el Sistema Esigef, por un monto de USD\$52.752, que permitió solicitar la elaboración de la Resolución de Inicio de Proceso de contratación de la Auditoría Financiera del Programa. Se gestionó ante instancias externas (MEF) e internas (CGPGE y CGAF) la modificación presupuestaria del grupo 73 del Proyecto, por un monto de USD\$461.392,03, lo que viabilizará la ejecución de las actividades que se tiene previstas dentro del Proyecto. Envío de comunicaciones al BID, con el propósito de obtener la no objeción a los términos de referencia de los procesos previstos para el presente año y que se encuentran pendientes de aprobación. La ejecución acumulada del Proyecto alcanza el 22.59%, dentro del grupo de gasto 71 a nivel nacional.		
FEBRERO 2021 - Envío la armonización del Plan Anual de la Política Pública en base al Acuerdo Nro. 0012 del Ministerio de Economía y Finanzas. -Envío de la Reforma a la PAPP 2021 del grupo de gasto 71 del organismo y correlativo (9999-9999) que se encuentra no ejecutable y en Planta Central, al organismo y correlativo (2004-4130) desconcentrando el presupuesto a cada EOD conforme la matriz de conversión y proyección de personal de febrero a agosto; y del grupo de gasto 73 que se encuentra en un organismo y correlativo no ejecutable (9999/9999) al organismo (2002/5077), de acuerdo a los montos indicados por la Dirección Financiera con la finalidad de obtener la Certificación Actividad PAPP "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CONTRATO DE PRESTAMO 4607/OC-EC" del Proyecto. A asimismo se solicitó el incremento de presupuesto a fin de cumplir con la ejecución de las actividades planificadas en el 2021. -Envío la Programación Financiera y Flujo Financiero 2021 del Contrato de Préstamo BID 4607/OC-EC "Programa de Inversión en Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil", correspondiente a la Operación L-1235. - Actualización en el SEPA del Plan de Adquisiciones del Proyecto EC-L1235 -Consulta al BID sobre estado de no Objeciones a TDR, en relación a plazo y montos de las consultoría del Equipo de Gestión (Especialistas: Financiero, Adquisiciones y Monitoreo y Evaluación) del Contrato de Préstamo 4607/OC-E	Pérez Ruales, Nicole Alexandra	07/03/2021 - 10:54 PM
ENERO 2021 1. Consolidación de la información remitida por las unidades desconcentradas de julio a noviembre para la revisión del Proyecto de Red de Protección Social del Gasto Elegible. Y enviada mediante Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2021-0006-M. 2. Mediante MIES-VIS-FAISDI-2021-5-TEMP, se remitió a las unidades desconcentradas un recordatorio solicitud de Información Ejecución Presupuestaria de los Gastos Organismo 2003-Préstamo 2206-Mision Ternura del segundo semestre. 3. Mediante Memorando MIES-VIS-FAISDI-2021-0002-O, se remitió a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, un alcance del PAPP 2021 del proyecto de Misión Ternura 4. Elaboración de informe legal trimestral del Proyecto EC-L1235. 5. Elaboración de resolución de inicio, resolución de adjudicación y borrador de contrato para Proceso de Contratación EDG L1235. 6. Remisión para revisión legal CGAJ borradores de documentos legales procesos de Auditoría y EDG 1235	Montaño Valencia, Mae	05/02/2021 - 09:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
7. Actualización de el PEP de L1235 en función de las certificaciones de los procesos previstos para iniciar en el PEP, se actualizará cronograma valorado, PA, PAPP, PAI Y PMR, para envío de Informe semestral del proyecto al BID, conforme lo dispuesto en las cláusulas del Contrato. 8. Ajustar TDR de Auditoría Externa del L1235 para remitir nuevamente al BID por los nuevos tiempos. 9. Preparación de documentación para la Auditoría de Estado de Cuenta del proyecto L1235. (Continuar organización de archivo físico y digital para auditoría financiera). 10. Entrega de Informe de Gerencia del mes de diciembre e informe semestral de aspectos legales de los proyectos que administra la Gerencia		
Diciembre 2020 1. Se realizaron los trámites correspondientes ante la Coordinación General de Planificación, por lo que mediante Oficio Nro. STPE-SPN-2020-1138-OF del 9 de diciembre 2020, el Subsecretario de Planificación Nacional, emitió el Criterio Favorable de la Certificación Presupuestaria Plurianual de la para la contratación "Auditar los Estados Financieros y Evaluar el Sistema de Control Interno: Contrato de Préstamo No. 4607/OC-EC "Inversión en Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil (EC-11235)" y Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/ MG-16956-EC "Violencia Contra la Niñez, adolescencia y las mujeres en Ecuador"; y , la contratación Técnica Especializada Adquisición, Técnica Especializada Monitoreo, y Técnica Especializada Financiera. 2. Se realizó la gestión para la liquidación de Certificación papp de la LPI002 contrato de préstamo L1235. 3. Se solicitó la emisión de certificaciones plurianuales para los procesos de contratación previstos para el ejercicio 2020, lamentablemente no se emitieron las certificaciones correspondientes por lo que para el mes de enero se deberá actualizar el PEP de este proyecto, lo que implica también la actualización de las demás herramientas de gestión (Cronograma valorado, PA, PAPP, PAI y PMR). 4. Contrato de Licitaciones Públicas Internacionales - LPI. Se ha efectuado el acompañamiento, asesoría y seguimiento a los Administradores de contrato que se encuentran en ejecución (Contratos LPI001 y LPI002). Respecto de la LPI002, se recibió el pedido de la Administradora de Contrato de efectuar una segunda enmienda al contrato para prorrogar el plazo de la segunda entrega, para lo cual remitió el borrador de acta de negociación y en borrador de informe de prórroga; estos documentos fueron enviados a BID para su no objeción, a lo cual se recibió respuesta favorable mediante oficio CAN/CEC-1558/2020 de 23 de diciembre de 2020. Sobre este mismo tema, mediante oficio MIES-VIS-FAISDI-0084-O de 24 de diciembre de 2020, se remitió el borrador de Enmienda No.2 LPI002 y se solicitó la no objeción a este documento. En espera de respuesta del BID. 5. Equipo de Gestión. Revisión de los TDR de los procesos de contratación del ejercicio fiscal 2021. Se ha procedido a la actualización de documentación precontractual: Equipo de Gestión / Proyecto EC-L1235 y Avisos en Prensa de contrataciones del Proyecto: EC-L1235, al momento se encuentran en revisión previa remisión para suscripción de los mismos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral - SDII. Además se ha realizado una organización de las carpetas de profesionales que reúnen los requisitos para la consultoría. 6. Auditorías Financieras. Se solicitó la certificación plurianual para iniciar el proceso, lamentablemente la Dirección Financiera no emitió la certificación correspondiente, por lo que este proceso se deberá retomar en el mes de enero de siguiente año. 7. Se cuenta con el borrador de propuesta de Resolución de Inicio (CTESA), borrador de Resolución de Adjudicación y borrador de contrato para el proceso de contratación para Firma Auditora. Se solicitará a la CGAJ la revisión legal de dichos documentos. 8. Los archivos financieros han sido organizados para la ejecución de la auditoría de este proyecto.	Pérez Ruales, Nicole Alexandra	15/01/2021 - 10:10 AM
Noviembre 2020 - Con fecha 20 de noviembre, el BID y el MEF suscribieron el Contrato Modificatorio Nro. 1 por lo que se procedió a realizar la actualización del cronograma valorado y demás documentos habilitantes establecidos por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador con base en el nuevo monto del crédito. - Elaboración y envío de matriz de seguimiento SIPEIP del mes de octubre. - Elaboración de matriz de logros, correspondiente al mes de octubre 2020. - Elaboración y envío de comunicaciones de seguimiento a la ejecución del PEP de los Contratos de Préstamo L1235, L1236 y Convenio ATN- Violencia. - Coordinación de varias reuniones interinstitucionales con el Equipo Consultor del BID. - Asesoría a los Administradores en la ejecución de los contratos de las LPI1 y LPI2. Seguimiento y protocolización de Enmiendas LPI 001 y LPI 002 contrato de préstamo L1235. - Trabajo en equipo con a la Subsecretaría de Discapacidades, Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral y Subsecretaría de Protección Especial, asesorando en los temas de adquisiciones y en la elaboración de documentación precontractual.	Mediavilla Bustamante, María Gabriela	09/12/2020 - 04:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Elaboración y envío del PAPP Proyecto Misión Ternura. Elaboración y envío de reprogramación No. 10 al PAPP, liberación de los recursos del grupo de gasto 71. Elaboración y envío de reforma 11 y 12 para disponibilidad de recursos. - Se culminó la actualización del cronograma valorado y anexos, se subió al SIPEIP la documentación del proyecto. - Mediante CANCEC-1424-2020 se obtuvo la no objeción del BID al Informe Semestral 1 del contrato de préstamo L1235. - Ajuste, revisión y validación de la documentación de sustento para el gasto elegible del Banco Mundial de la partida presupuestaria 71 y 99 de las obligaciones acumuladas del 2019 para el periodo de enero a junio 2020 de las unidades zonales que remitieron la documentación solicitada. - Actualización del PA contrato de préstamo L1235 en el sistema SEPA conforme observaciones del BID. - Gestión para la obtención de certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera para el pago de haberes de liquidaciones de ex servidores del proyecto Misión Ternura. - Elaboración de presentación y participación en reuniones de revisión de cartera del MEF de los préstamos 4607 Desarrollo Infantil, 4634 Discapacidades y 4923 Población Migrante. - Participación en reunión Secretaría Técnica Plan Toda una Vida para revisión del estado del Contrato de Préstamo L1236 Programa de Discapacidad. - Reunión con consultora de BID para realizar el control de calidad del PEP L1235. - Gestión para la obtención de Certificación presupuestaria LPI002 contrato de préstamo L1235. - Envío de solicitud de certificación presupuestaria plurianual, contrato de préstamo L1235, para los siguientes procesos de contratación: Firma Auditora, Contenidos y Metodologías CDI, Equipo de Gestión (Especialista de Adquisiciones, Financiero y de Monitoreo y Evaluación); y contrato de préstamo L1236 proceso de contratación del Equipo de Gestión (Especialista de Adquisiciones y Legal) y consultoría para Servicio de impresión de la ATN. - Iniciar la elaboración de propuesta de Resolución de Inicio (CTSA) del proceso de contratación para Firma Auditora.		
Octubre 2020 - Asesoría a los Administradores en la ejecución de los contratos de las LPI1 y LPI2. - Seguimiento y protocolización de Enmiendas LPI 001 y LPI 002, para posterior envío al BID. - Trabajo en equipo con a la Subsecretaría de Discapacidades, Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral y Subsecretaría de Protección Especial, asesorando en los temas de adquisiciones y en la elaboración de documentación precontractual. - Elaboración y envío de matriz de seguimiento SIPEIP del mes de septiembre. - Elaboración de matriz de logros del proyecto Misión Ternura, correspondiente al mes de septiembre 2020. - Elaboración y envío del PAPP Proyecto Misión Ternura y de la Reforma 009 correspondiente a reprogramación de presupuesto del grupo de gasto 73. - Elaboración y envío de comunicaciones de seguimiento a la ejecución del PEP de los Contratos de Préstamo L1235, L1236 y Convenio ATN- Violencia. - Coordinación de varias reuniones interinstitucionales con el Equipo Consultor del BID. - Validación del gasto elegible del Banco Mundial de la partida presupuestaria 71 y 99, del periodo de enero a junio 2020 de las unidades zonales que remitieron la documentación solicitada. Envío de informe a la CGAF y Talento Humano para acciones pertinentes de las unidades zonales que no cumplieron las cláusulas para la validación de los contratos para ser gasto elegible del Banco Mundial. - Ajuste del cronograma valorado con base en las observaciones remitidas por el BID. - Coordinación con la Subsecretaría de Protección Especial los requisitos para el cumplimiento de las condiciones previas para el Programa EC-L1258 y ATN RG-T3543- Movilidad - Ajuste del informe semestral y herramientas de gestión Contrato de Préstamo L1235, de acuerdo a las observaciones remitidas por el BID y envío de alcance. - Gestión para la aprobación del acuerdo ministerial 045 para la actualización del Reglamento Operativo del Proyecto "Apoyo a la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en Ecuador (EC-L1236). - Elaboración de matriz de indicadores proyecto misión ternura para remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil. - Remitir la documentación necesaria para conocimiento de los Proyectos, a las Autoridades entrantes de manera oficial. - Elaboración de respuesta a Informe sobre solicitud de prórroga y reprogramación de cronograma presentada por el Consorcio Lidex-Garabatos - Contrato LPI-001. - Participación en reunión de trabajo con la Subsecretaría de Desarrollo Infantil para revisión de temas pendientes del préstamo L1235. - Participación en reunión de trabajo con la Subsecretaría de Discapacidades para revisión de temas pendientes del préstamo L1236 y ajuste del PEP. - Actualización del PA contrato de préstamo L1236 en el sistema SEPA del BID y envío de matriz del PA préstamo L1235 para revisión del BID.	Palma Arias, Andrea Margarita	05/11/2020 - 10:04 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Participación en reunión de seguimiento del préstamo L1236 con la Secretaría Técnica Toda una Vida y envío de avances. - Envío de comunicación al BID para el reconocimiento de gastos como aporte local en proceso de capacitación a juntas con base en la Resolución 081 del MEF.		
Septiembre 2020 - Trabajo en equipo con a la Subsecretaría de Discapacidades y Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral y Equipo Técnico de la ATN - Violencia, asesorando en los temas de adquisiciones y en la elaboración de la documentación precontractual. - Asesoría a los Administradores en la ejecución de los contratos de las LPI1 y LPI2. - Coordinación de varias reuniones interinstitucionales con el Equipo Consultor del BID. - Elaboración de matriz de logros, correspondiente al mes de agosto 2020. - Elaboración y envío del PAPP Proyecto Misión Ternura. - Revisión de los TDR del Equipo Técnico de Desarrollo Infantil, contrato de préstamo L1235, para envío de solicitud de no objeción al BID. - Elaboración y envío de comunicaciones de seguimiento a la ejecución del PEP de los Contratos de Préstamo L1235, L1236 y Convenio ATN- Violencia. - Validación del gasto elegible del Banco Mundial de la partida presupuestaria 71 y 99, del periodo de enero a junio 2020 de las unidades zonales que remitieron la documentación solicitada. - Ajuste de informe semestral y herramientas de gestión Contrato de Préstamo L1235, de acuerdo a las observaciones remitidas por el BID. - Ajuste del cronograma valorado con base en las observaciones remitidas por el BID. - Elaboración y envío a la Viceministra el informe de logros, avances y plan de trabajo de la Gerencia (de enero al 21 de agosto 2020). - Elaboración y envío del PEP y PA de la ATN-Violencia, al BID. - Actualización y envío de la matriz de seguimiento requerida por la Presidencia - Contrato de Préstamo L1236. - Envío de Oficio al SERCOP, para la publicación de los perfiles para la contratación del equipo ejecutor L1236 y envío de memorando a la Dirección de Comunicación Social, para la publicación de los perfiles en la página web del MIES. - Recopilación, revisión y precalificación de hojas de vida para Especialistas de Adquisiciones y Legal del contrato de préstamo L1236, para envío al BID. - Realizar seguimiento al Acta negociación LPI002 y a la suscripción de la Enmienda LPI001. - Elaboración y envío de matriz de seguimiento SIPEIP del mes de agosto. - Preparación de respuesta a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, sobre las acciones de políticas de género. - Elaboración de informe de estado de préstamo de desarrollo infantil para presentar a la Viceministra. - Elaboración del informe de gestión de la gerencia del periodo enero-septiembre 2020 para la máxima autoridad. - Elaboración de propuesta de modificación ROP - L1236. BID otorgó no objeción a la tercera versión. - Envío a la Subsecretaría de Protección Especial los requisitos para el cumplimiento de las condiciones previas para el Programa Inclusión de la Población Migrante - y para la ATN RG-T3543. - Remitir los hitos a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral del contrato de préstamo L1235, de septiembre 2020 a mayo 2021.	Palma Arias, Andrea Margarita	05/10/2020 - 08:07 AM
Agosto 2020 - Trabajo en equipo con a la Subsecretaría de Discapacidades y Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, asesorando en los temas de adquisiciones y en la elaboración de la documentación precontractual. - Asesoría a los Administradores en la ejecución de los contratos de las LPI1 y LPI2. - Coordinación de varias reuniones interinstitucionales con el Equipo Consultor del BID. - Elaboración de matriz de logros correspondiente al mes de julio 2020. - Elaboración de informe de gestión y presentación sobre la gestión de enero a agosto y actividades de los próximos 3 meses de la Gerencia solicitado por el Viceministerio de Inclusión Social. - Revisión de los TDR del Equipo Técnico (Especialistas de Nutrición, Salud Mental y Pedagogía) del contrato de préstamo L1235, previo envío para no objeción al BID. - Coordinación con el equipo de la Subsecretaría de Protección Especial en los procesos de contratación programados para la ejecución de la ATN/MG-16956-EC - "Violencia contra la Niñez, la Adolescencia y las Mujeres en Ecuador". Actualización de PEP y SEPA. - Elaboración y envío de comunicaciones de seguimiento a la ejecución del PEP de los Contratos de Préstamo L1235, L1236 y Convenio ATN.	Palma Arias, Andrea Margarita	04/09/2020 - 12:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Se gestionó las solicitudes de certificaciones plurianuales para la Contratación de: Auditorías financieras, Elaboración de Contenidos y Metodologías de Trabajo de Centros de Desarrollo Infantil y Equipo de Gestión del Préstamo 4607/OC-EC. - Validación del gasto elegible del Banco Mundial de la partida presupuestaria 71 y 99, del periodo de enero a junio 2020. - Mediante Oficio Nro. MIES-SDII-FAISDI-2020-0039-O se remitió al MEF el informe de alcance de reprogramación para el cumplimiento del Acuerdo 001 y aporte local 2019, se solicitó el direccionamiento de USD 8.158.060,00. - Ajuste de informe semestral y herramientas de gestión Contrato de Préstamo L1236, de acuerdo a las observaciones remitidas por el BID y con base en las directrices establecidas en reunión de equipo. Se remite alcance mediante Oficio Nro. MIES-SDII-FAISDI-2020-0044-O -Mediante comunicación CAN/CEC-981/2020 de 21 de agosto de 2020, el BID otorgó la No Objeción a los modelos de invitación para la contratación del especialista legal y de adquisiciones del préstamo L1236 -Mediante comunicación CAN/CEC-901/2020 de 06 de agosto de 2020, el BID otorgó No Objeción a los modelos de invitación para la contratación del especialista de adquisiciones, financiero y monitoreo del préstamo L1235 - Envío de solicitud de No Objeción al BID de la Enmienda No.1 del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1 LPI-S-LPI-4607-001-2019.		
Julio 2020 -- Elaboración de Informes Semestrales de Progreso (ISP) y sus anexos, correspondientes a: Préstamo 4607/OC-EC - Programa "Inversión en Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil" (EC-L1235); Préstamo 4634/OC-EC - Programa de "Apoyo a la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en Ecuador" (EC-L1236); y Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MG-16956-EC -"Violencia contra la Niñez, la Adolescencia y las Mujeres en Ecuador" para envío al BID. - Actualización de la Matriz de Riesgos del contrato de préstamo L1235, misma que cuenta con aprobación de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil. - Construcción de la Matriz de Riesgos del contrato de préstamo L1236. - Trabajo en equipo con a la Subsecretaría de Discapacidades y Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, asesorando en los temas de adquisiciones y en la elaboración de la documentación precontractual. - Asesoría a los Administradores en la ejecución de los contratos de las LPI1 y LPI2. - Elaboración y envío del cronograma valorado plurianual del Proyecto Misión Ternura. - Elaboración y envío de la matriz PAI 2021, del Proyecto Misión Ternura. - Elaboración de cronogramas mensualizados del Proyecto Misión Ternura. - Elaboración de matriz de seguimiento a contratos de préstamo y ATN solicitada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales. - Elaboración de matriz de logros, correspondiente al mes de junio 2020, para la remisión a la SDII. - Elaboración del informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria institucional del proyecto Misión Ternura del periodo enero-junio 2020. - Envío de la propuesta de Reglamento Operativo del Proyecto del contrato de préstamo L1235 al BID, para su revisión previo envío de solicitud de no objeción. - Revisión del presupuesto de las unidades distritales que se unificaron con base en el nuevo Estatuto del MIES. - Armonización del PAPP en la nueva matriz remitida por la CGPGE. - Envío de comunicaciones para las Subsecretarías de Desarrollo Infantil y de Discapacidades con el seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas y pendientes, de acuerdo a la información del PEP. - Coordinación de varias reuniones interinstitucionales con el Equipo Consultor del BID. - Reforma de la partida presupuestaria 71 en relación a la sentencia de la Coordinación Zonal 7. - Envío de solicitud de no objeción para Consultorías Individuales del Equipo de Gestión del Contrato de Préstamo EC-L1235. - Actualización y envío de los Planes de Adquisiciones de los Préstamos L1235 y L1236, en el Sistema SEPA del BID. - Envío de solicitud de certificaciones plurianuales para la contratación de auditorías financieras del Préstamo EC-L1235. - Envío de solicitud de certificación plurianual para la contratación de "Consultor Individual para Elaboración de Contenidos y Metodologías de Trabajo de Centros de Desarrollo Infantil". - Elaboración del Informe de Gestión de Enero a Julio 2020, del Proyecto Misión Ternura. - Actualización de las herramientas de gestión de los Contratos de préstamo L1235, L1236 y Convenio ATN, para adjuntarlas a los informes semestrales respectivos.	Palma Arias, Andrea Margarita	04/08/2020 - 03:38 PM
Junio 2020 - Participación en Taller de arranque parte 2, para revisión del contrato de préstamo 4607/OC-EC "Inversión en calidad de los servicios de Desarrollo Infantil".	Palma Arias, Andrea Margarita	05/07/2020 - 03:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Envío de respuestas al MEF con los avances de los acuerdos alcanzados entre el MIES, BID y MEF en las reuniones de revisión de cartera del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC y Contrato de Préstamo 4634/OC-EC. - Trabajo en equipo con a la Subsecretaría de Discapacidades y Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, asesorando en los temas de adquisiciones y en la elaboración de la documentación precontractual. - Socialización del ROP contrato de préstamo L1236, a la Subsecretaría de Discapacidades, detallando los responsables y sus actividades. - Coordinación con Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral y el BID, para la determinación de la línea base y evaluación de impacto del proyecto L1235. - Envío de la solicitud de aprobación del Equipo de Gestión de los proyectos L1235 y L1236, al MEF con base en los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida el 08 de junio. Mef otorga no objeción para la contratación de 5 especialistas en total. - Elaboración de ajustes a la propuesta de ROP L1235, con base en observaciones del BID, previo envío de la solicitud de no objeción al BID. - Ajuste de Términos de Referencia del Equipo de Gestión, PEP, Plan de Adquisiciones y SEPA, de los proyectos L1235 y L1236, con base en los acuerdos alcanzados con el MEF y BID. - Actualización del Cronograma Valorado del Proyecto Misión Ternura. - Envío de memorando a la Dirección de Comunicación Social, para la publicación de los perfiles del equipo de gestión en la página web del MIES. - Gestión para el envío de solicitud de certificaciones plurianuales una vez que el BID remitió la no objeción respecto a los pliegos para la contratación de auditorías financieras del Préstamo 4607/OC-EC. - Armonización del PAP con base en el recorte presupuestario remitido por el MEF, Proyecto Misión Ternura. - Acompañamiento a los Administradores en la ejecución de los contratos de las LPI1 y LPI2, Préstamo 4607/OC-EC. - Revisión y envío al BID de formulario de reconocimiento de gastos del Contrato de Talleres de Capacitación para el Fortalecimiento de Capacidades de los Sistemas Especializados de Protección Integral de Derechos. - Envío de comunicaciones para las Subsecretarías de Desarrollo Infantil Integral y de Discapacidades con el seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas y pendientes, de acuerdo a la información del PEP. - Inicio de elaboración de Informes Semestrales de los préstamos L1235 y L1236, para envío al BID.		
Mayo 2020 - Presentación de la revisión de cartera del contrato de préstamo L1235, con el MEF, BID, seguimiento a compromisos y remisión de informe - Reunión con el BID y el equipo de la Subsecretaría de Protección Especial, para analizar el cambio de actividades del ATN considerando que por la emergencia del COVID no se podrá aplicar la encuesta prevista para el 2020. - Envío de oficio con la Justificación de Gastos, ficha de Desembolsos y Estado de Gastos al MEF préstamo L1235. - Gestión de observaciones del BID al formulario de reconocimiento de gastos del Contrato de talleres de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de los Sistemas Especializados de Protección Integral de Derechos. - Comunicación con la Coordinación de Planificación para conocer el estado del Proyecto y el CUP del Contrato de Préstamo "Inclusión de la Población Migrante y Receptora en los Servicios Sociales en Ecuador" (EC-L1258). - Seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas, de acuerdo al PEP, remitiendo comunicación con el detalle de actividades pendientes y las que deben ejecutarse durante mayo, préstamo L1235. - Remisión de PEP y PMR mediante Oficio Nro. MIES-SDII-FAISDI-2020-0028-O actualizados y ajustados del préstamo L1235, para revisión y aprobación del BID y actualización en sistema SEPA. - Envío de los informes técnicos de justificación para la contratación de los equipos de gestión al MEF, de los contratos de préstamo 4607/OC-EC y 4634/OC-EC. - Seguimiento al estado de los documentos precontractuales enviados a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a fin de obtener aprobación. - Elaboración del borrador de la propuesta del ROP L1235 previo envío de la solicitud de no objeción al BID. - Reprogramación al PAP con base en la última versión del PEP del préstamo L1235. - Coordinación y análisis de los saldos pendientes para liquidación de haberes de los ex servidores del Proyecto Misión Ternura 2020 en territorio. - Actualización de los cronogramas valorados de la Gerencia Misión Ternura. - Envío de herramientas de gestión, correspondientes al préstamo L1236, actualizadas y ajustadas para revisión y aprobación del BID. Elaboración de cronogramas valorados	Palma Arias, Andrea Margarita	05/06/2020 - 09:31 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Se expide el Acuerdo Ministerial No. 028 con fecha 30 de mayo, mediante el cual la Máxima Autoridad aprueba el ROP del Contrato de Préstamo No. 4634/OC-EC. - Reunión para presentación y revisión del ROP 1236, al Equipo de la Subsecretaría de Discapacidades.		
Abril 2020 - Actualización del ROP L1235, preparación de matriz de cambios y/o reformas, además de la revisión y estructuración de propuestas a partir del nuevo ROP L1236. - Análisis para el incremento del presupuesto y la emisión de la reforma presupuestaria de los saldos disponibles para el pago de liquidaciones de haberes 2019 y 2020. - Seguimiento al cumplimiento de la planificación de acuerdo a la información del PEP Préstamo 4607/OC-EC, detallando las actividades que se encuentran pendientes y las que deben ejecutarse durante todo el mes. - Participación en la coordinación y en el seguimiento al proceso de Transferencia para la Asistencia de Alimentación para hogares en vulnerabilidad transitoria. Reunión de coordinación para asistencia humanitaria con ONG CARE, Plan Internacional y Child Found por la emergencia del COVID-19. Elaboración de informe de viabilidad con al incorporación de un apartado de marco teórico (del manual esfera). - Aprobación del Informe Técnico de Viabilidad y solicitud de no objeción al ROP Contrato de Préstamo 4634/OC-EC "Programa de Apoyo a la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en Ecuador". - Envío del Plan de Adquisiciones al BID para aprobación, Préstamo 4607/OC-EC. - Reunión de gerencia para analizar y validar las actividades, productos y presupuestos de los contratos de préstamos considerando las directrices presupuestarias emitidas por el MEF para el segundo trimestre 2020. - Elaboración de propuesta de PMR del préstamo L1235 para presentación a las máximas autoridades sobre la nueva reprogramación del crédito. - Participación en reunión con el equipo del BID, Viceministra e Inclusión Social, Subsecretaria de Desarrollo Infantil para revisión de actividades del préstamo L1235 con base a emergencia COVID19 - Participación en la reunión para revisión de cartera del préstamo L1236 con el BID, Secretaría de Planificación, Ministerio de Finanzas y equipo técnico del MIES. - Mediante reuniones virtuales se trabajó en la revisión de herramientas de gestión PEP, PMR y equipo técnico del préstamo L1236. - Reunión con el equipo sectorial del BID para priorizar los contratos de los préstamos L1235 y L1236, tomando en cuenta la situación actual por la emergencia del COVID19	Palma Arias, Andrea Margarita	05/05/2020 - 11:04 AM
Marzo 2020 - Reunión con el equipo sectorial del BID a fin de validar el cambio del valor de la línea base 2017 de 49,85% a 54,31% del indicador de resultados del componente 1: "Calidad Estructural CNH: Ratio promedio de porcentajes de visitas efectivas CNH por niño de 0-18 meses, del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC. - Revisión de la última versión del PEP y del PMR, donde se ajustó la reprogramación respecto al Acuerdo 001 del MEF. Con lo que queda aprobada la nueva tabla de costos del contrato de préstamo. - Análisis del diseño del componente 1 del Préstamo 4607/OC-EC y revisión del estado de contratación de la consultoría de Guía y contenidos CDI para el soporte en la definición de TDRs y la consecución de los productos, con el equipo del BID y la Subsecretaría de Desarrollo Infantil. - Elaboración y ajuste de las herramientas para dar cumplimiento a las condiciones previas del Préstamo 4634/ OC-EC "Apoyo a la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en Ecuador". (ROP- matriz de resultados y PEP) - Mediante reuniones virtuales se trabajó en las herramientas: Matriz de resultados y Plan de ejecución del proyecto (PEP). - Realización del taller de arranque del Préstamo 4634/ OC-EC, en los que se realizaron ajustes a las herramientas y validación con el equipo fiduciario del BID. - Posteriormente se mantuvieron reuniones para ajustar el PEP con base a los lineamientos del BID considerando también la situación de emergencia del país y los plazos establecidos para los procesos de contratación. - Taller de capacitación en el sistema SEPA al equipo de la Gerencia Misión Ternura. - Reuniones para la definición del nuevo préstamo emergente para la entrega del bono por concepto de la emergencia sanitaria a la población más vulnerable a cargo del Viceministerio de Inclusión Económica. - Envío de los informes para la aplicación del acuerdo ministerial 001 del MEF de los siguientes contratos: Préstamo No. 4607/OC-EC- Programa "Inversión en Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil", se remitió el informe con la reprogramación del presupuesto y actividades, se solicitó la cancelación parcial del préstamo; del Contrato de préstamo 4634/OC-EC, "Componente 3 (MIES): Proyecto: "Fortalecimiento a la gestión e innovación en el cuidado de personas con	Palma Arias, Andrea Margarita	03/04/2020 - 11:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
discapacidad severa"; y del Contrato de préstamo 4923/OC-EC, se envió el Informe con el Componente 1 "Protección social de población migrante y receptora vulnerable". -Se informó a la Administradora del Contrato que se efectuó el pago de los anticipos de la LPI1 y LPI2 por lo que empezó a correr el plazo de los contratos, para sus acciones pertinentes. -Ajustes permanentes a la planificación y presupuesto programado considerando las reformas y disminuciones al presupuesto que realizó el MEF.		
Febrero 2020 - Armonización del PAPP con la cédula presupuestaria, solicitando las reformas respectivas para la corrección de los organismos y correlativos entre fuentes de financiamiento. - Seguimiento permanente a la Coordinación Administrativa Financiera y al MEF para la corrección y reforma presupuestarias a fin de que todos los pagos por concepto de remuneración del grupo sean cancelados. - Ajuste de las herramientas de gestión (PEP, PMR, PA, Plan Financiero y Flujo de caja) del contrato de préstamo 4607/OC-EC para dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial 001 del Ministerio de Economía y Finanzas en lo referente al PEP se propuso la desactivación de algunos productos del componente 3 por no ser competencia del MIES sin que afecten el indicador de resultados. - Elaboración y revisión de los TDR y solicitudes de propuesta para el equipo de gestión y coordinador del Préstamo 4607/OC-EC. De igual manera, se realizó la valoración de las hojas de vida para la determinación de las calificaciones. - Revisión y envío de observaciones a los TDRs del equipo técnico remitido por la Subsecretaría de Desarrollo Infantil a fin de que se inicie el proceso precontractual. - Elaboración y revisión de los TDR y pliegos para la contratación de la auditoría externa del contrato de préstamo 4607/OC-EC y de la ATN/MG-16956-EC. - Coordinación con la Subsecretaría de Discapacidades y el BID para el cumplimiento de las condiciones previas para la elegibilidad del préstamo 4634/OC-EC. - Programación 2020 en el módulo SIPeIP del proyecto de inversión con base a presupuesto asignado 2020. - Se preparó la información adicional sobre el Seguimiento y Evaluación de Ejecución Presupuestaria Institucional del año 2019. - En el mes de febrero se coordinaron varias reuniones interinstitucionales con el Equipo Consultor del BID. - Reuniones periódicas con el MEF a fin de cumplir con las obligaciones financieras pendientes del Proyecto. - Se ha puesto en conocimiento y aprobación del Viceministerio de Inclusión Social el Informe Técnico de Viabilidad FAISDI-2020-001 para la reforma de los Acuerdos Ministeriales 120 y 127.	Palma Arias, Andrea Margarita	12/03/2020 - 03:45 PM
Enero 2020 .Reuniones situacionales para establecer la planificación del año 2020 del proyecto considerando el Acuerdo Ministerial 001 emitido por el MEF, en el que se establece que en los proyectos con financiamiento externo el monto del IVA se incluya en los recursos del préstamo .Revisión y propuesta del organigrama del equipo de gestión (fiduciario) de todos los convenios (préstamos y ATNs) con fondos BID. .Elaboración de informe semestral de progreso del contrato de préstamo 4607 (período 01 de julio al 31 de diciembre de 2019) anexos (PEP, PMR, Flujo de caja, PA, Plan Financiero y Matriz de Riesgos). .Definición de la planificación PAPP 2020 del Proyecto con base en techo presupuestario aprobado .Informe institucional para el MEF sobre la ejecución presupuestaria y avances físicos del proyecto. .Informe semestral para reporte al SIPeIP sobre avances físicos del Proyecto Mision Ternura. .Elaboración de instrumentos para el Plan Anual Comprometido (PAC) 2020 e insumos GPR-establecimiento de hitos e indicadores para el 2020. .Regularización de reporte de resumen ejecutivo, ejecución presupuestaria, reporte de hitos del último trimestre de 2019. .Revisión de la metodología de la evaluación del impacto del préstamo 4607 a fin de iniciar la medición de la línea base. .Gestiones pertinentes para dar seguimiento al pago de los valores devengados de anticipos de procesos de licitación y contratación realizados en el 2019. .Asesoría a los equipos de las Subsecretarías para elaboración de los TDRs de los equipos técnicos (figura de consultoría). .Propuesta de acuerdo ministerial para delimitar la autorización de gasto dependiendo de las fuentes de financiamiento para que en cada proyecto se tenga claramente establecidas las atribuciones y responsabilidades de cada autoridad delegada, lo que mejoraría la articulación y ejecución de los mismos.	Palma Arias, Andrea Margarita	12/02/2020 - 03:35 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Gestiones para iniciar los procesos precontractuales para la contratación del equipo ejecutor, equipo técnico y auditoría externa.		
Diciembre 2019 Culminación de los procesos de licitación pública internacional 1.Licitación Pública Internacional LPI01 para la adquisición de 2016 KITS de material didáctico CDI y 4939 KITS para CNH. 2.Licitación Pública Internacional LPI02 para la adquisición de 2016 KITS de material impreso y 4939 CNH. Contratación de 4 consultores, los cuales tienen como objetivo 1. Capacitación en protección de derechos NNA 2. Elaborar propuestas de normativas para protección de derechos de NNA en el marco del contrato de préstamo 4607 3. Mecanismos en participación ciudadana 4. Construcción de implementación del sistema de información de igualdad y no discriminación con prioridad en protección integral NNA, los consultores procedieron con la entrega de los productos establecidos en los TDRs. Entrega de los productos de la consultoría para elaborar la Ley de Política de la Primera Infancia por un valor de \$ 35.000,00 Contratación de talleres de capacitación en consulta nacional a niños, niñas y adolescentes realizados en noviembre y diciembre. En el mes de diciembre se devengó un presupuesto total de: \$3.028.212,25 Información tomada del informe de fin de gestión del Ing. Carlos Caicedo Valladares remitido mediante Memorando Nro. MIES-SDII-FAISDI-2019-0228-M de fecha 31 de diciembre de 2019	Palma Arias, Andrea Margarita	07/01/2020 - 03:03 PM
NOVIEMBRE 2019: Avance en la ejecución de los procesos de licitación pública internacional 1.Licitación Pública Internacional LPI01 para la adquisición de 2016 KITS de material didáctico CDI y 4939 KITS para CNH. 2.Licitación Pública Internacional LPI02 para la adquisición de 2016 KITS de material impreso y 4939 CNH. Contratación de 4 consultores, los cuales tienen como objetivo 1. Capacitación en protección de derechos NNA 2. Elaborar propuestas de normativas para protección de derechos de NNA en el marco del contrato de préstamo 4607 3. Mecanismos en participación ciudadana 4. Construcción de implementación del sistema de información de igualdad y no discriminación con prioridad en protección integral NNA, actualmente los consultores están entregando productos para proceder al pago. En el mes de noviembre se devengó un presupuesto total de: \$1.498.008.28 Información tomada del informe de fin de gestión del Ing. Carlos Caicedo Valladares remitido mediante Memorando Nro. MIES-SDII-FAISDI-2019-0228-M de fecha 31 de diciembre de 2019	Palma Arias, Andrea Margarita	07/01/2020 - 02:33 PM
OCTUBRE 2019. Avance en la ejecución de los procesos de licitación pública internacional (LPI 01 y LPI 02) para el equipamiento e impresión de material para los CDI y CNH a nivel nacional.	Palma Arias, Andrea Margarita	06/01/2020 - 12:02 PM
SEPTIEMBRE 2019. El proyecto se enfoca a la sistematización de datos para el Informe mensual de seguimiento a la ejecución enmarcadas al Modelo de Gestión territorial establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.	Montaño Valencia, Mae	14/10/2019 - 02:34 PM
AGOSTO 2019. Elaboración de Término de Referencia para realizar la impresión de material didáctico; pliegos aprobados por parte del BID respecto a los insumos para la normativa nacional de niños, niñas y adolescentes, e Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria; todas estas acciones enmarcadas al Modelo de Gestión territorial establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.	Montaño Valencia, Mae	14/10/2019 - 02:33 PM
JULIO 2019: El proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y continuar con la consecución de los hito previstos para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil, adicional se presenta a la Dirección de Seguimiento el Informe mensual a la ejecución presupuestaria.	Montaño Valencia, Mae	29/08/2019 - 03:29 PM
JUNIO 2019: Elaboración de Términos de Referencia para realizar la contratación de los especialistas del equipo de gestión del proyecto BID "Inversión en Calidad de los Servicios" y elaboración de Términos de Referencia para la contratación de coordinadoras técnicas	Montaño Valencia, Mae	29/08/2019 - 03:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil en aplicación al Modelo de Gestión territorial en función a lo establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.		
MAYO 2019: Consecución de procesos para avanzar en la realización de los Términos de Referencia para la Impresión de material didáctico y/o curricular.	Montaño Valencia, Mae	29/08/2019 - 03:28 PM
ABRIL 2019: Elaboración y envío de Términos de Referencia para la Adquisición de material didáctico CDI y CNH los cuales son procesos de Licitación Pública Internacional.	Montaño Valencia, Mae	29/08/2019 - 03:28 PM
MARZO 2019: La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), emite el Dictámen de Prioridad al Proyecto y se presenta a la Dirección de Seguimiento el Informe mensual a la ejecución presupuestaria.	Montaño Valencia, Mae	29/08/2019 - 03:27 PM
FEBRERO 2019: Se obtuvo la aprobación del PAPP del proyecto, en las partidas presupuestarias y se redistribuyó a cada Entidad Operativa Desconcentrada (EOD), para el arranque del proyecto.	Montaño Valencia, Mae	29/08/2019 - 03:27 PM
ENERO 2019: El proyecto realiza acciones para la asignación de recursos presupuestarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, al proyecto.	Montaño Valencia, Mae	29/08/2019 - 03:26 PM
JULIO 2019: El proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y continuar con la consecución de los hito previstos para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil	Montaño Valencia, Mae	12/08/2019 - 03:06 PM
JUNIO 2019: Con el objetivo de garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, el proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y empezar procesos de contratación	Montaño Valencia, Mae	11/07/2019 - 04:37 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Si el Proveedor del LPI02 no cumple la segunda entrega de bienes CAUSARIA que no se liquide el contrato y a su vez no se justificaría 80% de recurso en el desembolso de Fondos ante el BID	02/06/2022	Mercedes Liliana Lascano Gomez	70 %	80	56	2/3

Riesgos cerrados: 10, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Elaboración de proyecto	4-Inicio de Trabajo	01/02/2019		01/02/2019		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto, elaborado	4-Inicio de Trabajo	08/02/2019		08/02/2019		Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: Dictamen de prioridad del proyecto, aprobado	9-Entregables Formales	04/03/2019		04/03/2019		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	11/03/2019		11/03/2019		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de material didáctico para	5-Entregables Intermedios	18/04/2019		18/04/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	equipar las unidades de CDI y CNH, aprobado							
6	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la contratación al equipo de Gestión para la Gerencia del Proyecto Misión Ternura, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/06/2019		05/06/2019		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil, elaborados	5-Entregables Intermedios	13/06/2019		13/06/2019		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	03/07/2019		03/07/2019		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	02/08/2019		02/08/2019		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la impresión de material didáctico y/o curricular desarrollado, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/08/2019		22/08/2019		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Informe de insumos para la normativa nacional de niños, niñas y adolescentes, elaborados	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	04/09/2019		04/09/2019		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	03/10/2019		03/10/2019		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	06/11/2019		06/11/2019		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la capacitación al personal técnico operativo de CDI y/o CNH, aprobado	4-Inicio de Trabajo	21/11/2019		21/11/2019		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a las asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2019		22/12/2019		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	29/02/2020		29/02/2020		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)							
21	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/04/2020		30/04/2020		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/05/2020		31/05/2020		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Elaborar las reformas al Reglamento Operativo Proyecto (ROP) - Contrato de préstamo EC-L1235. (Reglamento Operativo Proyecto (ROP) -Contrato de préstamo EC-L1235 reformado)	9-Entregables Formales	31/05/2020		31/05/2020		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Elaboración del Informe semestral de progreso (Formato BID). (Informe semestral de progreso(Formato BID))	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/08/2020		31/08/2020		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	30/09/2020		30/09/2020		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)	9-Entregables Formales	30/09/2020		30/09/2020		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
33	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/09/2020		30/09/2020		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/10/2020		31/10/2020		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/11/2020		30/11/2020		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Realizar informe final de ejecución del proyecto 2020. (Documento compilado de los resultados obtenidos del proyecto a nivel nacional)	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria ENERO . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/01/2021		31/01/2021		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Elaboración del Informe semestral (SEGUNDO SEMESTRE 2020) de progreso (formato BID). (Informe semestral de progreso(Formato BID)	9-Entregables Formales	28/02/2021		28/02/2021		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria FEBRERO . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	28/02/2021		28/02/2021		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes Trimestrales PRIMER TRIMESTRE (Informes de monitoreo y seguimiento;y; Asesoría Legal)	9-Entregables Formales	31/03/2021		31/03/2021		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria MARZO . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/03/2021		31/03/2021		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Elaborar las reformas al Reglamento	9-Entregables Formales	31/03/2021		31/03/2021		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Operativo Proyecto (ROP) - Contrato de préstamo EC-L1235. (Reglamento Operativo Proyecto (ROP) -Contrato de préstamo EC-L1235 reformado)							
46	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria ABRIL . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/04/2021		30/04/2021		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria MAYO . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/05/2021		31/05/2021		Sí	1.0
48	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes Trimestrales SEGUNDO TRIMESTRE (Informes de monitoreo y seguimiento;y; Asesoría Legal)	9-Entregables Formales	30/06/2021		30/06/2021		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria JUNIO. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/06/2021		30/06/2021		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN: Elaboración del Informe semestral (PRIMER SEMESTRE 2021) de progreso (formato BID). (Informe semestral de progreso(Formato BID	9-Entregables Formales	31/07/2021		31/07/2021		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria JULIO. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/07/2021		31/07/2021		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria AGOSTO . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/08/2021		31/08/2021		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Entrega de Estados Financieros Auditados 2019-2020 (Acta Entrega)	9-Entregables Formales	31/08/2021		31/08/2021		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes Trimestrales TERCER TRIMESTRE (Informes de monitoreo y seguimiento;y; Asesoría Legal)	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	1.0
55	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria SEPTIEMBRE . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria OCTUBRE . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/10/2021		31/10/2021		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
57	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria NOVIEMBRE . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/11/2021		30/11/2021		Sí	1.0
58	EJECUCIÓN: Contratación Equipo de Gestión (Coordinador, Adquisiciones, Monitoreo y Financiero)	9-Entregables Formales	31/12/2021		31/12/2021		Sí	1.0
59	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes Trimestrales CUARTO TRIMESTRE (Informes de monitoreo y seguimiento; y; Asesoría Legal)	9-Entregables Formales	31/12/2021		31/12/2021		Sí	1.0
60	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria DICIEMBRE . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/12/2021		31/12/2021		Sí	1.0
61	EJECUCIÓN: Realizar informe final de ejecución del proyecto 2021 (Documento compilado de los resultados obtenidos del proyecto a nivel nacional)	9-Entregables Formales	31/12/2021		31/12/2021		Sí	1.5
62	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria ENERO . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/01/2022		31/01/2022		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN: Elaboración del informe semestral (jul-dic 2021) . (Informe semestral y herramientas de gestión actualizadas)	9-Entregables Formales	28/02/2022		01/02/2022		Sí	0.5
64	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria FEBRERO . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	28/02/2022		28/02/2022		Sí	0.5
65	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes Trimestrales PRIMER TRIMESTRE (Informes de Monitoreo y Seguimiento, Adquisición; y; Asesoría Legal)	9-Entregables Formales	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.5
66	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria MARZO . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.5
67	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria ABRIL . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/04/2022		30/04/2022		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN: Envío al BID de los estados financieros	9-Entregables Formales	30/04/2022		30/04/2022		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	auditados ABRIL. (Informe de Auditoría)							
69	EJECUCIÓN: Aprobación por parte del BID del informe técnico de aprobación de necesidades de procesos a ejecutarse en el 2022. (Comunicación del BID)	9-Entregables Formales	31/05/2022		31/05/2022		Sí	0.5
70	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria MAYO . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/05/2022		31/05/2022		Sí	0.5
71	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes Trimestrales SEGUNDO TRIMESTRE (Informes de Monitoreo y Seguimiento, Adquisición; y; Asesoría Legal)	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	0.5
72	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria JUNIO . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	0.5
73	EJECUCIÓN: Elaboración del informe semestral (ene-jun 2022) JULIO . (Informe semestral y herramientas de gestión actualizadas)	9-Entregables Formales	31/07/2022	31/07/2022			No	0.5
74	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria JULIO . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/07/2022	31/07/2022			No	0.5
75	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria AGOSTO . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/08/2022	31/08/2022			No	0.5
76	EJECUCIÓN: Contratación para impresión de material didáctico y/o curricular-segunda fase (Contrato)	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	0.5
77	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria SEPTIEMBRE . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	0.5
78	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes Trimestrales TERCER TRIMESTRE (Informes de Monitoreo y Seguimiento, Adquisición; y; Asesoría Legal)	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	0.5
79	EJECUCIÓN: Adquisición de equipamiento tecnológico al servicio del desarrollo infantil (Contrato)	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
80	EJECUCIÓN: Contratación para equipamiento CNH segunda fase (Contrato)	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	0.5
81	EJECUCIÓN: Contratación de consultoría para la elaboración del mecanismo de monitoreo y control a los servicios de desarrollo infantil y sistema informático que permita su operativización (Contrato)	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	0.5
82	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria OCTUBRE . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	0.5
83	EJECUCIÓN: Elaboración de justificación de gastos NOVIEMBRE. (Formulario de justificación de fondos BID)	9-Entregables Formales	30/11/2022	30/11/2022			No	0.5
84	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria NOVIEMBRE . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/11/2022	30/11/2022			No	0.5
85	EJECUCIÓN: Contratación Equipo de Gestión ejercicio 2023 (Contratos Coordinador, Adquisiciones, Monitoreo, Legal y Financiero)	9-Entregables Formales	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
86	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes Trimestrales CUARTO TRIMESTRE (Informes de Monitoreo y Seguimiento, Adquisición; y; Asesoría Legal)	9-Entregables Formales	31/12/2022	31/12/2022			No	0.5
87	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y EJECUCIÓN presupuestaria DICIEMBRE . (Informes financieros y de EJECUCIÓN presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/12/2022	31/12/2022			No	0.5
88	CIERRE: Informe final de Ejecución del proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2023	31/12/2023			No	4.5
89	EJECUCIÓN: PLANIFICACIÓN 2023	9-Entregables Formales	31/12/2023	31/12/2023			No	15.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de procesos de Impresión de material didáctico y/o curricular CDI/ CNH		-	-	-	01/01/2022	-
2	Número de usuario atendidos en los servicios de desarrollo infantil.		0.00 %	59,795	0	01/04/2022	Abril


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	86,629,641.23 **
Costo Total:	214,689,779.55
Total Devengado:	69,713,497.03
% Costo Total Devengado:	32.47 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 32.47 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	68,983,252.75	22,504,669.00	0.00	91,487,921.75
Ppto. Externo Planeado	5,332,789.82	22,504,669.00	0.00	27,837,458.82
Ppto. Aprobado Inicial	47,745,436.44	22,504,669.00	0.00	70,250,105.44
Ppto. Codificado	27,366,805.37	22,504,669.00	0.00	49,871,474.37
Ppto. Comprometido	10,339,206.71	0.00	0.00	10,339,206.71
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	99,408,757.37	22,504,669.00	0.00	121,913,426.37
Ppto. Devengado	64,124,972.23	5,588,524.80	0.00	69,713,497.03
Pagado Real	10,330,926.56	0.00	0.00	10,330,926.56
Estimado a fin de año	* 64,124,972.23	0.00	0.00	64,124,972.23
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	35,283,785.14	22,504,669.00	0.00	57,788,454.14
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 64.51 %	24.83 %	0.00 %	57.18 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

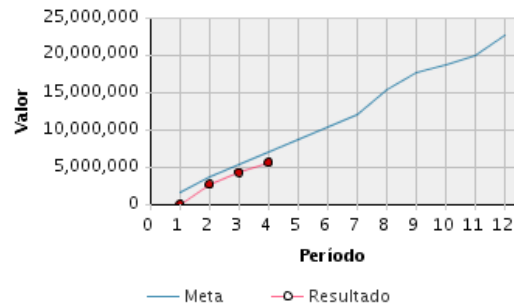

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	1,625,035.20	0.00	1,625,035.20	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	2,099,034.97	2,608,412.66	3,724,070.17	2,608,412.66	70.04 %		11.59 %
Mar	1,641,461.41	1,662,379.44	5,365,531.58	4,270,792.10	79.60 %		18.98 %
Abr	1,625,035.24	1,317,732.70	6,990,566.82	5,588,524.80	79.94 %		24.83 %
May	1,748,703.20		8,739,270.02				
Jun	1,625,035.24		10,364,305.26				
Jul	1,638,474.24		12,002,779.50				
Ago	3,387,712.09		15,390,491.59				
Sep	2,203,881.91		17,594,373.50				
Oct	1,001,636.12		18,596,009.62				
Nov	1,306,937.93		19,902,947.55				
Dic	2,601,721.45		22,504,669.00				
Total	22,504,669.00	5,588,524.80					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la promoción del desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 3 años de edad MEDIANTE la generación de procesos de fortalecimiento técnico, metodológico, de acompañamiento y evaluación de la gestión del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Aprobación Modicación Reforma Presupuestaria PAPP Nro 5 y Nro 06	MODIFICACIÓN_REFORMA_PRESUPUESTARIA_Nro05_y_06.pdf	05/07/2020
2	Aprobación Modicación Reforma Presupuestaria PAPP Nro 7	Modificación_Reforma_Presupuestaria_Nro.7.zip	01/08/2020
3	ASOCIACIÓN HITO Nro 11	Pliegos_NO_objeción_BID_Consulta_NNA_27_sept_2019_hito11.docx	27/09/2019
4	ASOCIACIÓN HITO Nro 14	Informe_financiero_ene-oct_2019.pdf	07/01/2020
5	ASOCIACIÓN HITO Nro. 10	Especificaciones_Técnicas.pdf	30/09/2019
6	ASOCIACIÓN HITO Nro. 12	Informe_ejecución_presupuestaria_agosto_2019.pdf	27/09/2019
7	ASOCIACIÓN HITO Nro. 13	Informe_de_ejecución_presupuestaria_sept_2019.pdf	03/10/2019
8	ASOCIACIÓN HITO Nro. 15	TDRs_Capacitación_a_Juntas.pdf	09/12/2019
9	ASOCIACIÓN HITO Nro. 16	Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.xlsx	27/12/2019
10	ASOCIACIÓN HITO Nro. 2	Matriz_PAPP_Inversión_2019_FORTALECIMIENTO_MT_26_07-08-2019.xlsx	07/08/2019
11	ASOCIACIÓN HITO Nro. 3	oficio_de_prioridad_senplades-2018-1410-of.pdf	07/08/2019
12	ASOCIACIÓN HITO Nro. 4	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
13	ASOCIACIÓN HITO Nro. 5	PLiegos_LPI001_CDI_CNH_26_jul_2019.docx	08/08/2019
14	ASOCIACIÓN HITO Nro. 6	hito_contratación_personal_gerencia.rar	08/08/2019
15	ASOCIACIÓN HITO Nro. 7	contratacion_de_personal.rar	08/08/2019
16	ASOCIACIÓN HITO Nro. 8	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
17	ASOCIACIÓN HITO Nro. 9	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
18	B8	ASOCIACIÓN_HITO_Nro_17.pdf	16/03/2020
19	B9	ASOCIACION_HITO_NRO_18.pdf	06/04/2020
20	C1	ASOCIACION_HITO_Nro_19.pdf	09/04/2020
21	C2	ASOCIACION_HITO_Nro_20.pdf	08/04/2020
22	C3	ASOCIACION_HITO_NRO_21.pdf	15/04/2020
23	C4	ASOCIACION_HITO_NRO_22.pdf	05/05/2020
24	C5	ASOCIACION_HITO_NRO_23.pdf	04/06/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
25	C6	ASOCIACION_HITO_NRO._24.pdf.pdf	05/06/2020
26	C7	ASOCIACION_HITO_NRO.25.pdf	07/07/2020
27	C8	ASOCIACION_HITO_NRO_26.pdf	07/07/2020
28	C9	ASOCIACION_HITO_NRO._27.pdf	07/07/2020
29	Cédulas presupuestarias	Cedulas_presupuestarias-_oct-nov-dic_2019.pdf	07/01/2020
30	D1	ASOCIACION_HITO28.zip	04/08/2020
31	D1 - ABRIL 2021	ASOCIACIÓN_HITO_46.pdf	10/05/2021
32	D2	ASOCIACION_HITO_NRO._29.pdf	11/09/2020
33	D2- MAYO 2021	ASOCIACIÓN_HITO_47.pdf	07/07/2021
34	D3	ASOCIACION_HITO_NRO._30.pdf	06/10/2020
35	D3 - JUNIO 2021	ASOCIACIÓN_HITO_NRO._48.pdf	09/07/2021
36	D4	ASOCIACION_HITO_NRO_31.pdf	08/10/2020
37	D4 - JUNIO 2021	ASOCIACIÓN_HITO_NRO._49.pdf	12/07/2021
38	D5	ASOCIACION_HITO_NRO._32.pdf	07/10/2020
39	D5 - JULIO 2021	ASOCIACIÓN_HITO_NRO._50.pdf	06/08/2021
40	D6	ASOCIACION_HITO_NRO._33.pdf	06/10/2020
41	D6 -JULIO 2021	ASOCIACIÓN_HITO_NRO._51.pdf	06/08/2021
42	D7	ASOCIACION_HITO_NRO._34.pdf-1.pdf	09/11/2020
43	D7- AGOSTO 2021	ASOCIACIÓN_HITO_NRO._52.pdf	13/09/2021
44	D8	ASOCIACION_HITO_NRO._35.pdf	18/01/2021
45	D8-AGOSTO 2021	ASOCIACIÓN_HITO_NRO._53.zip	14/09/2021
46	D9	ASOCIACION_HITO_NRO_36.pdf	18/01/2021
47	D9- SEPTIEMBRE 2021	ASOCIACIÓN_HITO_54.zip	14/10/2021
48	E-5 DICIEMBRE	ASOCIACION_HITO_NRO._59.pdf.pdf	13/01/2022
49	E-6 DICIEMBRE	ASOCIACION_HITO_NRO._60.pdf.pdf	13/01/2022
50	E-7 DICIEMBRE	ASOCIACION_HITO_NRO._61.pdf.zip	13/01/2022
51	E1	ASOCIACION_HITO_NRO._37.pdf	18/01/2021
52	E1 -SEPTIEMBRE 2021	ASOCIACIÓN_HITO_55.pdf	14/10/2021
53	E2	ASOCIACION_HITO_NRO._38.pdf	05/03/2021
54	E2-DICIEMBRE	ASOCIACION_HITO_NRO._55.pdf.pdf	13/01/2022
55	E3	ASOCIACION_HITO_NRO._39.pdf	09/02/2021
56	E4 - DICIEMBRE	ASOCIACION_HITO_NRO._58.pdf.pdf	13/01/2022
57	E4 -ENERO 2021	ASOCIACION_HITO_NRO._40.pdf	11/02/2021
58	E5 -FEBRERO 2021	ASOCIACION_HITO_NRO._41.pdf	05/03/2021
59	E6 - FEBRERO 2021	ASOCIACION_HITO_NRO._42.pdf	05/03/2021
60	E7 - MARZO 2021	ASOCIACION_HITO_NRO._43.pdf	06/04/2021
61	E7.1 -MARZO 2021	ASOCIACION_HITO_NRO._43_1.pdf	09/07/2021
62	E8- MARZO 2021	ASOCIACION_HITO_NRO._44.pdf	05/04/2021
63	E9- MARZO 2021	ASOCIACION_HITO_NRO._45.pdf	06/08/2021
64	F1-Enero 2022	ASOCIACIÓN_HITO_Nro_62.pdf	09/02/2022
65	F2-febrero 2022	ASOCIACION_HITO_Nro._63.pdf	09/03/2022
66	F3-febrero 2022	ASOCIACION_HITO_Nro._64.pdf	09/03/2022
67	F4-marzo 2022	ASOCIACION_HITO_Nro._65.zip	05/04/2022
68	F5-marzo 2022	ASOCIACION_HITO_Nro._66.pdf.zip	05/04/2022
69	F6-abril 2022	ASOCIACION_HITO_Nro._67.pdf	10/05/2022
70	F7-abril 2022	ASOCIACION_HITO_Nro._68.pdf	10/05/2022
71	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria- Ene- Dic 2019	Informe_financiero_ene-dic_2019.pdf	07/01/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
72	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria- Ene- Nov 2019	Informe_financiero_ene-nov_2019.pdf	07/01/2020
73	RECORTE PRESUPUESTARIO MEF-MARZO	Recorte_Presupuestario_MEF.zip	01/04/2020
74	RIESGO 1 No se puede realizar los pagos pendientes de la LP contratadas. (PLAN ACCIÓN 1 Y 2)	ASOCIACION_RIESGO_1.zip	14/10/2021
75	RIESGO 2 Atraso en los procesos de contratación de auditoría (PLAN ACCIÓN 1 Y 2)	ASOCIACION_RIESGO_2.zip	13/10/2021
76	RIESGO 2- NACIONAL. Si el Proveedor del LPI02 no cumple la segunda entrega de bienes...(Plan de Acción Nro 01) 2022	ASOCIACION_RIESGO_1_.pdf	09/02/2022
77	RIESGO 4 Atraso en los procesos de contratación de los equipos de gestión del proyecto (PLAN ACCIÓN 1 Y 2)	ASOCIACION_RIESGO_4.zip	13/10/2021

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	C4
	http://ASOCIACIÓN HITO NRO 22

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lascano Gomez, Mercedes Liliana	Gerente proyecto	Gerente proyecto MT	mercedes.lascano@inclusion.gob.ec	0992749238
Ortiz Vivas, Ana Lucia	Analista Financiera	Analista de Proyectos de Inversion 3	ana.ortiz@inclusion.gob.ec	
Romero Redrovan, Freddy Luis Angel	Analista de Monitoreo	Analista de proyectos de inversión	freddy.romero@inclusion.gob.ec	
