

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional
Dirección de Población Adulta Mayor

PROYECTO: K004 MIES-Sostenibilidad de los servicios gerontológicos y ampliación de la cobertura con un enfoque en el envejecimiento activo, digno y saludable "Envejeciendo juntos"

Líder del Proyecto:	Romo Pozo, Rosa Verónica (rosa.romo@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cruz Barragán, Teresa	Programas Relacionados:	
Titular:	Cordova Navia, Laura Esther	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387169	TIR:	25.61 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1.13
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	55,840,548.30
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista nacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	16/04/2025	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Romo Pozo, Rosa Verónica	Fecha del siguiente Hito:	10/01/2025

DATOS GENERALES

Descripción

Fortalecer los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores a través de la implementación de centros y unidades de atención que cuenten con personal técnico capacitado para la prestación de servicios con calidad y calidez.
Diseñar estrategias de protección y promoción para fomentar la participación de las personas adultas mayores en espacios de intervención que permitan su sostenimiento afectivo.
Implementar metodologías de Seguimiento y Monitoreo de los Servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores, para conocer los resultados de la intervención en territorio y fortalecer los servicios.

Beneficios Cualitativos

- 73.903 personas adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad recibirán servicios de atención y cuidado a través de cuatro modalidades de atención: Centros Gerontológicos Residenciales, Centros de Atención Diurna, Espacios de Socialización y de Encuentro y Atención Domiciliaria, a través de estos servicios se logra una atención preventiva para la población lo que disminuye considerablemente la probabilidad de que la persona adulta mayor incurra en gastos como los de salud, alimentación, cuidado, etc., evitando egresos y gastos económicos que afecten sus condiciones limitadas y vulnerables e impidiendo un mayor riesgo de su condición.
- 73.903 personas adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad participarán de un proyecto integral que los apoye en su cuidado, buscando la participación y corresponsabilidad familiar y comunitaria, que también impacta en la reducción de gastos en asuntos relacionados y que promueve la solidaridad y los lazos de integración e inclusión social
- El proyecto contará con un contingente profesional capacitado en servicios específicos, lo cual ocasionará que el adulto mayor cuente con una mejor condición de vida.
- Se establecerán lazos de integración entre adultos mayores que favorece su asociatividad, interrelación y mejoramiento de su calidad de vida.

Tipo de Beneficiario

- .Personas adultas mayores en condiciones de pobreza extrema en las localidades de intervención del proyecto.
- .Talento humano contratado para implementación local del proyecto y modalidades de atención.
- .Las familias de las personas adultas mayores serán partícipes y beneficiarios del proyecto.


Restricciones

- Alcance: El diseño de un módulo de seguimiento para la ejecución del proyecto
- Costo: No se contempla presupuesto
- Tiempo: Año 2022
- Recursos: Equipo técnico limitado

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 83.78 %
Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

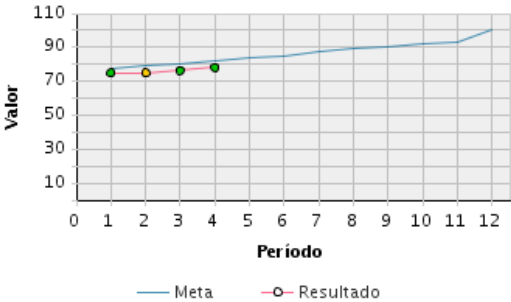

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
	78 %	79 %	80 %	82 %	84 %	85 %	88 %	89 %	90 %	92 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	75 %	75 %	76 %	78 %								
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
una ejecución presupuestaria de Además se ha generado una ejecución presupuestaria de \$ 5.003.647,74 correspondiente al grupo de gasto 71, 75, y 78. JULIO 2024: Confirme la prestación de los servicios de atención directa y por convenios de cooperación técnica económica, se han generado los primeros desembolsos, lo cual ha permitido el alza en ejecución al 44 % lo que corresponde a un monto de 7.197.953,55 de la asignación de 16.519.589,20.		
ABRIL 2024: Con la asignación de organismos y correlativos para el grupo de gasto 71, por lo cual se genera la ejecución de \$3.022.427,40. Al momento se mantiene a la espera de la asignación de organismos y correlativos del GG 73, 75 y 78. MAYO 2024: Con la asignación de organismos y correlativos para el grupo de gasto 71, 75 Y 78, se ha generado con fecha 10 de mayo de 2024, las reformas presupuestarias en virtud de generar los procesos conforme a los procesos desconcentrado. Además se ha generado la ejecución del grupo de gasto 71 y 75 de un monto de \$ 3.974.377,84. Además, se ha realizado una primera solicitud de aval para los convenios de cooperación técnica económica para el periodo fiscal 2024, por un monto de \$ 1.033.555,95 a través de Memorando Nro. MIES-SGI-2024-0716-M	López Moreta, José Luis	05/06/2024 - 12:58 PM
MARZO 2024: Se realiza la asignación de organismos y correlativos en el mes de marzo de 2024, para el grupo de gasto 71, por lo cual se genera la ejecución de \$2.232.737,65. Al momento se mantiene a la espera de la asignación de organismos y correlativos del GG 73, 75 y 78. Además se da la atención a 51.802 Personas Adultas Mayores en las 4 modalidades de atención. FEBRERO 2024: Se realiza la asignación de organismos y correlativos en el mes de febrero de 2024, para el grupo de gasto 71, por lo cual se genera la ejecución de \$1.337.375,30. Al momento se mantiene a la espera de la asignación de organismos y correlativos del GG 73, 75 y 78. Además se da la atención a 51.316 Personas Adultas Mayores en las 4 modalidades de atención. ENERO 2024: Con corte al mes de enero se genera como codificado de USD. 17.746.517,01 el cual se establece el proceso de regularización del Plan Anual de Política Pública para el periodo fiscal 2024, en el cual se planifica los servicios de atención gerontológica a través de convenios de cooperación técnica económica para 6 meses. Además se da la atención a 36.551 Personas Adultas Mayores en las 4 modalidades de atención.	Hurtado García, Ximena Sofía	15/04/2024 - 04:39 PM
DICIEMBRE 2023: Con corte al mes de diciembre se evidencia una ejecución presupuestaria por parte del proyecto "Envejeciendo Juntos" es de USD. 17.746.517,01, lo cual corresponde a la ejecución en el grupo de gasto 71, 73, 75, 78 y 99, puesto que durante el mes se ha procedido con los pagos correspondientes de salarios, pago a proveedores de bienes y servicios, pago de las planillas sobre la ejecución de la obra de construcción de un Centro Gerontológico Intercultural en el Cantón Colta, transferencias en la ejecución de los convenios de cooperación técnica - económica a través de desembolsos y contraprestación de servicio, como a su vez, el pago de obligaciones pendientes de años anteriores, para lo cual se ha ejecutado en este mes USD 2.419.858,31. Además, se ha realizado la promoción de los derechos de las PAM a través de la estrategia promoción, como a su vez, el primer módulo del seguimiento para el monitoreo a la ejecución de convenios del proyecto. Se presenta nudos críticos como la falta de asignación presupuestaria género en la paralización de los servicios en los meses de octubre, noviembre y diciembre lo cual repercute en las coberturas de atención, esto repercute en la cobertura de atención en base a la meta establecida en el proyecto, como a su vez, la falta de gestión en la solicitud de pago género en el GG 78 el arrastre de 545.004,04	Hurtado García, Ximena Sofía	12/01/2024 - 09:03 PM
NOVIEMBRE 2023: Con corte al mes de noviembre se evidencia una ejecución presupuestaria por parte del proyecto "Envejeciendo Juntos" es de USD. 15.326.658,70 13.918.763,18, lo cual corresponde a la ejecución en el grupo de gasto 71, 73, 75, 78 y 99, puesto que durante el mes se ha procedido con los pagos correspondientes de salarios, pago a proveedores de bienes y servicios, pago de las planillas sobre la ejecución de la obra de construcción de un Centro Gerontológico Intercultural en el Cantón Colta, transferencias en la ejecución de los convenios de cooperación técnica - económica a través de desembolsos y contraprestación de servicio, como a su vez, el pago de obligaciones pendientes de años anteriores, para lo cual se ha ejecutado en este mes USD 1.407.895,52. Además, en cumplimiento a la meta de propósito se ha realizado la atención de servicios gerontológicos a través de convenios y directa en las modalidades de Atención Domiciliaria Sin Discapacidad (convenio y directa), Atención Domiciliaria Con Discapacidad, Centro De Atención Diurna, Centro Gerontológico Residencial, Espacios De Socialización Y De Encuentro Con Alimentación, Espacios De Socialización Y De Encuentro Sin Alimentación.	Hurtado García, Ximena Sofía	12/12/2023 - 09:33 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2023: Con corte al mes de octubre se evidencia una ejecución presupuestaria por parte del proyecto "Envejeciendo Juntos" es de USD. 13.918.763,18, lo cual corresponde a la ejecución en el grupo de gasto 71, 73, 75, 78 y 99, puesto que durante el mes se ha procedido con los pagos correspondientes de salarios, pago a proveedores de bienes y servicios, pago de las planillas sobre la ejecución de la obra de construcción de un Centro Gerontológico Intercultural en el Cantón Colta, transferencias en la ejecución de los convenios de cooperación técnica - económica a través de desembolsos y contraprestación de servicio, como a su vez, el pago de obligaciones pendientes de años anteriores, para lo cual se ha ejecutado en este mes USD 1.476.740,94. Además, en cumplimiento a la meta de propósito se ha realizado la atención de servicios gerontológicos a través de convenios y directa en las modalidades de Atención Domiciliaria Sin Discapacidad (convenio y directa), Atención Domiciliaria Con Discapacidad, Centro De Atención Diurna, Centro Gerontológico Residencial, Espacios De Socialización Y De Encuentro Con Alimentación, Espacios De Socialización Y De Encuentro Sin Alimentación.	Hurtado García, Ximena Sofía	06/11/2023 - 01:20 PM
SEPTIEMBRE 2023: Con corte al mes de septiembre se evidencia una ejecución presupuestaria por parte del proyecto "Envejeciendo Juntos" es de USD. 12.442.022,24, lo cual corresponde a la ejecución en el grupo de gasto 71, 73, 75, 78 y 99, puesto que en el mes de agosto, se ha procedido con los pagos correspondientes de salarios, pago a proveedores de bienes y servicios, pago de las planillas sobre la ejecución de la obra de construcción de un Centro Gerontológico Intercultural en el Cantón Colta, transferencias a la ejecución de los convenios de cooperación técnica - económica a través de desembolsos y contraprestación de servicio, como a su vez, el pago de obligaciones pendientes de años anteriores, para lo cual se ha ejecutado en este mes USD 1.665.463,64. Además, en cumplimiento a la meta de propósito se ha realizado la atención de servicios gerontológicos a través de convenios y directa en las modalidades de Atención Domiciliaria Sin Discapacidad (convenio y directa), Atención Domiciliaria Con Discapacidad, Centro De Atención Diurna, Centro Gerontológico Residencial, Espacios De Socialización Y De Encuentro Con Alimentación, Espacios De Socialización Y De Encuentro Sin Alimentación.	Hurtado García, Ximena Sofía	06/11/2023 - 01:20 PM
AGOSTO 2023: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 10.776.558,60 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 109.225 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71, 73 y 78, puesto que en el mes de agosto, se ha procedido con los pagos correspondientes a la contraprestación de servicios en la ejecución de convenios de cooperación, conforme los suscripción de los mismos a niveles desconcentrados. JULIO 2023: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 9.014.515,28 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 110.332 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71, 73 y 78, puesto que en el mes de julio, se ha procedido con los pagos correspondientes a la contraprestación de servicios en la ejecución de convenios de cooperación, conforme los suscripción de los mismos a niveles desconcentrados.	Hurtado García, Ximena Sofía	11/09/2023 - 08:15 AM
JUNIO 2023: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 7.303.097,47 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 110.388 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71, 73 y 78, puesto que en el mes de junio, se ha procedido con los pagos correspondientes a la contraprestación de servicios en la ejecución de convenios de cooperación, conforme los suscripción de los mismos a niveles desconcentrados.	Hurtado García, Ximena Sofía	10/07/2023 - 01:51 PM
MAYO 2023: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 5.618.547,09 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 108.938 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71, 73 y 78, puesto que en el mes de mayo, se ha procedido con los pagos correspondientes a la contraprestación de servicios en la ejecución de convenios de cooperación, conforme los suscripción de los mismos a niveles desconcentrados.	Hurtado García, Ximena Sofía	09/06/2023 - 04:09 PM
Abril 2023: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 3.899.848,37 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 106.993 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71, 73 y 78, puesto que en el mes de marzo, se ha procedido con los pagos correspondientes a los reembolsos de la ejecución de convenios de cooperación, conforme los suscripción de los mismos a niveles desconcentrados.	Hurtado García, Ximena Sofía	15/05/2023 - 08:13 AM
Marzo 2023: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 2.608.798,29 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 108.773 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71 y 78, puesto que en el mes de marzo, se ha procedido con los pagos correspondientes	Hurtado García, Ximena Sofía	14/04/2023 - 09:00 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
a los reembolsos de la ejecución de convenios de cooperación, conforme los suscripción de los mismos a niveles desconcentrados.		
Febrero 2023: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 1.397.046,17 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 107.971 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71 y 78, puesto que en el mes de Febrero, el MEF asignó organismo y correlativo para la ejecución de convenios de cooperación, por lo que durante el mes se gestionaron los avales para solicitud de certificaciones presupuestarias en los niveles desconcentrados.	Hurtado García, Ximena Sofía	05/04/2023 - 03:17 PM
Enero 2023: La data oficial registra una cobertura de 110.642 PAM; conforme el registro de información en la herramienta GPR conforme el escenario presentado en el informe de coberturas correspondiente al mes de enero de 2023, en este sentido y una vez verificada la información, se determina una cobertura de 67.845 PAM en todas las modalidades de atención del tipo de gasto inversión y se registra un devengado de \$0,00. Además de la construcción del instrumento de planificación concerniente al Plan Anual de Política Pública.	Hurtado García, Ximena Sofía	05/04/2023 - 03:03 PM
Diciembre 2022: Con corte al mes de diciembre se evidencia una ejecución presupuestaria de USD 2.391.217,36 lo que corresponde a un alcance de cobertura generada a través del proyecto PEJ en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos de 69.645 PAM. El presupuesto codificado del proyecto Envejeciendo Juntos para el ejercicio fiscal 2022 es de USD 30.124.733,66. De este monto, la ejecución presupuestaria al mes de diciembre del año 2022 alcanzó el 89%, correspondiente a un total de USD 26.910.920,76.	Hurtado García, Ximena Sofía	15/01/2023 - 09:20 PM
Noviembre 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 2.010.497,39 lo que corresponde a un alcance de cobertura generada a través del proyecto PEJ en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos de 69.901 PAM.	Hurtado García, Ximena Sofía	09/12/2022 - 06:35 PM
Octubre 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 4.727.697,87 lo que corresponde a un alcance de cobertura generada a través del proyecto PEJ en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos de 67.147 PAM.	Hurtado García, Ximena Sofía	14/11/2022 - 02:23 PM
Septiembre 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 1.011.326,51 lo que corresponde a un alcance de cobertura en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos de 66.530 PAM corresponden a la cobertura generada a través del proyecto PEJ.	Hurtado García, Ximena Sofía	14/11/2022 - 01:35 PM
Agosto 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 1.772.674,00 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 109.614 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos de estos 66.383 PAM corresponden a la cobertura generada a través del proyecto PEJ.	López Moreta, José Luis	09/09/2022 - 05:24 PM
Julio 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 2.092.626,93 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 108.675 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos de estos 65.650 PAM corresponden a la cobertura generada a través del proyecto PEJ.	López Moreta, José Luis	08/08/2022 - 09:30 AM
Junio 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 2.5880.664,76 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 107.075 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos de estos 64.899 PAM corresponden a la cobertura generada a través del proyecto PEJ; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71 y 78 ya que durante el mes se inició el proceso de primeros desembolsos a cooperantes.	López Moreta, José Luis	12/07/2022 - 09:55 AM
Mayo 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 4.751.65,2 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 108.009 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos de estos 65.377 PAM corresponden a la cobertura generada a través del proyecto PEJ; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71 y 78 ya que durante el mes se inició el proceso de primeros desembolsos a cooperantes.	López Moreta, José Luis	10/06/2022 - 11:10 AM
Abril 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 3.964.550,70 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 101.682 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71 y 78, puesto que el 27 de marzo de 2022, el MEF asignó organismo y correlativo para la ejecución de convenios de cooperación, por lo que durante el mes de abril se gestionaron los avales para solicitud de certificaciones presupuestarias en los niveles desconcentrados. (Se corrige dato de ejecución presupuestaria en el anterior reporte se consideró el dato del programa integral, no se desagregó proyecto)	López Moreta, José Luis	10/05/2022 - 11:24 AM
Abril 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 6.668.758,60 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 101.682 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71 y 78, puesto que el 27 de marzo de 2022, el MEF asignó organismo y correlativo para la ejecución de convenios de cooperación, por lo que durante el mes de abril se gestionaron los avales para solicitud de certificaciones presupuestarias en los niveles desconcentrados.	López Moreta, José Luis	10/05/2022 - 11:14 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 1.682.052,99 lo que corresponde a un alcance de cobertura de 109.294 en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71, cabe indicar que a la fecha no se asigna organismo y correlativo para ejecución de los grupos de gastos 73, 75 y 78.	López Moreta, José Luis	08/04/2022 - 03:04 PM
Febrero 2022: Con corte a este mes se evidencia una ejecución presupuestaria de USD. 969.268,56, lo que corresponde a un alcance de cobertura de 111.057 PAM en las diferentes modalidades de atención de servicios gerontológicos; el recurso citado corresponde al grupo de gasto 71, cabe indicar que a la fecha no se asigna organismo y correlativo para ejecución de los grupos de gastos 73, 75 y 78.	López Moreta, José Luis	14/03/2022 - 03:52 PM
Enero 2022: La data oficial registra una cobertura de 115.277 PAM; sin embargo con Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0056-M de 17.02.2022 la Sra. Directora de Población Adulta Mayor solicita el registro de información en la herramienta GPR conforme el escenario presentado en el informe de coberturas correspondiente al mes de enero de 2022, en este sentido y una vez verificada la información se determina una cobertura de 62.918 PAM en todas las modalidades de atención del tipo de gasto inversión y se registra un devengado de \$0,00	López Moreta, José Luis	17/02/2022 - 02:34 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de asignación de recursos CAUSARÍA el retraso en los procesos de operatividad de la atención en los servicios de atención gerontológica, como a su vez, el seguimiento y monitoreo del impacto de las intervenciones realizadas en territorio	28/02/2023	Lisette Patricia Rendón	50 %	70	35	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Bolívar
2	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Archidona
3	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Alausi
4	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
5	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
6	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
7	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
8	Zona 8 - DMG > Guayas > Durán
9	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	(Definición) Dictamen de prioridad del proyecto	9-Entregables Formales	10/02/2022		01/02/2022		Sí	1.5
2	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	17/02/2022		10/02/2022		Sí	0.75
3	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	17/02/2022		10/02/2022		Sí	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	5-Entregables Intermedios	17/02/2022		15/02/2022		Sí	1.0
5	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	09/03/2022		09/03/2022		Sí	0.75
6	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	09/03/2022		09/03/2022		Sí	0.75
7	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/04/2022		11/04/2022		Sí	0.75
8	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/04/2022		11/04/2022		Sí	0.75
9	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/05/2022		10/05/2022		Sí	0.75
10	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/05/2022		10/05/2022		Sí	0.75
11	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/06/2022		10/06/2022		Sí	0.75
12	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/06/2022		10/06/2022		Sí	0.75
13	(Ejecución) Informe ejecución primer desembolso	5-Entregables Intermedios	11/07/2022		11/07/2022		Sí	1.0
14	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/07/2022		11/07/2022		Sí	0.75
15	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/07/2022		11/07/2022		Sí	0.75
16	(Ejecución) Informe de transferencia monetaria para la construcción del Centro Gerontológico Colta	5-Entregables Intermedios	10/08/2022		08/08/2022		Sí	3.0
17	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/08/2022		08/08/2022		Sí	0.75
18	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/08/2022		08/08/2022		Sí	0.75
19	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	09/09/2022		09/09/2022		Sí	0.75
20	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	09/09/2022		09/09/2022		Sí	0.75
21	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/10/2022		10/10/2022		Sí	0.75
22	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/10/2022		10/10/2022		Sí	0.75
23	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	14/11/2022		14/11/2022		Sí	0.75
24	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	14/11/2022		14/11/2022		Sí	0.75
25	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	12/12/2022		12/12/2022		Sí	0.75
26	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	13/12/2022		13/12/2022		Sí	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	15/01/2023		15/01/2023		Sí	0.75
28	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	15/01/2023		15/01/2023		Sí	0.75
29	(Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto	5-Entregables Intermedios	18/01/2023		18/01/2023		Sí	1.0
30	(Ejecución) Informe ejecución segundo desembolso	5-Entregables Intermedios	18/01/2023		18/01/2023		Sí	1.0
31	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	1.0
32	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/02/2023		10/02/2023		Sí	0.75
33	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/02/2023		10/02/2023		Sí	0.75
34	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/03/2023		10/03/2023		Sí	0.75
35	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/03/2023		10/03/2023		Sí	0.75
36	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/04/2023		10/04/2023		Sí	0.75
37	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/04/2023		10/04/2023		Sí	0.75
38	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/05/2023		10/05/2023		Sí	0.75
39	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/05/2023		10/05/2023		Sí	0.75
40	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	12/06/2023		12/06/2023		Sí	0.75
41	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	12/06/2023		12/06/2023		Sí	0.75
42	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/07/2023		10/07/2023		Sí	0.75
43	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/07/2023		10/07/2023		Sí	0.75
44	(Ejecución) Informe ejecución primer desembolso	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		17/07/2023		Sí	1.0
45	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.75
46	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.75
47	(Ejecución) Informe de ejecución construcción del Centro Gerontológico Colta	5-Entregables Intermedios	16/08/2023		16/08/2023		Sí	2.5
48	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/09/2023		11/09/2023		Sí	0.75
49	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/09/2023		11/09/2023		Sí	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
50	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.75
51	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.75
52	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.75
53	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.75
54	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/12/2023		11/12/2023		Sí	0.75
55	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/12/2023		11/12/2023		Sí	0.75
56	(Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto	5-Entregables Intermedios	31/12/2023		31/12/2023		Sí	2.0
57	(Ejecución) Informe ejecución segundo desembolso	5-Entregables Intermedios	31/12/2023		31/12/2023		Sí	1.0
58	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/01/2024		10/01/2024		Sí	0.75
59	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/01/2024		10/01/2024		Sí	0.75
60	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	1.0
61	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	12/02/2024		12/02/2024		Sí	0.75
62	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	12/02/2024		12/02/2024		Sí	0.75
63	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/03/2024		11/03/2024		Sí	0.75
64	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/03/2024		11/03/2024		Sí	0.75
65	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/04/2024		10/04/2024		Sí	0.75
66	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/04/2024		10/04/2024		Sí	0.75
67	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/05/2024		10/05/2024		Sí	0.75
68	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/05/2024		10/05/2024		Sí	0.75
69	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/06/2024		10/06/2024		Sí	0.75
70	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/06/2024		10/06/2024		Sí	0.75
71	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/07/2024		10/07/2024		Sí	0.75
72	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/07/2024		10/07/2024		Sí	0.75
73	(Ejecución) Informe ejecución primer desembolso	5-Entregables Intermedios	31/07/2024		31/07/2024		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
74	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	12/08/2024		12/08/2024		Sí	0.75
75	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	12/08/2024		12/08/2024		Sí	0.75
76	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/09/2024		10/09/2024		Sí	0.75
77	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/09/2024		10/09/2024		Sí	0.75
78	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/10/2024		10/10/2024		Sí	0.75
79	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/10/2024		10/10/2024		Sí	0.75
80	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	11/11/2024		11/11/2024		Sí	0.75
81	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	11/11/2024		11/11/2024		Sí	0.75
82	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/12/2024		10/12/2024		Sí	0.75
83	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/12/2024		10/12/2024		Sí	0.75
84	(Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto	5-Entregables Intermedios	31/12/2024		14/01/2025		Sí	2.0
85	(Ejecución) Informe ejecución segundo desembolso	5-Entregables Intermedios	31/12/2024		15/01/2025		Sí	1.0
86	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/01/2025	10/01/2025			No	0.75
87	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	10/01/2025		13/01/2025		Sí	0.75
88	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/01/2025	10/01/2025			No	0.75
89	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	5-Entregables Intermedios	10/01/2025		13/01/2025		Sí	0.75
90	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	5-Entregables Intermedios	10/01/2025	10/01/2025			No	1.0
91	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/02/2025	10/02/2025			No	0.75
92	mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/02/2025	10/02/2025			No	0.75
93	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/03/2025		10/03/2025		Sí	0.75
94	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/03/2025		10/03/2025		Sí	0.75
95	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/04/2025		10/04/2025		Sí	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
96	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/04/2025		10/04/2025		Sí	0.75
97	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/05/2025	10/05/2025			No	0.75
98	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/05/2025	10/05/2025			No	0.75
99	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/06/2025	10/06/2025			No	0.75
100	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/06/2025	10/06/2025			No	0.75
101	(Ejecución) Informe ejecución primer desembolso, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/07/2025	10/07/2025			No	1.0
102	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/07/2025	10/07/2025			No	0.75
103	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/07/2025	10/07/2025			No	0.75
104	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	12/08/2025	12/08/2025			No	0.75
105	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	12/08/2025	12/08/2025			No	0.75
106	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/09/2025	10/09/2025			No	0.75
107	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/09/2025	10/09/2025			No	0.75
108	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	09/10/2025	09/10/2025			No	0.75
109	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	09/10/2025	09/10/2025			No	0.75
110	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/11/2025	10/11/2025			No	0.75
111	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/11/2025	10/11/2025			No	0.75
112	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/12/2025	10/12/2025			No	0.75
113	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/12/2025	10/12/2025			No	0.75
114	(Ejecución) Informe ejecución segundo desembolso	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
115	(Ejecución) Informe final de ejecución de proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2025	31/12/2025			No	4.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de actividades realizadas de sensibilización y promoción de la participación social de las personas adultas mayores	—	-	-	-	01/01/2022	-
2	Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de centros gerontológicos residenciales - INVERSIÓN	—	-	-	-	01/01/2022	-
3	Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de centros gerontológicos de atención diurna -INVERSIÓN	—	-	-	-	01/01/2022	-
4	Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de espacios de socialización y de encuentro con y sin alimentación - INVERSIÓN	—	-	-	-	01/01/2022	-
5	Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de atención domiciliaria con y sin discapacidad - INVERSIÓN	—	-	-	-	01/01/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	55,840,548.30 **
Costo Total:	157,079,713.69
Total Devengado:	40,602,382.23
% Costo Total Devengado:	25.85 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 25.85 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	157,079,713.69	40,695,668.66	0.00	197,775,382.35
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
Ppto. Codificado	35,000,000.00	15,238,166.07	0.00	50,238,166.07
Ppto. Comprometido	0.00	714,343.70	0.00	714,343.70
Planeado - Codificado (2025)		25,457,502.59		
Programado a Devengar	48,691,515.47	15,238,166.07	0.00	63,929,681.54
Ppto. Devengado	40,602,382.23	0.00	0.00	40,602,382.23
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 40,602,382.23	15,238,166.07	0.00	55,840,548.30
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	8,089,133.24	0.00	0.00	8,089,133.24
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 83.39 %	0.00 %	0.00 %	63.51 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025

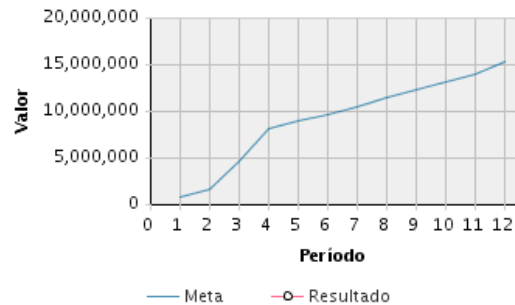

Presupuesto Mensual 2025

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	714,343.70		714,343.70				

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	813,677.85		1,528,021.55				
Mar	3,002,724.98		4,530,746.53				
Abr	3,501,937.95		8,032,684.48				
May	813,677.85		8,846,362.33				
Jun	813,677.85		9,660,040.18				
Jul	813,677.85		10,473,718.03				
Ago	961,727.88		11,435,445.91				
Sep	813,677.85		12,249,123.76				
Oct	813,677.85		13,062,801.61				
Nov	813,677.85		13,876,479.46				
Dic	1,361,686.61		15,238,166.07				
Total	15,238,166.07						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
11	Mantener el acceso y estándares de calidad en la prestación de servicios de atención y cuidado orientado a personas Adultas Mayores, con énfasis en la población en extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad MEDIANTE la generación de políticas públicas, normativas técnicas, modelos de atención y gestión de las modalidades de servicios

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	84 (Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto	84_(Ejecución)_Informe_anual_de_ejecución_de_proyecto.pdf	14/01/2025
2	85 (Ejecución) Informe ejecución segundo desembolso	G.4. - _HITO_85__Informe_segundo_desembolsos_2024.pdf	15/01/2025
3	86 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	86_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecución_presupuestaria.pdf	16/01/2025
4	87 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	87_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas.pdf	13/01/2025
5	93_03_2025_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento de asistencias, aprobado	1._SJ_Informe_de_asistencia_-_febrero_2025_PEJ_FINAL-signed-signed-signed.pdf	20/03/2025
6	94_03_2025_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	1.SJ_Informe_de_Ejecución_Febrero2025-signed-signed-signed.pdf	20/03/2025
7	94_03_2025_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	1.SJ_Informe_de_Ejecución_Febrero2025-signed-signed-signed.pdf	20/03/2025
8	D.5. - HITO 31.- (Planeación) PAPP del proyecto aprobado	D.5. - _HITO_31_-_(Planeación)_PAPP_del_proyecto_aprobado_a_traves_de_MIES-CGPGE-DPI-2023-0158-M.pdf	13/03/2023
9	D.6. - HITO 32.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria ENERO 2023	D.6. - _HITO_32_-_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecución_presupuestaria_-_ENERO_2023.pdf	13/03/2023
10	D.7. - HITO 33.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas - ENERO 2023	D.7. - _HITO_33_- _INFORME_MENSUAL_DE_COBERTURAS_-_ENERO_2023.pdf	13/03/2023
11	D.8. - HITO 34.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria FEBRERO 2023	D.8. - _HITO_34_-_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecución_presupuestaria_-_FEBRERO_2023.pdf	15/03/2023
12	D.9. - HITO 35.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas - FEBRERO 2023	D.9. - _HITO_35_-_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_-_FEBRERO_2023.pdf	15/03/2023
13	E.1. - HITO 36.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria MARZO 2023	E.1. - _HITO_36_-_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecución_presupuestaria_MARZO_2023.pdf	31/05/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	E.2. - HITO 37.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas - MARZO 2023	E.2. - _HITO_37.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _MARZO_2023.pdf	15/05/2023
15	E.3. - HITO 38.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria ABRIL 2023	E.3. - _HITO_38.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecución_presupuestaria_ABRIL_2023.pdf	31/05/2023
16	E.4. - HITO 39.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas - ABRIL 2023	E.4. - _HITO_39.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _#_ABRIL_2023_.1..pdf	31/05/2023
17	E.5. - HITO 40.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria MAYO 2023	E.5. - _HITO_40.- _(Ejecución)_Informe_ejecución_presupuestaria_- _MAYO_2023.pdf	14/06/2023
18	E.6. - HITO 41.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas - MAYO 2023	E.6. - _HITO_41.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _MAYO_2023.pdf	14/06/2023
19	E.7. - HITO 42.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria JUNIO 2023	E.7. - _HITO_42.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecución_presupuestaria_JUNIO_2023.pdf	11/07/2023
20	E.8. - HITO 43.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas - JUNIO 2023	E.8. - _HITO_43.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _JUNIO_2023.pdf	11/07/2023
21	E.9. - HITO 44.- (Ejecución) Informe semestral de Desembolso 2023	E.9. - _HITO_42.- _(Ejecución)_Informe_semestral_de_Desembolso_2023_SGI.pdf	28/07/2023
22	F.1. - _HITO_45.- _(Ejecución)_Informe_ejecución_presupuestaria_- _JULIO_2023.pdf	F.1. - _HITO_45.- _(Ejecución)_Informe_ejecución_presupuestaria_- _JULIO_2023.pdf.pdf	14/08/2023
23	F.2. - _HITO_46.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _JULIO_2023.pdf	F.2. - _HITO_46.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _JULIO_2023.pdf.pdf	14/08/2023
24	F.3. - HITO 47.- _Informe_construcción_centro Gerontologico Colta - _JULIO_2023.pdf	F.3. - _HITO_46.- _Informe_construcción_centro_Gerontologico_Colta_- _JULIO_2023.pdf	29/08/2023
25	F.4. - HITO 48.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria AGOSTO 2023	F.4. - _HITO_48.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_ejecución_presupuestaria_- _AGOSTO_2023.pdf	12/10/2023
26	F.5. - _HITO_49.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _AGOSTO_2023.pdf	F.5. - _HITO_49.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _AGOSTO_2023.pdf.pdf	12/10/2023
27	F.6. - HITO 50.- (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria SEPTIEMBRE 2023	F.6. - _HITO_50.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_ejecución_presupuestaria_- _Septiembre_2023.pdf	12/10/2023
28	F.7. - _HITO_51.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _SEPTIEMBRE_2023.pdf	F.7. - _HITO_51.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _SEPTIEMBRE_2023.pdf_(2).pdf	12/10/2023
29	F.8. - _HITO_52.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_ejecución_presupuestaria_- _OCTUBRE_2023.pdf	F.8. - _HITO_52.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_ejecución_presupuestaria_- _OCTUBRE_2023.pdf.pdf	14/11/2023
30	F.9. - _HITO_53.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _OCTUBRE_2023.pdf	F.9. - _HITO_53.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _OCTUBRE_2023.pdf.pdf	14/11/2023
31	G.1. - _HITO_54.- _(PRESUPUESTO)_Informe_mensual_de_ejecución_presupuestaria_- _NOVIEMBRE_2023.pdf	G.1. - _HITO_54.- _(Presupuesto)_Informe_mensual_de_ejecucion_presupuestaria_- _NOVIEMBRE_2023.pdf	13/12/2023
32	G.2. - _HITO_55.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _NOVIEMBRE_2023.pdf	G.2. - _HITO_55.- _(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_coberturas_- _NOVIEMBRE_2023.pdf	13/12/2023
33	G.3. - _HITO_56.- _Informe_proyecto_2023	G.3. - _HITO_56.- _Informe_proyecto_2023.pdf.pdf	12/01/2024
34	G.4. - _HITO_57.- __Informe_desembolsos_-2023.pdf	G.4. - _HITO_57.- __Informe_desembolsos_-2023.pdf.pdf	12/01/2024
35	G.5. - _HITO_58.- _(Presupuesto)_Informe_mensual_de_ejecucion_- _DICIEMBRE_2023.pdf	G.5. - _HITO_58.- _(Presupuesto)_Informe_mensual_de_ejecucion_- _DICIEMBRE_2023.pdf.pdf	12/01/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
36	G.6._HITO_59.- _(Cobertura)_Informe_mensual_de_cobertura_- _DICIEMBRE_2023.pdf	G.6._HITO_59.- _(Cobertura)_Informe_mensual_de_cobertura_- _DICIEMBRE_2023.pdf.pdf	12/01/2024
37	G.7._HITO_60.- (Planeación) - PAPP del proyecto aprobado 2024	G.7._HITO_60.- (Planeación) - _PAPP_del_proyecto_aprobado_2024_- _MIES- CGPGE-2024-0139-M.pdf	15/03/2024
38	G.8._HITO_61.- (Ejecución) - INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL - ENERO 2024	G.8._HITO_61.- (Ejecución) - _INFORME_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_MENSUAL_- _ENERO_2024.pdf	15/03/2024
39	G.9. HITO 62.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Enero 2024	G.9._HITO_62.- _(Ejecución)_#_Informe_de_coberturas_mensual_#_Enero_2024.pdf	15/03/2024
40	H.1. HITO 63.- (Ejecución) - Informe ejecución presupuestaria mensual - Febrero 2024	H.1._HITO_63.- (Ejecución) - _Informe_ejecución_presupuestaria_mensual_- _Febrero_2024.pdf	15/03/2024
41	H.2. HITO 64.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Febrero 2024	H.2._HITO_64.- _(Ejecución)_#_Informe_de_coberturas_mensual_#_Febrero_2024.pdf	15/03/2024
42	H.3. HITO 65.- (Ejecución) - Informe ejecución presupuestaria mensual - Marzo 2024	H.3._HITO_65.- (Ejecución) - _Informe_ejecución_presupuestaria_mensual_- _Marzo_2024.pdf	15/04/2024
43	H.4. HITO 66.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Marzo 2024	H.4._HITO_66.- (Ejecución) - _Informe_de_coberturas_mensual_- _Marzo_2024.pdf	15/04/2024
44	H.5. HITO 67.- (Ejecución) - Informe ejecución presupuestaria mensual - Abril 2024	H.5._HITO_67.- (Ejecución) - _Informe_ejecución_presupuestaria_mensual_- _Abril_2024.pdf	13/06/2024
45	H.6. HITO 68.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Abril 2024	H.6._HITO_68.- (Ejecución) - _Informe_de_coberturas_mensual_#_Abril_2024.pdf	13/06/2024
46	H.7. HITO 69.- (Ejecución) - Informe ejecución presupuestaria mensual - Mayo 2024	H.7._HITO_69.- (Ejecución) - _Informe_ejecución_presupuestaria_mensual_#_Mayo_2024.pdf	13/06/2024
47	H.8. HITO 70.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Mayo 2024	H.8._HITO_70.- (Ejecución) - _Informe_de_coberturas_mensual_#_Mayo_2024.pdf	13/06/2024
48	H.9. HITO 71.- (Ejecución) - Informe de ejecución presupuestaria - Junio 2024	H.9._HITO_71.- (Ejecución) - _Informe_de_ejecución_presupuestaria_- _Junio_2024.pdf	15/07/2024
49	HITO A1: 1 (Definición) Dictamen de prioridad del proyecto	MIES-MIES-2021-2456-EXT_(Dictamen_de_prioridad).pdf	01/02/2022
50	HITO A2: 2 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	INFORME_EJECUCIÓN_MENSUAL_ENERO_2022_ENVEJECIDO- signed-signed.pdf	17/02/2022
51	HITO A3: 3 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	formato_informe_coberturas_enero_2022_sgi-signed.pdf	17/02/2022
52	HITO A4: 4 (Planeación) PAPP del proyecto aprobado	MIES-CGPGE-DPI-2022-0095-M_(Entrega_PAPP).pdf	17/02/2022
53	HITO A5: 5 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	INFORME_EJECUCIÓN_MENSUAL_FEBRERO_2022_ENVEJECIDO- signed.pdf	17/03/2022
54	HITO A6: 6 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_FEBRERO_2022_SGI- signed.pdf	14/03/2022
55	HITO A7: 7 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	INFORME_EJECUCIÓN_MENSUAL_MARZO_2022_ENVEJECIDO- signed-signed.pdf	13/04/2022
56	HITO A8: 8 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_MARZO_2022_SGI- signed.pdf	13/04/2022
57	HITO A9: 9 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	Informe_ejecución_presupuestaria_abril_2022-signed.pdf	11/05/2022
58	HITO B1: 10 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_ABRIL_2022_SGI- signed.pdf	11/05/2022
59	HITO B2: 11 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	Informe_ejecución_presupuestaria_Mayo_2022-signed.pdf	10/06/2022
60	HITO B3: 12 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_MAYO_2022- signed.pdf	13/06/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
61	HITO B4: 13 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	INFORME_EJECUCIÓN_MENSUAL_JUNIO_2022_ENVEJECIDOS- signed.pdf	12/07/2022
62	HITO B5: 14 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_JUNIO_2022- signed.pdf	12/07/2022
63	HITO B6: 15(Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_JUNIO_2022- signed.pdf	03/08/2022
64	HITO B7: 16 (Ejecución) Informe de transferencia monetaria para la construcción del Centro Gerontológico Colta	FORMATO_INFORME_COLTA_REV-signed- signed(1).pdf	09/08/2022
65	HITO B8: 17 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	INFORME_EJECUCIÓN_MENSUAL_PEJ_JULIO_2022_-signed- signed(1)(1)-signed.pdf	09/09/2022
66	HITO B9: 18 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_JULIO_2022- signed.pdf	09/08/2022
67	HITO C1: 19 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_AGOSTO_2022.pdf	14/09/2022
68	HITO C2 : 20 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	informe_de_ejecucion_prsupuestaria_agosto_2022.pdf	07/10/2022
69	HITO C3: 21 Informe trimestral de capacitación continua - promoción y protección integral de derechos	Informe_Promoción.pdf	07/10/2022
70	HITO C4:21 a (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_SEPTIEMBRE_2022- signed(1).pdf	14/10/2022
71	HITO C5 : 22 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	INFORME_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_MENSUAL_- _SEPTIEMBRE_2022-signed_(1).pdf	14/11/2022
72	HITO C6 : 23 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	INFORME_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_MENSUAL_- _OCTUBRE_2022.pdf	14/11/2022
73	HITO C7:24 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_OCTUBRE_2022.pdf	15/11/2022
74	HITO C8:25 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	FORMATO_INFORME_COBERTURAS_NOVIEMBRE_2022- signed.pdf	16/12/2022
75	HITO C9:26 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	INFORME_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_MENSUAL_- _NOVIEMBRE_2022.pdf	16/12/2022
76	HITO D1:27 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	INFORME_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_MENSUAL_- _DICIEMBRE_2022_ajustado-signed-signed.pdf	15/01/2023
77	HITO D2:28 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento coberturas	INFORME_COBERTURAS_DICIEMBRE_2022_- _13.01.2022-signed.pdf	15/01/2023
78	HITO D3:29 (Ejecución) Informe anual de ejecución del proyecto diciembre	informe_final_gerencia_2022_diciembre.pdf	18/01/2023
79	HITO D4:30 (Ejecución) Informe de segundos desembolsos	INFORME_DESEMBOLSOS_SEGUNDO_SEMESTRE_GG7- signed(1)-signed-signed.pdf	18/01/2023
80	I.1. HITO 72.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Junio 2024	I.1. HITO_72.- (Ejecución) - _Informe_de_coberturas_mensual_- _Junio_2024.pdf	15/07/2024
81	I.2. HITO 73.- (Ejecución) Informe ejecución primer desembolso	I.2. HITO_73.- _(Ejecución)_Informe_ejecución_primer_desembolso.pdf	25/11/2024
82	I.3. HITO 74.- (Ejecución) - Informe de ejecución presupuestaria - Julio 2024	I.3. HITO_74.- (Ejecución) - _Informe_de_ejecución_presupuestaria_- _Julio_2024.pdf	25/11/2024
83	I.3. HITO 83.- (Ejecución) - Informe de ejecución presupuestaria - Noviembre 2024	Informe_de_ejecucion_presupuestaria_proyecto_noviembre- signed.pdf	13/12/2024
84	I.4. HITO 75.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Julio 2024	INFORME_DE_COBERTURAS_- _JULIO_2024_REV- signed-signed-signed.pdf	25/11/2024
85	I.6. HITO 77.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Agosto 2024	I.6. HITO_77.- (Ejecución) - _Informe_de_coberturas_mensual_#_Agosto_2024.pdf	25/11/2024
86	I.7. HITO 78.- (Ejecución) - Informe de ejecución presupuestaria - Septiembre 2024	I.7. HITO_78.- (Ejecución) - _Informe_de_ejecución_presupuestaria_#_Septiembre_2024.pdf	25/11/2024
87	I.8. HITO 79.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Septiembre 2024	I.8. HITO_79.- (Ejecución) - _Informe_de_coberturas_mensual_#_Septiembre_2024.pdf	25/11/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
88	I.9. HITO 80.- (Ejecución) - Informe de ejecución presupuestaria - Octubre 2024	I.9._HITO_80.-_(Ejecución)_-_Informe_de_ejecución_presupuestaria_#_Octubre_2024.pdf	25/11/2024
89	J.1. HITO 81.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Octubre 2024	J.1._HITO_81.-_(Ejecución)_-_Informe_de_coberturas_mensual_#_Octubre_2024.pdf	25/11/2024
90	J.1. HITO 82.- (Ejecución) - Informe de coberturas mensual - Noviembre 2024	13-B-INFORME_DE_COBERTURAS__NOVIEMBRE_2024_signed-signed.pdf	13/12/2024

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Romo Pozo, Rosa Verónica	Líder	Gerente de Proyecto 2	rosa.romo@inclusion.gob.ec	0996752121
