

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social

Subsecretaría de Discapacidades

Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad

PROYECTO: K004 MIES-Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES.

Líder del Proyecto:	RON ARIAS, DIEGO JAVIER (diego.ron@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Añazco, Luis Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Hurtado Hurtado, Ximena Sofia	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387167	TIR:	23.65 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	7,959,744.68
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	16,958,017.83
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	04/05/2025	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Ron Arias, Diego Javier	Fecha del siguiente Hito:	13/05/2025

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto de inversión se plantea con la finalidad de fortalecer la gestión que la Subsecretaría realiza para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus redes de apoyo, a través de servicios institucionalizados con los Centros Diurnos de desarrollo Integral para personas con discapacidad, Centros de Referencia y Acogida y Atención en el Hogar y la Comunidad para personas con discapacidad, además del seguimiento a la gestión y proceso de corresponsabilidad de los beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, así como a las personas responsables del cuidado a ser atendidas bajo la modalidad de Comités de Personas Responsables del Cuidado.

Beneficios Cualitativos

- Contribuir a la construcción de un sistema integral de servicios adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad que aporte a mejorar su calidad de vida.
- Elevar los niveles de autonomía e independencia de las personas con discapacidad, para su inclusión social y económica, a través del desarrollo de sus habilidades.
- Gestionar las acciones que permitan fortalecer los círculos de apoyo a personas con discapacidad; y, la actoría de las personas responsables del cuidado.
- Desarrollar estrategias para el cuidado y la atención a personas con discapacidad a través de talento humano

Tipo de Beneficiario

Personas con discapacidad de 18 a 64 años, once meses y veintinueve días; con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad, tal como se indica en la misión de la Subsecretaría de Discapacidades Acuerdo Ministerial 030, de 16 de junio de 2020.

Usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, - Personas con discapacidad grave, muy Grave y completa en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

- Personas con Enfermedades Catastróficas, Raras y Huérfanas en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

- Niños, Niñas y Adolescentes menores de 18 años viviendo con VIH-SIDA en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

Tal como se indica en el Acuerdo Ministerial 033, de 21 de mayo de 2021.


Restricciones

Recursos: déficit en el número de personal técnico contratado para la ejecución de los componentes, debido a la disminución de recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 83.78 %
Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

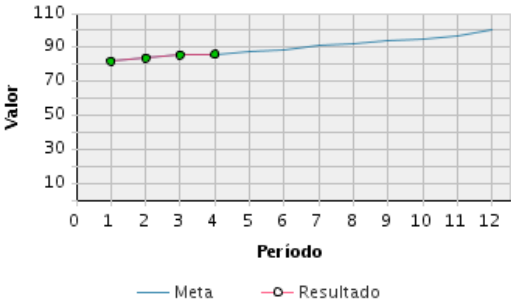

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
	82 %	84 %	86 %	86 %	87 %	88 %	91 %	92 %	94 %	95 %	96 %	100 %
	Avance real acumulado											
	82 %	84 %	86 %	86 %								
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2025: El proyecto tiene al 30 de abril o como codificado un valor de USD 5.073.932,70 3, sin embargo, el valor real es de asignado al proyecto es de USD 4,511,052.03; al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de USD 1.936.480,01, que corresponde al 43%; para el año 2025 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 8.820 usuarios; sin embargo a diferentes motivos se suscribirán 109 cubriendo la totalidad de la cobertura, en este sentido a la fecha se han suscrito 109 convenios de inversión, lo que indica que se ha cumplido el 100%	Ron Arias, Diego Javier	04/05/2025 - 08:05 PM
MARZO 2025: El proyecto tiene al 28 de febrero como codificado un valor de USD 5.511.052,03, sin embargo, el valor real es de asignado al proyecto es de USD 4,511,052.03; al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de USD 1.455.916,05, que corresponde al 32%; para el año 2025 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 8.820 usuarios; se han suscrito 110 convenios de inversión.	Ron Arias, Diego Javier	01/04/2025 - 02:51 PM
FEBRERO 2025: El proyecto tiene al 28 de febrero como codificado un valor de USD 5.511.052,03, sin embargo, el valor real es de asignado al proyecto es de USD 4,511,052.03; al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de USD 358.048,36, que corresponde al 8%; para el año 2025 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 8.820 usuarios; se han suscrito 71 convenios de inversión.	Ron Arias, Diego Javier	12/03/2025 - 07:36 AM
ENERO 2025: El proyecto tiene al 31 de enero como codificado un valor de USD 5.511.052,03, sin embargo, el valor real es de asignado al proyecto es de USD 4,511,052.03; al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de USD 34.779,33 que corresponde al 1%; para el año 2025 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 8820 usuarios.	Ron Arias, Diego Javier	12/03/2025 - 07:33 AM
DICIEMBRE 2024: El proyecto tiene al 31 de diciembre como codificado un valor de USD 4.511.052,03, esto debido al incremento de recursos para la suscripción de convenios modificatorios, al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de USD 3.540.529,07 del 89,41%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios.	Ron Arias, Diego Javier	06/01/2025 - 03:16 PM
NOVIEMBRE 2024: El proyecto tiene al 30 de noviembre como codificado un valor de USD 4.511.052,03, esto debido al incremento de recursos para la suscripción de convenios modificatorios, al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de USD 3.583.612,63 del 79,44%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios.	Ron Arias, Diego Javier	03/12/2024 - 09:15 AM
OCTUBRE 2024: El proyecto tiene al 31 de OCTUBRE como codificado un valor de USD 4.511.052,03, esto debido al incremento de recursos para la suscripción de convenios modificatorios, al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 2.584.978,87 del 27,30%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios.	Ron Arias, Diego Javier	05/11/2024 - 09:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 3.855.828,93, para su ejecución al 30 de SEPTIEMBRE al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 2.439.963,58 del 63,37.65%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios.	Ron Arias, Diego Javier	05/10/2024 - 07:19 PM
AGOSTO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 3.855.828,93, para su ejecución al 31 de AGOSTO al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 2.145.903,56 del 55.65%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de AGOSTO se cuenta con 117 convenios	Ron Arias, Diego Javier	02/09/2024 - 02:38 PM
JULIO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 3.855.828,93, para su ejecución al 31 de JULIO al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 1.636.736,09 del 42.45%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de JULIO se cuenta con 115 convenios	Ron Arias, Diego Javier	02/08/2024 - 03:24 PM
JUNIO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 3.855.828,93, para su ejecución al 30 de JUNIO al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 209.837,19 del 5.44%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 30 de JUNIO se cuenta con 84 convenios lo que significa una ejecución del 71.2%.	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	04/07/2024 - 03:04 PM
MAYO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 4.700.000,00, para su ejecución al 31 de MAYO al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 175.868,09 del 3.70%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de MAYO se cuenta con 0 convenios lo que significa una ejecución del 0%, esto debido a que no se contaba con organismo y correlativo, sin embargo a finales de mes, ya se cuenta con el recurso y se inicia el trámite de avales.	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	04/06/2024 - 09:32 AM
ABRIL 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 4.207.426,77, para su ejecución al 30 de ABRIL al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 140.224,91 del 28.47%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 30 de ABRIL se cuenta con 0 convenios lo que significa una ejecución del 0%, esto debido a que no se cuenta con organismo y correlativo, lo que implica que no se puedan realizar lo trámites de reforma PAPP y avales ante el MEF	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	02/05/2024 - 02:53 PM
MARZO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 4675861,94, para su ejecución, al 31 de enero se cuenta con un codificado de USD 4.666.867,09 al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria del 2,22%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de marzo se cuenta con 0 convenios lo que significa una ejecución del 01%, esto debido a que no se cuenta con organismo y correlativo, lo que implica que no se puedan realizar lo trámites de reforma PAPP y avales ante el MEF	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	01/04/2024 - 04:05 PM
FEBRERO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 4675861,94, para su ejecución, al 31 de enero se cuenta con un codificado de USD 4675861,94 al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria del 1.34%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de enero se cuenta con 0 convenios lo que significa una ejecución del 01%, esto debido a que no se cuenta con organismo y correlativo, lo que implica que no se puedan realizar lo trámites de reforma PAPP y avales ante el MEF	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	15/03/2024 - 12:47 AM
ENERO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 4675861,94, para su ejecución, al 31 de enero se cuenta con un codificado de USD 4675861,94 al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria del 00%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de enero se cuenta con 0 convenios lo que significa una ejecución del 01%, esto debido a que no se cuenta con organismo y correlativo, lo que implica que no se puedan realizar lo trámites de reforma PAPP y avales ante el MEF	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	15/03/2024 - 12:42 AM
DICIEMBRE: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 31 de DICIEMBRE se cuenta con un codificado de USD 4.287.868,89 al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria del 97.00%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de diciembre se cuenta con 111 convenios lo que significa una ejecución del 100.91%, esto debido a que se reemplazo un convenio en la Coordinación Zonal 5, sin embargo no implica aumento de cobertura o de presupuesto.	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	04/01/2024 - 03:09 PM
NOVIEMBRE: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 30 de NOVIEMBRE se cuenta con un codificado de USD 4.074.197,12 al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria del 90.80%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 30 de noviembre se cuenta con 111 convenios lo que significa una ejecución del 100.91%, esto debido a que se reemplazo	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	04/12/2023 - 08:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
un convenio en la Coordinación Zonal 5, sin embargo no implica aumento de cobertura o de presupuesto.		
OCTUBRE: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 31 de OCTUBRE se cuenta con un codificado de USD 4.551.667,75 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 78.80%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de octubre se cuenta con 111 convenios lo que significa una ejecución del 100.91%, esto debido a que se reemplazo un convenio en la Coordinación Zonal 5, sin embargo no implica aumento de cobertura o de presupuesto.	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	01/11/2023 - 11:06 AM
SEPTIEMBRE: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 30 de SEPTIEMBRE se cuenta con un codificado de USD 4937357,92 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 73.62%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 30 de septiembre se cuenta con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	02/10/2023 - 04:08 PM
AGOSTO: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 31 de AGOSTO se cuenta con un codificado de USD 4.977.357,92 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 64.37%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de agosto se cuenta con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	27/09/2023 - 03:49 PM
JULIO: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 31 de JULIO se cuenta con un codificado de USD 5.023.857,92 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 40.5%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de julio se cuenta con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	03/08/2023 - 10:58 AM
JUNIO: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 30 de JUNIO se cuenta con un codificado de USD 5.023.857,92 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 43.77%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 30 de junio se cuenta con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Chamba Revilla, Miro Fernando	05/07/2023 - 10:54 AM
MAYO: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 31 de mayo se cuenta con un codificado de USD 5.044.990,82 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 40.95%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de mayo se cuenta con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Sarzosa, Luis	01/06/2023 - 11:17 AM
ABRIL: El proyecto cuenta con un presupuesto de USD 5.115.000, al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 37.03%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 30 de abril de se cuentan con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Sarzosa, Luis	03/05/2023 - 11:13 PM
MARZO: El proyecto cuenta con un presupuesto de USD 5.115.000, al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 13.23%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de marzo de se cuentan con 109 convenios lo que significa una ejecución del 99.09%	Sarzosa, Luis	04/04/2023 - 02:48 PM
FEBRERO: este mes se han suscrito 104 convenios y se ha ejecutado el 3.36% del presupuesto asignado	Sarzosa, Luis	07/03/2023 - 09:42 AM
ENERO: para el año 2023 se ha planificado la suscripción de 110 convenios de inversión, de los cuales al 31 de enero de 2023 se han suscrito 70 convenios.	Sarzosa, Luis	07/03/2023 - 08:55 AM
DICIEMBRE 2022: en este mes se ha ejecutado el 92,11 del presupuesto asignado para el proyecto, además de que existen 117 convenios suscritos que se encuentran brindando servicios.	Sarzosa, Luis	04/01/2023 - 09:06 PM
NOVIEMBRE 2022: en este mes se ha ejecutado el 75,85 del presupuesto asignado para el proyecto, además de que existen 117 convenios suscritos que se encuentran brindando servicios.	Sarzosa, Luis	05/12/2022 - 08:05 PM
OCTUBRE 2022: en este mes se cuenta con una ejecución del 70.33%, y la firma de 117 convenios.	Sarzosa, Luis	07/11/2022 - 09:09 AM
SEPTIEMBRE 2022: en este mes se cuenta con una ejecución del 57.74%, y la firma de 117 convenios.	Sarzosa, Luis	05/10/2022 - 07:51 AM
AGOSTO 2022: en este mes se cuenta con una ejecución del 54.87%, y la firma de 117 convenios.	Sarzosa, Luis	01/09/2022 - 03:27 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 -	Sarzosa, Luis	05/08/2022 - 10:47 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de julio se cuenta con una ejecución del 45, 81%, y la firma de 117 convenios		
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de junio se cuenta con una ejecución del 45, 81%, y la firma de 117 convenios	Obando Ortiz, Zoila Gabriela	05/08/2022 - 09:26 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de junio se cuenta con una ejecución del 36, 89%, y la firma de 116 convenios	Sarzosa, Luis	05/07/2022 - 11:57 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de mayo se cuenta con una ejecución del 26, 74%, y la firma de 113 convenios	Sarzosa, Luis	05/07/2022 - 11:53 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de abril se cuenta con una ejecución del 10, 20%, y la firma de 68 convenios	Sarzosa, Luis	06/05/2022 - 08:09 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de marzo se cuenta con una ejecución del 20%,	Pozo Fierro, Gabriela Alexandra	06/04/2022 - 12:32 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de febrero cuanta con una ejecución del 13%.	Sarzosa Mossot, Luis Alberto	05/03/2022 - 09:22 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00.	Sarzosa Mossot, Luis Alberto	04/02/2022 - 03:19 PM

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición. Dictamen de prioridad, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/01/2022		05/01/2022		Sí	0.35
2	Planificación: Fichas de Costos, entregadas	5-Entregables Intermedios	05/01/2022		05/01/2022		Sí	0.35
3	Planificación: Matriz de Microplanificación, entregado	5-Entregables Intermedios	13/01/2022		13/01/2022		Sí	0.35
4	Planificación: Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2022, entregado	5-Entregables Intermedios	31/01/2022		31/01/2022		Sí	0.35
5	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria enero, entregado	5-Entregables Intermedios	07/02/2022		07/02/2022		Sí	0.35
6	Ejecución: Informe de cobertura mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2022		10/02/2022		Sí	0.35
7	Ejecución: Informe y ficha al mes enero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2022		10/02/2022		Sí	0.35
8	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	07/03/2022		07/03/2022		Sí	0.35
9	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	09/03/2022		09/03/2022		Sí	0.35
10	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	09/03/2022		09/03/2022		Sí	0.35
11	Ejecución: Informe de cobertura mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2022		10/03/2022		Sí	0.35
12	Ejecución: Informe y ficha al mes febrero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2022		10/03/2022		Sí	0.35
13	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	05/04/2022		05/04/2022		Sí	0.35
14	Ejecución: Informe de cobertura mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	11/04/2022		11/04/2022		Sí	0.35
15	Ejecución: Informe y ficha al mes marzo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/04/2022		11/04/2022		Sí	0.35
16	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/05/2022		05/05/2022		Sí	0.35
17	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria abril, entregado	5-Entregables Intermedios	05/05/2022		05/05/2022		Sí	0.35
18	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014	5-Entregables Intermedios	09/05/2022		09/05/2022		Sí	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	al 2021 a nivel nacional, entregado							
19	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	09/05/2022		09/05/2022		Sí	0.35
20	Ejecución: Informe de cobertura mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2022		10/05/2022		Sí	0.35
21	Ejecución: Informe y ficha al mes abril de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2022		10/05/2022		Sí	0.35
22	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	05/06/2022		05/06/2022		Sí	0.35
23	Ejecución: Informe de cobertura mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	10/06/2022		10/06/2022		Sí	0.35
24	Ejecución: Informe y ficha al mes mayo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/06/2022		10/06/2022		Sí	0.35
25	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	0.35
26	Ejecución: Informe consolidado del segundo desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	0.35
27	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria junio, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	0.35
28	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	0.35
29	Ejecución: Informe de cobertura mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	0.35
30	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	0.35
31	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	0.35
32	Ejecución: Informe y ficha al mes junio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	0.35
33	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria julio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/08/2022		05/08/2022		Sí	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
34	Ejecución: Informe de cobertura mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	11/08/2022		11/08/2022		Sí	0.35
35	Ejecución: Informe y ficha al mes julio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/08/2022		11/08/2022		Sí	0.35
36	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/09/2022		05/09/2022		Sí	0.35
37	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	05/09/2022		05/09/2022		Sí	0.35
38	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	07/09/2022		07/09/2022		Sí	0.35
39	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	07/09/2022		07/09/2022		Sí	0.35
40	Ejecución: Informe y ficha al mes agosto de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	12/09/2022		12/09/2022		Sí	0.35
41	Ejecución:Informe de cobertura mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	12/09/2022		12/09/2022		Sí	0.35
42	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	0.35
43	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	0.35
44	Ejecución: Matriz proforma presupuestaria 2023, entregada	5-Entregables Intermedios	07/10/2022		07/10/2022		Sí	0.35
45	Ejecución:Informe de cobertura mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		11/10/2022		Sí	0.35
46	Ejecución:Informe y ficha al mes septiembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		11/10/2022		Sí	0.35
47	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	07/11/2022		07/11/2022		Sí	0.35
48	Ejecución:Informe de cobertura mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2022		10/11/2022		Sí	0.35
49	Ejecución:Informe y ficha al mes octubre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2022		10/11/2022		Sí	0.35
50	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	22/11/2022		09/11/2022		Sí	0.35
51	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre	5-Entregables Intermedios	22/11/2022		09/11/2022		Sí	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado							
52	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/12/2022		05/12/2022		Sí	0.35
53	Ejecución:Informe de cobertura mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	12/12/2022		12/12/2022		Sí	0.35
54	Ejecución:Informe y ficha al mes noviembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	12/12/2022		12/12/2022		Sí	0.35
55	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.35
56	Ejecución:Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.35
57	Ejecución:Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.35
58	Ejecución:Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.35
59	Ejecución:Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.35
60	Ejecución:Informe de cobertura mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.35
61	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.35
62	Ejecución:Informe y ficha al mes diciembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.35
63	Ejecución: Fichas de Costos, entregadas	5-Entregables Intermedios	05/01/2023		05/01/2023		Sí	0.35
64	Ejecución: Matriz de Microplanificación, entregado	5-Entregables Intermedios	13/01/2023		13/01/2023		Sí	0.35
65	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2023, entregado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.35
66	Ejecución: Informe de cobertura mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2023		10/02/2023		Sí	0.35
67	Ejecución: Informe y ficha al mes enero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2023		10/02/2023		Sí	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
68	Ejecución; Informe de ejecución presupuestaria enero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2023		10/02/2023		Sí	0.35
69	Ejecución: Informe de caracterización mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/02/2023		16/02/2023		Sí	0.35
70	Ejecución: Informe de alertas mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/02/2023		16/02/2023		Sí	0.35
71	Ejecución: Informe de cobertura mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2023		10/03/2023		Sí	0.35
72	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2023		10/03/2023		Sí	0.35
73	Ejecución: Informe y ficha al mes febrero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2023		10/03/2023		Sí	0.35
74	Ejecución: Informe de caracterización mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2023		16/03/2023		Sí	0.35
75	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2023		16/03/2023		Sí	0.35
76	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2023		16/03/2023		Sí	0.35
77	Ejecución: Informe de alertas mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2023		16/03/2023		Sí	0.35
78	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	10/04/2023		10/04/2023		Sí	0.35
79	Ejecución; Informe y ficha al mes marzo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/04/2023		10/04/2023		Sí	0.35
80	Ejecución: Informe de cobertura mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	11/04/2023		11/04/2023		Sí	0.35
81	Ejecución: Informe de caracterización mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	17/04/2023		17/04/2023		Sí	0.35
82	Ejecución: Informe de alertas mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	17/04/2023		17/04/2023		Sí	0.35
83	Ejecución: Informe de cobertura mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2023		10/05/2023		Sí	0.35
84	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria abril, entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2023		10/05/2023		Sí	0.35
85	Ejecución: Informe y ficha al mes abril de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2023		10/05/2023		Sí	0.35
86	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de	5-Entregables Intermedios	12/05/2023		12/05/2023		Sí	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado							
87	Ejecución: Informe de alertas mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2023		16/05/2023		Sí	0.35
88	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2023		16/05/2023		Sí	0.35
89	Ejecución:Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2023		16/05/2023		Sí	0.35
90	Ejecución:Informe de caracterización mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2023		16/05/2023		Sí	0.35
91	Ejecución: Informe y ficha al mes mayo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	09/06/2023		09/06/2023		Sí	0.35
92	Ejecución: Informe de cobertura mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	12/06/2023		12/06/2023		Sí	0.35
93	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	12/06/2023		12/06/2023		Sí	0.35
94	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria junio, entregado	5-Entregables Intermedios	10/07/2023		10/07/2023		Sí	0.35
95	Ejecución: Informe y ficha al mes junio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/07/2023		10/07/2023		Sí	0.35
96	Ejecución:Informe de cobertura mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	10/07/2023		10/07/2023		Sí	0.35
97	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2023		13/07/2023		Sí	0.35
98	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2023		13/07/2023		Sí	0.35
99	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2023		16/07/2023		Sí	0.35
100	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2023		16/07/2023		Sí	0.35
101	Ejecución: Informe de alertas mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2023		16/07/2023		Sí	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
102	Ejecución: Informe de caracterización mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2023		16/07/2023		Sí	0.35
103	Ejecución: Informe de alertas mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		17/07/2023		Sí	0.35
104	Ejecución: Informe de caracterización mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		17/07/2023		Sí	0.35
105	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria julio, entregado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.35
106	Ejecución: Informe de cobertura mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.35
107	Ejecución: Informe y ficha al mes julio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.35
108	Ejecución: Informe de alertas mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2023		16/08/2023		Sí	0.35
109	Ejecución: Informe de caracterización mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2023		16/08/2023		Sí	0.35
110	Ejecución: Informe y ficha al mes agosto de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/09/2023		11/09/2023		Sí	0.35
111	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	11/09/2023		11/09/2023		Sí	0.35
112	Ejecución: Informe de cobertura mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	12/09/2023		12/09/2023		Sí	0.35
113	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.35
114	Ejecución: Informe de alertas mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.35
115	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.35
116	Ejecución: Informe consolidado del segundo cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.35
117	Ejecución: Informe de caracterización mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.35
118	Ejecución: Informe de cobertura mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.35
119	Ejecución: Informe y ficha al mes septiembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
120	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.35
121	Ejecución: Informe de alertas mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/10/2023		16/10/2023		Sí	0.35
122	Ejecución: Informe de caracterización mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/10/2023		16/10/2023		Sí	0.35
123	Ejecución: Informe de cobertura mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.35
124	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.35
125	Ejecución: Informe y ficha al mes octubre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.35
126	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.35
127	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.35
128	Ejecución: Informe de alertas mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.35
129	Ejecución: Informe de caracterización mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.35
130	Ejecución: Informe y ficha al mes noviembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	08/12/2023		08/12/2023		Sí	0.35
131	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	11/12/2023		11/12/2023		Sí	0.35
132	Ejecución: Informe de cobertura mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	11/12/2023		11/12/2023		Sí	0.35
133	Ejecución: Informe de alertas mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	15/12/2023		15/12/2023		Sí	0.35
134	Ejecución: Informe de caracterización mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	15/12/2023		15/12/2023		Sí	0.35
135	Ejecución: Matriz proforma presupuestaría 2023, entregada	5-Entregables Intermedios	15/12/2023		15/12/2023		Sí	0.35
136	Ejecución: 2025	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.35
137	Ejecución: Informe consolidado del tercer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.35
138	Ejecución: Informe de alertas mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
139	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.35
140	Ejecución: Informe de caracterización mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.35
141	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.35
142	Ejecución: 2024	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.35
143	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.35
144	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
145	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
146	Ejecución: Informe de cobertura mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
147	Ejecución: Informe y ficha al mes diciembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
148	Ejecución: Fichas de Costos, entregadas	5-Entregables Intermedios	30/01/2024		30/01/2024		Sí	0.25
149	Ejecución: Matriz de Microplanificación, entregado	5-Entregables Intermedios	30/01/2024		30/01/2024		Sí	0.25
150	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2024, entregado	5-Entregables Intermedios	30/01/2024		30/01/2024		Sí	0.25
151	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria enero, entregado	5-Entregables Intermedios	02/02/2024		02/02/2024		Sí	0.25
152	Ejecución: Informe y ficha al mes enero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	13/02/2024		13/02/2024		Sí	0.25
153	Ejecución: Informe de cobertura mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	14/02/2024		14/02/2024		Sí	0.25
154	Ejecución: Informe de alertas mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/02/2024		16/02/2024		Sí	0.25
155	Ejecución: Informe de caracterización mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/02/2024		16/02/2024		Sí	0.25
156	Ejecución: Informe y ficha al mes febrero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	13/03/2024		13/03/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
157	Ejecución: Informe de cobertura mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	14/03/2024		14/03/2024		Sí	0.25
158	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	15/03/2024		15/03/2024		Sí	0.25
159	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2023 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2024		16/03/2024		Sí	0.25
160	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2024		16/03/2024		Sí	0.25
161	Ejecución: Informe de alertas mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2024		16/03/2024		Sí	0.25
162	Ejecución: Informe de caracterización mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2024		16/03/2024		Sí	0.25
163	Ejecución: Informe y ficha al mes marzo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/04/2024		13/04/2024		Sí	0.25
164	Ejecución: Informe de cobertura mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	14/04/2024		14/04/2024		Sí	0.25
165	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	15/04/2024		15/04/2024		Sí	0.25
166	Ejecución: Informe de alertas mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/04/2024		16/04/2024		Sí	0.25
167	Ejecución: Informe de caracterización mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/04/2024		16/04/2024		Sí	0.25
168	Ejecución: Informe y ficha al mes abril de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/05/2024		13/05/2024		Sí	0.25
169	Ejecución: Informe de cobertura mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	14/05/2024		14/05/2024		Sí	0.25
170	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria abril, entregado	5-Entregables Intermedios	15/05/2024		15/05/2024		Sí	0.25
171	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2023 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2024		16/05/2024		Sí	0.25
172	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2024		16/05/2024		Sí	0.25
173	Ejecución: Informe de alertas mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2024		16/05/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
174	Ejecución: Informe de caracterización mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2024		16/05/2024		Sí	0.25
175	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	17/05/2024		17/05/2024		Sí	0.25
176	Ejecución: Informe y ficha al mes mayo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/06/2024		13/06/2024		Sí	0.25
177	Ejecución: Informe de cobertura mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	14/06/2024		14/06/2024		Sí	0.25
178	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	15/06/2024		15/06/2024		Sí	0.25
179	Ejecución: Informe de alertas mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/06/2024		16/06/2024		Sí	0.25
180	Ejecución: Informe de caracterización mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/06/2024		16/06/2024		Sí	0.25
181	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2024		13/07/2024		Sí	0.25
182	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2024		13/07/2024		Sí	0.25
183	Ejecución: Informe y ficha al mes junio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2024		13/07/2024		Sí	0.25
184	Ejecución: Informe de cobertura mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	14/07/2024		14/07/2024		Sí	0.25
185	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria junio, entregado	5-Entregables Intermedios	15/07/2024		15/07/2024		Sí	0.25
186	Ejecución: Informe de alertas mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2024		16/07/2024		Sí	0.25
187	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2024 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2024		16/07/2024		Sí	0.24
188	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2024 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2024		16/07/2024		Sí	0.25
189	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2024		16/07/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
190	Ejecución: Informe de caracterización mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2024		16/07/2024		Sí	0.25
191	Ejecución: Informe y ficha al mes julio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/08/2024		13/08/2024		Sí	0.25
192	Ejecución: Informe de cobertura mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	14/08/2024		14/08/2024		Sí	0.25
193	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria julio, entregado	5-Entregables Intermedios	15/08/2024		15/08/2024		Sí	0.25
194	Ejecución: Informe de alertas mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2024		16/08/2024		Sí	0.25
195	Ejecución: Informe de caracterización mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2024		16/08/2024		Sí	0.25
196	Ejecución: Informe y ficha al mes agosto de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/09/2024		13/09/2024		Sí	0.25
197	Ejecución: Informe de cobertura mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	14/09/2024		14/09/2024		Sí	0.25
198	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2024		15/09/2024		Sí	0.25
199	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/09/2024		16/09/2024		Sí	0.25
200	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/09/2024		16/09/2024		Sí	0.25
201	Ejecución: Informe de caracterización mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	16/09/2024		16/09/2024		Sí	0.25
202	Ejecución: Informe de alertas mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	16/09/2024		16/09/2024		Sí	0.25
203	Ejecución: Informe consolidado del segundo cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	17/09/2024		17/09/2024		Sí	0.25
204	Ejecución: Informe y ficha al mes septiembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/10/2024		13/10/2024		Sí	0.25
205	Ejecución: Informe de cobertura mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	14/10/2024		14/10/2024		Sí	0.25
206	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	15/10/2024		15/10/2024		Sí	0.25
207	Ejecución: Informe de caracterización mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/10/2024		16/10/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
208	Ejecución: Informe de alertas mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/10/2024		16/10/2024		Sí	0.25
209	Ejecución: Informe y ficha al mes octubre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/11/2024		13/11/2024		Sí	0.25
210	Ejecución: Informe de cobertura mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	14/11/2024		14/11/2024		Sí	0.25
211	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	15/11/2024		15/11/2024		Sí	0.25
212	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2024		16/11/2024		Sí	0.25
213	Ejecución: Informe de alertas mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2024		16/11/2024		Sí	0.25
214	Ejecución: Informe de caracterización mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2024		16/11/2024		Sí	0.25
215	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	16/11/2024		16/11/2024		Sí	0.25
216	Ejecución: Informe y ficha al mes noviembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/12/2024		13/12/2024		Sí	0.25
217	Ejecución: Informe de cobertura mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	14/12/2024		14/12/2024		Sí	0.25
218	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	15/12/2024		15/12/2024		Sí	0.25
219	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/12/2024		16/12/2024		Sí	0.25
220	Ejecución: Informe de alertas mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/12/2024		16/12/2024		Sí	0.25
221	Ejecución: Informe de caracterización mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/12/2024		16/12/2024		Sí	0.25
222	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	29/12/2024		29/12/2024		Sí	0.25
223	Ejecución: Informe consolidado del tercer cuatrimestre de desebbolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024		29/12/2024		Sí	0.25
224	Ejecución: Informe de alertas mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024		29/12/2024		Sí	0.25
225	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las	5-Entregables Intermedios	29/12/2024		29/12/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado							
226	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables	5-Entregables Intermedios	29/12/2024		29/12/2024		Sí	0.25
227	Ejecución: Informe de caracterización mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024		29/12/2024		Sí	0.25
228	Ejecución: Informe de cobertura mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024		29/12/2024		Sí	0.25
229	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024		29/12/2024		Sí	0.25
230	Ejecución: Informe y ficha al mes diciembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024		29/12/2024		Sí	0.25
231	Ejecución: Fichas de Costos, aprobadas	5-Entregables Intermedios	10/01/2025		10/01/2025		Sí	5.0
232	Ejecución: Matriz de Microplanificación, aprobada	5-Entregables Intermedios	10/01/2025		10/01/2025		Sí	5.0
233	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria enero, aprobado	5-Entregables Intermedios	13/02/2025		13/02/2025		Sí	0.35
234	Ejecución: Informe y ficha al mes enero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, aprobados	5-Entregables Intermedios	14/02/2025		14/02/2025		Sí	0.35
235	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2025, aprobada	5-Entregables Intermedios	17/02/2025		17/02/2025		Sí	1.14
236	Ejecución: Informe y ficha al mes febrero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, aprobados	5-Entregables Intermedios	13/03/2025		13/03/2025		Sí	0.35
237	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2024 a nivel nacional, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/03/2025		17/03/2025		Sí	0.35
238	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/03/2025		14/03/2025		Sí	0.35
239	Ejecución: Informe de cobertura mes de febrero, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/03/2025		14/03/2025		Sí	0.35
240	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria febrero, aprobado	5-Entregables Intermedios	17/03/2025		17/03/2025		Sí	0.35
241	Ejecución: Informe de cobertura mes de marzo, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/04/2025		14/04/2025		Sí	0.0
242	Ejecución: Informe y ficha al mes marzo de la gerencia	5-Entregables Intermedios	14/04/2025		14/04/2025		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	sobre la ejecución del proyecto entregado							
243	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria marzo, aprobado	5-Entregables Intermedios	16/04/2025		16/04/2025		Sí	0.35
244	Ejecución: Informe y ficha al mes abril de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/05/2025	13/05/2025			No	0.35
245	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2024 a nivel nacional, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/05/2025	14/05/2025			No	0.35
246	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/05/2025	14/05/2025			No	0.35
247	Ejecución: Informe de cobertura mes de abril, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/05/2025	14/05/2025			No	0.35
248	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria abril, aprobado	5-Entregables Intermedios	16/05/2025	16/05/2025			No	0.0
249	Ejecución: Informe de cobertura mes de mayo, aprobado	5-Entregables Intermedios	13/06/2025	01/06/2025			No	0.35
250	Ejecución: Informe y ficha al mes mayo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/06/2025	13/06/2025			No	0.35
251	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria mayo, aprobado	5-Entregables Intermedios	17/06/2025	17/06/2025			No	0.35
252	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2024 a nivel nacional, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/07/2025	14/07/2025			No	0.35
253	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/07/2025	14/07/2025			No	0.35
254	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/07/2025	14/07/2025			No	0.35
255	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/07/2025	14/07/2025			No	0.35
256	Ejecución: Informe de cobertura mes de junio, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/07/2025	14/07/2025			No	0.35
257	Ejecución: Informe y ficha al mes junio de la gerencia	5-Entregables Intermedios	14/07/2025	14/07/2025			No	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	sobre la ejecución del proyecto entregado							
258	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria junio, aprobado	5-Entregables Intermedios	17/07/2025	17/07/2025			No	0.35
259	Ejecución: Informe y ficha al mes julio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, aprobado	5-Entregables Intermedios	13/08/2025	13/08/2025			No	0.35
260	Ejecución: Informe de cobertura mes de julio, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/08/2025	14/08/2025			No	0.35
261	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria julio, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/08/2025	15/08/2025			No	0.35
262	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2024 a nivel nacional, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/09/2025	15/09/2025			No	0.35
263	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/09/2025	15/09/2025			No	0.35
264	Ejecución: Informe de cobertura mes de agosto, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/09/2025	15/09/2025			No	0.35
265	Ejecución: Informe y ficha al mes agosto de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, aprobados	5-Entregables Intermedios	15/09/2025	15/09/2025			No	0.35
266	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria agosto, aprobado	5-Entregables Intermedios	17/09/2025	17/09/2025			No	0.35
267	Ejecución: Informe y ficha al mes septiembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, aprobados	5-Entregables Intermedios	13/10/2025	13/10/2025			No	0.35
268	Ejecución: Informe de cobertura mes de septiembre, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/10/2025	14/10/2025			No	0.35
269	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria septiembre, aprobado	5-Entregables Intermedios	17/10/2025	17/10/2025			No	0.35
270	Ejecución: Informe y ficha al mes octubre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, aprobado	5-Entregables Intermedios	13/11/2025	13/11/2025			No	0.35
271	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2024 a nivel nacional, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/11/2025	14/11/2025			No	0.35
272	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/11/2025	14/11/2025			No	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
273	Ejecución: Informe de cobertura mes de octubre, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/11/2025	14/11/2025			No	0.35
274	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria octubre, aprobado	5-Entregables Intermedios	17/11/2025	17/11/2025			No	0.35
275	Ejecución: Informe y ficha al mes noviembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, aprobados	5-Entregables Intermedios	13/12/2025	13/12/2025			No	0.35
276	Ejecución: Informe de cobertura mes de noviembre, aprobado	5-Entregables Intermedios	14/12/2025	14/12/2025			No	0.35
277	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/12/2025	15/12/2025			No	0.35
278	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, aprobado	5-Entregables Intermedios	16/12/2025	16/12/2025			No	0.35
279	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2024 a nivel nacional, aprobado	5-Entregables Intermedios	16/12/2025	16/12/2025			No	0.35
280	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.35
281	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.35
282	Ejecución: Informe de cobertura mes de diciembre, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.35
283	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria diciembre, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.42
284	Ejecución: Informe y ficha al mes diciembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.35

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Unidades en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad		-	-	-	01/01/2022	-
2	Número de convenios de cooperación técnico - económico suscritos en la modalidad "ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD"		-	-	-	01/01/2022	-

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
3	Porcentaje de usuarios que asisten a los servicios de Atención para Personas con Discapacidad (Inversión)		94.00 %	1	0.94	01/01/2025	Abril


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	16,958,017.83 **
Costo Total:	42,164,298.74
Total Devengado:	14,383,445.81
% Costo Total Devengado:	34.11 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 34.11 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	84,328,597.48	4,511,052.03	0.00	88,839,649.51
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	10,615,000.00	4,511,052.03	0.00	15,126,052.03
Ppto. Codificado	5,115,000.00	4,511,052.03	0.00	9,626,052.03
Ppto. Comprometido	5,115,000.00	4,511,052.03	0.00	9,626,052.03
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	13,091,299.50	4,511,052.03	0.00	17,602,351.53
Ppto. Devengado	12,446,965.80	1,936,480.01	0.00	14,383,445.81
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 12,446,965.80	4,511,052.03	0.00	16,958,017.83
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	644,333.70	0.00	0.00	644,333.70
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 95.08 %	42.93 %	0.00 %	81.71 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025

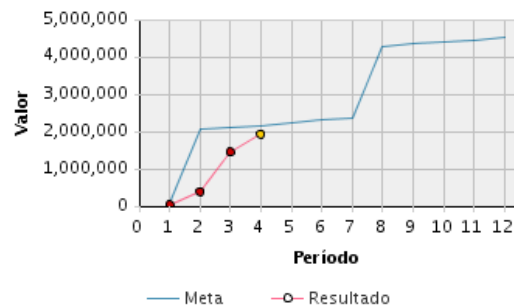

Presupuesto Mensual 2025

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	54,401.12	34,779.33	54,401.12	34,779.33	63.93 %		0.77 %

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,993,965.93	358,048.36	2,048,367.05	392,827.69	19.18 %		8.71 %
Mar	55,191.12	1,063,088.36	2,103,558.17	1,455,916.05	69.21 %		32.27 %
Abr	55,141.12	480,563.96	2,158,699.29	1,936,480.01	89.71 %		42.93 %
May	79,451.12		2,238,150.41				
Jun	55,101.12		2,293,251.53				
Jul	54,901.12		2,348,152.65				
Ago	1,942,625.12		4,290,777.77				
Sep	55,341.17		4,346,118.94				
Oct	55,191.13		4,401,310.07				
Nov	55,341.21		4,456,651.28				
Dic	54,400.75		4,511,052.03				
Total	4,511,052.03	1,936,480.01					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
11	Incrementar la eficiencia en la prestación del servicio a las personas con discapacidad y sus familias MEDIANTE la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las modalidades de atención en el marco del enfoque social e inclusivo.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO_01	A.1.pdf	04/09/2022
2	ASOCIACIÓN HITO_10	A.10.pdf	04/09/2022
3	ASOCIACIÓN HITO_100	K.6.pdf	21/07/2023
4	ASOCIACIÓN HITO_101	K.7.pdf	18/07/2023
5	ASOCIACIÓN HITO_103	K.9.pdf	20/07/2023
6	ASOCIACIÓN HITO_104	L.1.pdf	04/09/2023
7	ASOCIACIÓN HITO_105	L.2.pdf	04/09/2023
8	ASOCIACIÓN HITO_106	L.3.pdf	15/08/2023
9	ASOCIACIÓN HITO_107	L.4.pdf	15/08/2023
10	ASOCIACIÓN HITO_107	L.4.1.pdf	15/08/2023
11	ASOCIACIÓN HITO_108	L.5.pdf	04/09/2023
12	ASOCIACIÓN HITO_109	L.6.pdf	28/09/2023
13	ASOCIACIÓN HITO_11	A.11.pdf	04/09/2022
14	ASOCIACIÓN HITO_11.1	A.11.1.pdf	04/09/2022
15	ASOCIACIÓN HITO_110	L.7.pdf	27/09/2023
16	ASOCIACIÓN HITO_110	L.7.1.pdf	27/09/2023
17	ASOCIACIÓN HITO_111	L.8.pdf	27/09/2023
18	ASOCIACIÓN HITO_112	L.9.pdf	27/09/2023
19	ASOCIACIÓN HITO_113	M.1.pdf	28/09/2023
20	ASOCIACIÓN HITO_114	M.2.pdf	27/09/2023
21	ASOCIACIÓN HITO_115	M.3.pdf	28/09/2023
22	ASOCIACIÓN HITO_116	M.4.pdf	28/09/2023
23	ASOCIACIÓN HITO_117	M.5.pdf	28/09/2023
24	ASOCIACIÓN HITO_118	M.6.pdf	12/10/2023
25	ASOCIACIÓN HITO_119	M.7.pdf	11/10/2023
26	ASOCIACIÓN HITO_119	M.7.1.pdf	11/10/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
27	ASOCIACIÓN HITO_12	A.12.pdf	04/09/2022
28	ASOCIACIÓN HITO_120	M.8.pdf	16/10/2023
29	ASOCIACIÓN HITO_121	M.9.pdf	17/10/2023
30	ASOCIACIÓN HITO_122	N.1.pdf	17/10/2023
31	ASOCIACIÓN HITO_123	N.2.pdf	23/11/2023
32	ASOCIACIÓN HITO_124	N.3.pdf	27/11/2023
33	ASOCIACIÓN HITO_125	N.4.pdf	23/11/2023
34	ASOCIACIÓN HITO_125	N.4.1.pdf	23/11/2023
35	ASOCIACIÓN HITO_126	N.5.pdf	23/11/2023
36	ASOCIACIÓN HITO_127	N.6.pdf	23/11/2023
37	ASOCIACIÓN HITO_128	N.7.pdf	23/11/2023
38	ASOCIACIÓN HITO_129	N.8.pdf	23/11/2023
39	ASOCIACIÓN HITO_13	B.1.pdf	04/09/2022
40	ASOCIACIÓN HITO_130	N.9.1.pdf	18/12/2023
41	ASOCIACIÓN HITO_130	N.9.pdf	18/12/2023
42	ASOCIACIÓN HITO_131	O.1.pdf	18/12/2023
43	ASOCIACIÓN HITO_132	O.2.pdf	18/12/2023
44	ASOCIACIÓN HITO_133	O.3.pdf	20/12/2023
45	ASOCIACIÓN HITO_134	O.4.pdf	04/01/2024
46	ASOCIACIÓN HITO_136	Matriz_Microplanificacion_2024_SD_CON__FORMATO_21-10-2023-2024.xlsm	10/01/2024
47	ASOCIACIÓN HITO_137	O.7.pdf	15/01/2024
48	ASOCIACIÓN HITO_138	O.8.pdf	16/01/2024
49	ASOCIACIÓN HITO_139	O.9.pdf	04/01/2024
50	ASOCIACIÓN HITO_14	B.2.pdf	04/09/2022
51	ASOCIACIÓN HITO_140	P.1.pdf	16/01/2024
52	ASOCIACIÓN HITO_141	P.2.pdf	16/01/2024
53	ASOCIACIÓN HITO_143	P.4.pdf	15/01/2024
54	ASOCIACIÓN HITO_144	P..5	16/01/2024
55	ASOCIACIÓN HITO_145	P.6.pdf	08/01/2024
56	ASOCIACIÓN HITO_146	P.7.pdf	16/01/2024
57	ASOCIACIÓN HITO_147	P8.pdf	11/01/2024
58	ASOCIACIÓN HITO_147	P.8.1.pdf	11/01/2024
59	ASOCIACIÓN HITO_148	A.1.rar	15/03/2024
60	ASOCIACIÓN HITO_149	A.2.zip	15/03/2024
61	ASOCIACIÓN HITO_15	B.3.pdf	04/09/2022
62	ASOCIACIÓN HITO_15	B.3.1.pdf	04/09/2022
63	ASOCIACIÓN HITO_150	A.3.rar	15/03/2024
64	ASOCIACIÓN HITO_151	A.4.pdf	15/03/2024
65	ASOCIACIÓN HITO_152	A.5.pdf	15/03/2024
66	ASOCIACIÓN HITO_152	A.5.1.pdf	15/03/2024
67	ASOCIACIÓN HITO_153	A.6.pdf	15/03/2024
68	ASOCIACIÓN HITO_154	A.7.pdf	25/03/2024
69	ASOCIACIÓN HITO_155	A.8.pdf	15/03/2024
70	ASOCIACIÓN HITO_156	A.9.pdf	15/03/2024
71	ASOCIACIÓN HITO_156	A.9.1.pdf	15/03/2024
72	ASOCIACIÓN HITO_157	B.1.pdf	15/03/2024
73	ASOCIACIÓN HITO_158	B.2.pdf	15/03/2024
74	ASOCIACIÓN HITO_159	B.3.pdf	15/03/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
75	ASOCIACIÓN HITO_16	B.4.pdf	04/09/2022
76	ASOCIACIÓN HITO_16	B.5.pdf	04/09/2022
77	ASOCIACIÓN HITO_160	B.4.pdf	15/03/2024
78	ASOCIACIÓN HITO_161	B.5.pdf	25/03/2024
79	ASOCIACIÓN HITO_162	B.6.pdf	28/03/2024
80	ASOCIACIÓN HITO_163	B.7.pdf	15/04/2024
81	ASOCIACIÓN HITO_163	B.7.1.pdf	15/04/2024
82	ASOCIACIÓN HITO_164	B.8.pdf	10/04/2024
83	ASOCIACIÓN HITO_165	B.9.pdf	30/04/2024
84	ASOCIACIÓN HITO_166	C.1.pdf	30/04/2024
85	ASOCIACIÓN HITO_167	C.2.pdf	30/04/2024
86	ASOCIACIÓN HITO_168	C.3.pdf	15/05/2024
87	ASOCIACIÓN HITO_168	C.3.1.pdf	15/05/2024
88	ASOCIACIÓN HITO_169	C.4.pdf	15/05/2024
89	ASOCIACIÓN HITO_17	B.6.pdf	04/09/2022
90	ASOCIACIÓN HITO_170	C.5.pdf	15/05/2024
91	ASOCIACIÓN HITO_171	ASOCIACIÓN_HITO_171.pdf	17/05/2024
92	ASOCIACIÓN HITO_172	ASOCIACIÓN_HITO_172.pdf	17/05/2024
93	ASOCIACIÓN HITO_173	ASOCIACIÓN_HITO_173.pdf	20/05/2024
94	ASOCIACIÓN HITO_174	ASOCIACIÓN_HITO_174.pdf	22/05/2024
95	ASOCIACIÓN HITO_175	D.1.pdf	19/06/2024
96	ASOCIACIÓN HITO_176	D.2.pdf	19/06/2024
97	ASOCIACIÓN HITO_176	D.2.1.pdf	19/06/2024
98	ASOCIACIÓN HITO_177	D.3.pdf	25/06/2024
99	ASOCIACIÓN HITO_178	D.4.pdf	19/06/2024
100	ASOCIACIÓN HITO_179	D.5.pdf	19/06/2024
101	ASOCIACIÓN HITO_180	D.6.pdf	15/07/2024
102	ASOCIACIÓN HITO_181	D.7.pdf	23/07/2024
103	ASOCIACIÓN HITO_182	D.8.pdf	15/07/2024
104	ASOCIACIÓN HITO_183	D.9.pdf	23/07/2024
105	ASOCIACIÓN HITO_183	D.9.1.pdf	23/07/2024
106	ASOCIACIÓN HITO_184	E.1.pdf	23/07/2024
107	ASOCIACIÓN HITO_185	E.2.pdf	30/07/2024
108	ASOCIACIÓN HITO_186	E.3.pdf	23/07/2024
109	ASOCIACIÓN HITO_187	E.4.pdf	31/07/2024
110	ASOCIACIÓN HITO_188	E.5.pdf	31/07/2024
111	ASOCIACIÓN HITO_189	E.6.pdf	24/07/2024
112	ASOCIACIÓN HITO_19	B.7.pdf	04/09/2022
113	ASOCIACIÓN HITO_190	E.7.pdf	17/07/2024
114	ASOCIACIÓN HITO_191	E.8.1.pdf	02/09/2024
115	ASOCIACIÓN HITO_191	E.8.pdf	02/09/2024
116	ASOCIACIÓN HITO_192	E.9.pdf	28/08/2024
117	ASOCIACIÓN HITO_193	F.1.pdf	02/09/2024
118	ASOCIACIÓN HITO_194	F.2.pdf	28/08/2024
119	ASOCIACIÓN HITO_195	F.3.pdf	28/08/2024
120	ASOCIACIÓN HITO_196	F.4.pdf	27/09/2024
121	ASOCIACIÓN HITO_196	F.4.1.pdf	27/09/2024
122	ASOCIACIÓN HITO_197	F.5.pdf	10/10/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
123	ASOCIACIÓN HITO_198	F.6.pdf	27/09/2024
124	ASOCIACIÓN HITO_199	F.7.pdf	18/10/2024
125	ASOCIACIÓN HITO_2	A.2.rar	04/09/2022
126	ASOCIACIÓN HITO_20	B.8.pdf	04/09/2022
127	ASOCIACIÓN HITO_200	F.8.pdf	18/10/2024
128	ASOCIACIÓN HITO_201	D_6.pdf	11/01/2024
129	ASOCIACIÓN HITO_201	F.9.pdf	27/09/2024
130	ASOCIACIÓN HITO_202	G.1.pdf	27/09/2024
131	ASOCIACIÓN HITO_203	G.2.pdf	27/09/2024
132	ASOCIACIÓN HITO_204	G.3.pdf	15/10/2024
133	ASOCIACIÓN HITO_204	G.3.1.pdf	15/10/2024
134	ASOCIACIÓN HITO_205	G.4.pdf	18/10/2024
135	ASOCIACIÓN HITO_206	G.5.5	28/10/2024
136	ASOCIACIÓN HITO_207	G.6.pdf	18/10/2024
137	ASOCIACIÓN HITO_208	G.7.pdf	18/10/2024
138	ASOCIACIÓN HITO_209	G.8.pdf	04/12/2024
139	ASOCIACIÓN HITO_209	G.8.1.pdf	04/12/2024
140	ASOCIACIÓN HITO_21	B.9.pdf	04/09/2022
141	ASOCIACIÓN HITO_21	B.9.1.pdf	04/09/2022
142	ASOCIACIÓN HITO_210	G.9.pdf	04/12/2024
143	ASOCIACIÓN HITO_211	H.1.pdf	04/12/2024
144	ASOCIACIÓN HITO_212	H.2.pdf	31/01/2025
145	ASOCIACIÓN HITO_213	H.3.pdf	24/12/2024
146	ASOCIACIÓN HITO_215	H.5.pdf	04/12/2024
147	ASOCIACIÓN HITO_216	H.6.pdf	24/12/2024
148	ASOCIACIÓN HITO_216	H.6.1.pdf	24/12/2024
149	ASOCIACIÓN HITO_217	H.7.pdf	24/12/2024
150	ASOCIACIÓN HITO_218	H.8.pdf	07/01/2025
151	ASOCIACIÓN HITO_219	J.2.pdf	16/01/2025
152	ASOCIACIÓN HITO_22	C.1.pdf	04/09/2022
153	ASOCIACIÓN HITO_220	I.1.pdf	24/12/2024
154	ASOCIACIÓN HITO_221	I.1.pdf	16/01/2025
155	ASOCIACIÓN HITO_222	I.2.pdf	16/01/2025
156	ASOCIACIÓN HITO_223	I.3.pdf	31/01/2025
157	ASOCIACIÓN HITO_224	I.4.pdf	16/01/2025
158	ASOCIACIÓN HITO_225	I.5.pdf	16/01/2025
159	ASOCIACIÓN HITO_226	I.6.pdf	16/01/2025
160	ASOCIACIÓN HITO_227	I.7.pdf	31/01/2025
161	ASOCIACIÓN HITO_228	I.8.pdf	16/01/2025
162	ASOCIACIÓN HITO_228	A.1.zip	13/03/2025
163	ASOCIACIÓN HITO_229	I.9.pdf	31/01/2025
164	ASOCIACIÓN HITO_229	A.2.rar	13/03/2025
165	ASOCIACIÓN HITO_23	C.2.pdf	04/09/2022
166	ASOCIACIÓN HITO_230	J.1.pdf	16/01/2025
167	ASOCIACIÓN HITO_230	J.1.1.pdf	16/01/2025
168	ASOCIACIÓN HITO_230	A.3.rar	13/03/2025
169	ASOCIACIÓN HITO_231	A.4.pdf	13/03/2025
170	ASOCIACIÓN HITO_232	A.5.pdf	13/03/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
171	ASOCIACIÓN HITO_232	A.5.1.pdf	13/03/2025
172	ASOCIACIÓN HITO_233	A.6.pdf	13/03/2025
173	ASOCIACIÓN HITO_235	A.8.pdf	13/03/2025
174	ASOCIACIÓN HITO_235	A.8.1.pdf	13/03/2025
175	ASOCIACIÓN HITO_236	A.9.pdf	14/03/2025
176	ASOCIACIÓN HITO_237	A.7.pdf	17/03/2025
177	ASOCIACIÓN HITO_238	B.2.pdf	17/03/2025
178	ASOCIACIÓN HITO_24	C.3.pdf	04/09/2022
179	ASOCIACIÓN HITO_24	C.3.1.pdf	04/09/2022
180	ASOCIACIÓN HITO_241	B.3.pdf	14/04/2025
181	ASOCIACIÓN HITO_242	B.4.pdf	14/04/2025
182	ASOCIACIÓN HITO_242	B.4.1.pdf	14/04/2025
183	ASOCIACIÓN HITO_243	B.5.pdf	16/04/2025
184	ASOCIACIÓN HITO_25	C.4.pdf	04/09/2022
185	ASOCIACIÓN HITO_26	C.5.pdf	04/09/2022
186	ASOCIACIÓN HITO_27	C.6.pdf	04/09/2022
187	ASOCIACIÓN HITO_28	C.7.pdf	04/09/2022
188	ASOCIACIÓN HITO_29	C.8.pdf	04/09/2022
189	ASOCIACIÓN HITO_3	A.3.zip	04/09/2022
190	ASOCIACIÓN HITO_30	C.9.pdf	04/09/2022
191	ASOCIACIÓN HITO_31	D.1.pdf	04/09/2022
192	ASOCIACIÓN HITO_32	D.2.pdf	04/09/2022
193	ASOCIACIÓN HITO_32	D.2.1.pdf	04/09/2022
194	ASOCIACIÓN HITO_33	D.3.pdf	04/09/2022
195	ASOCIACIÓN HITO_34	D.4.pdf	04/09/2022
196	ASOCIACIÓN HITO_35	D.5.pdf	04/09/2022
197	ASOCIACIÓN HITO_35	D.5.1.pdf	04/09/2022
198	ASOCIACIÓN HITO_36	D.6.pdf	19/09/2022
199	ASOCIACIÓN HITO_37	D.7.pdf	19/09/2022
200	ASOCIACIÓN HITO_38	D.8.pdf	13/10/2022
201	ASOCIACIÓN HITO_39	D.9.pdf	13/10/2022
202	ASOCIACIÓN HITO_4	A.4.rar	04/09/2022
203	ASOCIACIÓN HITO_40	E.1.pdf	19/09/2022
204	ASOCIACIÓN HITO_40	E.1.1.pdf	19/09/2022
205	ASOCIACIÓN HITO_41	E.2.pdf	13/10/2022
206	ASOCIACIÓN HITO_42	E.3.pdf	07/11/2022
207	ASOCIACIÓN HITO_43	E.3.pdf	07/11/2022
208	ASOCIACIÓN HITO_44	E.4.zip	07/11/2022
209	ASOCIACIÓN HITO_44	E.4.1.pdf	07/11/2022
210	ASOCIACIÓN HITO_45	E.5.pdf	07/11/2022
211	ASOCIACIÓN HITO_46	E.6.pdf	07/11/2022
212	ASOCIACIÓN HITO_46	E.6.1.pdf	07/11/2022
213	ASOCIACIÓN HITO_47	E.7.pdf	15/11/2022
214	ASOCIACIÓN HITO_48	E.8.pdf	15/11/2022
215	ASOCIACIÓN HITO_49	E.9.pdf	15/11/2022
216	ASOCIACIÓN HITO_49	E.9.1.pdf	15/11/2022
217	ASOCIACIÓN HITO_5	A.5.pdf	04/09/2022
218	ASOCIACIÓN HITO_50	F.1.pdf	25/11/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
219	ASOCIACIÓN HITO_51	F.2.pdf	30/11/2022
220	ASOCIACIÓN HITO_52	F.3.pdf	20/12/2022
221	ASOCIACIÓN HITO_53	F.4.pdf	20/12/2022
222	ASOCIACIÓN HITO_54	F.5.pdf	14/12/2022
223	ASOCIACIÓN HITO_54.1	F.5.1.pdf	14/12/2022
224	ASOCIACIÓN HITO_55	F.6.pdf	22/03/2023
225	ASOCIACIÓN HITO_56	F.7.pdf	22/03/2023
226	ASOCIACIÓN HITO_57	F.8.pdf	18/01/2023
227	ASOCIACIÓN HITO_58	F.9.pdf	22/03/2023
228	ASOCIACIÓN HITO_59	G.1.pdf	18/01/2023
229	ASOCIACIÓN HITO_6	A.6.pdf	04/09/2022
230	ASOCIACIÓN HITO_6.1	A.6.1.pdf	04/09/2022
231	ASOCIACIÓN HITO_60	G.2.pdf	18/01/2023
232	ASOCIACIÓN HITO_61	G.3.pdf	22/03/2023
233	ASOCIACIÓN HITO_62	G.4.pdf	18/01/2023
234	ASOCIACIÓN HITO_62.1	G.4.1.pdf	18/01/2023
235	ASOCIACIÓN HITO_63	G.5.rar	22/03/2023
236	ASOCIACIÓN HITO_64	G.6.rar	22/03/2023
237	ASOCIACIÓN HITO_65	G.7.zip	22/03/2023
238	ASOCIACIÓN HITO_66	G.8.pdf	22/03/2023
239	ASOCIACIÓN HITO_67	G.9.pdf	22/03/2023
240	ASOCIACIÓN HITO_67	G.9.1.pdf	22/03/2023
241	ASOCIACIÓN HITO_68	H.1.pdf	22/03/2023
242	ASOCIACIÓN HITO_7	A.7.pdf	04/09/2022
243	ASOCIACIÓN HITO_70	H.3.pdf	14/04/2023
244	ASOCIACIÓN HITO_71	H.4.pdf	14/04/2023
245	ASOCIACIÓN HITO_72	H.5.pdf	22/03/2023
246	ASOCIACIÓN HITO_73	H.6.pdf	22/03/2023
247	ASOCIACIÓN HITO_73	H.6.1.pdf	22/03/2023
248	ASOCIACIÓN HITO_75	H.8.pdf	22/03/2023
249	ASOCIACIÓN HITO_76	H.9.pdf	14/04/2023
250	ASOCIACIÓN HITO_77	I.1.pdf	30/05/2023
251	ASOCIACIÓN HITO_78	I.2.pdf	30/05/2023
252	ASOCIACIÓN HITO_79	I.3.pdf	30/05/2023
253	ASOCIACIÓN HITO_79	I.3.1.pdf	30/05/2023
254	ASOCIACIÓN HITO_8	A.8.pdf	04/09/2022
255	ASOCIACIÓN HITO_80	I.4.pdf	30/05/2023
256	ASOCIACIÓN HITO_82	I.6.pdf	30/05/2023
257	ASOCIACIÓN HITO_83	I.7.pdf	30/05/2023
258	ASOCIACIÓN HITO_84	I.8.pdf	30/05/2023
259	ASOCIACIÓN HITO_85	I.9.pdf	30/05/2023
260	ASOCIACIÓN HITO_85	I.9.1.pdf	30/05/2023
261	ASOCIACIÓN HITO_86	J.1.pdf	30/05/2023
262	ASOCIACIÓN HITO_87	J.2.pdf	30/05/2023
263	ASOCIACIÓN HITO_88	J.3.pdf	30/05/2023
264	ASOCIACIÓN HITO_89	J.4.pdf	30/05/2023
265	ASOCIACIÓN HITO_9	A.9.pdf	04/09/2022
266	ASOCIACIÓN HITO_91	J.6.pdf	18/07/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
267	ASOCIACIÓN HITO_91	J.6.1.pdf	18/07/2023
268	ASOCIACIÓN HITO_92	J.7.pdf	18/07/2023
269	ASOCIACIÓN HITO_93	J.8.pdf	18/07/2023
270	ASOCIACIÓN HITO_94	J.9.pdf	18/07/2023
271	ASOCIACIÓN HITO_95	K.1.pdf	18/07/2023
272	ASOCIACIÓN HITO_95	K.1.1.pdf	18/07/2023
273	ASOCIACIÓN HITO_96	K.2.pdf	18/07/2023
274	ASOCIACIÓN HITO_97	K.3.pdf	20/07/2023
275	ASOCIACIÓN HITO_98	K.4.pdf	18/07/2023
276	ASOCIACIÓN HITO_99	K.5.pdf	18/07/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
GONZALEZ, ANDREA	Analista	Analista	andrea.gonzalez@inclusion.gob.ec	6020
Pozo Fierro, Gabriela Alexandra	Analista	Analista	gabriela.pozo@inclusion.gob.ec	
RON ARIAS, DIEGO JAVIER	Gerente de Proyecto	GERENTE DE PROYECTO	diego.ron@inclusion.gob.ec	6045
Vinces Sanchez, Shedany Esthela	Analista	Analista	shedany.vinces@inclusion.gob.ec	6045
