

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Protección Especial
Dirección de Servicios de Protección Especial

PROYECTO: K015 MIES-Implementar y Fortalecer Servicios de Atención de Movilidad Humana y Modalidades Alternativas para la Protección, Atención y Restitución de Derechos Vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes.

Líder del Proyecto:	Arrieta Garcés, Camila Judith (camila.arrieta@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Flores Brandt, David Eduardo	Programas Relacionados:	
Titular:	Villavicencio Zambrano, Vanessa Stefania	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.385568	TIR:	28.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	2,543,438.96
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,349,217.09
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/12/2021 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	28/04/2025	Fecha de Fin Base:	01/12/2025
Modificado por:	Lapuerta Jaramillo, Nelson Adrian	Fecha del siguiente hito:	31/01/2025

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto busca fortalecer e implementar servicios de protección especial para la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana, y en situación de vulneración y riesgo de pérdida del cuidado familiar.

Beneficios Cualitativos

- Con la brigadas multidisciplinarias de apoyo, información y referencia en la modalidad "Ciudadades de Acogida", se atenderá a las niñas, niños y adolescentes acompañados y sus familias en situación de vulnerabilidad, riesgo, calle o mendicidad y personas adultas con doble vulnerabilidad.
- Con los servicios de atención y protección emergente "Casas de Abrigo Temporal", se atenderá a niñas, niños y adolescentes no acompañados, o separados de su medio familiar; en los cuales no se haya podido realizar una reunificación familiar inmediata.
- Con los equipos multidisciplinarios para el apoyo familiar, se atenderá a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en situación de riesgo identificado como negligencia, violencia intrafamiliar que no constituyan delito. Asimismo, en custodia familiar se atenderá a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad cuyo medio familiar nuclear constituye una amenaza, riesgo y/o vulneración de sus derechos.

Tipo de Beneficiario

El proyecto está dirigido a los beneficiarios siguientes:

La población objetivo del proyecto está basada en las niñas, niños, adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana y en situación de vulneración y riesgo de pérdida del cuidado familiar, en las modalidades de ciudades de acogida, casas de abrigo temporal, y, apoyo y custodia familiar.


Restricciones

- Alcance: Será beneficiarios las niñas, niños, adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana, en situación de vulneración y riesgo de pérdida del cuidado familiar que se ejecutará en las ciudades priorizadas.
- Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 5 años, por situación de la pandemia de la COVID-19 no se ha ejecutado en el 2021.
- Recursos: Equipo técnico necesario contratado para la atención integral de las niñas, niños, adolescentes y sus familias para la ejecución del proyecto.
- Costo: No se puede exceder los recursos definidos en la fuente de financiamiento establecida en el contrato de préstamo y el convenio de financiamiento no reembolsable.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.12 %
Fecha de Inicio: 01/12/2021 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

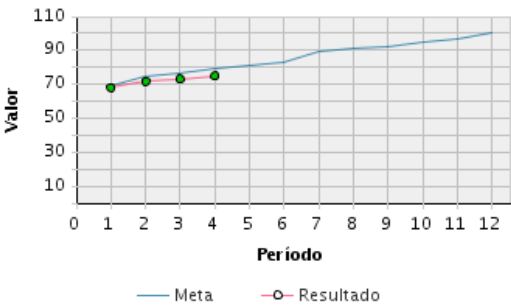

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
	70 %	75 %	77 %	79 %	81 %	83 %	89 %	91 %	92 %	95 %	97 %	100 %
	Avance real acumulado											
	68 %	72 %	73 %	75 %								
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2025: Se remitió a la Dirección de Planificación e Inversión el Plan Anual de la Política Publica - PAPP armonizado a valores codificados del Sistema de Administración Financiera - E-SIGEF, correspondiente al mes de marzo 2025. Se canceló un total de 23 pagos de arrastre del año 2024 en la modalidad Ciudades de Acogida por un monto de \$61.199,73. Se canceló un total de 27 pagos de arrastre del año 2024 en la modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar por un monto de \$40.445,70. Capacitar a nivel nacional a los administradores de contratos, técnicos distritales y OSC para que los expedientes de ejecución mensual de los servicios de Protección Especial, sean presentados según la Normativa Legal Vigente, lo que evitará retrasos en la gestión de solicitud de pago.	Lapuerta Jaramillo, Nelson Adrian	28/04/2025 - 01:53 PM
Febrero 2025: Se remitió a la Dirección de Planificación e Inversión el Plan Anual de la Política Publica - PAPP armonizado a valores codificados del Sistema de Administración Financiera - E-SIGEF, correspondiente al mes de febrero 2025. Se canceló un total de 63 pagos de arrastre del año 2024 (julio a noviembre 2024) en la modalidad Ciudades de Acogida por un monto de \$796.103,48. Se canceló un total de 26 pagos de arrastre del año 2024 (julio a octubre 2024) en la modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar por un monto de \$175.372,08. El día 28 de febrero de 2025, se realizó una insistencia al Ministerio de Economía y Finanzas para la autorización y aprobación de planteamiento de modificaciones presupuestarias para realizar el cambio de fuente de financiamiento, de la fuente 202 a la 701, esto garantizará el pago de las enmiendas suscritas en el ejercicio fiscal 2025.	Lapuerta Jaramillo, Nelson Adrian	28/04/2025 - 01:50 PM
Enero 2025: Se garantiza el servicio desde el 01 de enero de 2025 en la modalidad Ciudades de Acogida y Apoyo Familiar y Custodia Familiar a nivel nacional, hasta agosto de 2025. El proyecto tiene una vigencia hasta septiembre 2025, es necesario iniciar las gestiones pertinentes para solicitar la ampliación del plazo, de esta forma se garantizará el servicio hasta el 31 de diciembre de 2025. Se encuentran en ejecución 19 contratos en la modalidad Ciudades de Acogida y 12 contratos en la modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar.	Lapuerta Jaramillo, Nelson Adrian	28/04/2025 - 01:50 PM
DICIEMBRE Tramite correspondiente para gestionar el incremento presupuestario en la fuente 701 y 202 contenida en oficio SNP-SGP-SPN-2024-1159-OF. Gestiones correspondientes ante la Secretaria Nacional de Planificación y Ministerio de Economía y Finanzas para la obtención de la certificación presupuestaria plurianual. Certificación presupuestaria contenida en memorando MIES-CGAF-DF-2024-3384-M para la subscrición de enmiendas de los contratos que se encuentran en ejecución para la atención de los servicios en las modalidades de: Ciudades de Acogida, Apoyo y Custodia Familiar, y Equipo de Gestión. Armonización del presupuesto en e-SIGEF y PAPP correspondiente al mes de noviembre.	Jara Viera, Edison Vinicio	08/01/2025 - 03:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Elaboración del Plan Anual de la Política Pública para su ejecución del ejercicio fiscal 2025.		
NOVIEMBRE Justificación de gastos y pedido de desembolso del Contrato de Préstamo y Asistencia Técnica NO Reembolsable de la fuente de financiamiento ante el Banco Interamericano de Desarrollo, solicitado con oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-0149-O, por cuanto se alcanzó el 80% de ejecución respecto a los saldos desembolsados. Se realizaron liquidaciones de certificaciones presupuestarias que contaban con saldos disponible, lo que ha permitido obtener AVALES y Certificaciones Presupuestarias lo que ha permitido pagar a las OSC hasta el mes de julio de acuerdo a los saldos presupuestarios disponibles. La Secretaria Nacional de Planificación, emite pronunciamiento de reprogramación del cronograma valorado dentro del plazo de prioridad, contenida en oficio SNP-SNP-SGP-2024-0462-O. Incremento de techo presupuestario en la fuente 701 y 202.	Jara Viera, Edison Vinicio	08/01/2025 - 02:49 PM
OCTUBRE Se cuenta con el presupuesto codificado en la fuente 202 y 701 en el organismo, correlativo e ítems presupuestario para el pago de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Se realiza las gestiones correspondiente para la liquidación de certificaciones presupuestarias con saldos disponibles Se gestiona con la Coordinación General Administrativa y Financiera para el pago de las obligaciones del ejercicio fiscal 2024 de los meses de julio y agosto de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida; y, de la misma manera se gestiona el pago del mes de agosto de las OSC las cuales prestan servicios en las modalidades de Apoyo y Custodia Familiar. Se convalida el AVAL y Certificación presupuestaria Se solicita ratificación del incremento al techo presupuestario para el pago de las OSC.	Jara Viera, Edison Vinicio	05/11/2024 - 03:59 PM
SEPTIEMBRE Se cuenta con el presupuesto codificado en la fuente 202 y 701 en el organismo, correlativo e ítems presupuestario para el pago de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Se realiza las gestiones correspondiente para el presupuesto que se encuentra en la fuente 202 organismo y correlativo 9999 sean asignados a la fuente 202 organismo 2002 y correlativo 5091 Se gestiona con la Coordinación General Administrativa y Financiera para el pago de las obligaciones del ejercicio fiscal 2024 de los meses de Mayo y Junio de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Se obtiene la certificación PAPP Se convalida el AVAL y Certificación presupuestaria Se solicita incremento al techo presupuestario para el pago de las OSC para el periodo comprendido de julio a diciembre	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 03:42 PM
AGOSTO Se cuenta con el presupuesto codificado en la fuente 202 y 701 en el organismo, correlativo e ítems presupuestario para el pago de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Se realiza las gestiones correspondiente para el presupuesto que se encuentra en la fuente 202 organismo y correlativo 9999 sean asignados a la fuente 202 organismo 2002 y correlativo 5091 Revisión de expedientes del ejercicio fiscal 2024 de los meses de MAYO Y JUNIO para el pago de las OSC en las modalidades Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar Se gestiona con la Coordinación General Administrativa y Financiera para el pago de las obligaciones del ejercicio fiscal 2024 de los meses de Marzo y Abril de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Se obtiene la certificación PAPP Se convalida el AVAL y Certificación presupuestaria	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 03:39 PM
JULIO Se cuenta con el presupuesto codificado en la fuente 202 y 701 en el organismo, correlativo e ítems presupuestario para el pago de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. El presupuesto asignado y codificado dentro de la proyección permitirá pagar a las OSC hasta el mes de junio Revisión de expedientes del ejercicio fiscal 2024 de los meses de MAYO Y JUNIO para el pago de las OSC en las modalidades Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar Se gestiona con la Coordinación General Administrativa y Financiera para el pago de las obligaciones del ejercicio fiscal 2024 de los meses de Marzo y Abril de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar.	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 03:35 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
aprobación del POA 2024 por parte del BID, emite la NO OBJECCIÓN mediante comunicado O-CAN/CEC-712/2024 Se obtiene la certificación PAPP Se convalida el AVAL y Certificación presupuestaria		
JUNIO Se cuenta con el presupuesto codificado en la fuente 202 y 701 en el organismo, correlativo e ítems presupuestario para el pago de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Revisión de expedientes del ejercicio fiscal 2024 de los meses de MAYO Y JUNIO para el pago de las OSC en las modalidades Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar Se gestiona con la Coordinación General Administrativa y Financiera para el pago de las obligaciones del ejercicio fiscal 2024 de los meses de enero y febrero de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Se trabaja con funcionarios del BID el POA 2024 Se obtiene la certificación PAPP Se convalida el AVAL y Certificación presupuestaria	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 03:32 PM
MAYO Se cuenta con el presupuesto codificado en la fuente 202 y 701 en el organismo, correlativo e ítems presupuestario para el pago de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Revisión de expedientes del ejercicio fiscal 2024 de los meses de abril y mayo para el pago de las OSC en las modalidades Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar Se gestiona con la Coordinación General Administrativa y Financiera para el pago de las obligaciones del ejercicio fiscal 2023 de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar.	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 03:29 PM
ABRIL Se cuenta con el presupuesto codificado en la fuente 202 en el organismo, correlativo e ítems presupuestario para el pago de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Revisión de expedientes del ejercicio fiscal 2024 de los meses de febrero, marzo para el pago de las OSC en las modalidades Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar Se gestiona con la Coordinación General de Planificación del MIES el planteamiento y aprobación del presupuesto en la fuente 701 lo que permitirá realizar el pago a las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Se obtiene la certificación de actividades PAPP para la convalidación de AVALES. Se obtiene la convalidación de los avales y certificaciones presupuestarias	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 03:24 PM
MARZO Se cuenta con la redistribución del presupuesto codificado en la fuente 202 en el organismo, correlativo e ítems presupuestario para el pago de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Revisión de expedientes del ejercicio fiscal 2024 para el pago de las OSC en las modalidades Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar Se gestiona con la Coordinación General de Planificación del MIES para una optimización de recursos, para el planteamiento de reforma y redistribución de recursos para la obtención del presupuesto en la fuente 701 lo que permitirá realizar el pago a las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar.	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 03:21 PM
FEBRERO Se gestiona para la obtención y redistribución en la fuente 202 del presupuesto codificado en el organismo, correlativo e ítems presupuestario para el pago de las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar. Revisión de expedientes del ejercicio fiscal 2023 para el pago de las OSC en las modalidades Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar Se gestiona ante el MEF para la obtención del presupuesto en la fuente 701 lo que permitirá realizar el pago a las OSC las cuales prestan los servicios en las modalidades de Ciudades de Acogida, y, Apoyo y Custodia Familiar.	Jara Viera, Edison Vinicio	04/10/2024 - 03:11 PM
Resumen situación a Enero 2024: .El monto mínimo requerido del proyecto de movilidad, establece los montos correspondientes a los contratos y adendas ya suscritas por esta gerencia, tanto para arrastre de 2023, como para lo planificado para el año 2024, referente a los servicios de ciudades de acogida, apoyo y custodia y equipo de gestión. .En el presente año, se debe realizar la convalidación de certificaciones plurianuales para dar cumplimiento a los contratos firmados el año 2023 que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.	Salazar Carrillo, Anabel Cecilia	15/03/2024 - 08:28 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Por lo que el monto asignado para el año 2024, es insuficiente y no permite gestionar el pago de los servicios, lo que ocasionará la falta de cumplimiento de atención a la cobertura prevista afectando las atenciones de más de 9.650 usuarios catalogados con doble vulnerabilidad. .Es importante mencionar que, de los USD 6.232.619,73 requeridos como monto mínimo para el ejercicio fiscal 2024; USD 766.440,73 corresponden a arrastre del año 2023 y USD 5.466.179,00 corresponden a contratos firmados y en ejecución. Se recomienda: .Con la finalidad de garantizar que se dé cumplimiento a las metas de ejecución financiera y de cobertura que se encuentran en ejecución y programadas para el ejercicio fiscal 2024; la Gerencia FAISDI requiere como asignación mínima el monto de USD 6.232.619,73; por lo que se recomienda a la CGPGE, realizar las gestiones ante los organismos correspondientes para contar inicialmente con este monto; ya que la planificación de actividades para el año 2024 considera un monto superior (USD 7.299.147,66) y se debe realizará la gestión de incremento presupuestario posteriormente. .Se recomienda realizar reuniones entre el equipo del BID, la Gerencia FAISDI y el Viceministerio de Inclusión Social, para establecer una estrategia de trabajo para la aprobación de la Norma Técnica guía de implementación, para el Servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal), y no seguir posponiendo las fechas de inicio del servicio. .Monitorear permanentemente la programación de las actividades, productos e hitos, para garantizar su cumplimiento, a través del PEP actualizado, esto permitirá identificar las debilidades de la planificación y determinar si las fechas de los hitos y de los entregables se están cumpliendo. .Realizar la gestión para la emisión de las certificaciones presupuestarias anuales (convalidación de certificaciones presupuestarias plurianuales). .Dar continuidad a los procesos de contratación de los productos que están avanzados, con la finalidad de dar cumplimiento a la prestación de servicios y coberturas del proyecto.		
Resumen de gestión mes de diciembre de 2023: .Al 31 de diciembre de 2023, se mantiene el servicio de atención de las brigadas multidisciplinarias para la atención, apoyo, información y referencia a la población migrante vulnerable, en ciudades de acogida, a través de 23 Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC. .Al 31 de diciembre de 2023, se cuenta con 17 Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC, para brindar el servicio de atención a través de Brigadas multidisciplinarias para fortalecimiento de vínculo familiar y acompañamiento aplicando la modalidad de atención "Apoyo y Custodia Familiar". .Las herramientas de gestión de planificación internas del MIES como PAPP, ficha de metas físicas y financieras, Gobierno por Resultados - GPR, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP, Matriz PAC de seguimiento, fueron actualizadas en el marco de los requerimientos mensuales y trimestrales, mismo que han sido enviados a la Coordinación de Planificación en las fechas respectivas. .La cobertura mensual alcanzada con corte al 31 de diciembre de 2023 es de 10.734 atenciones/ usuarios equivalentes al 126,28% del total de la cobertura programada, como parte del servicio de atención en Ciudades de Acogida brindado por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Unidades de Atención), información que se encuentra en el sistema INFOMIES. Así también, conforme la cobertura alcanza en el mismo mes, es de 9.750 usuarios equivalente al 114.70% del total de la cobertura programada y de acuerdo a los registros administrativos de la Gerencias FAISDI. Cabe indicar que existe diferencias entre las dos fuentes. .La ejecución presupuestaria mensual es del 4,55%, que corresponde a un monto devengado de USD 159.097,94; y, la ejecución presupuestaria acumulada es de USD 2.387.662,33 con un 72,88% de avance presupuestario respecto al monto codificado (USD 3.844.776,03) al 31 de diciembre de 2023. .En el mes de noviembre, se suscribieron 17 contratos con Organizaciones de la Sociedad Civil, las mismas que iniciaron a brindar el servicio a partir del 1 de diciembre de 2023 bajo la modalidad de "Apoyo y Custodia Familiar". .Los contratos con los Especialistas Financiero y de Monitoreo y Evaluación, se suscribieron el día 15 de diciembre de 2023, dando inicio a las consultorías el 18 de diciembre de 2023.	Salazar Carrillo, Anabel Cecilia	29/02/2024 - 12:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.El Plan de Adquisiciones del Contrato de Préstamo: "Inclusión de la Población Migrante y Receptora en los Servicios Sociales en Ecuador" fue actualizado durante el mes de diciembre de 2023, en el Sistema de Ejecución de Planes de Ejecución - SEPA. Se recomienda: .Se recomienda realizar una reunión de trabajo con la Subsecretaría de Protección Especial, para indicar que existe diferencias entre la cobertura reportada con fuente del sistema INFOMIES y los registros administrativos de la Gerencia FAISDI, y que se establezca una directriz general para el ingreso de información en el SIIMIES. .Se recomienda realizar reuniones entre el equipo del BID, la Gerencia FAISDI y el Viceministerio de Inclusión Social, para establecer una estrategia de trabajo para la aprobación de la Norma Técnica guía de implementación, para el Servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal), y no seguir posponiendo las fechas de inicio del servicio.		
Hitos y alertas correspondiente al mes de noviembre de 2023: . Al 30 de noviembre de 2023, se mantiene el servicio de atención de las brigadas multidisciplinarias para la atención, apoyo, información y referencia a la población migrante vulnerable, en ciudades de acogida, a través de 23 Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC. . La cobertura mensual alcanzada con corte al 30 de noviembre de 2023 es de 9.958 atenciones/ usuarios equivalentes al 117.15% del total de la cobertura programada, como parte del servicio de atención en Ciudades de Acogida brindado por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Unidades de Atención), información que se encuentra en el sistema INFOMIES. Así también, conforme la cobertura alcanza en el mismo mes, es de 9.750 usuarios equivalente al 114.70% del total de la cobertura programada y de acuerdo a los registros administrativos de la Gerencias FAISDI. Cabe indicar que existe diferencias entre las dos fuentes. . La ejecución presupuestaria acumulada es del 62,10% con un monto devengado de USD 2.387,662,33 correspondiente a 20 pagos efectuados (18 OSC y 2 Especialistas: Legal y de Adquisiciones) por el valor de USD 247.349,97 lo que representa un avance porcentual en la ejecución presupuestaria del 6,43% sobre el presupuesto ejecutable del proyecto que asciende al valor de USD 3.844.776,03. . En el mes de noviembre, se suscribieron 17 contratos con Organizaciones de la Sociedad Civil y se declararon desierto 5 ítems en referencia a la modalidad de "Apoyo y Custodia Familiar"; y, los ítems, que no se contrataron en el presente año, se deberán contratar en el año 2024, con la finalidad de cumplir con la cobertura y alcance del proyecto. . En el proceso de contratación de los Especialistas Financiero y de Monitoreo y Evaluación, la Gerencia FAISDI avanzó hasta la elaboración de las resoluciones de adjudicación, quedando lista la documentación para la firma de las resoluciones y contratos con los consultores para el mes de diciembre. . El Plan de Adquisiciones del Contrato de Préstamo: "Inclusión de la Población Migrante y Receptora en los Servicios Sociales en Ecuador" fue actualizado durante el mes de noviembre de 2023, en el Sistema de Ejecución de Planes de Ejecución - SEPA. Se recomienda: . Se recomienda realizar reuniones entre el equipo del BID, la Gerencia FAISDI y el Viceministerio de Inclusión Social, para establecer una estrategia de trabajo para la aprobación de la Norma Técnica guía de implementación, para el Servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal), y no seguir posponiendo las fechas de inicio del servicio. . Completar el Equipo de Gestión, con la finalidad de gestionar eficientemente cada uno	Dávila Cueva, María Gabriela	02/01/2024 - 12:04 PM
Hitos y alertas correspondiente al mes de octubre de 2023: 01. Las atenciones/coertura es de 10.230 usuarios con fuente INFOMIES y de 7.250 usuarios con fuente de registros administrativos de la Gerencia FAISDI con corte al 31 de octubre de 2023 en ambos casos. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 236.038,73 con un 6,14% de avance presupuestario al 31 de octubre de 2023. 03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 2.140.312,36 con un 55,67% de avance presupuestario al 31 de octubre de 2023.	León Suqui, Fernando David	13/11/2023 - 03:05 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
04. Se realizó la segunda justificación de gastos y anticipo de desembolso para la ejecución de actividades previstas en el proyecto, así mismo se realizó la gestión para la obtención de avales y certificaciones presupuestarias para la modalidad apoyo y custodia familiar. 05. Servicio de atención en "Ciudades de Acogida": En octubre se realizaron 17 de 23 pagos a los OSC. 06. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": Se inició el proceso de contratación con la resolución Nro. MIES-VIS-FAISDI-2023-0019-R; además, se realizó el llamado público a través de los diferentes canales de comunicación BID, MIES, SERCOP y redes sociales.		
Hitos y alertas correspondiente al mes de septiembre de 2023: 01. Las atenciones/coertura es de 10.169 usuarios con fuente INFOMIES y de 9.750 usuarios con fuente de registros administrativos de la Gerencia FAISDI con corte al 30 de septiembre de 2023. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 213.179,32 con un 5,54% de avance presupuestario al 30 de septiembre de 2023. 03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 1.904.273,63 con un 49,53% de avance presupuestario al 30 de septiembre de 2023. 04. Servicio de atención en "Ciudades de Acogida": Entró en vigencia las 8 Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC para el servicio de atención de ciudades de acogida, con los ítems: 01 Quito Centro 1, 02 Quito Centro 2, 18 Guayaquil Centro Sur, 19 Quito Norte, 20 Quito Sur, 21 Rumiñahui, 22 Manta; y, 23 Lago Agrio para completar una cobertura de 9.750 con 23 OSC o unidades de atención. 05. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": La Guía de Apoyo Familiar y Custodia Familiar fue finalizado y se encuentra pendiente la No Objeción por parte del BID. 06. Equipo de gestión del proyecto: Se lanzó el proceso de contratación de los consultores individuales especialistas financiero y monitoreo & evaluación, y serán contratados en octubre de 2023.	León Suqui, Fernando David	12/10/2023 - 02:32 PM
Hitos y alertas correspondiente al mes de agosto de 2023: 01. Las atenciones/coertura es de 7.394 usuarios con fuente INFOMIES y de 6.500 usuarios con fuente de registros administrativos de la Gerencia FAISDI con corte al 30 de agosto de 2023. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 227.290,52 con un 5,59% de avance presupuestario al 30 de agosto de 2023. 03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 1.691.094,31 con un 41,59% de avance presupuestario al 30 de agosto de 2023. 04. Servicio de atención en "Ciudades de Acogida": El 29 y 31 de agosto de 2023 se firmaron los contratos con las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC para el servicio de atención de ciudades de acogida, con los ítems: 01 Quito Centro 1, 02 Quito Centro 2, 18 Guayaquil Centro Sur correspondientes a los procesos de contratación directa; además los ítems: 19 Quito Norte, 20 Quito Sur, 21 Rumiñahui, 22 Manta; y, 23 Lago Agrio respecto al proceso de contratación competitiva, el mencionado servicio entró en vigencia el 01 de septiembre de 2023. 05. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": Versión final de la Guía de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, el documento necesita unos ajustes por parte de la Subsecretaría de Protección Especial, antes de su aprobación final. 06. Equipo de gestión del proyecto: La Coordinadora General Administrativa Financiera debe aprobar las Resolución de Inicio para la contratación de los especialista financiero y monitoreo & evaluación, documentos que se encuentran pendiente al cierre del mes de agosto.	León Suqui, Fernando David	14/09/2023 - 01:11 PM
Hitos y alertas correspondiente al mes de julio de 2023: 01. Las atenciones/coertura es de 7.372 usuarios con fuente INFOMIES y de 6.500 usuarios con fuente de registros administrativos de la Gerencia FAISDI con corte al 31 de julio de 2023. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 152.315,51 con un 3,75% de avance presupuestario al 31 de julio de 2023. 03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 1.463.803,79 con un 36,00% de avance presupuestario al 31 de julio de 2023. 04. Servicio de atención en "Ciudades de Acogida": Se recibió el 14 y el 18 de julio de 2023, las ofertas técnicas y económicas por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el proceso de contratación directa y competitiva, para brindar el servicio de atención en 8 ciudades de acogida: Rumiñahui, Lago Agrio, Manta, Quito Norte, Quito Sur, Guayaquil Centro Sur, Quito Centro 1 y Quito Centro 2. 05. Servicio de atención y protección emergente "Casas de Abrigo Temporal": Existe un retraso en la aprobación de la Norma Técnica mediante Acuerdo Ministerial, se ha realizado reuniones de trabajo entre la Subsecretaría de Protección Especial y el Viceministerio de Inclusión Social, para solventar las observaciones y se estima una aprobación hasta noviembre del 2023, lo que retrasaría significativamente la contratación del servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal) y no podría empezar en enero 2024. 06. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": Versión preliminar de la Guía de Apoyo Familiar y Custodia Familiar (antes nombrado como anexo Nro. 3 del Reglamento Operativo del	León Suqui, Fernando David	09/08/2023 - 09:55 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Programa - ROP), mismo que contiene el proceso de contratación y ejecución del servicio de atención en apoyo y custodia familiar. 07. Equipo de gestión del proyecto: Se realizó la solicitud a la Coordinación Administrativa y Financiera, para la autorización de gasto e inicio de los procesos para la contratación de los especialista financiero y monitoreo & evaluación. Además, se realizó los proyectos de resolución de inicio para la contratación de los especialista antes mencionados 08. Otras actividades: Se realizó el Informe Semestral de Progreso en cumplimiento de la Cláusula 5.01: Supervisión y Ejecución del Programa, literal (a), del Capítulo V: Supervisión y Evaluación del Programa, del Contrato de Préstamo Nro. 4923 - L1258 y el Convenio de Financiamiento No Reembolsable Nro. 4924, correspondiente al primer semestre del 2023. El documento y las herramientas de gestión fueron enviados al BID el 31 de julio de 2023 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2023-0164-O para la respectiva "No Objeción"..		
Hitos y alertas correspondiente al mes de junio de 2023: 01. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 233.371,04 con un 4,71% de avance presupuestario al 30-jun-2023. 02. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 1.311.488,28 con un 26,47% de avance presupuestario al 30-jun-2023. 03. Servicio de atención en "Ciudades de Acogida": El 23-jun-2023 se solicitó al SERCOP, la publicación del llamado público a las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC para el proceso de contratación competitiva. Además, se realizó la invitación a las OSC que fueron previamente seleccionadas por la Subsecretaría de Protección Especial, a presentar su oferta para los procesos de contratación directa de los Servicios de Atención de "Ciudades de Acogida". 04. Servicio de atención y protección emergente "Casas de Abrigo Temporal": Existe un retraso en la aprobación de la Norma Técnica mediante Acuerdo Ministerial, se ha realizado reuniones de trabajo entre la Subsecretaría de Protección Especial y el Viceministerio de Inclusión Social, para solventar las observaciones y se estima una aprobación hasta el mes de julio de 2023, lo que retrasaría significativamente la contratación del servicio de atención. 05. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": Versión preliminar del anexo Nro. 3 del Reglamento Operativo del Programa - ROP, mismo que contiene el proceso de contratación y ejecución del servicio de atención en apoyo y custodia familiar. 06. Equipo de gestión del proyecto: El 06-jun-2023 mediante documento Nro. CAN/CEC-559/2023 el BID emite "No Objeción" a los modelos de invitación del Especialista de Monitoreo y Evaluación y Especialista Financiero.	León Suqui, Fernando David	02/08/2023 - 04:05 PM
Hitos y avances correspondiente al mes de mayo de 2023: 01. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 1.078.117,24 con un 21,76% de avance presupuestario al 31 de mayo de 2023. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 320.831,70 con un 6,48% de avance presupuestario al 31 de mayo de 2023. 03. Servicio de atención en "Ciudades de Acogida": Continuidad de los servicios de atención en la modalidad de ciudades de acogida para el año 2023 por parte de 15 unidades de atención (Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC) a nivel nacional.. La cobertura mensual alcanzada con corte al 31 de mayo de 2023 es de 7.291 equivalente al 85,78% del total de la cobertura programada. Se encuentra pendiente la contratación de 8 unidades de atención (OSC). 04. Servicio de atención y protección emergente "Casas de Abrigo Temporal": Se encuentra pendiente de aprobación de la Norma Técnica mediante Acuerdo Ministerial, se reprogramó la aprobación para julio de 2023. 05. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": Versión preliminar del anexo Nro. 3 del Reglamento Operativo del Programa - ROP, mismo que contiene el proceso de contratación y ejecución del servicio de atención en apoyo y custodia familiar. 06. Equipo de gestión del proyecto: Se encuentra pendiente la contratación del especialista financiero y de monitoreo & evaluación. La Subsecretaría de Protección Especial debe presentar los documentos preparatorios (Informe de necesidad, informe de viabilidad, términos de referencia y el respectivo presupuesto) para la contratación de los consultores mencionados. 07. Herramientas de Gestión BID: El 05 de mayo de 2023 a través de documento Nro. CAN/CEC-431/2023, el equipo del BID, remitió la No Objeción al POA 2023 del programa: "Inclusión de la Población Migrante y Receptora en los Servicios Sociales en Ecuador".	León Suqui, Fernando David	09/06/2023 - 04:43 PM
Hitos y avances correspondiente al mes de abril de 2023: 01. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 757.285,54 con un 15,29% de avance presupuestario al 30 de abril de 2023. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 377.720,89 con un 7,62% de avance presupuestario al 30 de abril de 2023. 03. Servicio de atención en "Ciudades de Acogida": Continuidad de los servicios de atención en la modalidad de ciudades de acogida para el año 2023 por parte de 15 unidades de atención (Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC) a nivel nacional, con una cobertura promedio de 7.137 equivalente al 83,96% al 30 de abril de 2023.	León Suqui, Fernando David	08/05/2023 - 12:23 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
04. Servicio de atención y protección emergente "Casas de Abrigo Temporal": Existe un retraso en la aprobación de la Norma Técnica mediante Acuerdo Ministerial, el documento se encuentra en revisión del Viceministerio de Inclusión Social y se estima una aprobación a finales de mayo o inicio de junio de 2023, lo que retrasaría el inicio de la contratación del servicio. 05. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": Versión finalizada del anexo Nro. 3 del Reglamento Operativo del Programa - ROP, mismo que contiene el proceso de contratación y ejecución del servicio de atención en apoyo y custodia familiar. 06. Equipo de gestión del proyecto: Se encuentra pendiente la autorización por parte del Ministerio de Economía Finanzas - MEF a las remuneraciones planteadas para la contratación de los consultores especialistas individuales financiero y monitoreo & evaluación. 07. Herramientas de Gestión BID: Se concluyó con el POA 2023, PEP, PMR, flujo de caja, programación de desembolsos y fue enviado al BID.		
Hitos y avances correspondiente al mes de marzo de 2023: 01. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 379.564,65 con un 7.66% de avance presupuestario al 31 de marzo de 2023. 02. Servicio de atención en la modalidad de "Ciudades de Acogida": La cobertura es de 7.247 en marzo de 2023, para el servicio de atención en la modalidad de ciudades de acogida. 03. Servicio de atención y protección emergente "Casas de Abrigo Temporal": Se encuentra pendiente la aprobación de la Norma Técnica de la modalidad de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal), documento que se encuentra en revisión por el Viceministerio de Inclusión Social. 04. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": En función de un cronograma de trabajo, se han realizado reuniones periódicas para la construcción del anexo 3 del ROP para la modalidad de Apoyo y Custodia Familiar. 05. Equipo de gestión del proyecto: Se han elaborado y se tiene un documento preliminar con los proyectos de contrato para la contratación de los consultores especialistas individuales financiero y monitoreo. 06. Herramientas de Gestión BID: El 03 de marzo de 2023 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2023-0045-O, se envió al BID para análisis el Plan de Ejecución del Programa - PEP y el Plan Operativo Anual - POA del componente 1 referente al programa: "Inclusión de la Población Migrante y Receptora en los Servicios Sociales en Ecuador", para el ejercicio fiscal 2023.	León Suqui, Fernando David	25/04/2023 - 03:52 PM
Hitos y avances correspondiente al mes de febrero de 2023: 01. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 0,00 con un 0,00% de avance presupuestario al 28 de febrero de 2023. 02. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 0,00 con un 0,00% de avance presupuestario al 28 de febrero de 2023. 03. Servicio de atención en la modalidad de "Ciudades de Acogida": La cobertura aproximada es de 7.133 al 28 de febrero de 2023 para el servicio de atención en la modalidad de ciudades de acogida. 04. Servicio de atención y protección emergente "Casas de Abrigo Temporal": Se encuentra pendiente la aprobación de la Norma Técnica mediante Acuerdo Ministerial. 05. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": La Norma Técnica fue aprobada el 8 de febrero de 2023 a través de Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2023-013. 06. Equipo de gestión del proyecto: Se obtuvo las hojas de vida de las personas que presentaron interés en participar en el proceso de Selección de Consultores Individuales para conformar el equipo de Gestión (Especialista financiero y monitoreo & evaluación).	León Suqui, Fernando David	31/03/2023 - 03:44 PM
Hitos y avances correspondiente al mes de enero de 2023: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de enero de 2023. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 0,00 con un 0,00% de avance presupuestario al 31 de enero de 2023. 03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 0,00 con un 0,00% de avance presupuestario al 31 de enero de 2023. 04. Servicio de atención en la modalidad de "Ciudades de Acogida": La cobertura aproximada es de 6.500 al 31 de enero de 2023 para el servicio de atención en la modalidad de ciudades de acogida. Además, se registró en el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF, 15 adendas a los contratos para la continuidad de la prestación de servicios de ciudades de acogida. 05. Servicio de atención y Protección Emergente "Casas de Abrigo Temporal": La Norma Técnica de la modalidad de casas de abrigo temporal se encuentra actualizada y se tiene un documento preliminar pero sin aprobación mediante Acuerdo Ministerial. 06. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": La Norma Técnica de la modalidad de apoyo y custodia familiar se encuentra actualizada y se tiene un documento preliminar pero sin aprobación mediante Acuerdo Ministerial.	León Suqui, Fernando David	08/03/2023 - 10:56 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
07. Equipo de gestión del proyecto: Se preparó la documentación para la contratación del equipo de gestión (especialista financiero y monitoreo & evaluación).		
Hitos y avances correspondiente al mes de diciembre de 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2022. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 140.265,49 con un 12,67% de avance presupuestario al 31 de diciembre de 2022. 03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 396.707,73 con un 35,84% de avance presupuestario al 31 de diciembre de 2022. 04. Se elaboró y se aprobó el informe trimestral del cuarto trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo. 05. Se aprobó la certificación presupuestaria plurianual para la continuidad del servicio de atención en la modalidad de "ciudades de acogida" y el equipo de gestión del proyecto de movilidad humana (especialistas legal y adquisiciones) por el valor de USD 2.794.339,71. 06. Servicio de atención en la modalidad de "Ciudades de Acogida": El 01 de diciembre de 2022 se inició el cuarto mes del servicio de atención para las brigadas multidisciplinarias para la atención, apoyo, información y referencia a la población migrante vulnerable, aplicando la modalidad de ciudades de acogida, a través de las 16 Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC contratadas a nivel nacional. Además, se obtuvo una certificación presupuestaria plurianual para la continuidad del servicio de atención de ciudades de acogida por el valor de USD 2.736.762,27. Finalmente, se realizó la suscripción de las adendas a los contratos para la continuidad de los servicios de atención antes descritos para el año 2023. 07. Servicio de atención y Protección Emergente "Casas de Abrigo Temporal": La Norma Técnica de la modalidad de casas de abrigo temporal se encuentra actualizada y se tiene un documento preliminar pero sin aprobación mediante Acuerdo Ministerial. Además, el BID realizó una asistencia técnica para definir la metodología, instrumentos y costeo de servicios para la modalidad de casas de abrigo temporal. 08. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": La Norma Técnica de la modalidad de apoyo y custodia familiar se encuentra actualizada y se tiene un documento preliminar pero sin aprobación mediante Acuerdo Ministerial. Además, el BID realizó una asistencia técnica para definir la metodología, instrumentos y costeo de servicios para la modalidad de apoyo y custodia familiar. 09. Equipo de gestión del proyecto: Se obtuvo una certificación presupuestaria plurianual para la continuidad de los servicios de los consultores individuales especialistas en adquisiciones y legal por el valor de USD 57.577,44 , Además, para la contratación de los consultores individuales especialistas financiero y monitoreo & evaluación.	León Suqui, Fernando David	19/01/2023 - 10:22 AM
Hitos y avances correspondiente al mes de noviembre de 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de noviembre de 2022. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 186.972,86 con un 10,27% de avance presupuestario al 30 de noviembre de 2022. 03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 256.442,24 con un 14,09% de avance presupuestario al 30 de noviembre de 2022. 04. Se solicitó el 30 de noviembre de 2022 la certificación plurianual para la continuidad del proceso del servicio de atención de la modalidad de "ciudades de acogida" y el equipo de gestión del proyecto de movilidad humana por el valor de USD 2.851.917,15. 05. Servicio de atención en la modalidad de "Ciudades de Acogida": El 01 de noviembre de 2022 inició el segundo mes del servicio de atención, para las brigadas multidisciplinarias para la atención, apoyo, información y referencia a la población migrante vulnerable, aplicando la modalidad de ciudades de acogida mediante las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC contratadas a nivel nacional. 06. Servicio de atención y Protección Emergente "Casas de Abrigo Temporal": La Norma Técnica de la modalidad de casas de abrigo temporal se encuentra actualizada y se tiene un documento preliminar pero sin aprobación mediante Acuerdo Ministerial. Además, el BID realizará una asistencia técnica para definir la metodología, instrumentos y costeo de servicios para la modalidad de casas de abrigo temporal. 07. Servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar": La Norma Técnica de la modalidad de apoyo y custodia familiar se encuentra actualizada y se tiene un documento preliminar pero sin aprobación mediante Acuerdo Ministerial. Además, el BID realizará una asistencia técnica para definir la metodología, instrumentos y costeo de servicios para la modalidad de apoyo y custodia familiar.	León Suqui, Fernando David	20/12/2022 - 11:05 PM
Hitos y avances correspondiente al mes de octubre de 2022:	León Suqui, Fernando David	14/12/2022 - 11:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 27 de octubre de 2022. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 69.469,38 con un 3,82% de avance presupuestario al 31 de octubre de 2022. 03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 69.469,38 con un 3,82% de avance presupuestario al 31 de octubre de 2022. 04. El 01-10-2022 inició el segundo mes del servicio de atención en la modalidad de "Ciudades de Acogida". Además, para realizar el primer pago a las OSC sobre la cobertura alcanzada, se está revisando los expedientes con los apéndices, informes y facturas del mes de septiembre de 2022. Se ha enviado a la Dirección Financiera 8 expedientes para el pago y se han pagado a 6 OSC del mes de septiembre de 2022. Finalmente, se encuentra pendiente de revisión los expedientes del servicio brindado en el mes de octubre de 2022. 05. Se ha elaborado el documento preliminar del anexo 4 del Reglamento Operativo del Proyecto - ROP para la ejecución del servicio de Atención y Protección Emergente "Casas de Abrigo Temporal". Se realizará una asistencia técnica por parte del BID para definir la metodología, instrumentos y costeo de servicios para todas las modalidades de atención. El servicio de atención iniciará tentativamente el 01-02-2023. 06. Se ha elaborado el documento preliminar del anexo 3 del Reglamento Operativo del Proyecto - ROP para la ejecución del servicio de atención de "Apoyo y Custodia Familiar". Se tuvo que realizar una modificación de la norma técnica y aprobado con acuerdo ministerial hasta el 15-10-2022, sin embargo, hasta el 31-10-2022 no se ha entregado la norma técnica por parte de la Subsecretaría de Protección Especial. Se realizará una asistencia técnica por parte del BID para definir la metodología, instrumentos y costeo de servicios para todas las modalidades de atención. El servicio de atención iniciará tentativamente el 01-12-2022.		
Hitos y avances correspondiente al mes de septiembre de 2022: 01. Se elaboró y se aprobó los informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo al 30 de septiembre de 2022. 02. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2022. 03. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 0,00 al 30 de septiembre de 2022. 04. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 0,00 al 30 de septiembre de 2022. 05. El 01-09-2022 inició el servicio de atención en la modalidad de "Ciudades de Acogida", y mediante seguimiento continuo se solicitó la entrega los planes de acción y de riesgo, para realizar el primer pago a las OSC correspondiente al mes de septiembre de 2022. 06. Se encuentra en elaboración el anexo 3 para la modalidad del servicio de Apoyo y Custodia Familiar mismo que iniciará a partir del 01-12-2022, se solicitó estudio de mercado. 07. Se encuentra en elaboración el anexo 4 para la modalidad del servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal) mismo que iniciará a partir del 01-12-2022. Asimismo, se tiene que realizar una modificación de la norma técnica del servicio hasta el 15-10-2022.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	28/10/2022 - 08:35 AM
Hitos y avances correspondiente al mes de agosto de 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2022. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 0,00 al 31 de agosto de 2022. 03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 0,00 al 31 de agosto de 2022. 04. Se encuentra en proceso la resolución de adjudicación y firmas de contratos con las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC para la modalidad del servicio de Ciudades de Acogida. 05. Se encuentra en elaboración el anexo 3 para la modalidad del servicio de Apoyo y Custodia Familiar mismo que iniciará a partir del 01-10-2022. 06. Se encuentra en elaboración el anexo 4 para la modalidad del servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal) mismo que iniciará a partir del 01-10-2022.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	22/09/2022 - 05:29 PM
Hitos y avances correspondiente al mes de julio 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2022. 02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 0,00 al 31 de julio de 2022. 03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 0,00 al 31 de julio de 2022. 04. Se encuentra en proceso precontractual (Recepción de ofertas de las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC) la modalidad del servicio de Ciudades de Acogida y está distribuidos en 12 provincias, 13 ciudades y 18 cotratos. 05. Se encuentra en construcción el anexo 3 para la modalidad del servicio de Apoyo y Custodia Familiar mismo que iniciará a partir del 01-10-2022. 06. Se encuentra en construcción el anexo 4 para la modalidad del servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal) mismo que iniciará a partir del 01-10-2022.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	25/08/2022 - 11:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Hitos y avances correspondiente al mes de junio 2022: 01. Se obtuvo la "No Objeción" del anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP con el proceso para la contratación en la modalidad de "Ciudades de Acogida". 02. Se realizó la postulación del proyecto de inversión: "Implementar y Fortalecer Servicios de Atención de Movilidad Humana y Modalidades Alternativas para la Protección, Atención y Restitución de Derechos Vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes" en el Plan Anual de Inversiones - PAI 2023. 03. Se realizó y se aprobó los informes del segundo trimestre de 2022 de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo. 04. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2022 05. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 0,00 al 30 de junio de 2022. La ejecución se realizará con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5091 del Contrato de Préstamo BID 4923/OC-EC y con fuente 701, organismo 2002 y correlativo 9980 del Convenio de Financiamiento No Reembolsable Nro. 4924 GR-EC, esto con la finalidad de dar cumplimiento al paripasu del 80/20. 06. Se encuentra en el inicio del proceso precontractual (Informe de necesidad, informe de viabilidad, términos de referencia y certificaciones presupuestarias) para las 19 ciudades de acogida. 07. El 30-06-2022 se aprobó mediante Acuerdo Ministerio Nro. 0042 la ampliación del ítem presupuestario 730607 denominado servicios técnicos especializados. 08. La contratación el equipo de gestión (especialista financiero y especialista de monitoreo) por temas técnicos se realizará desde proyecto de inversión de Discapacidad Severa, financiado mediante el Contrato de Préstamo Nro. 4634/OC-EC - L1236.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	13/07/2022 - 04:03 PM
Hitos y avances correspondiente al mes de mayo 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2022. 02. Al 31 de mayo de 2022, la ejecución presupuestaria es del 0,00%, se ejecutará mediante un paripasu del 80/20 previsto dentro del ROP, POD y Contrato de Préstamo BID 4923/OC-EC y ATN 4924 GR-EC. 03. En proceso de construcción del anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP para el proceso de contratación de GADs y OSCs para la modalidad de "Brigadas Multidisciplinarias de Apoyo, Información y Referencia en la Modalidad (Ciudades de Acogida)", en el mes de mayo se han mantenido Talleres entre el Equipo Técnico del BID, la Subsecretaría de Protección Especial y la Gerencia del Proyecto para avanzar en la definición del mencionado Anexo al ROP. Al 31 de mayo de 2022, se encuentran en revisión del BID el documento preliminar. 04. Sobre el ítem presupuestario en el grupo de gasto 73, el MEF ha indicado que utilizará el ítem presupuestario 730607 denominado: "servicios técnicos especializados" y se realizará una ampliación a la descripción del ítem para que se consideren la atención a persona en situación de vulnerabilidad. El clasificador presupuestario se actualizará y será aprobado mediante un Acuerdo Ministerial por el MEF. 05. El 31 de mayo de 2022, con memorando MIES-VIS-FAISDI-2022-0367-M se realizó una reforma presupuestaria por el valor de USD 387.592,65 con la finalidad de cubrir el presupuesto para los procesos de contratación con GAD y OSCs para la modalidad de "Brigadas Multidisciplinarias de Apoyo, Información y Referencia en la Modalidad (Ciudades de Acogida)".	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	21/06/2022 - 06:55 PM
Hitos y avances correspondiente al mes de abril 2022: 01.- Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2022. 02.- Al 30 de abril de 2022 la ejecución presupuestaria es del 0,00%, se ejecutará mediante un paripasu del 80/20 previsto dentro del ROP, POD y Contrato de Préstamo BID 4923/OC-EC y ATN 4924 GR-EC. 03.- Sigue en proceso de construcción del anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP con el proceso de contratación para las tres modalidades, en el mes de abril se han mantenido Talleres entre el Equipo Técnico del BID, la Subsecretaría de Protección Especial y la Gerencia del Proyecto para avanzar en la definición del mencionado Anexo al ROP. 04.- Se encuentra pendiente en el Ministerio de Economía y Finanzas, la creación de los ítems presupuestarios tanto con financiamiento corriente e inversión en los grupos de gasto 53 y 73, hasta el 30 de abril no se contraba con una respuesta favorable. Sin embargo, se ha indicado de manera verbal por el MEF, que se utilizará el ítem presupuestario 730607 denominado: "servicios técnicos especializados" y se realizará una ampliación a la descripción del ítem para que se consideren la atención a persona en situación de vulnerabilidad.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	10/05/2022 - 07:00 PM
Hitos y avances correspondiente al mes de marzo 2022:	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	06/04/2022 - 01:27 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1.- Se procedió a cerrar el riesgo sobre la Norma Técnica del Servicio de Atención y Protección Emergente "Casas de Abrigo Temporal", misma que fue aprobada mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2022-012 de fecha 09 de marzo de 2022. 2.- Se elaboró y se aprobó los informes de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo del primer trimestre del 2022. 3.- Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2022. 4.- Al 31 de marzo de 2022 la ejecución presupuestaria es del 0,00%, debido a que en el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF recién aprobó la reforma el 22 de marzo de 2022 para obtener el organismo 2022 y correlativo 9980 con fuentes de financiamiento 701, esto con la finalidad de dar cumplimiento al paripasu del 80/20 previsto dentro del ROP, POD y Contrato de Préstamo BID 4923/OC-EC y ATN 4924 GR-EC. 5.- Sigue en procesos de construcción del anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP con el proceso de contratación para las tres modalidades, desde el mes de marzo se han mantenido Talleres con el Equipo Técnico del BID y de la Subsecretaría de Protección Especial, para avanzar en la definición del mencionado Anexo al ROP.		
Hitos cumplido correspondiente al mes de febrero 2022: 1. El 01 de febrero de 2022 se remitió el formulario de reforma Nro. MIES-VIS-MOVHUM-2022-01 con la finalidad de ajustar la planificación al presupuesto con su correspondiente organismo 2002, correlativo 5091 del contrato de préstamo y correlativo 9980 del convenio de financiamiento no reembolsable con fuente 701. 2. El 11 de febrero de 2022 mediante memorando Nro. MIES-VIS-2022-0108-M se solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera, se gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la creación de los ítems presupuestarios tanto con financiamiento corriente como inversión en los grupos de gasto 53 y 73, para firma de contratos de prestación de servicios para personas en situación de vulnerabilidad. 3. El 14 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0029-O enviado a la Subsecretaría de Presupuesto, Olga Núñez y al Subsecretario de Financiamiento Público, Carlos Carrera, se realizó una insistencia sobre la asignación de fuentes de financiamiento 202 y 701 para el proyecto de movilidad humana. La reforma se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 4. El 16 de febrero de 2022 a través de oficio Nro. MIES-CGAF-2022-0035-O al Ministerio de Economía y Finanzas, la Coordinación General Administrativa Financiera solicitó se incorpore un ítem presupuestario tanto en gasto corriente como gasto inversión, a fin de facilitar de manera adecuada la contratación de servicios relacionados con prestación de servicios sociales de atención integral a personas en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. 5. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 28 de febrero de 2022. 6. Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2021 del programa L1258 para el BID.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	10/03/2022 - 05:26 PM
Hitos cumplido correspondiente al mes de enero 2022: 1.El 28 de enero de 2022 se remitió el Plan Anual de la Política Pública - PAPP del proyecto de "Implementar y fortalecer servicios de atención de movilidad humana y modalidades alternativas para la protección, atención y restitución de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes", para el ejercicio fiscal 2022. 2.Se realizaron varias reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo, para generar avances en la estructura del contenido del Anexo al Reglamento Operativo del Programa, de la modalidad de atención "Ciudades de Acogida". 3.Entrega del informe y herramientas de gestión al BID, correspondiente al segundo semestre del 2021. 4.El 31 de enero de 2022 se realizó la reforma Nro. MIES-VIS-MOVHUM-2022-01 para ajustar la planificación al presupuesto con el organismo 2002, correlativo 5091.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	02/03/2022 - 10:03 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. La no asignación presupuestaria requerida para cubrir la planificación 2024, CAUSARÍA una suspensión de los servicios de protección especial contratados por el Ministerio.	29/02/2024	Anabel Cecilia Salazar Carrillo	80 %	100	80	0/0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. No contar con el anexo 4 del Reglamento Operativo del Proyecto - ROP, CAUSARÍA que no se puedan contratar con las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC y generaría un impacto en el servicio de atención en la modalidad de casas de abrigo temporal.	29/02/2024	Anabel Cecilia Salazar Carrillo	30 %	40	12	1/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planeación: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2022)	9-Entregables Formales	27/01/2022		27/01/2022		Sí	0.85
2	Ejecución: Elaboración de la reforma presupuestaria en función de los saldos disponibles en el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF (Reforma presupuestaria).	9-Entregables Formales	31/01/2022		31/01/2022		Sí	1.85
3	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de febrero (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de febrero 2022).	9-Entregables Formales	28/02/2022		28/02/2022		Sí	0.85
4	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2021 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2022		28/02/2022		Sí	1.85
5	Ejecución: Elaboración de los informes del primer trimestre 2022 de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.85
6	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de marzo (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de marzo 2022).	9-Entregables Formales	05/04/2022		05/04/2022		Sí	0.85
7	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de	9-Entregables Formales	09/05/2022		09/05/2022		Sí	0.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	abril (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de abril 2022).							
8	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de mayo (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de mayo 2022).	9-Entregables Formales	09/06/2022		09/06/2022		Sí	0.85
9	Ejecución: Elaboración del anexo 2 al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP con el proceso para la contratación en la modalidad de "Ciudades de Acogida" (Anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP aprobado).	9-Entregables Formales	23/06/2022		23/06/2022		Sí	4.68
10	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023).	9-Entregables Formales	25/06/2022		25/06/2022		Sí	1.85
11	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de junio (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de junio 2022).	9-Entregables Formales	08/07/2022		08/07/2022		Sí	0.85
12	Ejecución: Elaboración de los informes del segundo trimestre 2022 de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del segundo trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	10/07/2022		10/07/2022		Sí	1.85
13	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2022 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	01/08/2022		01/08/2022		Sí	1.85
14	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de julio (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de julio 2022).	9-Entregables Formales	16/08/2022		16/08/2022		Sí	0.85
15	Ejecución: Gestionar la suscripción de los contratos de cooperación económica con las OCS para brigadas multidisciplinarias, funcionando en ciudades de acogida.	9-Entregables Formales	01/09/2022		01/09/2022		Sí	5.0
16	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de agosto (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de agosto 2022).	9-Entregables Formales	15/09/2022		15/09/2022		Sí	0.85
17	Ejecución: Elaboración de los informes del tercer trimestre	9-Entregables Formales	07/10/2022		07/10/2022		Sí	1.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	2022 de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).							
18	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de septiembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de septiembre 2022).	9-Entregables Formales	07/10/2022		07/10/2022		Sí	0.85
19	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de octubre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de octubre 2022).	9-Entregables Formales	01/11/2022		01/11/2022		Sí	0.85
20	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de noviembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de noviembre 2022).	9-Entregables Formales	19/12/2022		19/12/2022		Sí	0.85
21	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de diciembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de diciembre 2022).	9-Entregables Formales	06/01/2023		06/01/2023		Sí	0.85
22	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP.	9-Entregables Formales	10/01/2023		10/01/2023		Sí	2.0
23	Ejecución: Elaboración de los informes del cuarto trimestre 2022 de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del cuarto trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	16/01/2023		16/01/2023		Sí	2.83
24	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de enero 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo).	9-Entregables Formales	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.85
25	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de febrero 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo).	9-Entregables Formales	21/03/2023		21/03/2023		Sí	0.85
26	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de marzo 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo).	9-Entregables Formales	24/04/2023		24/04/2023		Sí	0.85
27	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de abril 2023 (Informe	9-Entregables Formales	05/05/2023		05/05/2023		Sí	0.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo).							
28	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de mayo 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo).	9-Entregables Formales	09/06/2023		09/06/2023		Sí	0.85
29	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de junio 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo).	9-Entregables Formales	10/07/2023		10/07/2023		Sí	0.85
30	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de julio 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo).	9-Entregables Formales	08/08/2023		08/08/2023		Sí	0.85
31	Ejecución: Gestionar la suscripción de los contratos para el servicio de atención de ciudades de acogida con Lago Agrio, Rumiñahui, Manta, Quito norte, Quito sur (5 OSC Contratación competitiva).	9-Entregables Formales	31/08/2023		31/08/2023		Sí	1.83
32	Ejecución: Gestionar la suscripción de los contratos para el servicio de atención de ciudades de acogida con Quito centro 1 , Quito centro 2 y Guayaquil centro sur (3 OCS Contratación directa).	9-Entregables Formales	31/08/2023		31/08/2023		Sí	1.85
33	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de agosto 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo).	9-Entregables Formales	13/09/2023		13/09/2023		Sí	0.85
34	Ejecución: Elaboración de la Guía del Servicio de Atención con el proceso para la contratación en la modalidad de "Apoyo y Custodia Familiar" (Anexo 4 al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP aprobado).	9-Entregables Formales	11/10/2023		11/10/2023		Sí	2.89
35	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de septiembre 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo).	9-Entregables Formales	12/10/2023		12/10/2023		Sí	0.85
36	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de octubre 2023 (Informe de gerencia con información financiera,	9-Entregables Formales	12/11/2023		12/11/2023		Sí	0.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	adquisiciones, legal y monitoreo).							
37	Ejecución: Contratación del equipo de gestión - Consultor individual especialista financiero y monitoreo & evaluación (Contratos suscritos con los especialistas financiero y monitoreo & evaluación).	9-Entregables Formales	20/11/2023		20/11/2023		Sí	1.85
38	Ejecución: Gestionar la suscripción de los contratos para el servicio de atención en la modalidad de apoyo y custodia familiar.	9-Entregables Formales	30/11/2023		30/11/2023		Sí	1.85
39	Ejecución: Elaboración y presentación del informe de gerencia de noviembre 2023 (Informe de gerencia con información financiera, adquisiciones, legal y monitoreo).	9-Entregables Formales	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.85
40	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2024).	9-Entregables Formales	31/01/2024		31/01/2024		Sí	1.85
41	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2024 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones PAI 2024).	9-Entregables Formales	31/01/2024		31/01/2024		Sí	1.85
42	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2023 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2024		28/02/2024		Sí	1.85
43	Ficha técnica de seguimiento aprobada, mes enero	9-Entregables Formales	29/02/2024		29/02/2024		Sí	0.85
44	Informe de Gestión de Gerencia del mes de enero aprobado.	9-Entregables Formales	29/02/2024		29/02/2024		Sí	0.85
45	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2024 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	31/07/2024		29/01/2025		Sí	1.85
46	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2025).	9-Entregables Formales	31/01/2025	31/01/2025			No	1.42
47	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2025 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2025).	9-Entregables Formales	31/01/2025	31/01/2025			No	1.83

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
48	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Diciembre 2024.	9-Entregables Formales	12/02/2025		12/02/2025		Sí	0.85
49	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Enero 2025.	9-Entregables Formales	12/02/2025		12/02/2025		Sí	0.85
50	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Diciembre 2024.	9-Entregables Formales	13/02/2025		13/02/2025		Sí	0.85
51	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Enero 2025.	9-Entregables Formales	13/02/2025		13/02/2025		Sí	0.85
52	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2024 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2025		31/01/2025		Sí	1.85
53	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Febrero 2025	9-Entregables Formales	11/03/2025		11/03/2025		Sí	0.85
54	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Febrero 2025.	9-Entregables Formales	12/03/2025		12/03/2025		Sí	0.85
55	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Marzo 2025	9-Entregables Formales	11/04/2025		11/04/2025		Sí	0.85
56	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Marzo 2025.	9-Entregables Formales	11/04/2025		11/04/2025		Sí	0.85
57	Ejecución: Ficha de seguimiento trimestral aprobada (Primer trimestre enero-febrero-marzo).	9-Entregables Formales	16/04/2025	16/04/2025			No	1.0
58	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Abril 2025.	9-Entregables Formales	12/05/2025	12/05/2025			No	0.85
59	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Abril 2025.	9-Entregables Formales	12/05/2025	12/05/2025			No	0.85
60	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Mayo 2025.	9-Entregables Formales	11/06/2025	11/06/2025			No	0.85
61	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Mayo 2025.	9-Entregables Formales	11/06/2025	11/06/2025			No	0.85
62	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Junio 2025.	9-Entregables Formales	11/07/2025	11/07/2025			No	0.85
63	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Junio 2025.	9-Entregables Formales	11/07/2025	11/07/2025			No	0.85
64	Ejecución: Ficha de seguimiento trimestral aprobada (Segundo trimestre abril-mayo-junio)	9-Entregables Formales	15/07/2025	15/07/2025			No	1.0
65	Ejecución: Informe aprobado primer semestre 2025 (enero a junio) remitido al BID.	9-Entregables Formales	31/07/2025	31/07/2025			No	1.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
66	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2025 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	31/07/2025	31/07/2025			No	1.85
67	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Julio 2025.	9-Entregables Formales	11/08/2025	11/08/2025			No	0.85
68	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Julio 2025.	9-Entregables Formales	11/08/2025	11/08/2025			No	0.85
69	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Agosto 2025.	9-Entregables Formales	11/09/2025	11/09/2025			No	0.85
70	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Agosto 2025.	9-Entregables Formales	11/09/2025	11/09/2025			No	0.85
71	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Septiembre 2025.	9-Entregables Formales	13/10/2025	13/10/2025			No	0.85
72	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Septiembre 2025.	9-Entregables Formales	13/10/2025	13/10/2025			No	0.85
73	Ejecución: Ficha de seguimiento trimestral aprobada (Tercer trimestre julio-agosto-septiembre).	9-Entregables Formales	15/10/2025	15/10/2025			No	1.0
74	Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Octubre 2025.	9-Entregables Formales	11/11/2025	11/11/2025			No	0.85
75	Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Octubre 2025.	9-Entregables Formales	11/11/2025	11/11/2025			No	0.85
76	Cierre: Cierre y baja del proyecto de inversión (Informe sobre el cierre y baja del proyecto de inversión).	9-Entregables Formales	30/12/2025	30/12/2025			No	1.42
77	Planificación actividades 2026	9-Entregables Formales	31/12/2025	31/12/2025			No	1.7

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de personas atendidas bajo las brigadas multidisciplinarias de apoyo, información y referencia en la modalidad de Ciudades de Acogida.	☐	-	-	-	01/01/2023	-
2	Número de personas atendidas bajo las brigadas multidisciplinarias para fortalecimiento de vínculo familiar y acompañamiento aplicando la modalidad de atención "Apoyo y custodia familiar".	☐	-	-	-	01/01/2024	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,349,217.09 **
Costo Total:	16,973,057.00
Total Devengado:	7,388,670.02
% Costo Total Devengado:	43.53 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 43.53 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	10,184,771.31	0.00	0.00	10,184,771.31
Ppto. Externo Planeado	10,184,771.31	0.00	0.00	10,184,771.31
Ppto. Aprobado Inicial	10,184,771.31	0.00	0.00	10,184,771.31
Ppto. Codificado	12,207,655.22	0.00	0.00	12,207,655.22
Ppto. Comprometido	5,959,509.35	0.00	0.00	5,959,509.35
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	10,907,655.22	6,406,842.00	0.00	17,314,497.22
Ppto. Devengado	5,942,375.09	1,446,294.93	0.00	7,388,670.02
Pagado Real	1,904,273.63	0.00	0.00	1,904,273.63
Estimado a fin de año	* 5,942,375.09	0.00	0.00	5,942,375.09
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	4,965,280.13	6,406,842.00	0.00	11,372,122.13
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 54.48 %	22.57 %	0.00 %	42.67 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025

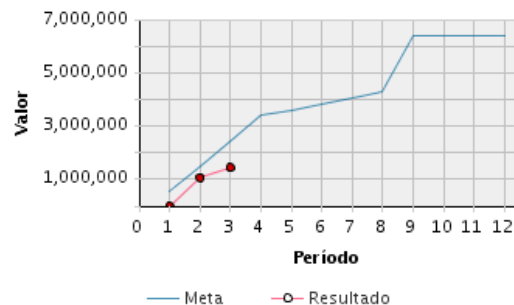

Presupuesto Mensual 2025

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	581,210.73	0.00	581,210.73	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	933,584.96	1,068,144.17	1,514,795.69	1,068,144.17	70.51 %		16.67 %
Mar	933,584.96	378,150.76	2,448,380.65	1,446,294.93	59.07 %		22.57 %
Abr	937,868.96		3,386,249.61				
May	222,163.64		3,608,413.25				
Jun	222,163.64		3,830,576.89				
Jul	222,163.64		4,052,740.53				
Ago	222,163.64		4,274,904.17				
Sep	2,125,511.77		6,400,415.94				
Oct	2,142.02		6,402,557.96				
Nov	2,142.02		6,404,699.98				
Dic	2,142.02		6,406,842.00				
Total	6,406,842.00	1,446,294.93					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la calidad y eficiencia de los Servicios de Protección Especial MEDIANTE la actualización de normas técnicas y modelos de atención, capacitación, asistencia técnica, esclarecimiento legal y seguimiento a la implementación de la política pública de protección especial

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A0 - Actualizacoon Dictamen Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0941-OF.pdf	A0 - _Actualizacio	03/03/2022
2	A0 - Documento de Proyecto 2021-11-26	A0 - _Documento_de_Proyecto_2021-11-26.pdf	03/03/2022
3	A0 - Saldo Inicial Movilidad Humana	A0 - _Saldo_Inicial_Movilidad_Humana.pdf	03/03/2022
4	aa1. Envio de informe segundo semestre 2023 BID, asociado a hito 41.	MIES-VIS-2024-0009-O_envioinformesemestralBID_31-1-2024.pdf	29/02/2024
5	ab1. Postulacion de Proyecto Proforma 2024, asociado al hito 42	MIES-VIS-FAISDI-2024-0004-M_envioProforma_2024.pdf	29/02/2024
6	AC1. Fiche de seguimiento del proyecto a enero, asociado al item 43	Ficha_Técnica_Movilidad_Humana_(Enero_2024)-signed-signed-signed.pdf	13/03/2024
7	AC2. Informe de seguimiento del proyecto a enero de 2024, asociado al item 44	Informe_Estado_Actual_Movilidad_Humana-signed.pdf	13/03/2024
8	Asociación hito 48: Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Diciembre 2024.	Informe_de_gestión_diciembre_L1258-signed-signed-signed.pdf	16/04/2025
9	Asociación hito 49: Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Enero 2025.	Informes_de_gestión_enero_L1258-signed-signed-signed.pdf	16/04/2025
10	Asociación hito 50: Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Diciembre 2024.	Ficha_Te	16/04/2025
11	Asociación hito 51: Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Enero 2025.	Ficha_Te	16/04/2025
12	Asociación hito 52: Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2024 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	MIES-VIS-FAISDI-2025-0006-O_(Envío_informe_primer_semestre).pdf	14/04/2025
13	Asociación hito 53: Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Febrero 2025	Informes_de_gestión_febrero_L1258-signed-signed-signed.pdf	16/04/2025
14	Asociación hito 54:Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Febrero 2025.	Ficha_Técnica_Movilidad_Humana_(Febrero_2025)-signed-signed-signed-signed.pdf	16/04/2025
15	Asociación hito 55: Ejecución: Ficha de seguimiento, aprobada. Marzo 2025	Ficha_Técnica_Movilidad_Humana_(Marzo_2025)-signed-signed-signed.pdf	16/04/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	Asociación hito 56: Ejecución: Informe de Gerencia, aprobado. Marzo 2025.	Informes_de_gestión_Marzo_(MH)-signed-signed.pdf	16/04/2025
17	Asociación hito 70: Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2024 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	MIES-VIS-FAISDI-2025-0008-O_(Envío_informe_segundo_semestre).pdf	14/04/2025
18	B1 - PAPP Movilidad Humana 2022-01-31 Asociación al hito Nro. 01.	A1_-_PAPP_Movilidad_Humana_2022-01-31.xlsb	25/02/2022
19	B2 - Reforma MIES-VIS-MOVHUM-2022-01 Asociación al hito Nro. 02.	A2_-_Reforma_MIES-VIS-MOVHUM-2022-01.xlsx	25/02/2022
20	B3 - Informe Financiero MovHum Febrero 2022 Asociación al hito Nro. 03.	A3_-_Informe_Financiero_MovHum_Febrero_2022-signed.pdf	09/03/2022
21	B4 - Informe Gestio#n 2do Semestre 2021 - L1258 Asociación al hito Nro. 04.	A4_-_Informe_Gestio	09/03/2022
22	C1 - Informe Financiero MovHum Marzo 2022 Asociación al hito Nro. 06.	C1_-_Informe_Financiero_MovHum_Marzo_2022-signed.pdf	05/04/2022
23	C2 - Cierre de Riesgo AM Nro. 012 - Norma Te#cnica	C2_-_Riesgo_AM_Nro._012_-_Norma_Te	05/04/2022
24	C3 - Informe Legal L1258 1er Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 05.	C3_-_Informe_Legal_L1258_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	05/04/2022
25	C4 - Informe Adquisiciones L1258 1er Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 05.	C4_-_Informe_Adquisiciones_L1258_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	06/04/2022
26	C5 - Informe Seguimiento y Monitoreo L1258 1er Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 05.	C5_-_Informe_SegMonitoreo_L1258_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	06/04/2022
27	D1 - Informe Financiero MovHum Abril 2022 Asociación al hito Nro. 07.	Informe_Financiero_MovHum_Abril_2022-signed.pdf	09/05/2022
28	E1 - Informe Financiero MovHum Mayo 2022 Asociación al hito Nro. 08.	E1_-_Informe_Financiero_MovHum_Mayo_2022-signed.pdf	09/06/2022
29	F1 - Envío proforma presupuestaria PAI 2023 Asociación al hito Nro. 10.	F1_-_MIES-VIS-FAISDI-2022-0431-M_Respuesta_Envio_PAI_2023.pdf	12/07/2022
30	F2 - Proforma presupuestaria PAI 2023 Movilidad Humana Asociación al hito Nro. 10.	F2_-_Movilidad_Humana_Proforma_PAI_2023.zip	12/07/2022
31	F3 - Informe financiero MovHum Junio 2022 Asociación al hito Nro. 11.	F3_-_Informe_Financiero_MovHum_Junio_2022-signed.pdf	12/07/2022
32	F4 - No Objeción Anexo ROP Ciudades de Acogida Asociación al hito Nro. 09.	F4_-_CAN:CEC-691:2022_Anexo_ROP_Ciudades_de_Acogida.pdf	12/07/2022
33	F5 - Informe Legal L1258 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F5_-_Informe_Legal_L1258_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
34	F6 - Informe SegMonitoreo L1258 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F6_-_Informe_SegMonitoreo_L1258_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
35	F7 - Informe Adquisiciones L1258 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F7_-_Informe_Adquisiciones_L1258_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
36	G1 - Informe Semestral L1258 - 2022-08-01 - Asociado al hito Nro. 13.	G1_-_Informe_Semestral_L1258_-_2022-08-01.zip	05/09/2022
37	G2 - Informe Financiero MovHum Julio 2022 Asociación al hito Nro. 14.	G1_-_Informe_Financiero_MovHum_Julio_2022-signed.pdf	18/08/2022
38	H1 - Resolucio#n Administrativa de Adjudicacio#n - Asociado al hito Nro. 15	H1_-_Resolucio	05/09/2022
39	H2 - Resolucio#n de Adjudicacio#n Aclaratoria - Asociado al hito Nro. 15	H2_-_Resolucio	05/09/2022
40	H3 - Informe Financiero MovHum Agosto 2022 - Asociado al hito Nro. 16.	H3_-_Informe_Financiero_MovHum_Agosto_2022-signed.pdf	15/09/2022
41	I1 - Informe Legal L1258 3er Trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 17.	I1_-_Informe_Legal_L1258_3er_Trimestre_2022-signed.pdf	25/10/2022
42	I2 - Informe MonitoreoEval L1258 3er Trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 17.	I2_-_Informe_MonitoreoEval_L1258_3er_Trimestre_2022-signed.pdf	25/10/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
43	I3 - Informe Adquisiciones L1258 3er Trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 17.	I3_-Informe_Adquisiciones_L1258_3er_Trimestre_2022-signed.pdf	25/10/2022
44	I4 - Informe Financiero MovHum Septiembre 2022 - Asociado al hito Nro. 18.	I4_-Informe_Financiero_MovHum_Septiembre_2022-signed.pdf	25/10/2022
45	J1 - Informe Financiero MovHum Octubre 2022 - Asociado al hito Nro. 19.	J1_-Informe_Financiero_MovHum_Octubre_2022-signed.pdf	02/11/2022
46	K1 - Informe Financiero MovHum Noviembre 2022 - Asociado al hito Nro. 20.	Informe_Financiero_MovHum_Noviembre_2022-signed.pdf	20/12/2022
47	L1 - Informe Financiero MovHum Diciembre - Asociado al hito Nro. 21.	L1_-Informe_Financiero_MovHum_Diciembre-signed.pdf	09/01/2023
48	L1 - PAPP Movilidad Humana - Asociado al hito Nro. 22.	L1_-PAPP_Movilidad_Humana_2023-01-06.xlsb	08/03/2023
49	L2 - Informe MonitoreoEval L1258 4to Trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 23.	L2_-Informe_MonitoreoEval_L1258_4to_Trimestre_2022-signed.pdf	16/01/2023
50	L3 - Informe Legal L1258 4to Trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 23.	L3_-Informe_Legal_L1258_4to_Trimestre_2022-signed.pdf	19/01/2023
51	L4 - Informe Adquisiciones L1258 4to Trimestre 2022 - Asociado al hito Nro. 23.	L4_-Informe_Adquisiciones_L1258_4to_Trimestre_2022-signed.pdf	20/01/2023
52	M1 - Informe Gerencia Movilidad Humana Enero - Asociado al hito Nro. 24.	M1_-Informe_Gerencia_Movilidad_Humana_Enero_signed.pdf	08/03/2023
53	N1 - Informe Gerencia Movilidad Humana Febrero - Asociado al hito Nro. 25.	N1_-Informe_Gerencia_Movilidad_Humana_Febrero_signed.pdf	25/04/2023
54	O1. Informe Gerencia Movilidad Humana Marzo - Asociado al hito Nro. 26.	O1._Informe_Gerencia_Movilidad_Humana_Marzo_2023-04-25-signed.pdf	25/04/2023
55	P1. Informe Gerencia Movilidad Humana Abril - Asociado al hito Nro. 27.	P1._Informe_Gerencia_Movilidad_Humana_Abril_2023-05-04-signed.pdf	09/05/2023
56	Q1. informe Gerencia Movilidad Humana Mayo - Asociado al hito Nro. 28.	Q1._Informe_Gerencia_Movilidad_Humana_Mayo_2023-06-08-signed.pdf	09/06/2023
57	R1. informe Gerencia Movilidad Humana Junio - Asociado al hito Nro. 29.	R1._Informe_Gerencia_Movilidad_Humana_Junio_2023-07-10-signed.pdf	14/07/2023
58	S1. informe Gerencia Movilidad Humana Julio - Asociado al hito Nro. 30.	S1._Informe_Gerencia_Movilidad_Humana_Julio_2023-08-08-signed.pdf	09/08/2023
59	T1 5 OSC Contratación Competitiva - Asociado al hito Nro. 31.	T1_5_OSC_Contratación_Competitiva.rar	14/09/2023
60	T2 3 OSC Contratación Directa - Asociado al hito Nro. 32.	T2_3_OSC_Contratación_Directa.rar	14/09/2023
61	T3. Informe Gerencia Movilidad Humana Agosto - Asociado al hito Nro. 33.	T3_Informe_Gerencia_Movilidad_Humana_Agosto_2023-09-13-signed.pdf	13/09/2023
62	U1. Informe Gerencia Movilidad Humana Septiembre - Asociado al hito Nro. 34.	U1._Informe_Gerencia_Movilidad_Humana_Septiembre_2023-10-01-signed.pdf	10/10/2023
63	U2. Guía Modalidad Apoyo No objeción - Asociado al hito Nro. 35.	U2._Guía_Modalidad_Apoyo_No_objeción_2023-10-10.pdf	12/10/2023
64	U3. O-CANCEC-9912023 No Objeción Guía - Asociado al hito Nro. 35	U3._O-CANCEC-9912023_No_Objeción_Guía.pdf	12/10/2023
65	V1. Informe Gerencia Movilidad Humana Octubre - Asociado al hito Nro. 36.	V1._Informe_Gerencia_Movilidad_Humana_Octubre_2023-11-01-signed.pdf	01/11/2023
66	W1. Informe Gerencia Movilidad Humana Noviembre - Asociado al hito Nro. 43.	informe_de_gerencia_movilidad_humana_noviembre_2023-signed-signed-signed.pdf	02/01/2024
67	x1. Contratos suscritos apoyo y custodia familiar, asociado al ITEM 41	Contratos_comp_compressed.pdf	02/01/2024
68	y1. Contratos especialistas financiero y monitoreo, asociados al ITEM 37	CONTRATO_ESPECIALISTAS_GESTION.zip	02/01/2024
69	z1. Aplicación reforma inicial PAPP, asociado a hito 40.	MIES-VIS-2024-0070-M_reformaPAPP_inicio.pdf	29/02/2024

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Analista del Proyecto de Inversión de Movilidad Humana			
Salazar Carrillo, Anabel Cecilia	Líder del Proyecto de Inversión de Movilidad Humana	Gerente de Proyecto 3	anabel.salazar@inclusion.gob.ec	
