

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento
Dirección de Emprendimientos

PROYECTO: K001 MIES-Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.

Líder del Proyecto:	Naranjo Borja, María Antonieta (mantonietanaranjo@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Burgos Carrera, Arianna Stephany	Programas Relacionados:	
Titular:	Zambrano, María de Los Angeles	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.384446	TIR:	32.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	42,404,618.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,580,773.95
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	20/06/2019 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	06/06/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Cárdenas Oñate, María Verónica	Fecha del siguiente hito:	20/06/2022

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto busca la sostenibilidad socio-económica de la población en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad, a través del acceso a servicios de inclusión económica como el crédito de desarrollo humano, capacitación y acompañamiento técnico; y el fortalecimiento de los servicios de inclusión social que permitan mejorar las condiciones de vida de la población en atención prioritaria principalmente niños, niñas y adultos mayores.

Beneficios Cualitativos

El proyecto tiene como beneficios:

1. Con el Crédito de Desarrollo Humano - CDH, la población logra su sostenibilidad socio-económica;
2. Con el Bono de Desarrollo Humano Variable - BDH-V, los núcleos familiares con hijos menores de edad, romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza;
3. Con la Pensión Mis Mejores Años - PMMA, se reduce la desigualdad de ingresos de las personas adultas mayores.

Tipo de Beneficiario

El proyecto está dirigido a 3 tipos de usuarios:

1. Hogares pobres y no pobres que recibirán un crédito de desarrollo humano;
2. Niños menores de 3 años de hogares pobres que acceden al BDH-V y a servicios para la primera infancia;
3. Adultos mayores de hogares pobres que reciben PMMA y tienen acceso a servicios de atención.


Restricciones

Alcance: Inclusión y exclusión de la base de datos del registro social 2018.
 Tiempo: El tiempo de ejecución es limitado hasta diciembre de 2022.
 Recursos: Liberación oportuna de la base de datos del registro social 2018.
 Costo: No se puede exceder los recursos definidos por la fuente de financiamiento.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 86.13 %

Fecha de Inicio: 20/06/2019

Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

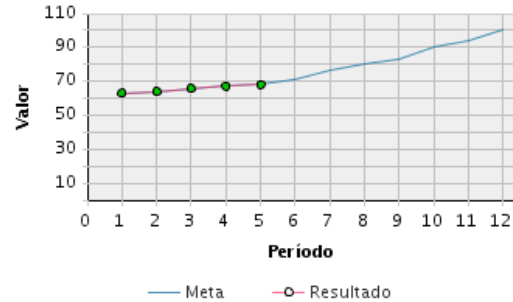

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	63 %	64 %	66 %	67 %	68 %	71 %	77 %	80 %	83 %	90 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	63 %	64 %	66 %	67 %	68 %							
	Estado											
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2022: El proyecto ha realizado las gestiones pertinentes para efectuar la actualización del dictamen de prioridad conforme los acuerdos establecidos con el Banco Mundial, apenas se cuente con la suscripción de la Cuarta enmienda al contrato de préstamo será posible remitir la documentación a la SNP para iniciar el proceso de actualización de prioridad. Sin embargo, la UGP ya está trabajando en el documento del proyecto	Cárdenas Oñate, María Verónica	06/06/2022 - 02:59 PM
Abril 2022: Marzo 2022 Se encuentra atado al contrato de préstamo Nro. BIRF -8946 EC, con el Banco Mundial. En vista de que se firmará una Cuarta Enmienda tentativamente el 25 de mayo de 2022, se planteó la necesidad de solicitar un nuevo Dictamen de Actualización de Prioridad a la Secretaría Nacional de Planificación, a fin de incluir las modificaciones y ampliación de vigencia del proyecto hasta el 2024, acorde a los compromisos asumidos con el Banco Mundial. En este sentido, desde esta Gerencia, se han realizado los acercamientos respectivos con las autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, y nos encontramos ala espera de los pronunciamientos de las entidades rectoras, a fin de iniciar el proceso de actualización del proyecto a la brevedad posible, considerando que existen procesos que no pueden detenerse, como es el caso de la ejecución de la segunda fase de la Encuesta ENDI a cargo del coejecutor del proyecto, INEC.	López Moreta, José Luis	06/05/2022 - 10:49 AM
Marzo 2022 Se encuentra atado al contrato de préstamo Nro. BIRF -8946 EC, con el Banco Mundial. En vista de que se firmará una Cuarta Enmienda tentativamente el 25 de mayo de 2022, se planteó la necesidad de solicitar un nuevo Dictamen de Actualización de Prioridad a la Secretaría Nacional de Planificación, a fin de incluir las modificaciones y ampliación de vigencia del proyecto hasta el 2024, acorde a los compromisos asumidos con el Banco Mundial. En este sentido, desde esta Gerencia, se han realizado los acercamientos respectivos con las autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, y nos encontramos ala espera de los pronunciamientos de las entidades rectoras, a fin de iniciar el proceso de actualización del proyecto a la brevedad posible, considerando que existen procesos que no pueden detenerse, como es el caso de la ejecución de la segunda fase de la Encuesta ENDI a cargo del coejecutor del proyecto, INEC.	López Moreta, José Luis	06/05/2022 - 10:48 AM
Febrero 2022: Se cumplió con la entrega del segundo producto consultores del equipo de gestión, relacionado al Componente 5 del proyecto. Es importante recalcar que debido a la necesidad de efectuar una Cuarta enmienda al contrato de Préstamo con el Banco Mundial, es necesario la re-estructuración del proyecto y la ampliación del mismo, por tanto se están realizando los acercamientos con la Secretaría Nacional de Planificación, a fin de identificar el procedimiento más idóneo para viabilizar este tema.	Naranjo Borja, María Antonieta	09/03/2022 - 11:28 AM
Enero 2022: Ejecución: Primer producto consultores del equipo de gestión del proyecto. Se realizaron los procesos necesarios para efectivizar la transferencia de recursos del MIES al INEC	Naranjo Borja, María Antonieta	17/02/2022 - 08:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
para financiar la operación estadística para seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición.		
Diciembre 2021: * Durante el mes de diciembre se generaron y enviaron, al Banco Mundial, los informes respectivos conforme las definiciones metodológicas acordadas al interno del MIES. * Se emitieron los documentos habilitantes para continuar con el proceso de verificación técnica, conforme lo señalado en el Manual Operativo del Proyecto, y de acuerdo a lo estipulado en el contrato, los resultados de la consultoría se lo tendrán hasta finales del mes de marzo del 2022. * Pese a las insistencias del MIES, se encuentra pendiente, la regularización de los saldos considerados como libre disponibilidad por parte del MEF.	Naranjo Borja, María Antonieta	13/01/2022 - 01:07 PM
Noviembre 2021: La información necesaria para la emisión del reporte del estado de los indicadores del Proyecto ha sido proporcionada por las áreas respectivas. Se procederá a emitir el informe respectivo conforme las definiciones metodológicas acordadas al interno del MIES.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:41 PM
Octubre 2021: La definición de las fichas metodológicas para el cálculo de los indicadores se encuentra finalizada y han sido enviadas al equipo del Banco Mundial, en atención a los compromisos asumidos en las diferentes reuniones de trabajo de la Misión mantenida en el mes de agosto.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:40 PM
Septiembre 2021: La conciliación conjunta de la cuenta designada (MIES-URS) fue aprobada y enviada al Banco Mundial.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:37 PM
Agosto 2021: Segunda enmienda realizada ante la necesidad de financiar las transferencias monetarias BDH y BDH-V en el contexto de la pandemia provocada por el COVID19. Enmienda aprobada el 25 de agosto de 2020.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:30 PM
Julio 2021: El documento correspondiente al Perfilamiento de Género de los Usuarios de los Servicios de Inclusión Económica y Social contó con la aprobación final del BM durante el mes de julio de 2021.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:26 PM
Junio 2021: El Documento correspondiente a Plan de Partes Interesadas y Divulgación de información fue enviado al Banco Mundial para revisión en enero de 2021. Fue recibida la retroalimentación del mismo durante el mes de junio de 2021.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:24 PM
Mayo 2021: El Manual Operativo de la "Estrategia de Inclusión Económica" fue aprobado y emitido mediante Acuerdo Ministerial MIES-2021-028 de 14 de mayo de 2021.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:22 PM
Abril 2021: Aprobación del BM del documento denominado Procedimiento para la Gestión del Trabajo y las Condiciones Laborales durante el mes de abril 2021. Dentro de este instrumento técnico se especifican los elementos primordiales para el cumplimiento de esta salvaguarda como: promoción de la seguridad y salud en el trabajo, promoción del trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores del proyecto, mecanismo de quejas y reclamos interno tanto de la Unidad de Implementación como de la Unidad de Registro Social.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 01:58 PM
Marzo 2021: Mediante correo electrónico de 29 de marzo de 2021, el Sr. Juan Carlos Álvarez Representante Residente del Banco Mundial en Ecuador, remite "" la Tercera Enmienda al Acuerdo de Préstamo BIRF 8946-EC para el "Proyecto Redes de Protección Social", implementado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Unidad del Registro Social, debidamente firmado por el Señor Boris Utria, en representación de la Sra. Marianne Fay, Directora para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú y contrafirmado por el Sr. Juan Hidalgo, Subsecretario de Financiamiento Público, por el Ministerio de Economía y Finanzas...", a la Gerente de Proyecto del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de continuar con el trámite correspondiente.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 01:54 PM
Febrero 2021: Mediante oficio Nro. MIES-MIES-2021-0049-O y oficio Nro. MIES-MIES-2021-0092-O de 26 de enero y 26 de febrero de 2021, respectivamente, la entonces Máxima Autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social remite al entonces Ministro de Economía y Finanzas los informes respectivos de reestructura del Proyecto "Red de Protección Social", a fin de continuar con el proceso respectivo con el Banco Mundial.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 01:54 PM
Enero 2021: Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-001, de 08 de enero 2021, el entonces Ministro de Inclusión Económica y Social, dispone reformar el Manual Operativo de 6 de noviembre de 2020,	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 01:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
mismo que en su parte medular y anexos contempla la estructura para la ejecución, procesos para el levantamiento de información, procedimiento para adquisiciones y contrataciones; y, la planificación, seguimiento y monitoreo del proyecto.		
Avance físico del proyecto en diciembre 2020: - Plan Anual de la Política Pública 2021, presupuesto prorrogado, aprobado. - Plan Anual de la Política Pública segundo semestre 2020, aprobado.	León Suqui, Fernando David	28/12/2020 - 12:35 PM
Avance físico del proyecto en agosto 2020: - Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre del 2020 para el Banco Mundial, aprobado.	León Suqui, Fernando David	25/09/2020 - 10:32 AM
Avance físico del proyecto en julio 2020: - Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020, aprobado. - Plan Anual de la Política Pública ejecutado primer semestre 2020, aprobado. - Informe ejecutivo sobre la actualización del proyecto de inversión de Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.	León Suqui, Fernando David	07/08/2020 - 11:41 AM
Avance físico del proyecto en mayo 2020: - Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 0.83 millones en cumplimiento del DLI 5, aprobado.	León Suqui, Fernando David	08/06/2020 - 03:29 PM
Avance físico del proyecto en abril 2020: - Actualización del Manual Operativo del Proyecto - MOP, aprobado.	León Suqui, Fernando David	13/05/2020 - 12:23 PM
Avance físico del proyecto en febrero 2020: - Plan de Adquisiciones para el Banco Mundial, aprobado; - Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre 2019 para el Banco Mundial, aprobado.	León Suqui, Fernando David	23/03/2020 - 02:32 PM
Avance físico del proyecto en enero 2020: - Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 6.1 millones en cumplimiento del DLI 3, aprobado. - Informe de reprogramación presupuestaria de ingresos (DLI) y gastos (Asistencia Técnica) 2020, 2021 y 2022 del Proyecto de Red de Protección Social (BIRF-8946-EC) conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado. - Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado. - Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2019, aprobado.	León Suqui, Fernando David	23/03/2020 - 02:29 PM
Avance físico del proyecto en diciembre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de diciembre 2019 elaborado. - Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR's de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años". - Términos de referencia - TDR de la Verificación Técnica elaborados. - Cotizaciones para la auditoría financiera recibidos.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 03:17 PM
Avance físico del proyecto en noviembre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de noviembre 2019 elaborado. - Términos de referencia - TDR para la contratación de la auditoría financiera elaborado. - Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados. - Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 11:57 AM
Avance físico del proyecto en octubre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de octubre 2019 elaborado. - Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020 elaborado. - Informe de justificación del recorte presupuestario al proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado. - Plan operativo de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 11:07 AM
Avance físico del proyecto en septiembre 2019: - Se elaboró un documento preliminar con el plan de adquisiciones.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 10:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Se realizó los términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.		
Avance físico del proyecto en agosto 2019: - Acuerdo Ministerial Nro. 125 emitido por el MIES para calificar como emblemático al proyecto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES". - Acuerdo Ministerial emitido por el MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 09:48 AM
Avance físico del proyecto en Julio 2019: -Se suscribió el acta resolutive suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US\$ 350 millones. -Se firmó el acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US\$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 09:36 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. La falta de recursos económicos CAUSARÍA el incumplimiento de la planificación y metas	17/02/2022	María de Los Angeles Zambrano	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición: Acta resolutive suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US\$ 350 millones.	Z - Compromiso Ministerial	10/07/2019		10/07/2019		Sí	2.0
2	Planeación: Acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US\$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	Z - Compromiso Ministerial	22/07/2019		22/07/2019		Sí	2.0
3	Planeación: Acuerdo Ministerial emitido por la Ministra del MIES para calificar como emblemático al proyecto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".	Z - Compromiso Ministerial	14/08/2019		14/08/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	Planeación: Acuerdo Ministerial por la Ministra del MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	Z - Compromiso Ministerial	27/08/2019		27/08/2019		Sí	2.0
5	Ejecución: Plan de Adquisiciones elaborado.	4-Inicio de Trabajo	20/09/2019		20/09/2019		Sí	1.0
6	Ejecución: Términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.	9-Entregables Formales	27/09/2019		27/09/2019		Sí	1.0
7	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de octubre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	04/10/2019		04/10/2019		Sí	1.0
8	Ejecución: Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	18/10/2019		18/10/2019		Sí	1.0
9	Ejecución: Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	21/10/2019		21/10/2019		Sí	1.0
10	Ejecución: Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020 elaborado.	9-Entregables Formales	21/10/2019		21/10/2019		Sí	1.0
11	Ejecución: Informe de justificación del recorte presupuestario al proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	22/10/2019		22/10/2019		Sí	1.0
12	Ejecución: Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado.	9-Entregables Formales	23/10/2019		23/10/2019		Sí	1.0
13	Ejecución: Plan operativo de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	1.0
14	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de noviembre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	05/11/2019		05/11/2019		Sí	1.0
15	Ejecución: Términos de referencia - TDR para la contratación de la auditoría financiera elaborado.	9-Entregables Formales	20/11/2019		20/11/2019		Sí	1.0
16	Ejecución: Certificaciones presupuestarias plurianuales	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	para los procesos de contratación elaborados y entregados.							
17	Ejecución: Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	2.0
18	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de diciembre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	05/12/2019		05/12/2019		Sí	1.0
19	Ejecución: Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR's de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años".	9-Entregables Formales	10/12/2019		10/12/2019		Sí	1.0
20	Ejecución: Términos de referencia - TDR de la Verificación Técnica elaborados.	9-Entregables Formales	10/12/2019		10/12/2019		Sí	1.0
21	Ejecución: Cotizaciones para la auditoría financiera recibidos.	9-Entregables Formales	15/12/2019		15/12/2019		Sí	1.0
22	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 6.1 millones en cumplimiento del DLI 3, aprobado.	5-Entregables Intermedios	06/01/2020		06/01/2020		Sí	2.0
23	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2019, aprobado.	9-Entregables Formales	10/01/2020		10/01/2020		Sí	2.0
24	Planeación: Programación de ingresos (DLI) y gastos (Asistencia Técnica) 2020, 2021 y 2022 del Proyecto de Red de Protección Social (BIRF-8946-EC) conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.	9-Entregables Formales	14/01/2020		14/01/2020		Sí	2.0
25	Planeación: Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.	Z - Compromiso Ministerial	16/01/2020		16/01/2020		Sí	2.0
26	Ejecución: Plan de Adquisiciones para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	11/02/2020		11/02/2020		Sí	2.0
27	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre 2019 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	14/02/2020		14/02/2020		Sí	2.0
28	Ejecución: Actualización del Manual Operativo del Proyecto - MOP, aprobado.	9-Entregables Formales	08/04/2020		08/04/2020		Sí	2.0
29	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 0.83	9-Entregables Formales	18/05/2020		18/05/2020		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	millones en cumplimiento del DLI 5, aprobado.							
30	Ejecución: Informe ejecutivo sobre la actualización del proyecto de inversión de Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.	9-Entregables Formales	22/07/2020		22/07/2020		Sí	1.0
31	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020		Sí	2.0
32	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública primer semestre 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.0
33	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre del 2020 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	14/08/2020		14/08/2020		Sí	2.0
34	Planificación: Plan Anual de la Política Pública 2021, presupuesto prorrogado, aprobado.	9-Entregables Formales	27/12/2020		27/12/2020		Sí	1.0
35	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública segundo semestre 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	28/12/2020		28/12/2020		Sí	2.0
36	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor máximo de USD 20 millones en cumplimiento del DLI 4, aprobado.	9-Entregables Formales	29/01/2021		29/01/2021		Sí	2.0
37	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 5 millones en cumplimiento del DLI 6, aprobado.	9-Entregables Formales	01/02/2021		01/02/2021		Sí	2.0
38	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre de 2020 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	15/02/2021		15/02/2021		Sí	2.0
39	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2021, aprobado.	9-Entregables Formales	16/07/2021		16/07/2021		Sí	1.0
40	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre de 2021 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	13/08/2021		13/08/2021		Sí	2.0
41	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2021, aprobado.	9-Entregables Formales	14/01/2022		14/01/2022		Sí	2.0
42	Ejecución: Primer producto consultores del equipo de gestión del proyecto	9-Entregables Formales	20/01/2022		20/01/2022		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
43	Ejecución: Segundo producto consultores del equipo de gestión	9-Entregables Formales	20/02/2022		20/02/2022		Sí	1.0
44	Ejecución: Tercer producto consultores del equipo de gestión	9-Entregables Formales	20/03/2022		20/03/2022		Sí	2.0
45	Ejecución: Cuarto producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/04/2022		20/04/2022		Sí	1.0
46	Ejecución: Quinto producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/05/2022		20/05/2022		Sí	1.0
47	Ejecución: Sexto producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/06/2022	20/06/2022			No	1.0
48	Ejecución: Cumplimiento de DLI verificado (producto final de consultoría)	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	2.0
49	Ejecución: Séptimo producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/07/2022	20/07/2022			No	1.0
50	Ejecución: Estados financieros período 2021 auditados	9-Entregables Formales	31/07/2022	31/07/2022			No	5.0
51	Ejecución:: Informe de seguimiento del proyecto correspondiente al 1er semestre de 2022	5-Entregables Intermedios	19/08/2022	19/08/2022			No	1.0
52	Ejecución: Octavo producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/08/2022	20/08/2022			No	1.0
53	Ejecución: Asistencia técnica de INEC para la operación estadística para seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición	5-Entregables Intermedios	31/08/2022	31/08/2022			No	1.0
54	Ejecución: Documentos habilitantes aprobados para la contratación del especialista en evaluación de impacto	5-Entregables Intermedios	15/09/2022	15/09/2022			No	2.0
55	Ejecución: Noveno producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/09/2022	20/09/2022			No	1.0
56	Ejecución: Contrato suscrito para la certificación de indicadores del MIES	5-Entregables Intermedios	15/10/2022	15/10/2022			No	2.0
57	Ejecución: Documentos habilitantes aprobados para la contratación de la elaboración de planes de pueblos y nacionalidades	5-Entregables Intermedios	15/10/2022	15/10/2022			No	2.0
58	Ejecución: Documentos habilitantes aprobados para la contratación de la evaluación de panel de la estrategia de inclusión económica	5-Entregables Intermedios	15/10/2022	15/10/2022			No	2.0
59	Ejecución: Décimo producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/10/2022	20/10/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
60	Ejecución: Contrato suscrito del especialista en evaluación de impacto	5-Entregables Intermedios	15/11/2022	15/11/2022			No	1.0
61	Ejecución: Documentos habilitantes aprobados para contratación de los consultores especialistas del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	15/11/2022	15/11/2022			No	2.0
62	Ejecución: Décimo primer producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/11/2022	20/11/2022			No	1.0
63	Ejecución: Décimo segundo producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/12/2022	20/12/2022			No	1.0
64	Ejecución: Contrato suscrito para la contratación de la evaluación de panel de la estrategia de inclusión económica	5-Entregables Intermedios	30/12/2022	30/12/2022			No	2.0
65	Ejecución: Contrato suscrito de la elaboración de planes de pueblos y nacionalidades	5-Entregables Intermedios	30/12/2022	30/12/2022			No	2.0
66	Ejecución: Contratos suscritos de los consultores especialistas del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	30/12/2022	30/12/2022			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,580,773.95 **
Costo Total:	180,486,200.00
Total Devengado:	610,842.86
% Costo Total Devengado:	0.34 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.34 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	6,998,529.34	81.67	0.00	6,998,611.01
Ppto. Externo Planeado	66,943,285.71	0.00	0.00	66,943,285.71
Ppto. Aprobado Inicial	11,852,837.54	2,000,000.00	0.00	13,852,837.54
Ppto. Codificado	7,287,168.85	565,389.91	0.00	7,852,558.76
Ppto. Comprometido	492,866.28	1,434,610.09	0.00	1,927,476.37
Planeado - Codificado (2022)		-565,308.24		
Programado a Devengar	74,248,569.72	2,000,000.00	0.00	76,248,569.72
Ppto. Devengado	580,773.95	30,068.91	0.00	610,842.86
Pagado Real	423,672.37	0.00	0.00	423,672.37
Estimado a fin de año	* 580,773.95	0.00	0.00	580,773.95
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	73,667,795.77	2,000,000.00	0.00	75,667,795.77
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.78 %	1.50 %	0.00 %	0.80 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

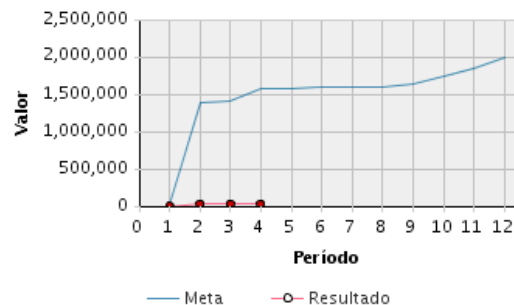

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	8,568.08	0.00	8,568.08	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,370,415.96	30,068.91	1,378,984.04	30,068.91	2.18 %		1.50 %
Mar	24,805.87	0.00	1,403,789.91	30,068.91	2.14 %		1.50 %
Abr	164,470.41	0.00	1,568,260.32	30,068.91	1.92 %		1.50 %
May	8,568.08		1,576,828.40				
Jun	8,568.08		1,585,396.48				
Jul	8,568.08		1,593,964.56				
Ago	8,568.08		1,602,532.64				
Sep	42,852.12		1,645,384.76				
Oct	102,852.12		1,748,236.88				
Nov	102,852.12		1,851,089.00				
Dic	148,911.00		2,000,000.00				
Total	2,000,000.00	30,068.91					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la efectividad en la prestación de los servicios financieros y no financieros a los usuarios del BDH, BDHV y Pensiones MEDIANTE la implementación de acuerdos interinstitucionales generados con carácter popular y solidario

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta resolutive suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US\$ 350 millones.	2._Acta_Resolutiva_Nro_19_del_2019-07-10.pdf	24/12/2019
2	Acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US\$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	3._Acuerdo_de_Pre	24/12/2019
3	Acuerdo Ministerial emitido por el MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	6._Acuerdo_Ministerial_Nro._128_MOP.pdf	24/12/2019
4	Acuerdo Ministerial emitido por la Ministra del MIES para calificar como emblemático al proyecto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".	7._Acuerdo_Ministerial_Nro._125_Proj_Embl.pdf	24/12/2019
5	Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados.	14._Anexo_2_-_Certificacio	24/12/2019
6	Cotizaciones para la auditoría financiera recibidas	Cotizaciones_Auditori	24/12/2019
7	Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR's de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años".	Informe_1er_Reembolso_BIRF-8946.pdf	24/12/2019
8	Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	Incremento_presupuestario_del_proyecto_DISIES.pdf	24/12/2019
9	Informe de cumplimiento del DLI 4, aprobado.	INFORME_DE_CUMPLIMIENTO_DLI4_DLI9_-_210120.pdf	07/01/2022
10	Informe de cumplimiento del DLI 6, aprobado.	INFORME_DE_CUMPLIMIENTO_DLI_6.pdf	07/01/2022
11	Informe de justificación del recorte presupuestario al proyecto DISIES.	Justificacio	24/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	Informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Presupuestaria del 2do semestre de 2019	Informe_Seg_y_Eval_Presupuestaria.pdf	12/02/2020
13	Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2021	4_ Informe_Semestral_ene-jun_2021.pdf	07/01/2022
14	Informe de seguimiento y evaluación presupuestaria del primer semestre 2020	Informe_de_Seguimiento_y_Evaluacio	07/08/2020
15	Informe del Proyecto Noviembre 2021	Informe_Proyecto_y_contrato_de_pre	10/01/2022
16	Informe del Proyecto Octubre 2021	Informe_Proyecto_y_contrato_de_préstamo_Octubre_2021-signed_(1).pdf	10/01/2022
17	Informe Desembolso DLI 3 Aprobado por el Banco Mundial	Informe_Desembolso_DLI_3_Aprobado_BM.zip	12/02/2020
18	Informe Desembolso DLI 5 Aprobado por el Banco Mundial	Informe_Desembolso_DLI_5_Aprobado_BM.zip	08/06/2020
19	Informe financiero del primer semestre de 2021	Informe_Financiero_1er_semestre_2021_Proyecto_BIRF_8906-EC-MIES-signed.pdf	06/01/2022
20	Informe financiero del segundo semestre de 2020	Informe_Financiero_2do_semestre_2020_Proyecto_BIRF_8906-EC.pdf	06/01/2022
21	Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre del 2020	Informe_financiero_interino_IFR_1er_semestre_del_2020.zip	25/09/2020
22	Informe Financiero Interino IFR del 2do Semestre de 2019	Informe_Financiero_Interino_IFR_2do_Sem_2019.zip	23/03/2020
23	INFORME MENSUAL CONSULTORES ENERO 2022	informe_mensual_de_actividades_#1_gc-signed.pdf	17/02/2022
24	INFORME MENSUAL CONSULTORES ENERO 2022 (2)	informe_mensual_enero_2022-signed.pdf	17/02/2022
25	INFORME MENSUAL CONSULTORES ENERO 2022 (3)	informe_mensual_enero_2022-signed0681103001642730844.pdf	17/02/2022
26	INFORME MENSUAL CONSULTORES ENERO 2022 (4)	producto_enero_2022-signed.pdf	17/02/2022
27	Informe Técnico del Proyecto Red de Protección Social en Aplicación del Acuerdo Ministerial 001	Informe_Te	12/02/2020
28	Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.	Informe_Te	12/02/2020
29	Manual Operativo del Proyecto - MOP 2020-04-08	Manual_Operativo_del_Proyecto_Actualizado_al_08_Abril_2020.pdf	28/05/2020
30	Plan Anual de la Política Pública ejecutado en el primer semestre 2020	PAPP_Ejecutado_Primer_Semestre_2020.zip	07/08/2020
31	Plan anual de la política pública - PAPP de diciembre de 2019	PAPP_2019-12-04.xls	24/12/2019
32	Plan anual de la política pública - PAPP de noviembre de 2019	PAPP_2019-11-05.xls	24/12/2019
33	Plan anual de la política pública - PAPP de octubre de 2019	PAPP_2019-10-02.xls	24/12/2019
34	Plan Anual de la Política Pública 2021	_PAPP_2021_Proyecto_DISIES.zip	28/12/2020
35	Plan Anual de la Política Pública ejecutado segundo semestre 2020	PAPP_Ejecutado_Segundo_Semestre_2020.zip	28/12/2020
36	Plan de Adquisiciones Banco Mundial 2020/02/11	Plan_de_Adquisiciones_para_el_Banco_Mundial_aprobado_2020.pdf	24/03/2020
37	Plan de Adquisiciones elaborado.	Plan_de_Adquisiciones_2019-09-21.xlsx	24/12/2019
38	Plan operativo anual de los proyectos RSS y DISIES	Plan_Operativo_Anual_RSS-DISIES.xlsx	24/12/2019
39	Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto DISIES.	Proforma_Presupuestaria_2020.xls	24/12/2019
40	Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto.	Programacio	24/12/2019
41	Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020.	Reporte_Ajuste_Techos_Presupuestarios_2020_.xlsx	24/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
42	Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado.	Reporte_de_Gasto_Retroactivo_y_no_Retroactivo_de_las_Misiones_2019	24/12/2019
43	Términos de referencia - TDR para la auditoría Técnica elaborados.	TDR_Auditori	24/12/2019
44	Términos de referencia - TDR para la verificación técnica elaborados.	TDR_Verificacio	24/12/2019
45	Términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.	TDR_de_los_Especialistas.pdf	24/12/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Naranjo Borja, María Antonieta	Gerente de Proyecto	Gerente Proyecto "Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigido a usuarios del MIES"	mantonietanaranjo@inclusion.gob.ec	
Zambrano, María de Los Angeles	Lider del proyecto	Directora de Empredimientos	mdelosangeles.zambrano@inclusion.gob.ec	
