

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social

Subsecretaría de Discapacidades

Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

PROYECTO: K008 MIES - Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidad y sus Familias para la Promoción y Exigibilidad de Derechos GERENCIA.

Líder del Proyecto:	Romo Pozo, Rosa Verónica (rosa.romo@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vela Yépez, María Soledad	Programas Relacionados:	AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Patiño Guzmán, Segundo Yobani	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	3.34
CUP:	102800000.740.5492	TIR:	27.10 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	17,012,778.32
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,715,217.51
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	20/07/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Vela Yépez, María Soledad	Fecha del siguiente hito:	01/08/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Se considera personas con discapacidad a quienes presentan una o varias condiciones biológicas, físicas o intelectuales, distinta a la media, condición que conduce a su exclusión social. La demanda efectiva del proyecto está enmarcada a personas que se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza que están recibiendo pensión asistencial. Serán beneficiarios también las personas con discapacidad que forman parte de las Federaciones Nacionales, a partir de las cuales cuentan con espacios de capacitación, formación y contención.

PRODUCTO: Se atenderá de conformidad con las tres modalidades:

- Cenros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad que se encargan de potenciar el desarrollo de habilidades a través de un trabajo conjunto con la familia y comunidad.
- Centros de referencia y acogida inclusivos que brindan atención especial y especializada a personas con discapacidad en condiciones de abandono y/o carente de referente familiar en situación de riesgo que requieren acogimiento institucional de forma emergente, temporal o permanente.
- Atención en el hogar y la comunidad, servicio orientado para quienes por su grado de discapacidad-intelectual, física y/o sensorial así como por su ubicación geográfica no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios.

DATOS GENERALES

Descripción

La ejecución del proyecto viene dándose mediante la firma de convenios de cooperación con las organizaciones sociales, Gobiernos Autonomos Descentralizados.

LÍNEA BASE: 22.349 personas con discapacidad en situación crítica

OBJETIVO GENERAL: Ampliar las capacidades de las personas con discapacidad en condiciones críticas y las de sus familias para la promoción y exigibilidad de sus derechos, a través de tres modalidades de atención.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.Incrementar servicios de cuidado y desarrollo integral para las personas con discapacidad
- 2.Incrementar y Fortalecer la respuesta institucional para la atención a las personas con discapacidad
- 3.Mejorar el equipamiento de los servicios de cuidado y desarrollo integral de las personas con discapacidad
- 4.Mejorar la infraestructura de los servicios de cuidado y desarrollo integral de las personas con discapacidad
- 5.Implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y control a la calidad de los servicios.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Contribuir a la construcción de un sistema integral de servicios adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad que aporte a mejorar su calidad de vida.

Elevar los niveles de autonomía e independencia de las personas con discapacidad, para su inclusión social y económica.

Tipo de Beneficiario

Las personas con discapacidad en situación crítica, población considerada de atención prioritaria por parte del estado, conformado por los sectores sociales y grupos etarios de la población: niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

Así como el fortalecimiento institucional de las Federaciones Nacionales de personas con discapacidad.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 6 años a partir del 2011.

COSTO: \$77,730,400.00

ALCANCE: El proyecto tiene una cobertura a nivel nacional, atenderá a 116.933 personas, por los 7 años, con discapacidad en situación crítica para lo que necesita capacitar a 855 operadores de los servicios en el modelo de atención integral del MIES a personas con discapacidad.

RECURSOS: equipos multidisciplinarios para la atención domiciliaria capacitados, movilización y accesibilidad geográfica, disponibilidad de locales y equipos para la realización de talleres.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 84.39 %

Fecha de Inicio: 01/01/2011

Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

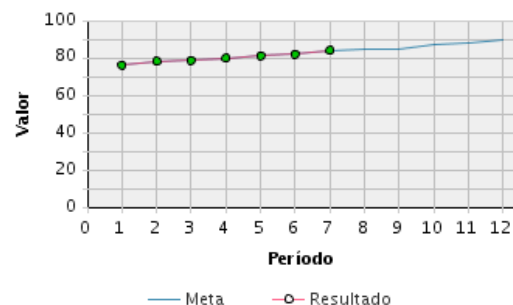

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	76 %	78 %	78 %	80 %	81 %	82 %	84 %	85 %	85 %	87 %	88 %	90 %
	Avance real acumulado											
	76 %	78 %	78 %	80 %	81 %	82 %	84 %					

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Estado												
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2018: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidaciones y suscripción de actas de finiquito de convenios: 2014 (1) convenio pendiente de liquidar corresponde al 0.58% , 2015 (1) convenio pendiente de liquidar corresponde al 0.42%, 2016, se encuentran (1) convenios pendientes de liquidación corresponden al 0,45%, 2017 se encuentran (5) convenios pendientes de liquidar correspondiente al 2,25%. Seguimiento a los desembolsos de los 234 convenios suscritos por la Gerencia en el año 2018. Con corte al 30 de junio del 2018 en el proyecto cuenta con un presupuesto de \$10.644.478,22 del cual se ha devengado a la fecha \$4.909.176,91 lo que representa un 46,12%.	Vela Yépez, María Soledad	04/07/2018 - 01:06 PM
MAYO 2018: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidaciones y suscripción de actas de finiquito de convenios: 2016, se encuentran (1) convenios pendientes de liquidación corresponden al 0,45%, 2017 se encuentran (6) convenios pendientes de liquidar correspondiente al 27,16%. Seguimiento a los desembolsos de los 234 convenios suscritos por la Gerencia en el año 2018. Con corte al 31 de mayo del 2018 en el proyecto cuenta con un presupuesto de \$10.644.478,22 del cual se ha devengado a la fecha \$4.274.766,99 lo que representa un 40,15%.	Vela Yépez, María Soledad	08/06/2018 - 04:49 PM
ABRIL 2018: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidaciones y suscripción de actas de finiquito de convenios: 2016, se encuentran (1) convenios pendientes de liquidación corresponden al 0,45%, 2017 se encuentran (7) convenios pendientes de liquidar correspondiente al 3,16%. Seguimiento a los desembolsos de los 234 convenios suscritos por la Gerencia en el año 2018. Con corte al 30 de ABRIL del 2018 en el proyecto cuenta con un presupuesto de \$10.644.478,22 del cual se ha devengado a la fecha \$2.802.871,30 lo que representa un 26,33%.	Patiño Guzmán, Segundo Yobani	10/05/2018 - 03:55 PM
MARZO 2018: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidaciones y suscripción de actas de finiquito de convenios: 2016, se encuentran (1) convenios pendientes de liquidación corresponden al 0,45%, 2017 se encuentran (7) convenios pendientes de liquidar correspondiente al 3,16%. Seguimiento a los desembolsos de los 234 convenios suscritos por la Gerencia en el año 2018. Con corte al 28 de febrero del 2018 en el proyecto cuenta con un presupuesto de \$10.870.943,86 del cual se ha devengado a la fecha \$2.410.319,30 lo que representa un 22,17%.	Patiño Guzmán, Segundo Yobani	10/05/2018 - 03:42 PM
FEBRERO 2018: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidaciones y suscripción de actas de finiquito de convenios. 2015, se encuentra el 100% de convenios liquidados, 2016, se encuentran (1) convenios pendientes de liquidación corresponden al 0,45%, 2017 se encuentran (7) convenios pendientes de liquidar correspondiente al 3,16%. Seguimiento a los desembolsos de los 234 convenios suscritos por la Gerencia en el año 2018. Con corte al 28 de febrero del 2018 en el proyecto cuenta con un presupuesto de \$10.870.943,86 del cual se ha devengado a la fecha \$145.524,28 lo que representa un 1,34%.	Patiño Guzmán, Segundo Yobani	10/05/2018 - 03:42 PM
ENERO 2018: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidaciones y suscripción de actas de finiquito de convenios. 2015, se encuentra el 100% de convenios liquidados, 2016, se encuentran (6) convenios pendientes de liquidación corresponden al 2.73%, 2017 se encuentran (206) convenios pendientes de liquidar correspondiente al 92.79%. Seguimiento a los desembolsos de los 234 convenios suscritos por la Gerencia en el año 2018. Con corte al 31 de enero del 2018 en el proyecto cuenta con un presupuesto de \$10.870.943,96 del cual se ha devengado a la fecha \$31.076,83 lo que representa un 0.29%. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0036-OF del 04 de enero de 2018, en su ANEXO 1, menciona que el proyecto de Ampliación de Capacidades de las personas con Discapacidad para la promoción y exigibilidad de sus derechos, cuenta con una reprogramación para el período 2011-2019.	Patiño Guzmán, Segundo Yobani	10/05/2018 - 03:34 PM
DICIEMBRE 2017: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidaciones y suscripción de actas de finiquito de convenios 2015, se encuentra (1)convenios pendiente de liquidación, correspondiente al 1%, convenios 2016 suscritos por 6 y 12 meses, se encuentran (7)convenios pendientes de liquidación corresponden al 3.19% Seguimiento a los desembolsos de los 221 convenios suscritos por la Gerencia. Con corte al 31 de diciembre el proyecto cuenta con un presupuesto de \$10.383.652,16 del cual se ha devengado a la fecha \$9.762.846,76 lo que representa un 95%.	Vela Yépez, María Soledad	10/05/2018 - 12:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2017: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidación y suscripción de actas de finiquito de convenios 2015, se encuentra (1) convenios pendientes de liquidación, corresponde al 1%, convenios del 2016 suscritos por 6 y 12 meses, se encuentran (7) convenios pendientes de liquidación corresponde al 3,19%. Seguimiento a los desembolsos de los 221 convenios suscritos por la Gerencia. Con corte al 30 de noviembre el proyecto cuenta con un presupuesto de \$10.383.652,16 del cual se ha devengado a la fecha de \$ 8.864.760,30 lo que representa un 85.37% respecto a la ejecución presupuestaria.	Coka Flores, Diego Fernando	19/12/2017 - 10:57 AM
OCTUBRE 2017: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidación y suscripción de actas de finiquito de convenios 2015, se encuentra (1) convenios pendientes de liquidación, corresponde al 1%, convenios del 2016 suscritos por 6 y 12 meses, se encuentran (8) convenios pendientes de liquidación corresponde al 3,65%, no ha existido avance en la liquidación de convenios ya que han existido observaciones en la información entregada por los cooperantes. Seguimiento a los desembolsos de los 221 convenios suscritos por la Gerencia. Con corte al 31 de octubre el proyecto cuenta con un presupuesto de \$10.385.188,12 del cual se ha devengado a la fecha de \$ 8.170.653,95 lo que representa un 70.56% respecto a la ejecución presupuestaria.	Coka Flores, Diego Fernando	19/12/2017 - 10:53 AM
SEPTIEMBRE 2017: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidación y suscripción de actas de finiquito de convenios 2015, se encuentra (1) convenios pendientes de liquidación, corresponde al 1%, convenios del 2016 suscritos por 6 y 12 meses, se encuentran (8) convenios pendientes de liquidación corresponde al 3,65%, no ha existido avance en la liquidación de convenios ya que han existido observaciones en la información entregada por los cooperantes. Seguimiento a los desembolsos de los 221 convenios suscritos por la Gerencia.	Coka Flores, Diego Fernando	19/12/2017 - 10:50 AM
AGOSTO 2017: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidación y suscripción de actas de finiquito de convenios 2015, se encuentra (1) convenios pendientes de liquidación, corresponde al 1%, convenios del 2016 suscritos por 6 y 12 meses, se encuentran (8) convenios pendientes de liquidación corresponde al 3,65%. Seguimiento a los desembolsos de los 221 convenios suscritos por la Gerencia.	Coka Flores, Diego Fernando	19/12/2017 - 10:47 AM
JULIO 2017: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidación y suscripción de actas de finiquito de convenios 2015, se encuentra (2) convenios pendientes de liquidación, corresponde al 1%, convenios del 2016 suscritos por 6 y 12 meses, se encuentran (18) convenios pendientes de liquidación corresponde al 8.3%. Seguimiento y monitoreo al proceso de suscripción de convenios 2017, (221) convenios de (221) convenios planificados, representa 100% Se han suscrito los convenios, solicitud de transferencia de recursos, en proceso de aprobación para desembolso a las Federaciones para revisión y aprobación de la máxima autoridad.	Coka Flores, Diego Fernando	19/12/2017 - 10:38 AM
JUNIO 2017: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidación y suscripción de actas de finiquito de convenios 2015, se encuentra (2) convenios pendientes de liquidación, corresponde al 1%, convenios del 2016 suscritos por 6 y 12 meses, se encuentran (20) convenios pendientes de liquidación corresponde al 9%. Seguimiento y monitoreo al proceso de suscripción de convenios 2017, (221) convenios de (221) convenios planificados, representa 100% Se han suscrito los convenios, solicitud de transferencia de recursos, en proceso de aprobación para desembolso a las Federaciones para revisión y aprobación de la máxima autoridad.	Coka Flores, Diego Fernando	19/12/2017 - 10:38 AM
MAYO 2017: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidación y suscripción de actas de finiquito de convenios 2015, se encuentra (4) convenios pendientes de liquidación, corresponde al 2%, convenios del 2016 suscritos por 6 y 12 meses, se encuentran (40) convenios pendientes de liquidación, corresponde al 18%. Seguimiento y monitoreo al proceso de suscripción de convenios 2017, se encuentra suscritos (217) convenios de (221), representa 98% Se han suscrito los convenios, solicitud de transferencia de recursos, en proceso de aprobación para desembolso a las Federaciones para revisión y aprobación de la máxima autoridad.	Salinas, Karina	01/06/2017 - 03:42 PM
MARZO 2017: Seguimiento y monitoreo permanente al estado de liquidación y suscripción de actas de finiquito de convenios 2015, se encuentra (5) convenios pendientes de liquidación, lo que representa el 2%; y, convenios del 2016 suscritos por 6 y 12 meses, se encuentran (112) convenios pendientes de liquidación, lo que representa el 51,14%. Seguimiento y monitoreo al proceso de suscripción de convenios 2017, se encuentra suscritos (51) convenios de (221), lo que representa el 23,08%. Se han remitido los informes técnicos previos a la suscripción de convenios con las Federaciones para revisión y aprobación de la máxima autoridad.	Salinas, Karina	05/04/2017 - 10:55 AM
FEBRERO 2017: Durante el mes de febrero se continuó con el seguimiento para la verificación del estado de liquidación y suscripción de actas de finiquito de convenios 2015, así como de los convenios suscritos por 6 y 12 meses que corresponden al año 2016. Igualmente se está realizando el seguimiento al envío de avales al Ministerio de Finanzas. Se asignó recursos para la firma de convenios con las federaciones nacionales de y para personas con discapacidad, recursos que se encuentran contemplados en los respectivos PAPP y PAI.	Salinas, Karina	06/03/2017 - 11:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2017: Elaboración de Reforma de Disminución de Presupuesto al PAPP 2016 conforme se detalla en el comprobante de modificación presupuestaria Nro. 2987 de fecha 30 de diciembre del 2016, por un monto de (\$ 739.643,14) en el ítem presupuestario 78, codificado anterior (\$ 6.036.706,67), nuevo codificado (\$ 5.297.063,53). PAPP aprobado por la señora Ministra mediante Acuerdo Ministerial 023 de 6 de enero de 2017. Revisión y validación del techo, presupuesto y cobertura de los servicios sociales 2017.	Salinas, Karina	06/03/2017 - 11:28 AM
Diciembre: monitoreo liquidación de convenios 2015 y suscritos por 6 meses 2016. Actualización PAPP	Salinas, Karina	10/01/2017 - 03:59 PM
Noviembre: Apoyo y seguimiento reformas presupuestarias en territorio	Salinas, Karina	05/12/2016 - 09:51 AM
Octubre: seguimiento reformas planteadas a nivel nacional	Salinas, Karina	07/11/2016 - 10:57 AM
Septiembre 2016: 1.- seguimiento a reformas presupuestarias a nivel nacional. 2.- Visita de observación in situ albergues Esmeraldas y Manabí. 3.- Elaboración de manuales relacionados con la emergencia nacional: Protocolo de Albergues	Salinas, Karina	07/11/2016 - 10:57 AM
Agosto: Equipo de la gerencia lidera la elaboración de documentos relacionados con la emergencia nacional.	Torres León, Irina Xiomar	05/10/2016 - 10:22 AM
Septiembre: La Gerencia conforma y lidera los equipos para elaborar los documentos relacionados con la emergencia nacional.	Torres León, Irina Xiomar	06/09/2016 - 05:18 PM
Julio 2016: se continua con la priorización al seguimiento al Ministerio de Finanzas para la acreditación a cooperantes. La Gerencia conforma y lidera los equipos para elaborar los documentos relacionados con la emergencia nacional. Con respecto a los siguientes hitos es importante indicar que: El hito 62 no se cumple por tema presupuestario. Los hitos 65 y 67 relacionados con las federaciones nacionales de y para personas con discapacidad no se ha cumplido en razón de requerimientos prioritarios por la emergencia nacional (Quipux MIES-SD-2016-145, 146, 148 Y 149-O de 29 abril de 2016). Con relación al hito 68, de igual manera, por temas de la emergencia nacional se ha visto posergado y se ha realizado una nueva programación para la realización de las capacitaciones (Quipux NUES-SD-2016-0197-M de 24 de mayo de 2016).	Torres León, Irina Xiomar	05/07/2016 - 09:04 AM
Junio 2016: se priorizó el seguimiento al Ministerio de Finanzas para la acreditación a cooperantes. Adicionalmente el equipo técnico dio apoyo in situ Portoviejo y Esmeraldas por tema del terremoto del 16 de abril de 2016.	Torres León, Irina Xiomar	21/06/2016 - 11:10 AM
Mayo 2016: El hito 62 no se cumple por tema presupuestario. Los hitos 65 y 67 relacionados con las federaciones nacionales de y para personas con discapacidad no se ha cumplido en razón de requerimientos prioritarios por la emergencia nacional (Quipux MIES-SD-2016-145, 146, 148 Y 149-O de 29 abril de 2016). Con relación al hito 68, de igual manera, por temas de la emergencia nacional se ha visto posergado y se ha realizado una nueva programación para la realización de las capacitaciones (Quipux NUES-SD-2016-0197-M de 24 de mayo de 2016).	Torres León, Irina Xiomar	03/06/2016 - 10:17 AM
Mayo 2016: Seguimiento desembolsos Ministerio de Finanzas	Torres León, Irina Xiomar	03/06/2016 - 09:31 AM
Mayo: Elaboración informe cuatrimestral para la máxima autoridad. Revisión y elaboración ficha de programación para Planificación según pedido de SENP LADES. Verificación de segundo desembolso a cooperantes.	Torres León, Irina Xiomar	11/05/2016 - 10:18 AM
Abril: Consolidación de información y elaboración de cuadros para solicitud de aval al Ministerio de Finanzas.	Torres León, Irina Xiomar	11/05/2016 - 10:16 AM
Marzo: El hito 62 no se cumple por tema presupuestario; Contratación del servicio de logística para las mesas temáticas de seguimiento, presentado.	Torres León, Irina Xiomar	06/04/2016 - 07:22 PM
Marzo: Se consolida la información para remitir semanalmente al Viceministerio a fin de que se solicite el aval al Ministerio de Finanzas para los convenios tanto de gasto corriente como de inversión. Se realiza seguimiento al primer desembolso de cooperantes. Se mantiene reunión con la Dirección Financiera para lineamientos sobre partidas 2015 y la correspondiente reforma integral. Se remite fichas de seguimiento del proyecto de inversión a Planificación.	Torres León, Irina Xiomar	06/04/2016 - 06:44 PM
Febrero: De conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro. 009 de 18 de enero de 2016 "Directrices para la gestión de gasto público no permanente" se procede a consolidar la información para remitir	Torres León, Irina Xiomar	08/03/2016 - 10:15 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
semanalmente al Viceministerio a fin de que se solicite el aval al Ministerio de Finanzas para convenios tanto de gasto corriente como de inversión. Revisión y actualización RUC cooperantes registrados en el SIIMIES, 2016. Consolidación pagos pendientes 2015 partidas, 71, 73 y 78 - 51, 53 y 58.		
Enero: 1. Levantamiento y confirmación convenios a nivel Distrital 2. Acompañamiento firma de convenios en territorio 3. Acompañamiento a Proyectos de las Federaciones Nacionales de y para personas con Discapacidad. 4. Seguimiento actualización hitos ficha GPR ya trabajados con la Unidad Metodológica del GPR 5. Seguimiento armonización PAPP	Torres León, Irina Xiomar	10/02/2016 - 08:28 AM
Diciembre: Actualización PAPP al 16 de diciembre de 2015. Seguimiento segundo desembolso Cuenca. Seguimiento cierre convenios 2015. Informe anual de gestión del Proyecto.	Torres León, Irina Xiomar	04/01/2016 - 12:19 PM
Noviembre: Se valida el proceso de microplanificación (techos cobertura y presupuestos) con cada distrito, para establecer los convenios que serán financiados con el proyecto en el año 2016.	Torres León, Irina Xiomar	02/12/2015 - 09:21 AM
Octubre: Apoyar proceso ficha de costos para determinar la microplanificación que se cubrirá con recursos del proyecto. Lineamientos para firmas de convenios, revisión nuevo formato de convenio 2016.	Torres León, Irina Xiomar	04/11/2015 - 09:22 AM
Septiembre: transferencia de recursos por segundo desembolso a cooperantes completada al 96%.	Torres León, Irina Xiomar	02/10/2015 - 10:06 AM
Septiembre: Transferencia de recursos por segundo desembolso a cooperantes completada al 100%	Torres León, Irina Xiomar	01/10/2015 - 09:26 AM
Agosto: Transferencia de recursos correspondiente al segundo desembolso a cooperantes por convenios suscritos con el MIES.	Torres León, Irina Xiomar	04/09/2015 - 03:19 PM
Julio: Liquidaciones del primer desembolso para realizar transferencia por segundo desembolso por convenios suscritos entre el MIES y cooperantes.	Torres León, Irina Xiomar	03/08/2015 - 08:42 AM
Junio: Evaluación del presupuesto para el segundo semestre. Se solicitó la reforma presupuestaria para redistribución de presupuesto.	Torres León, Irina Xiomar	02/07/2015 - 09:56 AM
Mayo: Aprobación de reforma integral al PAPP 2015 del Proyecto Emblemático de Discapacidades por saldos disponibles.	Torres León, Irina Xiomar	01/06/2015 - 12:09 PM
Abril: Ajuste y actualización metas y coberturas a nivel nacional de conformidad con microplanificación.	Torres León, Irina Xiomar	04/05/2015 - 08:33 AM
Marzo: Distribución de techos presupuestarios y cobertura a distritos	Torres León, Irina Xiomar	01/04/2015 - 03:45 PM
FEBRERO 2015: En territorio los convenios se encuentran en proceso de liquidación y cierre, es decir están en su etapa final	Torres León, Irina Xiomar	05/03/2015 - 02:52 PM
ENERO 2015: 1. Levantamiento de la información del presupuesto a nivel Distrital 2. Acompañamiento firma de convenios en territorio 3. Acompañamiento a Proyectos de las Federaciones Nacionales de y para personas con Discapacidad. 4. Seguimiento actualización hitos ficha GPR ya trabajados con la Unidad Metodológica del GPR	Torres León, Irina Xiomar	05/03/2015 - 02:51 PM
DICIEMBRE: Acompañamiento liquidación y cierre de Convenios suscritos con las Federaciones Nacionales y convenios suscritos con cooperantes.	Torres León, Irina Xiomar	05/01/2015 - 03:26 PM
NOVIEMBRE: Proceso de contratación para impresión y reproducción de Productos Educativos para la Subsecretaría de Discapacidades, Dirección de Prestación de Servicios, Dirección de Inclusión social, Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y Servicios de Administración Directa. Se llegará con el material a toda la comunidad que está vinculada a la gestión del ministerio a nivel nacional, especialmente en el marco de los eventos a realizarse por el 3 de Diciembre "Día de la Reivindicación de derechos de las personas con discapacidad".	Torres León, Irina Xiomar	04/12/2014 - 11:43 AM
OCTUBRE 2014: Se actualiza el proyecto y se postula de conformidad con lo solicitado por la Coordinación General de Planificación incluyendo el componente para MIDUVI	Torres León, Irina Xiomar	26/11/2014 - 01:52 PM
AGOSTO 2014: Mediante memorando Nro. MIES-SD-GPD-2014-0106-M, de 8 de agosto de 2014, se remite el nuevo Proyecto "Ampliación de Capacidades de las personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos" en el que se incluye la actividad Joaquín Gallegos Lara, con su respectivo anexo financiero. Proyecto que fue subido al SIPeIP. Se solicita a la Unidad de GPR realice gestiones para actualizar la ejecución de Distritos GPR-e-Sigef.	Torres León, Irina Xiomar	08/09/2014 - 09:36 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2014: Mediante memorando Nro. MIES-CGP-2014-0606-M, de 10 de julio de 2014, emite la aprobación de la reforma presupuestaria Nro. MIES-CGP-DPI-RP-0028 de 7 de julio de 2014 denominado "Ampliación de capacidades de las personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos" \$ 80.897,16. En el mes de julio el presupuesto es de \$ 377.817,00, en ese mes se realizó una reforma presupuestaria incrementando el presupuesto de planta Central a \$409,429, El 16 de julio hubo un recorte presupuestario por parte de Ministerio de Finanzas, en la Gerencia el recorte fue de 13,807,00, por lo tanto el nuevo codificado es de \$395,622,84.	Torres León, Irina Xiomar	08/09/2014 - 09:36 AM
JUNIO 2014: Actualización del Proyecto de Inversión en la nueva metodología SENPLADES para actualizar el Plan Anual de Inversión. Se postuló el proyecto para el año 2015. Acreditación primer desembolso para fortalecer gestión institucional de las Federaciones Nacionales.	Quisintuña Telenchana, María Josefa	04/08/2014 - 09:56 AM
MAYO 2014: Actualización del Proyecto de Inversión en la nueva metodología SENPLADES para actualizar el Plan Anual de Inversión y postular el proyecto para el año 2015.	Ruiz Herrera, Andrea Estefanía	09/06/2014 - 04:33 PM
ABRIL 2014: Al momento el proyecto presenta un avance del 66%, con una ejecución presupuestaria del 48% (\$5.771.061,74). Se solicitó reforma presupuestaria para el buen funcionamiento del Servicio Directo RACAR en la Coordinación Zonal 6 (Cuenca). Se realizaron certificaciones presupuestarias para la firma de convenios de fortalecimiento a las Federaciones Nacionales con el fin de desarrollar proyectos de capacitación, sensibilización, emprendimientos.	Torres León, Irina Xiomar	06/05/2014 - 10:16 AM
MARZO 2014: Se ha armonizado el PAPP 2014 de acuerdo al presupuesto asignado en ESIGEF, se ha realizado un incremento de 185.000 para cubrir convenios con Federaciones Nacionales y el talento humano de la gerencia. La ejecución presupuestaria se encuentra en el 48%. Se considera necesario definir claramente el proceso de liquidación mensual estandarizado para todas las subsecretarías, realizar visitas de monitoreo para validar coberturas y clarificar el modelo de gestión territorial.	Cruz Puente, Rita Jeaneth	04/04/2014 - 12:38 PM
FEBRERO 2014: Inicialmente se contaba con un presupuesto aprobado de \$13'492.417,21, del cual se recibió únicamente \$11'900.000. Se ajustó el PAPP 2014 a este valor y se priorizó para la firma de convenios. Posteriormente, se dió un incremento en el Proyecto de \$885.000. En este proceso, se pudo visibilizar que los equipos administrativos financieros en distritos, no estaban lo suficientemente capacitados para realizar transferencias, vinculaciones y demás para el pago de convenios. En este periodo se ha alcanzado una ejecución del 46% del presupuesto asignado. Se encuentra en construcción la ficha estandarizada del proyecto 'para las 40 direcciones distritales, la cual se consolidará a nivel de programa y será administrada desde la gerencia del proyecto.	Cruz Puente, Rita Jeaneth	08/03/2014 - 08:25 AM
ENERO 2014: El presupuesto necesario para la ejecución del proyecto de inversión fue aprobado y entregado en planta central y las coordinaciones zonales respectivas. Se concluyó con la firma de convenios para la atención a personas con discapacidad en tres modalidades a nivel nacional para el periodo 2014. Se está realizando el levantamiento de la base de datos de los mismos. Al momento se han firmado 171 convenios con una cobertura de 22.052 personas con discapacidad, de los cuales 3 pertenecen a la modalidad de Acogimiento, 13 a Centro Diurno y 155 a Atención en el Hogar y la Comunidad.	Cruz Puente, Rita Jeaneth	06/02/2014 - 08:55 AM
DICIEMBRE 2013: INFORME EJECUTIVO PROYECTO DE INVERSIÓN. MES DE DICIEMBRE 2013. El presupuesto ejecutado de USD 2.981.265,36, hasta el momento es de 96.64% lo que equivale a USD 2'881.215,29 Los convenios suscritos se encuentran en proceso de liquidación, en su mayoría están actualizando sus Proyectos para el 2014, según directrices de Fondos Concursables, para firma de convenios. Se actualiza PAPP 2014 del Proyecto, conforme a cuadro agregado como Archivo Anexo.	Cruz Puente, Rita Jeaneth	03/01/2014 - 08:56 AM
NOVIEMBRE 2013: El presupuesto ejecutado hasta el momento es de 84.59% que equivale a USD 2.521.748,04. Se cuenta con la asignación presupuestaria de USD 228.831,15, para suscribir convenios de octubre a diciembre, con entidades que han venido prestando sus servicios a personas con discapacidad. Se actualiza el PAPP 2013, conforme a la asignación enviada a zonas, el total del monto del Proyecto es de USD 2.981.265,36. Los convenios suscritos entre julio a diciembre de 2013, están en proceso de liquidación del primer desembolso o en proceso de entrega de segundos desembolsos; se ha socializado los lineamientos para la liquidación 2013.	Cruz Puente, Rita Jeaneth	03/01/2014 - 08:53 AM
OCTUBRE 2013: Los convenios suscritos entre enero a julio 2013, están en proceso de renovación.	Cruz Puente, Rita Jeaneth	01/11/2013 - 02:27 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El presupuesto ejecutado hasta el momento es de 78,75% que equivale a USD 1.610.760.90, Del monto total requerido para la suscripción de convenios del segundo semestre. Se ha solicitado \$ 249.247,00 para completar el funcionamiento de los servicios para Discapacidad. Con respecto al Proyecto "ampliación de capacidades para personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos", se elabora la Proforma para el 2014, solicitando \$214.000.000,00 para la ejecución de convenios de cooperación, según Marco Lógico del Proyecto y acuerdo con la Sra. Ministra, para integrar los proyectos de Inversión de la Subsecretaría de Discapacidades (Fortalecimiento de las Federaciones y Fortalecimiento de las organizaciones que brindan servicios a personas con discapacidad), los dos proyectos han sido integrados como actividades dentro del proyecto de ampliación de capacidades.		
SEPTIEMBRE 2013: Los convenios suscritos entre enero a julio 2013 (26) se encuentran con actas de finiquito, para la suscripción del nuevo período, que se ha tardado POR no contar con la "forma jurídica" para la firma de los mismos, se está solventando este inconveniente con la certificación enviada por el Ministerio de Finanzas No. MINFIN -DM-2013-0328/CONVENIOS DE DISCAPACIDAD, sobre la disponibilidad de fondos públicos para la firma de convenios. El presupuesto ejecutado hasta el momento es de 58,67% que equivale a USD 1.610.760.90, Del monto total requerido para la suscripción de convenios del segundo semestre, se encuentra pendiente la transferencia de USD 418.407. Con respecto al Proyecto "ampliación de capacidades para personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos", se elabora la Proforma para el 2014, solicitando \$ 10.809.921,35 para la ejecución de convenios de cooperación, según Marco Lógico del Proyecto.	Cruz Puente, Rita Jeaneth	30/09/2013 - 01:48 PM
AGOSTO 2013: De los convenios suscritos dentro del proyecto de inversión, estos fueron firmados en su mayoría para el período marzo-septiembre 2013, por lo que en el mes de agosto se continúa con el seguimiento a liquidación del primer desembolso y entrega del segundo desembolso, el Presupuesto ejecutado hasta el momento es de 53,61% que equivale a USD 1.432.210,36. De los 89 convenios, 26 organizaciones y/o GADs concluyeron la ejecución de la primera fase a julio y se encuentran en proceso de liquidación para la suscripción de convenios segundo período. Del monto requerido para la suscripción de convenios del segundo semestre, se encuentra pendiente la transferencia de USD 418.407. Con respecto al Proyecto "ampliación de capacidades para personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos", fue ingresado al SIPEiP y se ha solicitado dictamen de prioridad en SENPLADES. Se envía información a SENPLADES sobre requerimientos del proyecto en relación con los montos requeridos para la ejecución 2014, que necesitan la intervención del INCOP.	Cruz Puente, Rita Jeaneth	30/09/2013 - 01:46 PM
JULIO 2013 En relación a los convenios suscritos de inversión, estos fueron firmados en su mayoría para el período marzo-septiembre 2013, por lo que en el mes de julio se procedió a realizar el seguimiento a liquidación del primer desembolso y entrega del segundo desembolso, mismo que se ha ejecutado para 11 organizaciones. El Presupuesto ejecutado hasta el momento es de 52,48% que equivale a USD 936.832,95. Se ha realizado el proceso de transferencia de partidas presupuestaria para la suscripción de convenios del segundo semestre, el monto asignado hasta el momento es de USD 899.999,99 de UDS 1326.106.12 que se requieren para suscripción de convenios del segundo semestre. Con respecto al Proyecto "ampliación de capacidades para personas con discapacidad y sus familias para la propmoción y exigibilidad de derechos", fue ingresado al SIPEiP y se ha realizado el seguimiento a la programación semestral, sin conclusión puesto que el sistema no permite ingresar datos desagregados territorialmente. Al momento se encuentra en fase de reformulación para su posterior postulación en SENPLADES.	Cruz Puente, Rita Jeaneth	26/07/2013 - 12:41 PM
PRIMER TRIMESTRE DE 2013. El proyecto de inversión, durante el año 2012 no contó con recursos para su ejecución, sin embargo mantuvo vigente su prioridad para el período 2011 - 2015, con CUP: 102800000.740.5492, por el monto de USD 50.834.714. En el proceso de implementación del nuevo modelo de gestión MIES, la Subsecretaría de Protección Especial transfiere la gestión de servicios dirigida a personas con discapacidad por un monto US\$1.785.013,68 a la Subsecretaría de Discapacidades, la misma que para asumir su	Cruz Puente, Rita Jeaneth	26/07/2013 - 09:20 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
competencia, coordina las gestiones necesarias para financiar el proyecto antes mencionado e inicia la ejecución del componente "implementación de modalidades de atención a personas con discapacidad que viven bajo la línea de pobreza, implementadas. Actualmente el proyecto ha sido ingresado en el SIPEiP para su postulación conforme los lineamientos de SENPLADES. A continuación se detallan los logros alcanzados desde 18 de abril de 2013 fecha de transferencia de recursos hasta la presente fecha, en lo que respecta al componente de "implementación de modalidades de atención a personas con discapacidad que viven bajo la línea de pobreza, implementadas. -8.206 personas con discapacidad y sus familias atendidas en las tres modalidades de atención a través de convenios de cooperación con 89 organizaciones, por seis meses de ejecución, conforme se detalla a continuación: Modalidad Acogimiento: 42 personas con discapacidad Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad: 7.435 personas con discapacidad Modalidad Centro Diurno: 729 personas con discapacidad Total de convenios: 89 A la fecha el proyecto, cuenta con un ejecución del 47,18 tan solo a 2.80 puntos de la ejecución óptima, lo que se puede considerar como una eficiencia en la administración de recursos . La ejecución del componente antes mencionado, considerando su transferencia a zonas y distritos a partir del 18 de abril de 2013, fue en abril 3.72%, mayo 38,09%, y a junio 47,18%. Durante el tiempo de análisis superó el 8.33% de ejecución mensual acumulada normada por el Ministerio de Finanzas. El promedio es 29,66% mensual lo que equivale al 9.88% de ejecución mensual. La programación para el segundo semestre se basa fundamentalmente en cumplir con la dotación de los servicios, para lo cual se realizó el análisis detallado por convenio y se coordinó con las coordinaciones zonales sobre los requerimientos presupuestarios efectivos, los mismos que se detallan a continuación de manera mensualizada. La principal dificultad para la ejecución este componente es la certificación oportuna de los recursos para reformar en plazo y monto los convenios vigentes. El presupuesto del proyecto debe asignarse a la partida 78, para la suscripción de convenios de cooperación única y exclusivamente, por un monto de US\$1.317.578,92 Fuente: Informe del área del equipo de seguimiento y evaluación realizado el 25 de junio de 2013.		
OCTUBRE A DICIEMBRE 2012 PROBLEMA:	Castañeda Contreras, Karla	05/12/2012 - 10:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El proyecto se encuentra en estado de CONGELADO porque no cuenta con asignación presupuestaria para el año 2012, sin embargo la fecha de vigencia del mismo es desde el año 2011 hasta el año 2014 por ende sigue diferido.		
ENERO A JUNIO 2012 RESTRICCIÓN: Fue una limitante el no contar a tiempo con el Dictamen de Prioridad Favorable del proyecto por parte de la SENPLADES, dicho documento se obtuvo a finales de diciembre del 2011, condición que limitó su postulación en el SIPeIP y por consiguiente la asignación de recursos para el año 2012; pues de conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y los lineamientos definidos por la Secretaría Nacional de Planificación-SENPLADES, los proyectos de inversión deben ser postulados hasta el 20 de junio de cada año a fin de contar con recursos en el año siguiente. PROBLEMA: El proyecto se encuentra en estado de CONGELADO, porque no cuenta con asignación presupuestaria para el año 2012 situación que a la fecha sigue diferida la programación de actividades así como la construcción de indicadores y metas para el presente año. JULIO A OCTUBRE 2012 PROBLEMA: El proyecto se encuentra en estado de CONGELADO porque no cuenta con asignación presupuestaria para el año 2012, sin embargo la fecha de vigencia del mismo es desde el año 2011 hasta el año 2014 por ende sigue diferido.	Castañeda Contreras, Karla	01/11/2012 - 02:01 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. El desconocimiento de la normativa técnica CAUSARÍA un bajo nivel en la calidad del servicio para personas con discapacidad	20/04/2018	Mónica Maldonado	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 11, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Plan Operativo Anual e informe justificativo de reformas presupuestarias elaborado.	4-Inicio de Trabajo	10/01/2011		10/01/2011		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Taller de coordinación y alineación para 50 funcionarios/as de las Coordinaciones zonales y direcciones provinciales ejecutado .	5-Entregables Intermedios	22/03/2011		22/03/2011		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	EJECUCIÓN: Direcciones Provinciales del MIES para atender a las personas con discapacidad, cuentan con recursos transferidos.	5-Entregables Intermedios	04/04/2011		04/04/2011		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Convenio de cooperación con la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador-FENCE para atender a personas con discapacidad visual e intelectual firmado.	5-Entregables Intermedios	18/04/2011		18/04/2011		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Reprogramación de Convenio con el Municipio de Quito y el Patronato Municipal "San José" para sostenimiento de centro de referencia ubicado en la parroquia de Conocoto para primera fase firmado.	1-Solicitud de Información	15/05/2011		15/05/2011		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Convenios de cooperación en cada una de las Direcciones Provinciales del MIES, con organizaciones sociales de personas con discapacidad en el país firmados.	1-Solicitud de Información	16/05/2011		16/05/2011		Sí	0.5
7	EJECUCIÓN: Segundo aporte a operadores de convenios para sostenimiento de centros diurnos y modalidades de atención domiciliaria entregado .	Z - Compromiso Ministerial	03/09/2011		03/09/2011		Sí	0.5
8	EJECUCIÓN: Documento de Diagnóstico institucional que incluye los planes de mejoramiento en la aplicación de estándares mínimos de calidad elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/09/2011		29/09/2011		Sí	0.5
9	EJECUCIÓN: Aplicado 85 estándares mínimos de calidad en organizaciones sociales prestadoras de servicios a personas con discapacidad en el país.	1-Solicitud de Información	28/10/2011		28/10/2011		Sí	0.5
10	EJECUCIÓN: Informe intermedio de la ejecución anual del proyecto elaborado .	1-Solicitud de Información	23/11/2011		23/11/2011		Sí	0.5
11	EJECUCIÓN: Catalogo de servicios institucionales para personas con discapacidad diseñado.	5-Entregables Intermedios	28/11/2011		28/11/2011		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: 18 talleres de capacitación para madres cuidadoras de personas con discapacidad y promotores sociales realizados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2011		30/11/2011		Sí	0.5
13	CIERRE:Informe final de la ejecución anual del proyecto elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/12/2011		28/12/2011		Sí	1.0
14	PLANIFICACIÓN: Presupuesto del proyecto aprobado	4-Inicio de Trabajo	31/01/2013		31/01/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
15	EJECUCIÓN: Asistencia técnica en territorio para la suscripción de convenios	5-Entregables Intermedios	25/02/2013		25/02/2013		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Informe de Base de datos 2013 elaborada	5-Entregables Intermedios	01/04/2013		01/04/2013		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Transferencia de los recursos a las nueve coordinaciones zonales para la ejecución del proyecto	5-Entregables Intermedios	18/04/2013		18/04/2013		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Primer desembolso ejecutado	5-Entregables Intermedios	25/06/2013		25/06/2013		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Informe técnico financiero elaborado y aprobado para segundo desembolso	5-Entregables Intermedios	01/07/2013		01/07/2013		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Segundo desembolso entregado	5-Entregables Intermedios	01/08/2013		01/08/2013		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Informe técnico financiero elaborado y aprobado para liquidación	5-Entregables Intermedios	15/12/2013		15/12/2013		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Acta de cierre y liquidación del proyecto suscrita	5-Entregables Intermedios	20/12/2013		20/12/2013		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Devolución de garantías	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	1.0
24	EJECUCION: Presupuesto del proyecto aprobado	5-Entregables Intermedios	24/01/2014		24/01/2014		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Presupuesto para convenios en zonas entregado	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Base de datos convenios 2014 elaborada	5-Entregables Intermedios	14/02/2014		14/02/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Primer desembolso de convenios entregado a cooperantes	5-Entregables Intermedios	21/02/2014		21/02/2014		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Firma de convenios de cooperación con 5 Federaciones para personas con discapacidad, aprobados.	9-Entregables Formales	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Informe técnico y financiero para segundo desembolso aprobado	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Informe de desembolsos a FENCE, FENEDIF, FENODIS, FEPAPDEM Y FENASEC, entregados	9-Entregables Formales	15/08/2014		15/08/2014		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Informe Segundo desembolso de convenios entregado a cooperantes	5-Entregables Intermedios	15/08/2014		15/08/2014		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Informe evaluación y planificación de actividades para la ejecución del proyecto 2015	5-Entregables Intermedios	02/09/2014		02/09/2014		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Informe de sensibilización realizada por las Federaciones de FENASEC, FENODIS, FEPAPDEM, FENCE, FENEDIF de los	9-Entregables Formales	15/10/2014		15/10/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	meses de junio, julio, agosto y septiembre, entregado							
34	EJECUCIÓN: Informe de liquidación del Primer desembolso y entrega de Segundo desembolso a las Federaciones FENCE, FENEDIF, FENODIS, FEPAPDEM Y FENASEC, entregado	9-Entregables Formales	30/10/2014		30/10/2014		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo a la ejecución del Proyecto realizadas, aprobado	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	0.5
36	EJECUCIÓN: Informe de liquidación del Segundo desembolso de Convenios entregados a Cooperantes por Zonas, entregado	5-Entregables Intermedios	12/12/2014		12/12/2014		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Informe de gestión anual del Proyecto Ampliación de Capacidades de las personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos, entregado	5-Entregables Intermedios	24/12/2014		24/12/2014		Sí	0.5
38	EJECUCIÓN: Plan anual de gestión del proyecto a nivel nacional, entregado	4-Inicio de Trabajo	15/01/2015		15/01/2015		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Acta de cierre y liquidación de Federaciones FENCE, FENEDIF, FENODIS, FEPAPDEM Y FENASEC, entregado	5-Entregables Intermedios	29/01/2015		29/01/2015		Sí	1.0
40	PLANEACIÓN: PAPP 2015, aprobado	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: matriz de distribución de techos presupuestarios y metas coberturas a los distritos, entregado	4-Inicio de Trabajo	02/02/2015		02/02/2015		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Informe consolidado de los convenios suscritos en los Distritos, presentado.	9-Entregables Formales	27/02/2015		27/02/2015		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Informe consolidado del primer desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado.	9-Entregables Formales	30/03/2015		30/03/2015		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos con las Federaciones FENASEC, FENEDIF, FENCE, FENODIS y FEPAPDEM, entregado	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: contratación del servicio de logística para las mesas temáticas de seguimiento, presentado	9-Entregables Formales	06/04/2015		06/04/2015		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: informe de la capacitación en el proceso del pago del BJGL impartida a	9-Entregables Formales	08/05/2015		06/05/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	los técnicos del Bono Joaquín Gallegos Lara, presentado.							
47	EJECUCIÓN: Informe del desembolso a las Federaciones FENASEC, FENEDIF, FENCE, FENODIS y FEPAPDEM, entregado	9-Entregables Formales	26/05/2015		26/05/2015		Sí	1.0
48	EJECUCIÓN: Informe de compromiso para el proceso de equipamiento de las viviendas de los destinatarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, presentado	9-Entregables Formales	29/05/2015		29/05/2015		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Oficio de Actualización de prioridad, aprobado	9-Entregables Formales	15/06/2015		09/06/2015		Sí	3.0
50	EJECUCIÓN: Informe consolidado de liquidación del primer desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	9-Entregables Formales	30/07/2015		30/07/2015		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Informe sobre compromisos asumidos en mesas temáticas, entregado.	9-Entregables Formales	30/07/2015		30/07/2015		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Informe consolidado del segundo desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	9-Entregables Formales	28/08/2015		28/08/2015		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: Informe del avance en el cierre de brechas de atención a personas con discapacidad, presentado.	9-Entregables Formales	08/12/2015		08/12/2015		Sí	1.0
55	EJECUCIÓN: Informe anual de ejecución del proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Informe consolidado del actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos con las Federaciones FENASEC, FENEDIF, FENCE, FENODIS y FEPAPDEM, entregado	9-Entregables Formales	30/01/2016		30/01/2016		Sí	1.0
57	PLANEACIÓN: PAPP 2016, aprobado	9-Entregables Formales	30/01/2016		30/01/2016		Sí	1.0
58	EJECUCIÓN: matriz de distribución de techos presupuestarios y metas coberturas a los distritos, entregado	9-Entregables Formales	15/02/2016		15/02/2016		Sí	1.0
59	EJECUCIÓN: Plan anual de gestión del proyecto a nivel nacional, entregado	9-Entregables Formales	15/02/2016		15/02/2016		Sí	1.0
60	EJECUCIÓN: Informe consolidado de los convenios suscritos en los Distritos, presentado.	9-Entregables Formales	15/03/2016		15/03/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
61	EJECUCIÓN: Informe consolidado del primer desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado.	9-Entregables Formales	30/03/2016		30/03/2016		Sí	1.0
62	EJECUCIÓN: Informe consolidado de liquidación del primer desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	9-Entregables Formales	15/05/2016		15/05/2016		Sí	1.0
63	EJECUCIÓN: Informe consolidado del segundo desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	9-Entregables Formales	15/07/2016		15/07/2016		Sí	1.0
64	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	01/08/2016		01/08/2016		Sí	1.0
65	EJECUCIÓN: Informe del avance en el cierre de brechas de atención a personas con discapacidad, presentado.	9-Entregables Formales	15/09/2016		15/09/2016		Sí	1.0
66	EJECUCIÓN: Informe consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos 2015 a nivel nacional	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.0
67	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	22/12/2016		22/12/2016		Sí	1.0
68	EJECUCIÓN: Informe anual de ejecución del proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	22/12/2016		22/12/2016		Sí	1.0
69	EJECUCIÓN: Levantamiento del registro social en los usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, entregado	9-Entregables Formales	30/12/2016		30/12/2016		Sí	1.0
70	EJECUCIÓN: matriz de distribución de techos presupuestarios y metas de coberturas a los distritos, entregado.	9-Entregables Formales	04/01/2017		04/01/2017		Sí	1.0
71	PLANEACIÓN: PAPP 2017, aprobado	9-Entregables Formales	04/01/2017		04/01/2017		Sí	1.0
72	EJECUCIÓN: Informe consolidado de los convenios suscritos en los Distritos, presentado.	9-Entregables Formales	31/03/2017		31/03/2017		Sí	1.0
73	EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos con las Federaciones FENASEC, FENEDIF, FENCE, FENODIS y FEPAPDEM, entregado.	9-Entregables Formales	14/04/2017		14/04/2017		Sí	1.0
74	EJECUCIÓN: Informe del desembolso a las Federaciones FENASEC, FENEDIF, FENCE, FENODIS y FEPAPDEM, entregado.	9-Entregables Formales	15/05/2017		15/05/2017		Sí	1.0
75	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia	9-Entregables Formales	01/08/2017		01/08/2017		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.							
76	EJECUCIÓN: Informe del avance en el cierre de brechas de atención a personas con discapacidad, presentado.	9-Entregables Formales	15/09/2017		15/09/2017		Sí	1.0
77	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	27/12/2017		27/12/2017		Sí	1.0
78	EJECUCIÓN: matriz de distribución de techos presupuestarios y metas coberturas a los distritos, entregado	5-Entregables Intermedios	20/01/2018		20/01/2018		Sí	1.0
79	PLANIFICACIÓN: PAPP 2018, entregado	9-Entregables Formales	25/02/2018		25/02/2018		Sí	2.0
80	EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos con las Federaciones FENEDIF, FENODIS y FEPAPDEM, entregado.	5-Entregables Intermedios	29/03/2018		29/03/2018		Sí	0.5
81	EJECUCIÓN:Informe trimestral de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado.	5-Entregables Intermedios	10/04/2018		10/04/2018		Sí	0.5
82	EJECUCIÓN:Informe consolidado del primer desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado.	5-Entregables Intermedios	15/04/2018		15/04/2018		Sí	1.0
83	EJECUCIÓN: Informe del desembolso a las Federaciones FENEDIF, FENODIS y FEPAPDEM, entregado.	5-Entregables Intermedios	21/05/2018		21/05/2018		Sí	1.0
84	EJECUCIÓN: Informe consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos 2017 a nivel nacional	5-Entregables Intermedios	14/06/2018		14/06/2018		Sí	1.0
85	EJECUCIÓN:Informe consolidado del segundo desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	19/07/2018		19/07/2018		Sí	1.0
86	EJECUCIÓN:Informe semestral de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado.	5-Entregables Intermedios	20/07/2018		20/07/2018		Sí	1.0
87	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	5-Entregables Intermedios	01/08/2018	01/08/2018			No	1.0
88	EJECUCIÓN:Informe semestral de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado.	5-Entregables Intermedios	05/10/2018	05/10/2018			No	1.0
89	EJECUCIÓN:Informe consolidado del tercer desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	10/10/2018	10/10/2018			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
90	EJECUCIÓN: Informe de acompañaamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018	30/11/2018			No	1.0
91	EJECUCIÓN:Informe consolidado del cuarto desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	07/12/2018	07/12/2018			No	1.0
92	EJECUCIÓN:Informe anual de ejecución del proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	30/12/2018	30/12/2018			No	1.0
93	CIERRE: Informe final de ejecución del proyeto	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	31/12/2019			No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	El proyecto se ejecuta según lo planificado	Olaya Cordova, Líder Atahualpa	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	21/12/2016
2	Proyecto se ejecuta según lo planificado	Olaya Cordova, Líder Atahualpa	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24/03/2017
3	K008 MIES - Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidad y sus Familias para la Promoción y Exigibilidad de Derechos GERENCIA.	Samaniego Maigua, Franklin Omar	{PR} - Provincia - PICHINCHA	31/03/2017
4	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON LAS NAVES	Coronel Monar, Anibal Alejandrino	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/08/2017
5	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON LAS NAVES	Coronel Monar, Anibal Alejandrino	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/10/2017
6	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	20/03/2017
7	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHILANES	Tenelema Taris, Piedad Norma	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/01/2017
8	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/10/2016
9	Verificación personas con discapacidad Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	20/10/2016
10	Proyecto cumple según lo planificado	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	12/10/2016
11	Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidad y sus Familias para la Promoción y Exigibilidad de Derechos GERENCIA.	Samaniego Maigua, Franklin Omar	{PR} - Provincia - PICHINCHA	31/08/2016
12	EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/08/2016
13	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	07/06/2016
14	Verificación del avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	25/05/2016
15	Supervisión positiva se pudo obtener información del avance del proyecto de acuerdo al hito 67	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	20/05/2016
16	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	14/05/2016
17	Visita en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	19/04/2016
18	Supervisión Positiva - Firma de convenios con los GAD's en beneficio de las personas con discapacidades	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/02/2016
19	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	23/02/2016
20	PROYECTO SE EJECUTA EN TERRITORIO	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	19/02/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
21	Verificar la ejecución	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	27/01/2016
22	Verificación Ampliación de Capacidades personas con Discapacidad Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	20/01/2016
23	SUPERVISION EXITOSA DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	31/12/2015
24	Supervisión positiva	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/12/2015
25	Proyectgo se ejecuta en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	19/02/2016
26	PROYECTO SI SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/10/2015
27	Constatación Ampliación de Capacidades y sus familias	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	24/09/2015
28	Proyecto cumple según lo planificado	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	12/10/2015
29	SUPERVISION REALIZADA 24-09-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	24/09/2015
30	Supervision positiva sobre la gestion del proyecto en Morona Santiago de acuerdo al hito 53	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	24/09/2015
31	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	24/07/2015
32	Supervisión Positiva Protección, Ciudadano y Nutrición	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/07/2015
33	Supervisión del proyecto en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	26/06/2015
34	Supervisión positiva a Hitos efectuados en el Azuay en el proyecto.	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	25/06/2015
35	Supervisión Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidad y sus Familias para la Promoción y Exigibilidad de Derechos GERENCIA.	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	17/06/2015
36	Proyecto se viene cumpliendo de acuerdo a lo planificado en la Provincia de Zamora Chinchipe	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	28/05/2015
37	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/05/2015
38	VERIFICACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS GALÁPAGOS	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/04/2015
39	Supervisión del 29 de abril de 2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	30/04/2015
40	Proyecto con buenos resultados en el Cantón Caluma	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	17/04/2015
41	Proyecto en ejecución K008 MIES	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	14/04/2015
42	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/03/2015
43	Supervisión de Proyecto	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	24/03/2015
44	Personas que fueron atendidas duran el año en la provincia de Morona Santiago	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	26/01/2015
45	Supervisión del 23-02-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	23/02/2015
46	Proyecto_k008_MIES_DISCAPACIDADES	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	27/11/2014
47	Supervisión para verificar el avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	26/11/2014
48	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/11/2014
49	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	26/09/2014
50	Supervisión del avance del proyecto en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	19/08/2014
51	ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GALAPAGOS	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	18/07/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
52	Supervisión	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	30/06/2014
53	Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planificado.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	13/05/2014
54	PROYECTO EN EJECUCIÓN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO	Trujillo Castro, Jorge Eduardo	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	28/03/2014
55	kknkln	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	26/02/2014
56	EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	29/01/2014
57	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/12/2013
58	SUPERVISI{ON	Trujillo Castro, Jorge Eduardo	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	31/12/2013

ACCIONES CLAVE

T	Acción Clave	Responsable	Remitente	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Prioridad
1	K008. MIES-Sistema Inclusion y Equidad Social - Ampliacion de capacidades de las Personas con Discapacidad y sus familias para la promocion y exigibilida de derechos.	Llerena Llerena, Carlos Fabián	Llerena Llerena, Carlos Fabián	30/09/2011	30/09/2011	Alta

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de personas con discapacidad que acceden a los servicios por convenio del MIES		100.00 %	24,870	24,870	01/01/2015	Julio
2	Número de convenios suscritos en la modalidad de atención en el Hogar y la Comunidad		100.00 %	234	234	01/01/2015	Ene-Jun
3	Número de Unidades en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad		100.00 %	829	829	01/01/2015	Ene-Jun
4	Número de personas sensibilizadas en los eventos organizados por las Federaciones Nacionales de personas con discapacidad y para las personas con discapacidad.		100.00 %	6,000	6,000	01/04/2018	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,715,217.51 **
Costo Total:	2,423,700.00
Total Devengado:	6,543,952.46
% Costo Total Devengado:	270.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 270.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	18,268,387.93	0.00	0.00	18,268,387.93
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	27,897,862.58	10,237,160.09	0.00	38,135,022.67
Ppto. Codificado	4,675,348.45	409,332.78	0.00	5,084,681.23
Ppto. Comprometido	4,491,637.88	268,292.73	0.00	4,759,930.61
Planeado - Codificado (2018)		-409,332.78		
Programado a Devengar	6,646,993.08	409,332.78	0.00	7,056,325.86
Ppto. Devengado	6,305,884.73	238,067.73	0.00	6,543,952.46
Pagado Real	1,499,297.49	238,067.73	0.00	1,737,365.22
Estimado a fin de año	* 6,305,884.73	0.00	0.00	6,305,884.73
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	341,108.35	409,332.78	0.00	750,441.13
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 94.87 %	58.16 %	0.00 %	92.74 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

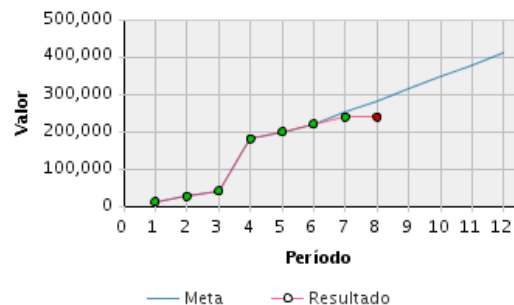

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	11,506.17	11,506.17	11,506.17	11,506.17	100.00 %		2.81 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	13,791.30	13,791.30	25,297.47	25,297.47	100.00 %		6.18 %
Mar	14,503.13	14,503.13	39,800.60	39,800.60	100.00 %		9.72 %
Abr	141,021.74	141,021.74	180,822.34	180,822.34	100.00 %		44.17 %
May	18,354.38	18,354.38	199,176.72	199,176.72	100.00 %		48.66 %
Jun	19,808.14	19,808.14	218,984.86	218,984.86	100.00 %		53.50 %
Jul	31,150.00	19,082.87	250,134.86	238,067.73	95.18 %		58.16 %
Ago	32,091.06	0.00	282,225.92	238,067.73	84.35 %		58.16 %
Sep	32,992.36		315,218.28				
Oct	31,091.76		346,310.04				
Nov	31,591.06		377,901.10				
Dic	31,431.68		409,332.78				
Total	409,332.78	238,067.73					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
10	Incrementar la eficiencia en la atención contribuyendo a la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias MEDIANTE la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las modalidades de atención en el marco del enfoque social e inclusivo.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
MIES-019	Atención en centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad
MIES-020	Atención en centros de referencia y acogida inclusivos para personas con discapacidad
MIES-022	Atención en el hogar y la comunidad para personas con discapacidad

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		A.26.pdf	30/07/2015
2		A.27.pdf	30/07/2015
3	79_PLANIFICACIÓN PAPP2018_Entregado	PAPP_2018_acuerdo_ministerial_nro_003.pdf	04/05/2018
4	86EJECUCIÓN:Informe semestral de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado.	INFORME_MENSUAL_GERENCIA_MES_DE_JUNIO.pdf	20/07/2018
5	ASOCIACION HITO 33: Informe de sensibilización realizado por las Federaciones: FENCE, FENEDIF, FENODIS, FEPAPDEM y FENASEC entregado	A.11.pdf	16/10/2014
6	ASOCIACION HITO 34: Informe de liquidación del Primer desembolso y entrega de Segundo desembolso a las Federaciones: FENCE, FENEDIF, FENODIS, FEPAPDEM y FENASEC entregado	A.12...pdf	31/10/2014
7	ASOCIACION HITO 36: Informe de liquidación del segundo desembolso de Convenios entregados a Cooperantes por zonas, entregado	A.14.pdf	12/12/2014
8	ASOCIACION HITO 37: Informe de gestión anual del proyecto Ampliación de Capacidades de las personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos	A.15.pdf	24/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
9	ASOCIACION HITO 45: EJECUCIÓN: Contratación del servicio de logística para las mesas temáticas de seguimiento, presentado	A.20.pdf	07/04/2015
10	ASOCIACION HITO 53: Informe consolidado segundo desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	A.28.pdf	31/08/2015
11	ASOCIACION HITO 54: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del proyecto, presentado.	A.29.pdf	01/10/2015
12	ASOCIACION HITO 55: Informe del avance en el cierre de brechas de atención a personas con discapacidad, presentado	A.30.pdf	09/12/2015
13	ASOCIACION HITO 60: Plan Anual de Gestión del Proyecto a nivel nacional, entregado.	A.34.pdf	01/03/2016
14	ASOCIACION HITO 60: Plan Anual de Gestión del Proyecto a nivel nacional, entregado.	A.32.pdf	29/03/2016
15	ASOCIACION HITO 61.- Informe consolidado de los convenios suscritos en los Distritos, presentado	A.35.xlsx	01/04/2016
16	ASOCIACION HITO 80.-Informe del avance en el cierre de brechas de atención a personas con discapacidad, presentado.	DOCUMENTO_GPR.pdf	02/10/2017
17	ASOCIACIÓN HITO 69	A.41.pdf	29/12/2016
18	ASOCIACIÓN HITO 70	A.42.pdf	29/12/2016
19	ASOCIACIÓN HITO 13: Acta_de_cierre_del_proyecto_de_inversión_2009-2012	A.2.pdf	30/04/2014
20	ASOCIACIÓN HITO 16	A.3.pdf	30/04/2014
21	ASOCIACIÓN HITO 17	A.4.pdf	30/04/2014
22	ASOCIACIÓN HITO 19	A.5.pdf	30/04/2014
23	ASOCIACIÓN HITO 1: PROYECTO_AMPLIACIÓN_DE_CAPACIDADES_PARA_LA_PROMOCIÓN	A.1.pdf	30/04/2014
24	ASOCIACIÓN HITO 28: Convenios suscritos 5 FEDERACIONES NACIONALES	5_CONVENIOS_SUSCRITOS.pdf	30/06/2014
25	ASOCIACIÓN HITO 29	A.7pdf.pdf	16/07/2014
26	ASOCIACIÓN HITO 30: Informe de desembolsos a FENCE, FENEDIF, FENODIS, FEPAPDEM y FENASEC	A.8.pdf	15/08/2014
27	ASOCIACIÓN HITO 31: Informe segundo desembolso a cooperantes	A.9.pdf	18/08/2014
28	Asociación hito 32: Informe de evaluación y planificación de actividades para la ejecución del Proyecto 2015	A.10.pdf	03/09/2014
29	ASOCIACIÓN HITO 35: Informe de seguimiento y monitoreo a la ejecución del proyecto realizadas, aprobado	A.13.pdf	28/11/2014
30	ASOCIACIÓN HITO 38: Acta de cierre y liquidación de Federaciones FENCE, FENEDIF, FENODIS, FEPAPDEM Y FENASEC, entregado.	A.16.pdf	29/01/2015
31	ASOCIACIÓN HITO 38: Plan anual de gestión del proyecto a nivel nacional, entregado	A.1.pdf	20/03/2015
32	ASOCIACIÓN HITO 39: PAPP 2015 APROBADO	A.17.pdf	13/03/2015
33	ASOCIACIÓN HITO 41: Matriz de distribución de techos presupuestarios y metas coberturas a los distritos, entregado	A.2.pdf	20/03/2015
34	ASOCIACIÓN HITO 43: Informe consolidado del primer desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	A.18.pdf	01/04/2015
35	ASOCIACIÓN HITO 44: Informe convenios suscritos con las federaciones FENASEC, FENEDIF, FENCE, FENODIS Y FEPAPDEM, entregado	A.19.pdf	01/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
36	ASOCIACIÓN HITO 46: Informe de la capacitación en el proceso del Bono Joaquín Gallegos Lara impartida a los técnicos del Bono Joaquín Gallegos Lara, presentado	A.21.pdf	06/05/2015
37	ASOCIACIÓN HITO 47: Informe de compromiso para el equipamiento de las viviendas de los destinatarios del bono Joaquín Gallegos Lara, presentado	A.23.pdf	01/06/2015
38	ASOCIACIÓN HITO 47: Informe del desembolso a las Federaciones: FENASEC, FENEDIF, FENCE, FENODIS y FEPAPDEM, entregado.	A.22.pdf	26/05/2015
39	ASOCIACIÓN HITO 50: Informe de actas de cierre y liquidación de convenios, completada	A.25.xls	02/07/2015
40	ASOCIACIÓN HITO 50: Oficio de Actualización de prioridad, aprobado	A.24.pdf	09/06/2015
41	ASOCIACIÓN HITO 59: Cobertura y techos convenios aprobado	A.33_HITO_59.pdf	25/02/2016
42	ASOCIACIÓN HITO 63.- Informe consolidado del primer desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	A.36.xlsx	01/04/2016
43	ASOCIACIÓN HITO 68: LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL BENEFICIARIOS JGL	A.38.pdf	03/06/2016
44	ASOCIACIÓN HITO 70: INFORME ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PRESENTADO	A.40.doc	29/08/2016
45	ASOCIACIÓN HITO 76 Informe Consolidado de los convenios suscritos	ASOCIACIÓN_HITO_76_Informe_consolidado_de_los_convenios_suscritos_en_los_Distritos.p	11/05/2017
46	ASOCIACIÓN HITO 77: Informe de convenios suscritos con las Federaciones FENASEC, FENEDIF, FENCE, FENODIS y FEPAPDEM, entregado.	Informe_de_convenios_suscritos_con_las_Federaciones_FENASEC_FENEDIF_FENCE_FENODIS_y_FEPAPDEM.pdf	14/05/2017
47	ASOCIACIÓN HITO 79: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	info_acompanamiento_tecnico_GPR.PDF	29/08/2017
48	ASOCIACIÓN HITO 81 EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	Scanned-image.pdf	29/12/2017
49	ASOCIACIÓN HITOS 65 Y 67: INFORME DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS FEDERACIONES.- INFORME DEL DESEMBOLSO A LAS FEDERACIONES	A.37(3).pdf	03/06/2016
50	Asociación: Hito 26 Base de datos	A6.pdf	20/06/2014
51	Base de datos de los convenios del proyecto de inversión para la atención a personas con discapacidad en el año 2014, de acuerdo a las tres modalidades. Se incluye número de personas a las que se está atendiendo e información de la entidad cooperante.	Hito_#26_Base_de_datos_06-03-2014.pdf	06/03/2014
52	Cronograma valorado para el 2015	A20.xlsx	16/04/2015
53	En relación al resumen ejecutivo Septiembre: informe de Gerencia mensual SEPTIEMBRE	INFORME_GERENCIA_SEPTIEMBRE_2014VF.pdf	24/12/2014
54	HITO 78 Matriz de distribución de techos presupuestarios y metas.	HITO_78_Matriz_de_distribución_de_techos_presupuestarios_y_metas.pdf	07/05/2018
55	HITO 80 Informe de convenios suscritos con las Federaciones FENEDIF, FENODIS, FEPAPDEM.2018	HITO_80_Informe_de_convenios_suscritos_con_las_Federaciones_FENEDIF_FENODIS_Y_FEPAPDEM.pdf	07/05/2018
56	HITO 81 Informe trimestral de la gerencias sobre ejecución del proyecto entregado.	HITO_81_Informe_trimestral_de_gerencias_sobre_la_ejecución_del_proyecto_entregado.pdf	04/05/2018
57	HITO 82 Informe consolidado del primer desembolso a cooperantes de cpmvemops em gasto de inversión.	HITO_82_Informe_consolidado_del_primer_desembolso_a_cooperantes_de_cpmvemops_em_gasto_de_inversión.pdf	04/05/2018
58	HITO 83 PRIMER DESEMBOLSO FEDERACIONES	HITO_83_PRIMER_DESEMBOLSO_FEDERACIONES.pdf	21/05/2018
59	HITO 85 EJECUCIÓN:Informe consolidado del segundo desembolso a cooperantes de convenios en territorio	REPORTE_DE_EJECUCIÓN_18-07-2018.zip	19/07/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
60	HITO ANEXO 78_ Informe del desembolso a las Federaciones FENASEC, FENEDIF, FENCE, FENODIS y FEPAPDEM, entregado	ANEXO_HITO_78_ Informe_del_desembolso_a_las_Federaciones_FENASEC_FENEDIF_FENCE_FENODIS_y_FEPAPDEM.pdf	01/08/2018
61	HITO_84_ Informe consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos a nivel nacional	HITO_84_ Informe consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos a nivel nacional.pdf	15/06/2018
62	Plan Anual de Política Pública para la Subsecretaría de Discapacidades con presupuesto aprobado para el año 2014.	Hito_#24_Presupuesto_aprobado_05-02-2014.pdf	05/02/2014
63	Reporte de Esigef donde se corroboró el presupuesto entregado en zonas para la firma de convenios.	Hito_#25_Presupuesto_entregado_05-02-2014.pdf	05/02/2014
64	Resumen de la base de datos donde se muestra los convenios mantenidos en las ocho zonas, diferenciados por modalidad de atención, con su respectiva cobertura y presupuesto.	Hito_#26_Base_por_modalidad_06-03-2014.pdf	06/03/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Maldonado, Mónica	Líder Técnica	Técnica del Proyecto de Discapacidades	monica.maldonado@inclusion.gob.ec	
