

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Familia
Dirección de Acompañamiento Familiar

PROYECTO: K001 MIES-Promoción de la Movilidad Social Ascendente de las Familias en extrema pobreza usuarias del BDH mediante el Acompañamiento Familiar y la Articulación de las Intervenciones y Recursos en su Entorno.

Líder del Proyecto:	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa (alexandra.guillen@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	Programas Relacionados:	PROMOCION LA MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA USUARIAS DEL BDH MEDIANTE EL ACOMPA
Titular:	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.376273	TIR:	58.25 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	16,401,135.34
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	42,213,479.25
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	07/09/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2015

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto busca contribuir a la movilidad social ascendente de los núcleos familiares usuarios del BDH en situación de extrema pobreza, por medio de la "Estrategia Acompañamiento Familiar", en un marco de corresponsabilidad familiar. Por medio del proyecto, se pretende articular los esfuerzos de todas las instancias involucradas para garantizar un piso de protección social básico (salud, educación, inclusión y vivienda) y a su vez desarrollar capacidades y oportunidades para la autonomía y salida sostenible de la pobreza. El acompañamiento a las familias en situación de extrema pobreza, toma en cuenta las características de cada uno de sus integrantes, su dinámica interna y sus relaciones con la comunidad, esta atención es personalizada a las familias en su hogar, con el afán de lograr que cada uno de sus integrantes reconozca sus potencialidades, adquiera habilidades, y, a la vez, fortalezca los vínculos familiares. La meta al 2017 es acompañar a 199,087 núcleos familiares en extrema pobreza, usuarios del Bono de Desarrollo Humano - BDH; que equivale a un promedio de 836,165 personas para contribuir a un proceso de movilidad social ascendente, en un período de cuatro años.

- OBJETIVO GENERAL,**
- Generar cambios internos en las familias y vincularlas a servicios que brinda el Estado, para contribuir a la eliminación de las barreras de tipo económico, social y psicológico que impiden su movilidad social.
- OBJETIVOS ESPECIFICOS,**
- Implementar procesos de acompañamiento psicosocial profesional y personalizado a los núcleos familiares en extrema pobreza (Registro Social),
 - Fortalecer el proceso de inclusión económica y movilidad social mediante el acompañamiento profesional y personalizado a los núcleos familiares en extrema pobreza.
 - Articular el Sistema único de servicios sociales para la atención a la población en extrema pobreza.

Beneficios Cualitativos

Contribuir a la movilidad social ascendente de los núcleos familiares usuarios del Bono de Desarrollo Humano-BDH en extrema pobreza

Tipo de Beneficiario

Núcleos familiares en extrema pobreza, usuarios del BDH


Restricciones

"TIEMPO: La duración del proyecto es de 4 años, comprendidos en el período 2014 a 2017
COSTO: El monto total durante la vida de todo el proyecto es de USD 51'263.743,64
ALCANCE: Está dirigido a las familias usuarias del bono de desarrollo humano, en extrema pobreza", que constan en el Registro Social, dispersión geográfica de los núcleos familiares
RECURSOS: Línea base del Registro Social, ejecución de procesos alternos (atención a familias en eventos adversos), rotación del personal

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 92.13 %

Fecha de Inicio: 01/01/2014

Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

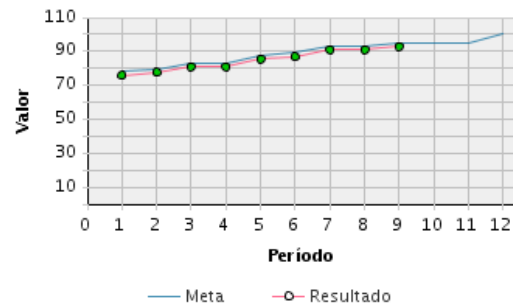

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	78 %	80 %	83 %	83 %	88 %	89 %	93 %	93 %	95 %	95 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	76 %	78 %	81 %	81 %	86 %	87 %	91 %	91 %	93 %			
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO: Proceso Financiero: Se aprueban reformas presupuestarias solicitadas por Distrito con la finalidad de que se ejecute el recurso en las partidas que se requiera. En la herramienta SIPeIP módulo III se registró los contratos y Curs del mes de agosto para el envío a la Coordinación de Planificación información enviada por Distrito y registrada desde el Proyecto en el sistema SIPeIP. Se realiza el seguimiento a la ejecución presupuestaria, los Distritos se encuentran a la espera que el Ministerio de Finanzas apruebe los avales planteados. Se realizó la ficha del proyecto con la finalidad de incluir en el presupuesto del año 2018. El cumplimiento del Hito N° 76, referente a la implementación de Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad en Familias usuarias BDH que se encuentran en acompañamiento, no se ejecutó en su planificación inicial debido a que por prioridades institucionales se desarrollaron Encuentros Comunitarios con la temática de "Prevención de Uso de Drogas"; actividad enmarcada dentro de la coordinación interinstitucional entre el MIES y la Secretaría Técnica de Drogas SERTED en el marco del Plan. Se planta cumplir con este hito en el último semestre del año. Proceso Metodológico En el mes de agosto 2017 desde se continua con los siguientes subprocesos: Actualización del Módulo Plan Familia del Sistema Integrado de Programas y Proyectos Sociales -SIPPS- directrices remitidas con a territorio; Proceso de Actualización DPA; Proceso de cierre del grupo C y D; Oficialización de Informes de cierre de ajuste emergente del servicio de acompañamiento familiar; Producción de ficha de cierre del grupo C Y D, Proceso de Cierre -eventos- de acompañamiento familiar, propuesta de sistematización de los resultados del proyecto de acompañamiento familiar; y, en el marco de acciones interinstitucionales sobre Prevención de Violencia de Género se ha realizado: Diálogos Nacional de Mujeres tema: economía y sistema de cuidados; réplica taller fortalecimiento de capacidades para la prevención de violencia basada en género y Módulo de Encuentros Comunitarios Prevención de Violencia de Género	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisca	05/09/2017 - 08:13 PM
JULIO: Proceso Financiero: En virtud del incremento de recursos dentro del grupo de gasto 73, los Distritos realizan certificación presupuestaria y solicitud de aval al Ministerio de Finanzas. Se evidencia que varios Distritos a la fecha cuentan con saldos disponibles, por lo que desde la Subsecretaría se realiza el seguimiento a la ejecución presupuestaria por Distrito. Adicionalmente los Distritos plantean reformas presupuestarias para mover los recursos a los ítems que van a ejecutar de acuerdo a la realidad de cada Distrito. En la herramienta SIPeIP módulo III se	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisca	05/09/2017 - 08:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
registró los contratos y Curs del mes de agosto para el envío a la Coordinación de Planificación información enviada por Distrito y registrada desde el Proyecto en el sistema SIPEIP. Proceso Metodológico: En el mes de julio 2017 desde se ejecutaron los siguientes subprocesos: Actualización del Módulo Plan Familia del Sistema Integrado de Programas y Proyectos Sociales -SIPPS- directrices remitidas con a territorio; Proceso de Actualización DPA; Proceso de cierre del grupo C y D; Oficialización de Informes de cierre de ajuste emergente del servicio de acompañamiento familiar; Producción de ficha de cierre del grupo C Y D, Proceso de Cierre - eventos- de acompañamiento familiar; y, en el marco de acciones interinstitucionales el Proceso de Prevención de Violencia de Género (cajas de herramientas, articulación con Viceministerio de Inclusión Social). Es importante mencionar que desde este mes se está generando la propuesta de sistematización de los resultados del proyecto de acompañamiento familiar.		
JUNIO 2017 PROCESO METODOLÓGICO: En el mes de junio de 2017, el equipo responsable de proceso de metodología inició varios procesos relevantes relacionados con la implementación del acompañamiento familiar, entre los más relevantes: proceso cierre acompañamiento familiar grupo C y grupo D (directrices, fichas de cierre), Cierre emergente grupo C y grupo D, Cierre de la Estrategia de Acompañamiento Familiar en la comunidad, operativo de actualización de la información familias en acompañamiento DPA; además, de la articulación a nivel de todas las subsecretarías del MIES para la operación de las acciones para cumplir con el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género. PROCESO FINANCIERO: en el mes de junio, se realizó el seguimiento a la ejecución presupuestaria del proyecto, en virtud de que los avales fueron aprobados en la mayoría de distritos se solicitó se realicen los procesos de contratación y de pago para los ítems de materiales de oficina y alquiler de vehículos, con la finalidad de visualizar ejecución. Se solicitó a los Distritos envíen la información concerniente a los procesos de contratación que se encuentran en ejecución para cargar en el Módulo III SIPEIP de contratos. Se realizó la formulación del PAI 2017 en la que se registra los montos a requerir hasta el mes de diciembre del 2017, (los montos a requerir se registraron en negativo ya que el proyecto mantiene un déficit presupuestario en las partidas del grupo de gasto 73	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	04/07/2017 - 07:32 PM
MAYO 2017 Proceso metodológico.- En el mes de mayo de 2016 las acciones se centraron en: la articulación con la Dirección de Procesos para revisión de la Norma Técnica del Servicio de Acompañamiento Familiar, revisión de documento preliminar y revisión de Modelo de Gestión de Unidades de Trabajo Social, en marco del Proceso de Institucionalización del Servicio; Proceso de Seguimiento (vinculación de familias de grupo E, Seguimiento a directrices de ajuste metodológico del grupo C y rezagadas de grupos A y B) y el Informe de avance de acompañamiento familiar (estado de implementación de metodología de acompañamiento familiar, detallando # de familias que se encuentran en cada grupo y sesión, con datos levantados mediante encuesta google (entre el 10 y 12 de mayo) y el reporte del SIPPS con cohorte 4 de mayo 2017. Proceso Financiero.- En virtud de que el Proyecto mantiene un déficit presupuestario se realizó una proyección de los recursos a ejecutar hasta Diciembre del 2017, se justificó el requerimiento mediante informe técnico para solicitar el incremento al Ministerio de Finanzas. En el proceso de seguimiento a la ejecución presupuestaria se insistió a las Direcciones Distritales realicen proceso de certificación y solicitud de aval para el ítem 730517 Vehículos Terrestres (Arrendamientos) y 730804 Materiales de Oficina para que a su vez inicien los procesos de contratación. Se realizó el seguimiento a nivel Distrital de los contratos que se encuentran en ejecución con la finalidad de que se reporte el sistema de Senplades SIPEIP.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	02/06/2017 - 05:22 PM
ABRIL 2017: PROCESO METODOLÓGICO: En el marco de la ejecución de la Estrategia de Acompañamiento Familiar se ha revisado el documento de la norma técnica del servicio y se ha elaborado los informes de estado del proyecto de inversión en el marco del proceso de transición de gobierno. Se cuenta con reporte actualizado del avance de condiciones básicas de desarrollo familiar en cuanto al acceso a servicios, requerimientos de familias por dimensión -requerimientos de servicios sociales-: 53.205 en Educación; 59.376 familias en Identificación; 59.100 en Ingresos y Trabajo; 25.985 familias en Inclusión Social; 60.481 en Salud; 3.500 en Dinámica Familiar; y, 4.388 en Derechos y Justicia (04/05/2017). PROCESO FINANCIERO: Demora en la aprobación de avales y reformas presupuestarias. Durante el mes de marzo de 2017, en referencia a la aprobación de los avales del proyecto, desde planta central a través de la Subsecretaría de Familia, Dirección Financiera y Coordinación General de Planificación, se han mantenido varias reuniones con el Ministerio de Finanzas. Como parte de las resoluciones, se solicitó homologar el ítem presupuestario al ítem 730517 por lo que se realizó reforma presupuestaria mediante Memorando Nro. MIES-SF-2017-0200-M de 10 de abril y esta fue aprobada por el MF el 26 de abril del 2017, lo que implica que desde Distrito deben realizar nuevamente el proceso de solicitar certificación presupuestaria y aval. Como alerta	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	05/05/2017 - 03:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
se indica que desde Distrito se encuentran planteado los avales y nuevamente el Ministerio de Finanzas demora el proceso de aprobación. Mediante memorando Nro. MIES-SF-2017-0242-M de 28 de abril del 2017 de fecha 28 de abril del 2017 se informó al Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica que se procedió a ingresar los comprobantes únicos de registro (CUR) de los contratos correspondientes al "Proyecto Acompañamiento Familiar" correspondiente al año 2016 en el módulo 3 SIPEP. En respuesta al memorando Nro. MIES-CGPE-2017-0424-M de 25 de abril del 2017 se ingresó en el Módulo de Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública -SIPEP la programación semestral de metas.		
MARZO 2017: PROCESO METODOLÓGICO.- El mes de marzo entre los procesos relevantes, se destacan: la construcción Manual de Proceso de Gestión Interna de Acompañamiento Operativo en Territorio y Manual de Procesos de Análisis Programático, Normativa y Articulación Interinstitucional, incluye la institucionalización del servicio de acompañamiento familiar, seguimiento a la implementación del acompañamiento familiar de los grupos C, D y E; además, del seguimiento a la ejecución presupuestaria del proyecto de inversión. Análisis de saldos déficit y superávit del proyecto. Análisis de respuesta dada por SENPLADES para financiar el déficit del proyecto. PROCESO FINANCIERO: Entre los procesos relevantes realizados a nivel Distrital, mediante memorando Nro. MIES-SF-20170162-M, se insitió a los Distritos realicen el proceso de certificación presupuestaria y solicitud de aval de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 011, dentro de las partidas del grupo 73. Con memorando Nro. MIES-SF-2017-0135-M se emite los procedimientos a seguir para las contrataciones que se realizan en el proyecto a nivel nacional, se adjunta la normativa, resoluciones y documentos referentes a los procesos de contratación de servicio de movilización, materiales de oficina. Dentro de las gestiones realizadas con el Ministerio de Finanzas, mediante Oficio Nro. MIES-SF-2017-0013-O se solicitó emitan las directrices que permitan tener claridad en el procedimiento de certificaciones presupuestarias y obtención de aval. Con oficio MIES-SF-2017-0052-M, la patrocinadora del proyecto informa al Viceministro que el presupuesto asignado al proyecto no corresponde a lo solicitado, generando un déficit por el monto de \$2.452.434.70, por lo que requiere generar los mecanismos para lograr la asignación del presupuesto total programado para el 2017. Mediante Oficio Nro. MIES-MIES-2017-0094-O la señora Ministra solicita al Ministerio de Finanzas realice el incremento de techo presupuestario al proyecto, la información se sustenta mediante informe técnico y metodológico.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	04/04/2017 - 09:07 AM
Febrero 2017 : Proceso metodológico: En el mes de febrero de 2017, el equipo técnico de la Estrategia de Acompañamiento Familiar elaboró la propuesta de capacitación y seguimiento de la implementación metodológica; además, de la construcción de la caja de herramientas referente al proceso de prevención de uso y consumo de drogas. También se elaboró el proceso de actualización de información de las familias en acompañamiento familiar, los resultados se tendrán en el mes de marzo. Proceso Financiero: Con memorando No.MIES-SF-2017-0065-M, se envió a las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales el PAPP 2017 del proyecto Acompañamiento familiar, a la vez se solicitó realizar los procesos de contratación con la finalidad de que se visualice ejecución presupuestaria y el Ministerio de Finanzas asigne los recursos faltantes al proyecto (déficit en el grupo 73 es de \$2.452.434,70). Con memorando No. MIES-SF-2017-0070-M, se solicitó a los Directores Distritales reportar con fecha 15 de cada mes la nómina del programa 57 "Acompañamiento Familiar" actividad 009, grupo de Gasto 51, correspondiente a la contratación del personal. Con memorando Nro. MIES-SF-2017-0071-M se solicitó llenar la matriz de registro de contratos con los Procesos de ínfima cuantía/ Catálogo Electrónico/ o cualquier otro proceso realizado en el portal de compras públicas. Con Memorando Nro. MIES-SF-2017-0106-M del 24 de febrero de 2017; se remite a las direcciones distritales y coordinaciones zonales los lineamientos para la solicitud de avales de los ítems presupuestarios del proyecto de inversión "Acompañamiento Familiar". Con Memorando Nro. MIES-SF-2017-0052-M la Subsecretaria de Familia, informa al Viceministro de Inclusión Económica que el presupuesto asignado al proyecto Acompañamiento Familiar en los primeros días de enero, no corresponde al solicitado, lo cual genera un déficit por el monto de \$2.452.434,70, al respecto y debido a la importancia de contar con el presupuesto total para la atención de los núcleos familiares a través del servicio de acompañamiento familiar, se solicita al viceministerio de inclusión económica, a través del memorando Nro. MIES-VIE-2017-0034-M del 02 de febrero de 2016, generar los mecanismos necesarios para lograr la asignación del presupuesto total programado para el año 2017.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	10/03/2017 - 12:19 PM
Enero 2017 Proceso metodológico: En el mes de enero de 2017, el equipo técnico de la Estrategia de Acompañamiento Familiar se centró en la planificación metodológica y presupuestaria. En lo referente a la implementación metodológica se realizó un proceso de redistribución de las familias, esto debido a la reducción de personal planificada para el año 2017, en territorio se ejecutaron operativos para retomar el acompañamiento y hacer el contacto de las familias con los	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	10/03/2017 - 11:55 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
nuevos técnicos. En lo que tiene que ver con el seguimiento se elaboró el informe de avance de intervención, en el que se incluye el cumplimiento de meta del grupo E que ingresó en el 2016. Proceso Financiero: Con memorando Nro. MIES-SF-2017-0005-M, se solicitó a distrito remitan el detalle de las obligaciones contraídas con proveedores y de personal en los años 2015 y 2016 esto con el fin de realizar el análisis y priorización de asignación de recursos. Con memorando No. MIES-SF-2017-0020-M, se solicitó a las Direcciones Distritales reportar la información de Registro de contratos con corte al 31 de diciembre del 2016 con sus respectivos respaldos. Con memorando Nro. MIES-SF-2017-0054-M se actualizó el Registro de Contratos en el módulo SIPeIP módulo contratos III. Proceso de Planificación: Mediante correos electrónicos de fechas 19 de enero y 25 de febrero de 2016 la Senplades emite las observaciones al proyecto. A través de correos electrónicos de fechas 04 de febrero, 17 y 31 de marzo, 01, 03,06 y 22 de junio de 2016, el Ministerio de Inclusión Económica y Social da contestación a los requerimientos realizados por SENPLADES. Con Oficio No. SENPLADES-SINV-2016-0421-OF de fecha 04 de julio de 2016, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo retorna el proyecto. El 25 de julio de 2016 se mantiene una reunión con el Director de Análisis de Proyectos de SENPLADES con el fin de aclarar el contenido del oficio No. SENPLADES-SINV-2016-0421-OF de fecha 04 de julio de 2016, en esta reunión el funcionario se ratifica en la respuesta aclarando que el MIES no necesita dictamen de actualización de prioridad ya que el proyecto está incluido en el PAI 2016 y es prioritario. El 25 de agosto 2016 el Viceministro de Inclusión Económica envía el Oficio Nro. MIES-VIE-2016-0600-0 en el cual solicita se realice el análisis a fin de que se emita el Dictamen de Actualización de Prioridad y Aprobación del Proyecto de inversión esta manera cumplir con los objetivos del Proyecto. En este oficio se aclara que el proyecto no planifica ampliar la cobertura del servicio por el contrario existe una disminución para el año 2016 y 2017. El 8 de septiembre de 2016 en oficio Nro. SENPLADES - SINV-2016-0578 OF, la SENPLADES avoca conocimiento del proyecto "Promoción de la Movilidad social Accedente de las familias en extrema pobreza usuarias del BDH y en respuesta al oficio enviado el 25 de agosto de 2016 la Subsecretaria de Inversión, se ratifica en el oficio enviado el 4 de julio de 2016.		
DICIEMBRE 2016.- El presente mes se ejecutó el proceso de evaluación del equipo de la Estrategia de Acompañamiento Familiar en territorio, con los resultados se definirá el personal que se le renovarán los contratos para el 2017. Además, se ejecutaron los eventos de cierre de los grupos A y B a nivel nacional, una vez que concluyeron dos años de acompañamiento, en el área financiera en el mes de Diciembre se realizó el seguimiento a la provisión de liquidaciones del personal que salió en el 2016 dentro de la partida 71. Se registró en el Sistema SIPP informacion de las contrataciones realizadas en Distrito dentro del grupo de gasto 73.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	05/01/2017 - 07:29 PM
En el marco de la ejecución de la Estrategia de Acompañamiento familiar se ejecutan los eventos de cierre del AF, además en este mes se realiza el proceso de evaluación del equipo técnico de cada uno de los distritos. Otro proceso importante es el proceso de institucionalización del servicio la generación de insumos en relación a la microplanificación. En el área financiera se emiten las disposiciones para liquidar al personal de la Estrategia en Distritos, además se confirma los montos asignados para realizar las liquidaciones del personal que cesará sus funciones en diciembre de 2016. Dentro del grupo de gasto 73 se envía a los Coordinadores Zonales y Directores Distritales el seguimiento a la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de noviembre.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	05/12/2016 - 05:24 PM
OCTUBRE: En el mes de Octubre en el proceso metodológico las principales acciones ejecutadas tienen que ver con: el ingreso de 12.000 familias del grupo E, se remitió la caja de herramientas para la implementación metodológica; en este mes se ejecuta el proceso de cierre del acompañamiento familiar de los grupos A y B incluido el cierre comunitario (envío de directrices a territorio); además, analistas de familia zonales realizaron proceso de seguimiento tanto al acompañamiento a familias usuarias del Bono de Desarrollo Humano, como a familias damnificadas por el terremoto Usuarías del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación y familias en albergues. En cuanto al proceso Financiero en virtud del recorte presupuestario realizado en el mes de septiembre por el Ministerio de Finanzas, mediante Oficio Nro. MIES-VIE-2016-0707-O se realizó informe Técnico en el cual se planteó al Ministerio de Finanzas la necesidad de restituir en ciertos casos los montos recortados y realizar reducción a otros ítems presupuestarios de manera que la afectación a las actividades en ejecución para el último trimestre del año sea de menor impacto, además mediante Circular Nro. MIES-VIE-2016-0007-C el Viceministro de Inclusión Económica solicitó a los Directores Distritales información de liquidaciones pendientes de pago al personal que laboró en el proyecto desde el período con la finalidad de realizar un análisis al Grupo de Gasto 71 y plantear reforma presupuestaria desde planta central. Mediante Memorando MIES-SF-2016-0444-M, desde la Subsecretaría de Familia se solicitó a los Distritos envíen información relacionada a los procesos de contratación realizados dentro del Grupo de Gasto 73 con sus respectivos respaldos.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	05/11/2016 - 11:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2016- En el mes de septiembre de 2016, el equipo de la Estrategia de Acompañamiento Familiar ejecutó las siguientes acciones: proceso de cierre del Grupo A; proceso de capacitación a personal contratado por la emergencia técnicos de acompañamiento familia que atienden a familias usuarias del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación y promotores familiares que atienden a familia en albergues; y, proceso de capacitación a equipo en territorio (coordinadores UTS, supervisores, técnico de acompañamiento familiar referente) para operar los diferentes procesos de la Subsecretaría de Familia. En cuanto al proceso Financiero con fecha 21 de septiembre del 2016 el Ministerio de Finanzas aprobó la reforma nacional No.MIES-CGPGE-DPI-RPI-2016-03. El Ministerio de Finanzas mediante modificación presupuestaria Nro. 2175 realizada con fecha 29 de Septiembre de 2016, realizó la regulación al PAI 2016, reduciendo el presupuesto al Proyecto "Promoción la movilidad social ascendente de las familias en extrema pobreza usuarias del BDH mediante el acompañamiento familiar y la articulación de las intervenciones y recursos en su entorno", en este contexto se elaboró informe Técnico el cual se planteó al Ministerio de Finanzas, la necesidad de restituir en ciertos casos los montos recortados y realizar la reducción de otros distritos y partidas presupuestarias; de manera que la afectación a las actividades en ejecución y planificadas para el último trimestre, sea la de menor impacto.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	05/10/2016 - 04:59 PM
AGOSTO-2016 Proceso Financiero: Se realiza planteamiento de reforma a nivel nacional con la finalidad de cubrir beneficios de ley (décimos) a nivel nacional. Proceso Metodología: En el marco de la ejecución de la Estrategia de Acompañamiento Familiar, con el objetivo de cumplir con la meta referente al 2016, se cuenta con la base para el ingreso de 12.500 familias distribuidas en los 40 distritos MIES. Al momento en 11 de los 40 distritos MIES, se está ejecutando el proceso de contratación para continuar con el acompañamiento a familias damnificas tanto en albergues como a familias usuarias del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación. En este mes también se trabajó en el ajuste metodológico para estas modalidades de acompañamiento.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	05/09/2016 - 05:36 PM
AÑO 2015: No se cumplieron los hitos 32 y 35: el retrasó en el cumplimiento de las actividades planificadas por el acuerdo ministerial 0149 de fecha 13 de abril del 2015, en el cual indica que se debe solicitar al comité de inversión el aval respecto de los montos a certificar y/o comprometer. La reducción del presupuesto del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Inclusión Económica y Social del 2015, del proyecto "Promoción la movilidad social ascendente de las familias en extrema pobreza usuarias del BDH mediante el acompañamiento familiar y la articulación de las intervenciones y recursos en su entorno" el 03 de Octubre de 2015, por el Ministerio de Finanzas AÑO 2016: HITO 45: No se cumple, en virtud a que SENPLADES, sigue emitiendo observaciones através de zimbra, por lo que no se termina de atender los requerimientos. HITO 49: No se cumple, debido a la emergencia nacional presentada por el terremoto del 16 de abril del presente año, donde las actividades se modificaron para atender las necesidades en las zonas afectadas. JULIO2016: Proceso Financiero: Se analiza saldos disponibles en territorio y planta central con la finalidad de reprogramar actividades que dependan de recursos presupuestarios y realizar planteamiento de reforma para aprobación de las autoridades. Proceso Metodología: En el mes de julio desde la Estrategia de Acompañamiento Familiar se realiza el acompañamiento a familias usuarias del Bono de Desarrollo Humanos (grupos A, B, C, D) a nivel nacional; además, del acompañamiento a familias usuarias del Programa de Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación, principalmente, concentrados en la zona cero, acompañamiento a familias que se encuentran en albergues. El equipo técnico de acompañamiento familia opera en territorio el Programa de Bono Acogida, Alquiler y Alimentación.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	05/08/2016 - 04:50 PM
AÑO 2015: No se cumplieron los hitos 32 y 35: el retrasó en el cumplimiento de las actividades planificadas por el acuerdo ministerial 0149 de fecha 13 de abril del 2015, en el cual indica que se debe solicitar al comité de inversión el aval respecto de los montos a certificar y/o comprometer. La reducción del presupuesto del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Inclusión Económica y Social del 2015, del proyecto "Promoción la movilidad social ascendente de las familias en extrema pobreza usuarias del BDH mediante el acompañamiento familiar y la articulación de las intervenciones y recursos en su entorno" el 03 de Octubre de 2015, por el Ministerio de Finanzas AÑO 2016: HITO 45: No se cumple, en virtud a que SENPLADES, sigue emitiendo observaciones através de zimbra, por lo que no se termina de atender los requerimientos. Se enviará solicitud de cambio.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	05/07/2016 - 04:17 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2016: HITO 49: No se cumple, debido a la emergencia nacional presentada por el terremoto del 16 de abril del presente año, donde las actividades se modificaron para atender las necesidades en las zonas afectadas. Proceso Presupuestario: Se evidencia baja ejecución presupuestaria, A inicio de año los Distritos, realizaron el proceso para solicitud de aval de las partidas Vehículos (arrendamiento), Pasajes al Interior y Materiales de Oficina, con una demora en la aprobación por parte del MinFin aproximadamente de dos meses. Una vez que los Distritos contaban con los avales de las partidas anteriormente descritas, según el Acuerdo No. 0048 vigente desde el 14 de marzo de 2016, con el cual el MinFin incorpora y modifica varios ítems en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, se afecta el ítem de Vehículos (arrendamiento) por el ítem Vehículos Terrestres (arrendamiento). Además, por la aprobación de la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana, en la que afecta el IVA del 12% al 14%; los avales que se encontraban en estado solicitado en el sistema E-sigef del MinFin hasta el 31 de mayo del 2016 fueron rechazados, por consiguiente los Distritos plantearon nuevamente la solicitud de avales. Para los ítems que tenían aval e iniciaron el proceso de contratación, al momento de realizar el pago, el sistema E-sigef del MinFin presenta un error en el que indica que deben liquidar la certificación presupuestaria y solicitar dos nuevas certificaciones por el monto y otra por el IVA del 14% lo que conlleva a reiniciar nuevamente el proceso. Para los ítems de pasajes al interior y viáticos y subsistencias en el interior, su ejecución se vio afectada por la reforma a la Norma Técnica de Viáticos, en la que estipula que se reconocerá pasajes y viáticos siempre y cuando cumplan con una distancia mayor a 100km. Las Zonas 4, 2, 9, no cuentan con procesos financieros y administrativos iniciados, de acuerdo al seguimiento realizado y la baja ejecución. Proceso Metodológico: Se están realizando los ajustes necesarios a la metodología del acompañamiento familiar para atender a las familias afectadas y damnificadas por el terremoto. La metodología se la debe adaptar en dos ámbitos: Acompañamiento Familiar para familias damnificadas que se encuentran en los Albergues y Acompañamiento Familiar para familias damnificadas que reciben el bono de acogimiento, alquiler y/o alimentación.		
AÑO 2015: No se cumplieron los hitos 32 y 35: el retrasó en el cumplimiento de las actividades planificadas por el acuerdo ministerial 0149 de fecha 13 de abril del 2015, en el cual indica que se debe solicitar al comité de inversión el aval respecto de los montos a certificar y/o comprometer. La reducción del presupuesto del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Inclusión Económica y Social del 2015, del proyecto "Promoción la movilidad social ascendente de las familias en extrema pobreza usuarias del BDH mediante el acompañamiento familiar y la articulación de las intervenciones y recursos en su entorno" el 03 de Octubre de 2015, por el Ministerio de Finanzas MAYO 2016 HITO 45: No se cumple, en virtud a que SENPLADES, sigue emitiendo observaciones a través de zimbra, por lo que no se termina de atender los requerimientos. Se enviará solicitud de cambio de fecha por 30 días más. Proceso Presupuestario: Se evidencia baja ejecución presupuestaria, debido al cambio de autoridades, procesos demorados en el Ministerio de Finanzas. Proceso Metodológico: En el mes de mayo se ejecutaron una serie de actividades referentes a los procesos de metodología y seguimiento. En lo referente a lo metodológico se concluyó con la propuesta de cierre del acompañamiento familiar de "Grupo A"; además, se encuentra en desarrollo la Propuesta de Acompañamiento a Familias Damnificadas. En cuanto al proceso de seguimiento, en el mes, se ejecutó el seguimiento a la implementación metodológica a través de las matrices de planificación y ejecución, a la par, se realizó el seguimiento a la operativización del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	03/06/2016 - 04:57 PM
ABRIL 2016: Desde el Proceso de Metodología y el Subproceso desarrollo e implementación del acompañamiento familiar, en este mes se concluyó con la elaboración del Informe de ejecución de cada una de las zonas y sus distritos, el informe incluye: resumen de ejecución -cobertura-, estado de la implementación metodológica -sesiones ejecutadas-, alertas y observaciones obtenidas de la ejecución del Proceso de Seguimiento correspondiente al primer trimestre del 2016 (matriz de nómina, matriz de sesiones) referentes a la ejecución de la estrategia y compromisos del equipo técnico de la Subsecretaría de familia. Se elaboraron los informes de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 8, el mes anterior se realizaron los de la zona 9 y zona 6, estos informes son presentados en los Comités Zonales. Proceso de Ejecución Presupuestaria; se envió directrices para el ítem de Espectáculos culturales y sociales, además se solicitó realicen el planeamiento de reforma en función al acuerdo 048 emitido por el Ministerio de Finanzas. En cuento a los Hitos que no se cumplieron en el mes de marzo, se remite memorando para le cambio de fechas comprometidas.	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	05/05/2016 - 04:43 PM
MARZO 2016:		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Proceso Metodológico: se ejecutó, a nivel nacional, el Proceso de Seguimiento sobre la implementación metodológica de la Estrategia de Acompañamiento Familiar. En enero y febrero, en un primer momento, el equipo técnico nacional se trasladó a cada distrito, el objetivo a cumplir fue constatar el estado de la implementación del Acompañamiento Familiar, entre las actividades que se desarrollaron están: revisión de expedientes físicos de cada familia y su actualización en el SIPPS, retroalimentación a los equipos en territorio sobre implementación metodológica y llenado de la Matriz Nómina conjuntamente con cada supervisor/a. La matriz nómina recoge información referente a: administración del personal, cobertura de la estrategia (número de familias en estado activo, número de familias en estado inactivo), número de familias por cada grupo/base A, B, C, D, E. Proceso Presupuestario: se emiten directrices respecto al reembolso de pasajes de los primeros meses del año, seguimiento presupuestario y de contratación de la plantilla ideal de TAF en distritos. Envío del pago de la factura del mes de diciembre a claro, por concepto de plan de datos móviles para las tablets. Con respecto a los Hitos: 42 - EJECUCIÓN: Dictamen de prioridad del proyecto Acompañamiento Familiar, emitido por SENPLADES, actualizado. Se plantea cambio en la fecha comprometida menor a 30 días. Actualmente el proyecto se encuentra en revisión de la SETECI (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional), a la espera del Aval, luego de solventar la observación de forma al cronograma valorado. Finalmente hay que puntualizar que el retraso generado ha sido por los tiempos consumidos por las Instituciones que intervienen para el otorgamiento del aval y tramites como el de la SNAP que no estuvo en la actualización del año pasado 43 - EJECUCIÓN: Encuentros comunitarios con las familias usuarias BDH que forman parte de la de acompañamiento familia, desarrollados. Se plantea cambio en la fecha comprometida mayor a 30 días. El Hito mencionado anteriormente, no se pudo cumplir en el mes de marzo, ya que por restricciones presupuestarias y priorización de actividades se pospuso su ejecución para el mes de mayo del 2016, cabe indicar que el Hito se cumplirá sin presupuesto asignado, pues debido a restricciones de talento humano de la Dirección, esta actividad cambió también la metodología y logística. 45 - EJECUCIÓN: Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia de Acompañamiento Familiar, construido. Se plantea cambio en la fecha comprometida mayor a 30 días. Con respecto al resumen ejecutivo del último cuatrimestre del 2015, se encuentra adjunto un documento.		
Enero 2016: Proceso Metodológico: En el mes de enero del presente año, se definieron nuevos lineamientos para ejecutar la Estrategia del Plan de Acompañamiento Familiar y operar las acciones de la Subsecretaría de Familia; uno de los procesos corresponde a metodología, incluye otros subprocesos, con este antecedente se presenta las acciones ejecutadas en cada uno de los subprocesos. Subproceso Transversalización de los enfoques de prevención de violencia de género y prevención de uso y consumo de drogas, Subproceso sensibilización y promoción, Subproceso Desarrollo e implementación del acompañamiento familiar, Subproceso estrategias metodológicas frente a eventos adversos. Proceso Actualización del SIPPS: al interior del equipo de la Subsecretaría, se han realizado reuniones para analizar y definir los aspectos que deben ser ajustados en el SIPPS. Este proceso se sustenta en las alertas recibidas desde territorio. Proceso Presupuestario: Al proyecto Promoción a la movilidad social ascendente de las familias en extrema pobreza usuarias del BDH mediante el Acompañamiento Familiar se realiza el incremento de \$3.728.311,07 quedando un total de \$ 13.986.783,04. Enero - Diciembre 2015: Hitos que no se lograron cumplir en el año 2015: HITO 30: EJECUCIÓN: Congreso Internacional de buenas prácticas de acompañamiento familiar, realizado. HITO 32: EJECUCIÓN: Equipos informáticos para la utilización de los técnicos de Plan Familia, entregados a los distritos. HITO 33: EJECUCIÓN: Estrategia comunicacional para el posicionamiento de la estrategia de acompañamiento familiar, socializada. HITO 34: EJECUCIÓN: Informe anual de la gestión de la estrategia de acompañamiento familiar, entregado. HITO 35: EJECUCIÓN: Materiales e indumentaria de prendas de protección para personal de acompañamiento familiar, entregado. HITO 37: EJECUCIÓN: Socialización de las Políticas Públicas relacionadas a los servicios que forman parte del acompañamiento familiar Justificación: La planificación de las actividades aprobadas a inicio de año, fue reprogramada por parte de las autoridades de la Subsecretaría de Familia y el Viceministerio de Inclusión Económica, por un sentido de responsabilidad ante la necesidad de la emergencia que viene atravesando en país el segundo semestre del año. El retrasó en el cumplimiento de las actividades planificadas por el acuerdo ministerial 0149 de fecha 13 de abril del 2015, en el cual indica que se debe solicitar al comité de inversión el aval respecto de los montos a certificar y/o comprometer. La reducción del presupuesto del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Inclusión Económica y Social del 2015, del proyecto "Promoción la movilidad social ascendente	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	04/03/2016 - 04:22 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de las familias en extrema pobreza usuarias del BDH mediante el acompañamiento familiar y la articulación de las intervenciones y recursos en su entorno" el 03 de Octubre de 2015, por el Ministerio de Finanzas. Diciembre 2015: Proceso Metodológico: Con el fin de fortalecer la Estrategia de Acompañamiento Familiar y su implementación, se ha mantenido el proceso de revisión, ajuste y validación y aprobación de documentos y herramientas referentes a la metodología, en todos los casos se ha procedido con el trámite de impresión luego de las observaciones de la Dirección de Comunicación del MIES, estos son: Cuaderno De Campo, Protocolo De Inclusión Económica, Ficha Del Plan De Acompañamiento Familiar, Manual Operativo, Manual De Corresponsabilidad, Guía Metodológica De Acompañamiento Familiar, Orientaciones Metodológicas Para Encuentros Comunitarios Imantados, Cuaderno Para La Familia y Certificado. Adicionalmente se ha realizado: Coordinación Intersectorial, y la Actualización Del Sipps (Sistema Integrado De Proyectos Y Procesos Sociales).		
Julio 2015 Revisión de las cargas familiares por cada distrito de acuerdo a la metodología de acompañamiento familiar, revisión de instrumentos técnicos y protocolos con los ajustes metodológicos, revisión y elaboración de material educomunicacional. En la parte presupuestaria se realizó una reforma presupuestaria transfiriendo recursos a los Distritos para la Socialización de los Enfoques de la Estrategia de Acompañamiento Familiar a Nivel Nacional, esta actividad tiene como finalidad realizar las Escuelas de Familia. Además, se inicia el proceso precontractual de la Actividad Reproducción de materiales comunicacionales para la ejecución de la estrategia de acompañamiento familiar. se realizó el Taller de Formación TAFs referenes nacionales en temáticas de corresponsabilidad comunitaria. Junio 2015 Con el reajuste de la metodología para el 2015 se procedió a revisar las fases, frecuencia y ajustar los instrumentos técnicos que se utilizarán para el acompañamiento familiar en este año. A continuación se detallan las fases y los instrumentos revisados por cada fase: FASE I PREVIA A LAS SESIONES CON LA FAMILIA, FASE II DE DIAGNÓSTICO, FASE III DE ACTIVACIÓN Y GESTIÓN Y FASE IIII DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN. Mayo 2015 En relación a la metodología de Acompañamiento familiar, en el mes de mayo se realizó un reajuste metodología de la Estrategia de Acompañamiento Familiar, considerando las experiencias y sugerencias de la implementación del Piloto 2013 - 2014 a nivel territorial. El reajuste realizado para el segundo semestre del 2015, se trabajará con las mismas 8 dimensiones y con 35 condiciones. En cuanto a las consultorías del BID se inicia: 1) Consultoría: "DISEÑO DEL MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 2) Consultoría: "GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CUALITATIVA SOBRE LA MOVILIDAD SOCIAL . En temas de presupuesto desde la Gerencia se aprueba reformar en Distrito, se emite directrices para la ejecución del presupuesto, se inicia procesos de contratación pública y se reprograma algunas actividades del PAPP. Abril 2015 En relación a las actividades del BID se procede a dar inicio al proceso precontractual para la contratación de los servicios de consultoría: "DISEÑO DEL MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (DEFINIR CONJUNTO DE INDICADORES Y VARIABLES)". Se realizan gestiones internas con el fin de certificar recursos e iniciar la contratación de procesos precontractuales. Marzo 2015 En base al cruce de información de bases de datos y el análisis estadísticos se elaboraron los gráficos de resultados para levantar el informe de caracterización que servirá para definir los nuevos criterios de focalización para la Estrategia de Acompañamiento Familiar. Levantamiento de información sobre el tipo y uso de las cocinas de los de los hogares acompañados, con el fin de conocer la demanda que existirá en torno al tipo de cocina que utilizan nuestros usuarios BDH. De esta manera, a nivel nacional se levantaron 22.905 encuestas a los núcleos familiares que son parte de la Estrategia de Acompañamiento Familiar. A través de memorando Nro. MIES-VAMS-2015-0190-M la gerencia del proyecto de movilidad social de las familias usuarias del BDH se solicita se inicie la elaboración del acuerdo ministerial en el que se nombre al ordenador del gasto para la ejecución del convenio de cooperación ATN/JF 13731-EC. Se solicita a la Coordinadora General Administrativa Financiera certificación presupuestaria de las actividades al PAPP 2015 de la Estrategia Acompañamiento Familiar, en relación al	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	05/08/2015 - 05:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
proceso de adquisición de equipos (computadoras de escritorio y scanners); se ha procedido a la certificación de actividades y presupuestaria y los términos de referencia se encuentran validándolos en la Dirección de tecnologías de la información.		
Con cohorte a 27 de febrero se registra en el SIPPS un total de 982 Técnicos incluidos supervisores, este personal tiene asignado un total de 48.169 núcleos familiares, de los cuales 35.454 se encuentran en las fases de intervención. Las 35.454 familias asignadas al sistema, o vinculadas a los TAF han sido visitadas y registran al menos la primera sesión y del total de familias asignadas 48.169, se registran 23.719 que han iniciado el levantamiento de línea de base y de estas 16.440 cuentan con la encuesta de Condiciones Básicas de Desarrollo Familiar levantada (Diagnóstico de Condiciones básicas). A partir de este segundo año de ejecución 2015, se activa el componente 2 del proyecto: "Fortalecer el proceso de inclusión económica y movilidad social mediante el acompañamiento profesional y personalizado a núcleos familiares usuarios del BDH en extrema pobreza", en este sentido en el mes de febrero se ha realizado un análisis de distribución del personal técnico en el territorio a ser contratado, se han levantado los TdR de este personal, teniendo como resultado la contratación 38 de los 40 técnicos de inclusión económica, por otro lado se elaboro una propuesta de intervención en relación a este componente, misma que contiene: la estrategia, el protocolo de intervención, el módulo de inclusión Económica dentro del aplicativo de acompañamiento familiar - SIPPS y una propuesta de capacitación para el equipo técnico, todas estas actividades se han desarrollado en coordinación con la Subsecretaría de Inclusión Económica. Con fecha 25 de febrero 2015, se solicita a la Coordinación General de Planificación la reforma presupuestaria del proyecto a fin de redistribuir el presupuesto, de tal manera que permita una mejor operatividad y ejecución del mismo. Finalmente la ficha que contiene la propuesta para actualización de la herramienta 2015 se encuentra en revisión.	Bassantes Espinel, Martha Cecilia	11/03/2015 - 09:22 AM
Durante el mes de enero, se ha realizado un seguimiento desde Planta Central, vía telefónica y correo electrónico con los técnicos zonales de familia y coordinadores UTS, a fin de corroborar el funcionamiento del plan de datos y el localizador de los equipos (tablets) entregados a los TAF para fortalecer el proceso de acompañamiento familiar a nivel nacional. Al respecto se debe informar que los inconvenientes encontrados en el funcionamiento del plan de datos y localizador están siendo subsanados con la operadora de telecomunicaciones contratada para el efecto. Con respecto al proceso de acompañamiento familiar de la herramienta SIPPS, con fecha 29 de enero, se registra un total de 32.287 familias acompañadas; 23.326 familias que han iniciado la Línea de Base y 16.463 familias que cuentan con Línea de Base, cabe indicar que el número de familias que han sido asignadas en el sistema es un total de 46.428. Respecto del personal que realiza el acompañamiento familiar, se registra un total de 824 Técnicos de Atención Familiar - TAF y 91 Supervisores, se debe mencionar que la diferencia entre el personal existente entre diciembre de 2014 y enero de 2015 se debe a que los procesos de contratación aún no están finiquitados en los distritos. En lo que respecta al Plan Anual de Política Pública - PAPP 2015 del proyecto, el grupo de gasto 710000 "Grupo de Gastos en personal para Inversión" con fecha 26 de enero de 2015 fue aprobado por el Ministerio de Finanzas, que se refleja en la herramienta e-SIGEF, por lo que se procedió a dar disposición de contratar el personal hasta el 15 de febrero de 2015; por otro lado, está pendiente la aprobación de la reforma presupuestaria en el Sistema e-SIGEF para la distribución de recursos en el grupo de gasto 730000 "Bienes y Servicios para la Inversión"	Bassantes Espinel, Martha Cecilia	05/02/2015 - 03:52 PM
Con corte a 29 de diciembre de 2014, el Sistema Integrado de Procesos y Proyectos Sociales - SIPPS registra un total de 979 técnicos de acompañamiento familiar y 102 supervisores. Con este número de personal que implementa la mencionada estrategia, se registran 25.143 núcleos familiares visitados, lo cual representa un 43% del avance de la metodología. Es importante resaltar que a este sistema se lo puede considerar como una herramienta oficial, que ha permitido el levantamiento de información tanto por Zonas como por Distritos MIES, además de monitorear e identificar avances y limitaciones respecto del proceso de acompañamiento realizado a los núcleos familiares en extrema pobreza. Durante el 2014 se distribuyó un total de 69.071 núcleos familiares que deberán continuar con su respectivo acompañamiento, es decir que se ha cumplido el 100% de la meta establecida para este año (41.250).	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	05/01/2015 - 05:10 PM
Durante el mes de noviembre, el personal que está realizando el proceso de acompañamiento familiar ha alimentado la herramienta Sistema Integrado Programas y Proyectos Sociales, luego de lo cual se puede evidenciar el registro de 25.703 familias que están siendo acompañadas, con corte al 27 de noviembre 2014. Cabe resaltar que en este mes se ha realizado el ingreso	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	05/12/2014 - 04:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de la tercera base de núcleos familiares a ser acompañados por la estrategia que es de 26.909 núcleos familiares, la misma que está siendo distribuida en territorio para realizar posteriormente el acompañamiento. Se han realizado en promedio nacional 1.035 sesiones efectivas por cada visita. En el mismo sistema se reflejan datos del equipo técnico que está haciendo dicho acompañamiento, de lo cual se resume que a nivel nacional se cuenta con 903 Técnicas/os de Acompañamiento Familiar y 94 Supervisoras/es. En el transcurso de este mes han sido necesarias algunas reformas presupuestarias con la finalidad de cubrir algunos déficits existentes en el territorio, por el recorte presupuestario hecho desde el Ministerio de Finanzas.		
Se ha diseñado un aplicativo, que es parte del sistema SIPPS, el mismo que está en funcionamiento y se convierte en una herramienta para el reporte oficial del proceso de acompañamiento familiar. Del primer reporte obtenido por el sistema, con corte a 30 de octubre, en el cual se identifican 22.996 núcleos familiares vinculados al equipo técnico a nivel distrital. De este número de familias, se ha ingresado información de 18.008 que están siendo acompañadas en las diferentes fases de intervención. Esto ha implicado, que hasta el momento, el equipo a nivel nacional ha realizado 68.457 sesiones efectivas de acompañamiento familiar, en las que se ha trabajado, bajo la metodología del programa, el levantamiento de información y del estado de las condiciones básicas de desarrollo familiar. Es importante considerar que existe personal recientemente incorporado y que aún se debe ingresar la información en su totalidad a nivel nacional, desde cada uno de los distritos. Con corte al 28 de octubre, se hace un reporte del personal que realiza este acompañamiento, a nivel nacional, de lo que se evidencia que se cuenta con: 95 Supervisoras/es, 911 técnicas/os de atención familiar y 40 coordinadoras/es de las Unidades de Trabajo Social - UTS. Los días 30 y 31 de octubre, en coordinación con la subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social, se realizó un primer taller con la finalidad de incorporar la nueva estrategia de Inclusión Económica, que desde esta Subsecretaría se impulsa para promover la generación de capacidades y oportunidades productivas, para la inclusión económica y la movilidad social ascendente de los/as usuarios/as del bono de desarrollo humano y que se aplicará en el 2015.	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	05/11/2014 - 05:11 PM
Durante el mes de septiembre, el equipo de acompañamiento familiar participó del registro social, para dicho operativo se estimaba una respuesta de agendamiento del 70 % de los núcleos familiares al final del operativo, con corte al 24 de septiembre la respuesta es del 61%, lo que implica que la estrategia de suspensión tuvo un efecto positivo en el incremento de la asistencia a los balcones de servicio para el levantamiento del Registro Social 2013 - 2014, con un incremento del 243%, en comparación a los resultados del mes de agosto. Del total de citas diarias agendadas, en promedio el 76.86 % de personas que agendaron acuden a la cita y un 23.14% no asiste. Una vez concluido el operativo que es el 8 de octubre de 2014, la información levantada será entregada al MCDS quien a su vez consolidará y subirá el reporte al Sistema del Registro Social. En lo que respecta a las familias en proceso de acompañamiento, 15.484 familias firmaron el compromiso, 515 familias no lo firmaron, 223 familias desistieron del acompañamiento, dándonos un total de 17.278 familias visitadas durante el mes de septiembre. Estos datos tienen corte a 12 de septiembre, actualmente se está esperando el reporte a través del aplicativo SIPPS que a partir del 8 de octubre se contará con toda la información digitalizada. Es importante señalar que la gerencia del Proyecto se encuentra gestionando la actualización de indicadores, metas e hitos de esta herramienta	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	27/10/2014 - 08:46 AM
Durante el mes de Agosto los equipos de TAF, han acompañado a 15.149 familias, de las cuales 13.078 han aceptado el acompañamiento. Se ha realizado la contratación de 531 técnicos a nivel de los 40 distritos, dichos técnicos son parte del levantamiento de información del Registro Social conjuntamente con el MCDS. Se ha realizado el agendamiento de los usuarios en cada uno de los Distritos MIES. Los TAF se encuentran realizando los eventos de Corresponsabilidad con la participación 30.289 usuarios. Se realiza un proceso de validación de los CV para las contrataciones en Distrito. Cabe manifestar que la cuarta fase del proceso de egresamiento, que se está llevando cabo, corresponde a una base de: 46.161 usuarios/as, que están dentro del proceso de egresamiento agosto 2014. Se ha realizado una reunión con la responsable de seguimiento GPR designada para el proyecto, con el fin de oficializar los cambios dentro de la ficha.	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	03/10/2014 - 05:02 PM
Se incorporaron al proceso de Acompañamiento Familiar 27.128 Familias a nivel nacional, para alcanzar la cobertura determinada de acuerdo a la capacidad operativa instalada.	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	11/09/2014 - 03:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se han creado un total de 809 claves para técnicos de Acompañamiento Familiar quienes realizarán el ingreso de la información en el sistema SIPPS. Al 31 de julio de 2014, el número de atenciones registradas en los Balcones de Servicios a nivel nacional es de 80.558, atenciones generadas por parte de los/las usuarios/as del BDH, Pensiones y de la ciudadanía que demanda información de los servicios del MIES y del sector social. Se realizó la cuarta fase del proceso de egresamiento con una base de: 46.161 usuarios/as. Se han visitado a 12,898 familias de las cuales 10.168 han aceptado el acompañamiento. El proceso logístico de entrega de las 380 tablets y el procedimiento administrativo estuvo bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa del MIES en coordinación con la Dirección de Familia a cada una de las Coordinaciones Zonales. Hasta el 25 de Junio de 2014, se tienen los siguientes datos: - En custodia de los/las técnicos/as: 241 - En custodia de personal administrativo: 133 - Tablets reportadas robadas: 6 - TOTAL: 380 Para la ejecución del Acompañamiento Familiar 2014 hasta el mes de julio de 2014 se han incorporado los siguientes profesionales: 84 Supervisores de Nombramiento, 20 Supervisores de CSO, en total 104 supervisores. 60 TAFs Nombramiento, 656 TAFsCSO, en total 716 TAFs. TOTAL PERSONAL: 820 personas El 28 de Julio de 2014 se realiza al Registro Social del MCDS la solicitud de treinta mil núcleos familiares para la realización del acompañamiento familiar, siendo entregada una base con 27.134 núcleos familiares. Las bases de las Direcciones Distritales de Gualaceo, Rumiñahui, Piñas, Quito Norte se encuentran en proceso de digitación por parte del MCDS ya que los registros se tomaron formularios de papel. La base de la Dirección Distrital de Guayaquil Centro Sur tiene cuota de núcleos familiares de difícil acceso y Quito Norte, no se intervino.		
JUNIO 2014: El proyecto se encuentra en etapa de actualización y se cuenta con una base para el Acompañamiento Familiar con un total de 16.500 familias distribuidas en los 40 Distritos MIES, sin embargo el levantamiento del RS en los distritos de Rumiñahui, El Empalme, Gualaceo y Piñas, culminará en el mes de julio por lo que al momento a estos distritos no se han asignado familias para la intervención. Por el proceso de egresamiento, no se ha logrado cumplir las metas en relación a las sesiones planificadas para el año 2014, razón por la que en el mes de julio se realizará la gestión para el replanteamiento de metas e hitos.	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	08/09/2014 - 11:54 AM
MAYO: El proyecto se encuentra en fase de actualización, luego de que esta actividad se encuentre culminada se realizará la reformulación de hitos con el propósito de que se encuentre acorde con la ejecución y se refleje realmente. El 87% del presupuesto del proyecto es para el pago de reuneraciones de los y las TAFs a nivel nacional, hasta el momento se encuentra en un 90% de contratación en territorio sin embargo, la parte financiera solo esta ejecutando el pago de remuneración y no han realizado las provisión de los beneficios sociales, vacaciones y fondos de reserva por este motivo no se ha logrado la ejecución requerida.	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	07/07/2014 - 08:08 AM
ABRIL 2014: Por disposición de las máximas autoridades el equipo técnico de acompañamiento está realizando visitas a las familias que de acuerdo al Registro Social deben salir del Bono de Desarrollo Humano, por tal motivo La Gerencia conjuntamente con la Dirección de Familia emitió una propuesta de escenarios para acompañamiento familiar y egresamiento BDH que fue aprobada, que se aplicara a partir de mayo y dará el inicio del acompañamiento familia 2014.	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	05/06/2014 - 03:33 PM
MARZO 2014: La base de familias priorizadas para el acompañamiento familiar depende de la información que remite el Registro Social, en este sentido el 8 de marzo se entrego una base priorizada con 22.978 de las 33.000 que se requieren para el inicio del acompañamiento del 2014, ya fueron asignadas a los técnicos de acompañamiento familiar e iniciarán el acompañamiento en abril, mientras tanto los técnicos de acompañamiento han efectuado acompañamiento familiar y visitas de acompañamiento a familias priorizadas durante el inicio del Registro Social 2013. Con respecto a la ejecución de presupuesto existen casos donde la remuneración aún está pendiente de pago, o pagado con gasto corriente, se está realizando la actualización en el distributivo de la partida antes mencionada.	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	02/05/2014 - 11:03 AM
FEBRERO: Con fecha 16 de enero 2014, SENPLADES emitió el Dictamen de Prioridad del Proyecto. En cuanto a su presupuesto, la ejecución del proyecto demanda de una inversión total de US\$ 50.763.744,90 por su ejecución hasta el año 2017. Para la operación del presente año se prevé una inversión de US\$ 15.044.808,29, lamentablemente el monto asignado propone un	Pachacama Mena, Soraya Gabriela	14/04/2014 - 08:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
recorte presupuestario de US\$ 545.462,89. Se validaron plantillas finales de personal contratado en cada Zona y Distrito y se socializó la metodología aprobada para el arranque de PLAN FAMILIA.		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Cambios en las directrices financieras por parte del Ministerio de Finanzas	14/02/2017	Alexandra Narcisa Guillen Salvatierra	50	70	35	0/1

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Redireccionamiento en la Política Social por parte del Gobierno CAUSARÍA un ajuste en la planificación del proyecto	07/03/2017	Olga Cristina Rosero Quelal	70 %	90	63	0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN. Dictamen de aprobación del MCDS al Proyecto de Inversión.	9-Entregables Formales	15/01/2014		15/01/2014		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN. Dictamen de Prioridad del Proyecto de Inversión por parte de SENPLADES	9-Entregables Formales	31/01/2014		16/01/2014		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN. Contratos de Profesionales en Trabajo social para el acompañamiento familiar legalizados.	9-Entregables Formales	03/02/2014		03/02/2014		Sí	1.0
4	PLANEACIÓN. Matriz PAPP a nivel distrital aprobada y socializada.	9-Entregables Formales	03/02/2014		03/02/2014		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN. Informe de participación mesa de trabajo para la articulación de procesos con entidades del sector social para facilitar acceso a servicios sociales entregado.	9-Entregables Formales	17/03/2014		17/03/2014		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Informe de capacitación a supervisores de	9-Entregables Formales	17/03/2014		17/03/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Plan Familia, responsables de la UTS, técnicos zonales de Familia y Técnico de protección Especial, entregado							
7	EJECUCIÓN. Informe de taller de validación de la metodología a Técnicos de acompañamiento familiar territoriales entregado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN. Informe de evaluación del modelo de gestión de la estrategia de acompañamiento familiar, por parte de técnicos de acompañamiento familiar, entregado.	9-Entregables Formales	01/09/2014		01/09/2014		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN. Informe de incorporación de 220 técnicos/as de acompañamiento familiar TAF para ampliar cobertura y fortalecer la estrategia de plan familia, entregado	5-Entregables Intermedios	01/09/2014		01/09/2014		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN. Documento de reformulación de la planificación operativa PAPP 2015, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN. Reporte de alertas de salud identificadas por los TAF del MIES (proceso de egresamiento), entregado	9-Entregables Formales	15/09/2014		15/09/2014		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN. Acta entrega de base de datos y aplicativo informático de la estrategia de acompañamiento familiar, entregado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2014		30/09/2014		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN. Informe de capacitación de 979 técnicos/as capacitados/as en el manejo de los aplicativos de la estrategia de acompañamiento familiar-sistema integrado de programas de protección social, entregado	9-Entregables Formales	15/10/2014		15/10/2014		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN. Informe del diagnóstico de la estrategia de acompañamiento familiar validado y entregado	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		15/10/2014		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN. Manuales y Protocolos de metodologías de acompañamiento familiar validados y distribuidos	9-Entregables Formales	30/11/2014		30/11/2014		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN. Documento de estrategia del incremento de cobertura de núcleos familiares en extrema pobreza, entregado	9-Entregables Formales	19/12/2014		19/12/2014		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN. Reporte anual de condiciones básicas de desarrollo alcanzadas por las familias acompañadas entregado	5-Entregables Intermedios	19/12/2014		19/12/2014		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Aprobación PAPP año 2015, entregado.	4-Inicio de Trabajo	13/01/2015		13/01/2015		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
19	EJECUCIÓN: Fortalecimiento de la estrategia Plan Familia a través de la aprobación de las actividades del convenio BID ATN-JF-13731-EC, aprobado	9-Entregables Formales	15/01/2015		15/01/2015		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Equipo técnico para la ejecución de la estrategia de acompañamiento familiar, contratado	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Modelo de Gestión ajustado, de la estrategia de acompañamiento familiar, entregado.	9-Entregables Formales	20/05/2015		20/05/2015		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: Estrategia del componente de Inclusión económica, elaborada con el equipo técnico en territorio, validada.	9-Entregables Formales	29/05/2015		29/05/2015		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Estrategia de intervención para la población usuaria del BDH	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Orientación estratégica de acompañamiento familiar, socializada.	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Postulación del proyecto de inversión a la SENPLADES	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Modelo seguimiento y monitoreo del acompañamiento familiar, entregado.	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Contrato ampliatorio para la contratación del servicio de plan de datos y localizador, firmado.	9-Entregables Formales	28/10/2015		28/10/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Materiales educomunicacionales para implementación de la estrategia de acompañamiento familiar, distribuidos en territorio.	9-Entregables Formales	30/12/2015		30/12/2015		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Adecuación de espacios físicos en los distritos para el trabajo de los técnicos de atención familiar, realizada	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN: Congreso Internacional de buenas prácticas de acompañamiento familiar, realizado.	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Elaboración del PAPP 2016, presentado.	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Equipos informáticos para la utilización de los técnicos de Plan Familia, entregados a los distritos.	9-Entregables Formales	31/12/2015	31/12/2015			No	1.0
33	EJECUCIÓN: Estrategia comunicacional para el posicionamiento de la estrategia de acompañamiento familiar, socializada.	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
34	EJECUCIÓN: Informe anual de la gestión de la estrategia de acompañamiento familiar, entregado.	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Materiales e indumentaria de prendas de protección para personal de acompañamiento familiar, entregado.	9-Entregables Formales	31/12/2015	31/12/2015			No	1.0
36	EJECUCIÓN: Modelo de gestión de las Unidades de Trabajo Social, aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	2.0
37	EJECUCIÓN: Socialización de las Políticas Públicas relacionadas a los servicios que forman parte del acompañamiento familiar	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Aprobación PAPP año 2016	4-Inicio de Trabajo	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.96
39	EJECUCIÓN: Informe de afectación a la Estrategia de Acompañamiento Familiar, por eventos adversos, elaborado.	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.96
40	EJECUCIÓN: Operativo de actualización del Registro Social dirigido a las familias en acompañamiento familiar, realizado.	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.96
41	EJECUCIÓN: Propuesta de transversalización del enfoque de prevención de droga en la Estrategia de Acompañamiento Familiar, en el marco de las acciones intersectoriales, elaborado.	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.96
42	EJECUCIÓN: Proceso de Seguimiento 2016 sobre implementación metodológica, cumplido.	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.96
43	EJECUCIÓN: Informe de avance y logros de Estrategia de Acompañamiento Familiar, elaborado.	9-Entregables Formales	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.96
44	EJECUCIÓN: Proceso de capacitación: fortalecimiento metodológico, implementado.	9-Entregables Formales	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.96
45	EJECUCIÓN: Dictamen de prioridad del proyecto Acompañamiento Familiar, emitido por SENPLADES, actualizado	9-Entregables Formales	31/05/2016	31/05/2016			No	0.0
46	EJECUCIÓN: Proceso de cierre del acompañamiento familiar, familias de la base A, preparado.	9-Entregables Formales	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.96
47	EJECUCIÓN: SIPSS en el marco de la ejecución del Plan de Acompañamiento Familiar, actualizado.	9-Entregables Formales	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.96
48	EJECUCIÓN: Informe semestral de ejecución	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.96

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	presupuestaria del proyecto, presentado a las autoridades.							
49	EJECUCIÓN: Proceso de promoción y sensibilización de los resultados alcanzados en la estrategia (uso de videos), realizado.	9-Entregables Formales	30/06/2016	30/06/2016			No	0.0
50	EJECUCION Metodología de AF dirigida a familias damnificadas por el terremoto del 16 Abril usuarias del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación, aprobada.	9-Entregables Formales	29/07/2016		29/07/2016		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Manual aplicativo web de medición de corresponsabilidad en Educación, desarrollado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		29/07/2016		Sí	1.6
52	EJECUCIÓN: Metodología de AF dirigida a familias damnificadas por el terremoto del 16 Abril en Albergues, aprobada.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		29/07/2016		Sí	1.0
53	EJECUCION Resultados del cumplimiento de condicionalidad de Educación en el ciclo Costa de usuarios en AF, elaborados.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: Informe de levantamiento de familias activas de AF posterior al terremoto 16 Abril., desarrollado	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.0
55	EJECUCION Informe de ingreso de familias del 2016 al proyecto AF, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Encuentros comunitarios con las familias usuarias BDH que forman parte de la de acompañamiento familia, desarrollados y sistematizados.	9-Entregables Formales	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.96
57	EJECUCIÓN: Fortalecimiento de la propuesta de transversalización del enfoque de prevención de violencia de género en el Acompañamiento Familiar, realizado.	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.96
58	EJECUCIÓN: Proceso de cierre del acompañamiento familiar, familias de la base A, preparado.	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.96
59	EJECUCIÓN: Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia de Acompañamiento Familiar, construido.	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.96
60	EJECUCION Informe de justificación del cumplimiento de metas del componente N° 01 del proyecto AF, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.5
61	EJECUCION Resultados del cumplimiento de	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	condicionalidad de Educación en el ciclo Sierra de usuarios en Acompañamiento Familiar, elaborados.							
62	EJECUCIÓN: Proceso de entrega de la Tarjeta de Salud, por parte de las y los técnicos de Acompañamiento Familiar a las familias usuarias del BDH, en acompañamiento, evaluado	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.96
63	EJECUCIÓN: Planificación de la ejecución y cierre del proyecto en el 2017.	9-Entregables Formales	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.5
64	EJECUCIÓN: Sistematización de la ejecución del proyecto en el año 2016.	9-Entregables Formales	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.5
65	EJECUCIÓN: Aprobación PAPP año 2017	4-Inicio de Trabajo	04/01/2017		04/01/2017		Sí	0.5
66	EJECUCIÓN: Propuesta de implementación de lineamientos para la asesoría técnica de políticas de prevención integral de drogas, aprobada.	9-Entregables Formales	27/01/2017		27/01/2017		Sí	2.5
67	EJECUCIÓN: Capacitación a los técnicos Nacionales MIES-SETED, para la ejecución de políticas de prevención integral de drogas, realizada	9-Entregables Formales	06/02/2017		06/02/2017		Sí	1.5
68	EJECUCIÓN: Modulo y caja de herramientas para la sensibilización a familias usuarias del BDH en prevención integral y abusos de drogas, elaborado	9-Entregables Formales	03/03/2017		03/03/2017		Sí	1.5
69	EJECUCIÓN: Informe de gestión de la implementación del acompañamiento familiar, aprobado	9-Entregables Formales	15/03/2017		15/03/2017		Sí	2.0
70	EJECUCIÓN: Norma técnica del Servicio de Acompañamiento familiar, elaborado	9-Entregables Formales	08/05/2017		08/05/2017		Sí	3.0
71	EJECUCIÓN: Resultados de la DPA (familias en acompañamiento familiar), actualizada	9-Entregables Formales	31/05/2017		31/05/2017		Sí	1.5
72	EJECUCIÓN: Resultados del proceso de capacitación al equipo técnico del servicio de acompañamiento familiar, presentado	9-Entregables Formales	09/06/2017		09/06/2017		Sí	1.5
73	EJECUCIÓN: Informe de cierre de las familias en acompañamiento de los grupos C y D, presentado	9-Entregables Formales	03/07/2017		03/07/2017		Sí	2.0
74	EJECUCION Resultados del cumplimiento de condicionalidad de Educación en el ciclo costa de usuarios en Acompañamiento Familiar, elaborados.	9-Entregables Formales	07/07/2017		07/07/2017		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
75	EJECUCIÓN: Capacitación a los técnicos Distritales MIES-SETED, para la ejecución de políticas de prevención integral de drogas, realizada	9-Entregables Formales	07/07/2017		07/07/2017		Sí	0.5
76	EJECUCIÓN: Encuentros comunitarios en prevención integral, usos y abusos de drogas, realizados	9-Entregables Formales	07/09/2017		07/09/2017		Sí	2.0
77	EJECUCIÓN: Informe Final de Encuentros comunitarios de corresponsabilidad 2017, dirigidos a familias en acompañamiento realizado.	9-Entregables Formales	08/12/2017	08/12/2017			No	1.0
78	EJECUCIÓN: Resultados del cumplimiento de condicionalidad de Educación en el ciclo Sierra de usuarios en Acompañamiento Familiar, elaborados.	9-Entregables Formales	08/12/2017	08/12/2017			No	1.5
79	CIERRE: Informe final del proyecto, presentado	9-Entregables Formales	22/12/2017	22/12/2017			No	2.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de núcleo familiares en acompañamiento familiar que cuentan con CDH para emprendimientos productivos		250.00 %	0.4	1	01/04/2015	Abr-Jun
2	Porcentaje de núcleos familiares en extrema pobreza que reciben el BDH, atendidos por el servicio de acompañamiento familiar.		99.84 %	0.319	0.3185	01/01/2017	Ene-Jun
3	Porcentaje de núcleos familiares atendidos por el servicio de acompañamiento familiar, identificados requerimientos y referenciados para el acceso a servicios sociales, en el marco de las dimensiones de acompañamiento familiar		84.90 %	1	0.849	01/01/2017	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	42,213,479.25 **
Costo Total:	50,763,744.90
Total Devengado:	41,282,530.65
% Costo Total Devengado:	81.32 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 81.32 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	31,128,548.76	1,552,496.05	0.00	32,681,044.81
Ppto. Externo Planeado	0.00	1,552,496.05	0.00	1,552,496.05
Ppto. Aprobado Inicial	42,104,676.35	10,258,471.97	0.00	52,363,148.32
Ppto. Codificado	42,841,297.71	2,652,554.64	0.00	45,493,852.35
Ppto. Comprometido	40,915,581.61	866,414.40	0.00	41,781,996.01
Planeado - Codificado (2017)		-1,100,058.59		
Programado a Devengar	43,687,969.75	1,552,496.05	0.00	45,240,465.80
Ppto. Devengado	40,660,983.20	621,547.45	0.00	41,282,530.65
Estimado a fin de año	* 40,660,983.20	0.00	0.00	40,660,983.20
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,026,986.55	1,552,496.05	0.00	4,579,482.60
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 93.07 %	40.04 %	0.00 %	91.25 %
Ppto. Codificado 998	0.00	32,142.85	0.00	32,142.85
Ppto. Devengado 998	0.00	32,142.85	0.00	32,142.85

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

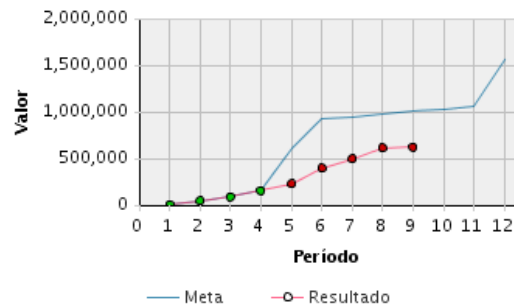

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	895.85	895.85	895.85	895.85	100.00 %		0.06 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	45,552.65	45,552.65	46,448.50	46,448.50	100.00 %		2.99 %
Mar	42,088.32	42,088.32	88,536.82	88,536.82	100.00 %		5.70 %
Abr	65,592.13	65,592.13	154,128.95	154,128.95	100.00 %		9.93 %
May	460,811.38	71,532.58	614,940.33	225,661.53	36.70 %		14.54 %
Jun	303,710.04	167,443.10	918,650.37	393,104.63	42.79 %		25.32 %
Jul	28,791.73	104,508.07	947,442.10	497,612.70	52.52 %		32.05 %
Ago	31,606.47	117,810.05	979,048.57	615,422.75	62.86 %		39.64 %
Sep	25,718.97	6,124.70	1,004,767.54	621,547.45	61.86 %		40.04 %
Oct	25,718.97		1,030,486.51				
Nov	25,718.97		1,056,205.48				
Dic	496,290.57		1,552,496.05				
Total	1,552,496.05	621,547.45					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
8	Incrementar la eficiencia y la calidad en la implementación de la estrategia de acompañamiento familiar MEDIANTE el fortalecimiento del equipo técnico, metodología de intervención, mecanismos de articulación a la oferta de servicios del Estado y herramientas de monitoreo y seguimiento a la gestión.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
MIES-017	Acompañamiento Familiar a usuarias del Bono de Desarrollo Humano

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Asociación hito 73.- Informe de cierre de las familias en acompañamiento de los grupos C y D, presentado	A.73.pdf	03/07/2017
2	.Asociación hito 57: "Fortalecimiento de la propuesta de transversalización del enfoque de prevención de violencia de género en el Acompañamiento Familiar, realizado."	A.57.pdf	08/11/2016
3	Asociación hito 75: Capacitación a los técnicos Distritales MIES-SETED, para la ejecución de políticas de prevención integral de drogas, realizada	A.75.PDF	10/07/2017
4	Asociación Hito 1. Dictamen de aprobación del MCDS	A1.pdf	14/04/2014
5	Asociación Hito 2: Dictamen de prioridad por parte de SENPLADES	A.2.pdf	02/05/2014
6	Asociación Hito 38, 39, 40, 41: Informe ejecución proyecto Enero	A.38__39__40_Y_41.pdf	04/03/2016
7	Asociación Hito 39: Reporte eventos adversos	A.39.ppt	04/03/2016
8	Asociación Hito 3: Contratos de Profesionales en Trabajo Social para el acompañamiento familia legalizados.	A.3.rar	30/05/2014
9	Asociación Hito 40: Ejecución Registro Social	A.40.pdf	04/03/2016
10	Asociación Hito 41: Propuesta de transversalización prevención drogas	A.41.ppt	04/03/2016
11	Asociación Hito 43: Avance de Evaluación	A.46.pdf	04/05/2016
12	Asociación Hito 44: Informe de proceso de seguimiento	A.44.pdf	05/04/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	Asociación Hito 44: Proceso de capacitación	A.47.pdf	04/05/2016
14	Asociación Hito 46: Cierre de Acompañamiento Familiar	A.46.pdf	03/06/2016
15	Asociación Hito 46: SIPPS	A._47.pdf	03/06/2016
16	Asociación Hito 48: Informe de Ejecución Presupuestaria	A.48.pdf	06/07/2016
17	Asociación Hito 4: Matriz PAPP a nivel distrital aprobada y socializada.	A.4.rar	02/05/2014
18	Asociación Hito 5. Informe de capacitación mesa de trabajo para articulación de proceso con entidades del sector social para facilitar acceso a servicios sociales	A.5.pdf	05/02/2015
19	Asociación Hito 50: PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS USUARIAS DEL BONO DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION	A.50.pdf	05/08/2016
20	Asociación Hito 51: Manual de Uso del Link para medición de la condicionalidad en Educación	A.51.pdf	05/08/2016
21	Asociación Hito 52: PROTOCOLO DE ATENCIÓN SOCIAL FAMILIAR EN ALBERGUES	A.52.pdf	05/08/2016
22	Asociación Hito 53: Resultados del cumplimiento de condicionalidad de Educación en el ciclo Costa de usuarios en AF, elaborados.	A.53.pdf	01/09/2016
23	Asociación Hito 54: Informe de levantamiento de familias activas de AF posterior al terremoto 16 Abril., desarrollado	A.54.pdf	01/09/2016
24	Asociación Hito 56: Encuentros comunitarios con las familias usuarias BDH que forman parte de la de acompañamiento familia, desarrollados y sistematizados	A.56.pdf	05/10/2016
25	Asociación Hito 59: Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Estrategia de Acompañamiento Familiar, construido.	A.59.rar	01/11/2016
26	Asociación Hito 6. Taller capacit. Modelo Gestión UTS_Manejo de instrumentos y validación	A.6.pdf	20/10/2014
27	Asociación Hito 60 "Informe de justificación del cumplimiento de metas del componente Nro 1 del proyecto AF, elaborado"	A.60.rar	05/12/2016
28	Asociación Hito 61 "Resultados del cumplimiento de condicionalidad de Educación en ciclo Sierra usuarios en AF, elaborados	A.61.pdf	05/12/2016
29	Asociación Hito 62: Proceso de entrega de la Tarjeta de Salud por parte de las y los técnicos de Acompañamiento Familiar a las familias usuarias del BDH en acompañamiento evaluado	A.62.pdf	05/12/2016
30	Asociación Hito 63 "Planificación de la ejecución y cierre del proyecto en el 2017"	A.63.pdf	05/01/2017
31	Asociación hito 64: "Sistematización de la ejecución del proyecto en el año 2016"	A.64.pdf	05/01/2017
32	Asociación Hito 65: Aprobación PAPP año 2017	A.65.rar	14/02/2017
33	Asociación Hito 66: Propuesta de implementación de lineamientos para la asesoría técnica de políticas de prevención integral de drogas, aprobada.	A.66.rar	10/03/2017
34	Asociación Hito 67: Capacitación a los técnicos Nacionales MIES-SETED, para la ejecución de políticas de prevención integral de drogas, realizada	A.67.rar	10/03/2017
35	Asociación Hito 68: Modulo y caja de herramientas para la sensibilización a familias usuarias del BDH en prevención integral y abusos de drogas, elaborado	A.68.rar	10/03/2017
36	Asociación hito 69: "Informe de gestión de la implementación del acompañamiento familiar, aprobado".	A.69.PDF	21/03/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
37	Asociación Hito 7. Informe de taller de validacion de Metodologia a TAF	A.7.pdf	13/01/2015
38	Asociación Hito 70: Norma técnica del Servicio de Acompañamiento familiar, elaborado	A.70.rar	10/05/2017
39	Asociación Hito 71: Resultados de la DPA (familias en acompañamiento familiar), actualizada	A._71.rar	31/05/2017
40	Asociación hito 72: Resultados del proceso de capacitación al equipo técnico del servicio de acompañamiento familiar, presentado	A.72.pdf	09/06/2017
41	Asociación Hito 74:Resultados del cumplimiento de condicionalidad de Educación en el ciclo costa de usuarios en Acompañamiento Familiar, elaborados.	A.74.PDF	10/07/2017
42	Asociación Hito 76.- Encuentros comunitarios en prevención integral, usos y abusos de drogas, realizados	A.76.rar	07/09/2017
43	Asociación Hito 8. Informe de evaluación del modelo de gestión de Estrategia de Acompañamiento Familiar	A.8.pdf	28/10/2014
44	Asociación Hito 9. Informe de incorporacion de 220 TAF	A.9.pdf	15/10/2014
45	Asociación Hito10. Documento de reformulación de la Planificación Operativa. PAPP 2015	A.10.pdf	22/10/2014
46	Asociación Hito11. Reporte de alertas de salud identificadas por los TAF	A.11.pdf	15/10/2014
47	Asociación Hito12. Acta Entrega de Base de Datos_Aplicativo Informatico	A.12.pdf	15/10/2014
48	Asociación Hito13. Informe capacitación a técnicos en manejo de aplicativos de la estrategia de acompañamiento familiar	A.13.pdf	20/10/2014
49	Asociación Hito14. Informe del diagnóstico de la estrategia de Acompañamiento Familiar	A.14.pdf	04/12/2014
50	Asociación Hito15. Manuales y Protocolos de la Metodología de Acompañamiento Familiar	A.15.pdf	04/12/2014
51	Asociación Hito17. Reporte anual de condiciones básicas de desarrollo alcanzadas por las familias acompañadas	A.17.pdf	14/01/2015
52	Asociación Hito18. Aprobación PAPP año 2015	A.18.pdf	05/02/2015
53	Asociación Hito19: Aprobación PAPP 2015 Incremento ATN-BID	A.19.pdf	02/04/2015
54	Asociación Hito20: Informe TH Acompañamiento Familiar	A.20.pdf	02/04/2015
55	Asociación Resumen Ejecutivo	Resumen_cuatrimestre_2015.docx	04/03/2016
56	Asociado hito 55: Informe de ingreso de familias del 2016 al proyecto AF, elaborado.	A.55.pdf	05/10/2016
57	Asociado hito 58: "Proceso de cierre del acompañamiento familiar, familias de la base A, preparado"	A.58.rar	01/11/2016
58	Cronograma valorado para el 2015	C2.xls	16/04/2015
59	Proyecto Acompañamiento Familiar actualizado al 02-05-2016 cargado en SipeIP	PROYECTO_AL_02-05-2016..pdf	03/03/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Técnica de Planificación y Presupuesto			
Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	Gerente de Proyecto	Gerente	alexandra.guillen@inclusion.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Pachacama Mena, Soraya Gabriela	Técnica de Seguimiento (Líder Técnica)	Asistente Administrativa	soraya.pachacama@mies.gob.ec	
Villalva Quiroz, Franklin Leonardo	Analista de Planificación	Analista de Planificación	franklin.villalva@inclusion.gob.ec	
