

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social Subsecretaría de Discapacidades

Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

PROYECTO: K002 MIES - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR

Líder del Proyecto:	Batallas Padilla, Fernando Raúl (fernando.batallas@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Madrid, Ernesto	Programas Relacionados:	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR
Titular:	Vela Yépez, María Soledad	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	487,691.12
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/08/2016 - 29/12/2017
Fecha de última actualización:	07/09/2017	Fecha de Fin Base:	29/12/2017
Modificado por:	Madrid, Ernesto	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2017

DATOS GENERALES

Descripción

dfasdfs

Beneficios Cualitativos

FGDG


Tipo de Beneficiario

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 78.10 %

Fecha de Inicio: 01/08/2016

Fecha de Fin: 29/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
Avance real acumulado												
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2017: Se solicitó ampliación de fecha para el cumplimiento del hito, considerando que por parte de la Coordinación Administrativa Financiera CAF, aún no emite el certificado de mantener saldos pendientes dentro del project.	Madrid, Ernesto	07/09/2017 - 11:18 AM
JULIO 2017: Se solicitó ampliación de fecha de cumplimiento de hito, el cual luego del análisis realizado por el Equipo Metodológico GPR y conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta de Gobierno por Resultados, se identifica que cuenta con el justificativo necesario, mismo que es expresado mediante Memorando Nro. MIES-CGPG-2017-0849-M, de fecha Quito, D.M., 19 de julio de 2017	Madrid, Ernesto	08/08/2017 - 08:42 AM
JUNIO 2017: Se solicitó ampliación de fecha para el cumplimiento del hito, considerando que por parte de la Coordinación General Administrativa y Financiera aún no se emite el certificado de no contar con deudas ni saldos pendientes dentro del project.	Madrid, Ernesto	10/07/2017 - 04:48 PM
MAYO 2017: Se ha consolidado los medios de verificación del cumplimiento de los hitos planteados para el Componente de Inclusión Participativa del proyecto "Fortalecimiento de Servicios Inclusivos y Redes de Apoyo para Personas con Discapacidad en Ecuador". Por la parte financiera se está realizando el seguimiento al proceso de liquidación de haberes de los funcionarios que formaron parte del componente y que no continúan laborando en el MIES.	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	05/06/2017 - 12:08 PM
ABRIL 2017: En este periodo se ha procedido con la compilación de medios de verificación de acciones realizadas respecto del proyecto "Fortalecimiento de Servicios Inclusivos y Redes de Apoyo para personas con Discapacidad en Ecuador". Se continúa con la elaboración del informe final	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	08/05/2017 - 09:10 AM
MARZO 2017: Se ha realizado el seguimiento al proceso administrativo y financiero a fin de identificar los ex funcionarios del MIES que aún no han sido liquidados en sus haberes. Adicional se continúa con la elaboración del informe de cierre del Componente de Inclusión Participativa.	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	28/04/2017 - 08:58 AM
FEBRERO 2017: Se realizó el proceso de liquidación de funcionarios que formaban parte del proyecto k002 MIES - Fortalecimiento de Servicios Inclusivos y Redes de Apoyo para Personas con Discapacidad en Ecuador. Se emitieron lineamientos para el fortalecimiento de Comités de personas cuidadoras a nivel nacional.	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	28/04/2017 - 08:57 AM
ENERO 2017: Durante este mes se realizó el seguimiento a las Direcciones Distritales, con el fin de identificar los funcionarios que continúan laborando en el MIES y quienes ya salieron de la institución. Adicional se emitió los lineamientos para el pago de haberes y liquidaciones del personal que no continuará trabajando en esta Cartera de Estado. Se realizó la revisión de los medios de verificación del cumplimiento de lineamientos emitidos por el MIES en el mes de agosto 2016, con el fin de que el MCDS inicie la elaboración del informe de cierre del proyecto total transferido de SETEDIS a diferentes Carteras de Estado.	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	28/04/2017 - 08:56 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2016: Como parte de las acciones realizadas por el MIES dentro del Componente de Inclusión Participativa, durante la semana del 5 al 10 de diciembre del 2016, se desarrollaron varias actividades de Cooperación Internacional como parte de la jornada de capacitación, evaluación y monitoreo a la implementación del Componente de Inclusión Participativa, a través de la visita técnica de la Sra. Chiyocho Numata, experta de JICA Japón, Master en Desarrollo Social Internacional. Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron visitas de campo a Comités de personas cuidadoras vinculadas con los comités de la SETEDIS, así mismo se realizó una capacitación para fortalecer las capacidades profesionales de los funcionarios y entidades cooperantes que trabajan en materia de discapacidades. En este mes se inició la elaboración del informe ejecutivo técnico y financiero para el cierre del Componente de Inclusión Participativa.	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	28/04/2017 - 08:56 AM
NOVIEMBRE 2016: En este mes se realizó la sistematización de información de los planes de acción de los Comités de las personas cuidadoras, con el fin de establecer indicadores que permitan medir las acciones más recurrentes que se presentan en los planes de acción comunitarios. Una vez realizada la vinculación de Comités y planes de acción, se obtuvieron los siguientes resultados: Vinculación del 91.4% de comités y planes de acción, considerando que el porcentaje restante (8.6%) corresponde a los Comités inactivos antes de la transferencia de SETEDIS al MIES y que se identificaron en la realización del Diagnóstico Situacional.	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	28/04/2017 - 08:56 AM
OCTUBRE 2016: La Dirección de Prestación de Servicios para personas con discapacidad, a través de la Subsecretaría de Discapacidades, solicitó a las Direcciones Distritales del MIES la realización de un diagnóstico situacional con el objetivo de conocer el estado actual de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Inclusivo Comunitario y Redes de Articulación Intersectorial Territorial que fueron implementadas por SETEDIS previo a la transferencia del componente. Dentro de los resultados obtenidos con la elaboración del diagnóstico situacional, tenemos: que de 237 Comités de personas con discapacidad conformados por SETEDIS, el 83% de Comités se encontraban en estado activo. Del 100% de actividades planificadas en los planes de acción comunitarios elaborados por la SETEDIS, el 41% de actividades se ejecutaron, según el reporte de cada Dirección Distrital MIES. El 84% de facilitadores comunitarios que fueron parte de la estrategia de SETEDIS se encontraban en estado activos a nivel nacional. En las 140 redes conformadas por SETEDIS, se identificó que en el 76% de redes, existió participación institucional del MIES, con la presencia de algún funcionario. De 237 territorios intervenidos por SETEDIS, se identificó que en el 56% del total de territorios intervenidos existió la participación de funcionarios del MIES.	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	28/04/2017 - 08:55 AM
SEPTIEMBRE 2016: Como parte de la transferencia de SETEDIS al MIES, en el acta entrega recepción consta el material audiovisual (67 juegos de CDs de las Guías para la RBC), folletos de las Guías para la RBC (3.370 juegos impresos), mismos que fueron distribuidos a nivel nacional en base a la matriz de distribución elaborada por la Dirección de Prestación de Servicios para personas con discapacidad a las diferentes Coordinaciones Zonales, posteriormente las Coordinaciones Zonales distribuyeron a las Direcciones Distritales y luego éstas fueron entregadas a los técnicos del MIES encargados de manejar temas relacionados a la discapacidad, representantes de Comités de personas cuidadoras de personas con discapacidad y entidades cooperantes que mantienen convenio con el MIES. La entrega del material a nivel nacional, contribuyó al proceso de inclusión participativa en territorio, puesto que la información es de carácter técnica y es considerado como una herramienta para generar la participación de las personas con discapacidad para la exigibilidad de sus derechos, y fortalecer los procesos participativos de las personas cuidadoras. A nivel nacional distribuyó 3017 juegos de guías.	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	28/04/2017 - 08:55 AM
AGOSTO 2016: ACCIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS:	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	28/04/2017 - 08:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Con memorando Nro. CGPGE-2016-0475-M del 09 de agosto del 2016, con sumilla inserta de la Máxima Autoridad se aprueba el Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2016 del Componente del Proyecto "Fortalecimiento de Servicios Inclusivos y Redes de Apoyo para personas con Discapacidad en Ecuador". Con Memorando Nro. MIES-SD-2016-0329-M del 15 de agosto del 2016 la Subsecretaría de Discapacidades solicita aprobación del PAPP del proyecto al Viceministerio de Inclusión Social y con Memorando Nro. MIES-SD-2016-0336-M del 18 de agosto del 2016, la Subsecretaría de Discapacidades solicita aprobación del PAPP a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica. Con memorando Nro. MIES-CGPGE-2016-0501-M del 25 de agosto del 2016 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica comunica a la Subsecretaría de Discapacidades dicha aprobación. ACCIONES TÉCNICAS OPERATIVAS: A través de la Circular Nro. MIES-SD-2016-0031-C, se remitió lineamientos a las Direcciones Distritales en función de sus competencias, con el propósito de fortalecer el componente de Inclusión Participativa en territorio. Dentro de los lineamientos se establecía la realización de un diagnóstico situacional, entrega recepción de archivos, audio libros y guías metodológicas, revisión de expedientes, socialización de la transferencia de la competencia al MIES a participantes de la estrategia de Desarrollo Inclusivo Comunitario, y vinculación de la Estrategia de Desarrollo Inclusivo Comunitario con los servicios MIES y Comités de personas Cuidadoras de personas con discapacidad.		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Contratación del personal a tiempo CAUSARÍA el no cumplimiento de las actividades planificadas	24/03/2017	Maria Teresa Caiza Hernandez	30 %	30	9	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	aPLANEACIÓN: Presupuesto para ejecución del proyecto, aprobado	9-Entregables Formales	30/08/2016		30/08/2016		Sí	10.0
2	EJECUCIÓN: Lineamientos técnicos para el proceso de vinculación del Componente de Inclusión Participativa al MIES, elaborados	9-Entregables Formales	30/08/2016		30/08/2016		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Actas de Entrega recepción de archivos, audiolibros, y guías metodológicas desde la Dirección de Prestación de Servicios a las Coordinaciones Zonales, realizadas	9-Entregables Formales	30/09/2016		30/09/2016		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Diagnóstico Situacional del Estado del	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Componente de Inclusión Participativa, aprobado							
5	EJECUCIÓN: Sistematización de información de los planes de acción de los Comités de las personas cuidadoras, aprobada	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/11/2016		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Vinculación de Planes de acción y Comités de personas con Discapacidad a Comités de personas cuidadoras, aprobado	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/11/2016		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Informe Técnico Ejecutivo Financiero del Componente de Inclusión Participativa.	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	20.0
8	EJECUCIÓN: Taller de monitoreo y evaluación al componente de Inclusión Participativa e intercambio de experiencias, realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	10.0
9	CIERRE: Informe final de cierre del Componente de Inclusión Participativa, presentado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017	31/10/2017			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	487,691.12 **
Costo Total:	277,806.34
Total Devengado:	253,473.50
% Costo Total Devengado:	91.24 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 91.24 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	295,741.23	236,837.26	0.00	532,578.49
Ppto. Comprometido	251,098.12	2,375.38	0.00	253,473.50
Planeado - Codificado (2017)		-236,837.26		
Programado a Devengar	251,578.12	236,593.00	0.00	488,171.12
Ppto. Devengado	251,098.12	2,375.38	0.00	253,473.50
Estimado a fin de año	* 251,098.12	0.00	0.00	251,098.12
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	480.00	236,593.00	0.00	237,073.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 99.81 %	1.00 %	0.00 %	51.92 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

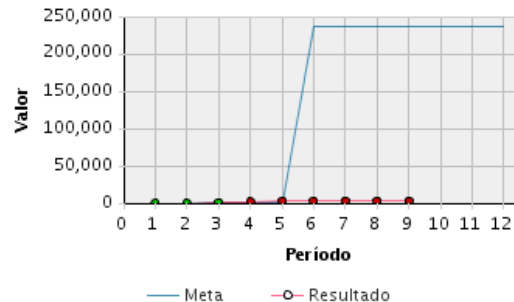

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	522.26	522.26	522.26	522.26	100.00 %		0.22 %
Abr	0.00	1,292.80	522.26	1,815.06	347.54 %		0.77 %
May	0.00	407.82	522.26	2,222.88	425.63 %		0.94 %
Jun	236,070.74	152.50	236,593.00	2,375.38	1.00 %		1.00 %
Jul	0.00	0.00	236,593.00	2,375.38	1.00 %		1.00 %
Ago	0.00	0.00	236,593.00	2,375.38	1.00 %		1.00 %
Sep	0.00	0.00	236,593.00	2,375.38	1.00 %		1.00 %
Oct	0.00		236,593.00				
Nov	0.00		236,593.00				
Dic	0.00		236,593.00				
Total	236,593.00	2,375.38					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar la eficiencia en la atención a personas con discapacidad MEDIANTE la implementación, seguimiento y monitoreo a las modalidades de atención

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 1: PLANEACIÓN: Presupuesto para ejecución del proyecto, aprobado	ANEXO_HITO_1.pdf	28/04/2017
2	ASOCIACIÓN HITO 2: Lineamientos técnicos para el proceso de vinculación del Componente de Inclusión Participativa al MIES, elaborados	ANEXO_HITO_2.pdf	28/04/2017
3	ASOCIACIÓN HITO 3: Actas de Entrega recepción de archivos, audiolibros, y guías metodológicas desde la Dirección de Prestación de Servicios a las Coordinaciones Zonales, realizadas	ANEXO_HITO_3.pdf	28/04/2017
4	ASOCIACIÓN HITO 4: Diagnóstico Situacional del Estado del Componente de Inclusión Participativa, aprobado	ANEXO_HITO_4.pdf	28/04/2017
5	ASOCIACIÓN HITO 5: Sistematización de información de los planes de acción de los Comités de las personas cuidadoras, aprobada	ANEXO_HITO_5.pdf	28/04/2017
6	ASOCIACIÓN HITO 6: Vinculación de Planes de acción y Comités de personas con Discapacidad a Comités de personas cuidadoras, aprobado	ANEXO_HITO_6.pdf	28/04/2017
7	ASOCIACIÓN HITO 7: Informe Técnico Ejecutivo Financiero del Componente de Inclusión Participativa	ANEXO_HITO_7.pdf	28/04/2017
8	ASOCIACIÓN HITO 8: Taller de monitoreo y evaluación al componente de Inclusión Participativa e intercambio de experiencias, realizado	ANEXO_HITO_8.pdf	28/04/2017
9	ASOCIACIÓN HITO 9: cambio de fecha comprometida del 30_06_2017 al 31_08_2017	MIES-SD-2017-0436-M.pdf	18/07/2017
10	K002 MIES - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR	Proyecto_1.rar	26/04/2017

