

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

PROYECTO: K003 IE-MT-MIES-Fortalecimiento, ampliación e innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil

Líder del Proyecto:			
Patrocinador Ejecutivo:	León Álvarez, Ivonne Tatiana	Programas Relacionados:	IE-MT-MISION TERNURA
Titular:	Callay Toledo, Susana Emperatriz	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.383775	TIR:	46.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	214,811,888.16
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	50,546,084.52
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2019 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	09/10/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Caicedo Valladares, Carlos Efraín	Fecha del siguiente Hito:	06/11/2019

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones en la calidad de los servicios de desarrollo infantil a través de las modalidades CDI, CNH y CCRA para niñas y niños de 0 a 3 años de edad y mujeres gestantes, mediante estrategias de articulación intersectorial y el involucramiento de la familia para el Desarrollo Infantil Integral. lo que permitirá mejorar la priorización de los mismos e incrementar año tras año, usuarios en la modalidad CCRA, enfocada al fortalecimiento del tejido social a través de consejerías grupales y apoyos nutricionales en zonas de alta dispersión, emergencia o vulnerabilidad. Para conseguir los objetivos planteados se han establecido los siguientes componentes:

1. Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil
2. Calidad de la Gestión de Servicios de Desarrollo Infantil
3. Marco Normativo e Institucional para la Primera Infancia
4. Personal Técnico - operativo Capacitado para Cubrir la Nueva Cobertura de los Servicios de Desarrollo Infantil
5. Evaluación del Proyecto

Producto/Servicio: Mejorar la calidad de los servicios en las unidades CDI, CNH y CCRA de Desarrollo Infantil.

línea Base: Con respecto a los temas de cobertura, la misma está enfocada en la atención a niños y niñas menores de 3 años con énfasis en los primeros 1000 días de vida incluido el período de gestación, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza. Actualmente, según datos de INEC (Proyección de población por años en edades simples), la población total menor a tres años asciende a 1.331.632 niñas y niños; en tanto que, al mes de junio 2018; 24,5% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza (15,9% en el área urbana y 43% en el área rural). Es decir, alrededor de 326.250 niñas y niños.

Objetivo General: Mejorar las condiciones en los servicios de Desarrollo Infantil del MIES, para niñas y niños de 0 a 3 años de edad y mujeres gestantes, mediante estrategias de articulación intersectorial y el involucramiento de la familia para el Desarrollo Infantil Integral.

Objetivos Específicos:

1. Garantizar la formación y la capacitación del talento humano de los servicios de Desarrollo Infantil para una atención de calidad.
2. Implementar un sistema de seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y acompañamiento al cumplimiento de la normativa de los servicios de Desarrollo Infantil.
3. Fortalecer la articulación intersectorial a nivel territorial bajo sus competencias.
4. Fomentar la participación de las familias y la comunidad en su responsabilidad frente al Desarrollo Infantil Integral
5. Mantener la cobertura de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral y atención a mujeres gestantes.
6. Realizar la evaluación del proyecto

Beneficios Cualitativos

Mejorar la calidad estructural y de procesos de los servicios de desarrollo infantil.

Beneficios Cualitativos

Se identificaron dos beneficios que se obtendría con la aplicación de Misión Ternura los cuales tienen como fundamento el impacto que tiene la desnutrición (crónica, global o aguda) en el desempeño escolar y productividad de los individuos que sufrieron de esta enfermedad en la etapa de primera infancia

Tipo de Beneficiario

*Niños menores de 3 años y madres gestantes, que se encuentran en áreas focalizadas y en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad (96 cantones priorizados)

* Técnicos de Desarrollo Infantil Integral

Restricciones

Alcance: Rotación de Funcionarios y Analistas

Tiempo: El tiempo de ejecución es limitado por el número de personal asignado al proyecto


Costo: No se contempla como restricción

Recursos: Personal limitado para la ejecución del proyecto

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO


% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 23.57 %

Fecha de Inicio: 01/02/2019 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

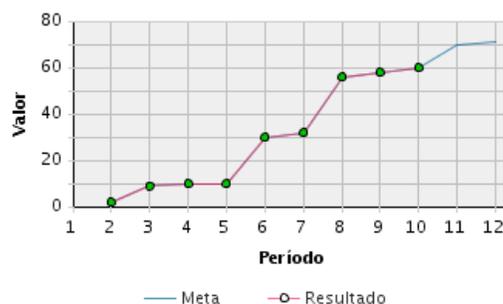

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
		2 %	9 %	10 %	10 %	30 %	32 %	56 %	58 %	60 %	70 %	71 %
	Avance real acumulado											
		2 %	9 %	10 %	10 %	30 %	32 %	56 %	58 %	60 %		
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2019. Elaboración de Término de Referencia para realizar la impresión de material didáctico; pliegos aprobados por parte del BID respecto a los insumos para la normativa nacional de niños, niñas y adolescentes, e Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria; todas estas acciones enmarcadas al Modelo de Gestión territorial establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.	Caicedo Valladares, Carlos Efraín	11/09/2019 - 11:01 AM
JULIO 2019: El proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y continuar con la consecución de los hito previstos para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil, adicional se presenta a la Dirección de Seguimiento el Informe mensual a la ejecución presupuestaria.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:29 PM
JUNIO 2019: Elaboración de Términos de Referencia para realizar la contratación de los especialistas del equipo de gestión del proyecto BID "Inversión en Calidad de los Servicios" y elaboración de Términos de Referencia para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil en aplicación al Modelo de Gestión territorial en función a lo establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.		
MAYO 2019: Consecución de procesos para avanzar en la realización de los Términos de Referencia para la Impresión de material didáctico y/o curricular.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:28 PM
ABRIL 2019: Elaboración y envío de Términos de Referencia para la Adquisición de material didáctico CDI y CNH los cuales son procesos de Licitación Pública Internacional.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:28 PM
MARZO 2019: La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), emite el Dictamen de Prioridad al Proyecto y se presenta a la Dirección de Seguimiento el Informe mensual a la ejecución presupuestaria.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:27 PM
FEBRERO 2019: Se obtuvo la aprobación del PAPP del proyecto, en las partidas presupuestarias y se redistribuyó a cada Entidad Operativa Desconcentrada (EOD), para el arranque del proyecto.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:27 PM
ENERO 2019: El proyecto realiza acciones para la asignación de recursos presupuestarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, al proyecto.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:26 PM
JULIO 2019: El proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y continuar con la consecución de los hito previstos para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil	López Moreta, José Luis	12/08/2019 - 03:06 PM
JUNIO 2019: Con el objetivo de garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, el proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y empezar procesos de contratación	López Moreta, José Luis	11/07/2019 - 04:37 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. La reducción en el presupuesto asignado a la institución CAUSARÍA que no se alcancen los niveles de ejecución planificados	09/10/2019	Blanca Marina Báez Pérez	10 %	10	1	0/1
2- NACIONAL. * General. Retraso en levantamiento de información implementación CAUSARÍA el desarrollo del mismo	09/10/2019	Blanca Marina Báez Pérez	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Elaboración de proyecto	4-Inicio de Trabajo	01/02/2019		01/02/2019		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto, elaborado	4-Inicio de Trabajo	08/02/2019		08/02/2019		Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: Dictamen de prioridad del proyecto, aprobado	9-Entregables Formales	04/03/2019		04/03/2019		Sí	6.0
4	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	11/03/2019		11/03/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de material didáctico para equipar las unidades de CDI y CNH, aprobado	5-Entregables Intermedios	18/04/2019		18/04/2019		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la contratación al equipo de Gestión para la Gerencia del Proyecto Misión Ternura, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/06/2019		05/06/2019		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil, elaborados	5-Entregables Intermedios	13/06/2019		13/06/2019		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	03/07/2019		03/07/2019		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	02/08/2019		02/08/2019		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la impresión de material didáctico y/o curricular desarrollado, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/08/2019		22/08/2019		Sí	20.0
11	EJECUCIÓN: Informe de insumos para la normativa nacional de niños, niñas y adolescentes, elaborados	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	04/09/2019		04/09/2019		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	03/10/2019		03/10/2019		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	06/11/2019	06/11/2019			No	2.0
15	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la capacitación al personal técnico operativo de CDI y/o CNH, aprobado	4-Inicio de Trabajo	21/11/2019	21/11/2019			No	8.0
16	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a las asistencias, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2019	22/12/2019			No	1.0
17	EJECUCIÓN: Elaboración del modelo de cooperación y relación con proveedores de servicios, aprobado	9-Entregables Formales	09/01/2020	09/01/2020			No	6.0
18	EJECUCIÓN: Elaboración del modelo de gestión territorial con un sistema web de monitoreo, gestión y rendición de cuentas, aprobado	5-Entregables Intermedios	06/02/2020	06/02/2020			No	7.0
19	EJECUCIÓN: Términos de referencia para el equipamiento de las Juntas y consejos cantonales, aprobada	5-Entregables Intermedios	16/04/2020	16/04/2020			No	9.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
20	EJECUCIÓN: Informe semestral de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/06/2020	05/06/2020			No	2.0
21	EJECUCIÓN: Informe semestral de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	01/02/2021	01/02/2021			No	2.0
22	EJECUCIÓN: Informe semestral de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	01/06/2021	01/06/2021			No	2.0
23	CIERRE: Informe de gestión y evaluación final, aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	IE-MT-Porcentaje de mujeres gestantes potenciales usuarias según la ficha de vulnerabilidad que son atendidas en los servicios de desarrollo infantil integral del MIES.		95.32 %	0.65	0.6196	01/02/2019	Ene-Jun
2	IE-MT-Porcentaje de cuidadores de niñas y niños entre 0 a 3 años usuarios de los servicios de desarrollo infantil integral del MIES que reciben consejería conforme a las realizaciones establecidas en las normas técnicas vigentes.		97.57 %	0.95	0.9269	01/02/2019	Ene-Jun
3	IE-MT-Porcentaje del personal técnico y operativo de desarrollo infantil integral del MIES que recibe capacitación conforme a lo establecido en las normas técnicas vigentes.		106.60 %	0.9	0.9594	01/02/2019	Ene-Jun
4	IE-MT-Porcentaje de mujeres gestantes usuarias de los servicios de desarrollo infantil integral del MIES que recibieron consejería conforme a las realizaciones establecidas en las normas técnicas vigentes.		76.96 %	0.95	0.7311	01/02/2019	Ene-Jun
5	IE-MT-Porcentaje de personal técnico y operativo de desarrollo infantil integral del MIES capacitado en la aplicación de instrumentos para detección y atención a víctimas de violencia en el contexto familiar.		111.11 %	0.9	1	01/02/2019	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	50,546,084.52 **
Costo Total:	214,689,779.55
Total Devengado:	12,102,028.75
% Costo Total Devengado:	5.64 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 5.64 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	22,412,639.84	0.00	22,412,639.84
Ppto. Externo Planeado	0.00	4,954,165.53	0.00	4,954,165.53
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	27,376,805.37	0.00	27,376,805.37
Ppto. Codificado	0.00	27,366,805.37	0.00	27,366,805.37
Ppto. Comprometido	0.00	10,339,206.71	0.00	10,339,206.71
Planeado - Codificado (2019)		-4,954,165.53		
Programado a Devengar	0.00	50,546,084.52	0.00	50,546,084.52
Ppto. Devengado	0.00	12,102,028.75	0.00	12,102,028.75
Pagado Real	0.00	10,330,926.56	0.00	10,330,926.56
Estimado a fin de año	* 0.00	27,366,805.37	0.00	27,366,805.37
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	23,179,279.15	0.00	23,179,279.15
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	23.94 %	0.00 %	23.94 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

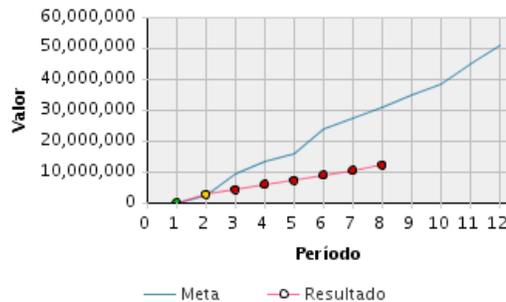

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	2,370,966.99	2,688,842.70	2,370,966.99	2,688,842.70	113.41 %		5.32 %
Mar	7,063,645.74	1,550,281.23	9,434,612.73	4,239,123.93	44.93 %		8.39 %
Abr	3,690,331.27	1,552,732.81	13,124,944.00	5,791,856.74	44.13 %		11.46 %
May	2,778,109.84	1,434,368.01	15,903,053.84	7,226,224.75	45.44 %		14.30 %
Jun	7,771,488.64	1,526,997.86	23,674,542.48	8,753,222.61	36.97 %		17.32 %
Jul	3,407,032.70	1,583,109.02	27,081,575.18	10,336,331.63	38.17 %		20.45 %
Ago	3,776,506.14	1,765,697.12	30,858,081.32	12,102,028.75	39.22 %		23.94 %
Sep	4,105,281.56		34,963,362.88				
Oct	3,357,846.99		38,321,209.87				
Nov	6,381,073.79		44,702,283.66				
Dic	5,843,800.86		50,546,084.52				
Total	50,546,084.52	12,102,028.75					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la promoción del desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 3 años de edad MEDIANTE la generación de procesos de fortalecimiento técnico, metodológico, de acompañamiento y evaluación de la gestión del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO Nro 11	Pliegos_NO_objección_BID_Consulta_NNA_27_sept_2019_hito	27/09/2019
2	ASOCIACIÓN HITO Nro. 10	Especificaciones_Técnicas.pdf	30/09/2019
3	ASOCIACIÓN HITO Nro. 12	Informe_ejecución_presupuestaria_agosto_2019.pdf	27/09/2019
4	ASOCIACIÓN HITO Nro. 13	Informe_de_ejecución_presupuestaria_sept_2019.pdf	03/10/2019
5	ASOCIACIÓN HITO Nro. 2	Matriz_PAPP_Inversión_2019_FORTALECIMIENTO_MT_26	07/08/2019
6	ASOCIACIÓN HITO Nro. 3	oficio_de_prioridad_senplades-2018-1410-of.pdf	07/08/2019
7	ASOCIACIÓN HITO Nro. 4	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
8	ASOCIACIÓN HITO Nro. 5	PLiegos_LPI001_CDI_CNH_26_jul_2019.docx	08/08/2019
9	ASOCIACIÓN HITO Nro. 6	hito_contratación_personal_gerencia.rar	08/08/2019
10	ASOCIACIÓN HITO Nro. 7	contratacion_de_personal.rar	08/08/2019
11	ASOCIACIÓN HITO Nro. 8	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
12	ASOCIACIÓN HITO Nro. 9	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Báez Pérez, Blanca Marina	Lider del proyecto	Analsita de Servicios de Atención Domiciliar	blanca.baez@inclusion.gob.ec	
