

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

PROYECTO: K001 Modalidades de atención: CIBV de atención directa - Funcionamiento, operación y atención de unidades.

Líder del Proyecto:	Vela, Soledad (soledad.vela@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	Programas Relacionados:	DESARROLLO INFANTIL, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Vela, Soledad	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.250.3290	TIR:	12.09 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	812,070.14
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,047,112.84
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	31/10/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Coronel Monar, Anibal Alejandro	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2017

DATOS GENERALES

Descripción

SENPLADES aprobó el proyecto "Desarrollo Infantil" con dos modalidades de atención: CIBV y CNH. Considerando 3 componentes:

- 1.Modalidades de atención
- 2.Equipamiento de las unidades de atención
3. Asistencia Técnica

1.Modalidades de atención:

Actualmente en las 2 modalidades se concertan y preparan propuestas que contextualizan los enfoques de género, intergeneracional, intercultural, territorial, derechos, participación ciudadana y sustentabilidad ambiental para responder a las necesidades específicas de niñ@s, de sus familias, su comunidad y su territorio en diferentes realidades sociales, culturales y económicas.

Las modalidades de atención de desarrollo infantil nacen de una concepción, que toma como célula básica a la familia para su realización, por ser éste el contexto donde transcurre la formación y el desarrollo del ser humano en todas las etapas de su vida, fundamentalmente en las primeras edades. Toma también como elemento fundamental un fuerte apoyo comunitario, vinculando a los diferentes actores sociales, para coordinar acciones coherentes para la consecución de un fin común: el desarrollo infantil integral de los niñas y niños menores de 3 años.

DATOS GENERALES

Descripción

1.1Centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV

Los Centros Infantiles del Buen Vivir CIBV son centros de atención integral a niños y niñas menores de 3 años, cuyos padres y madres trabajan fuera de casa y no tienen un adulto que se responsabilice de su cuidado o el mismo no está en capacidad de protegerlos adecuadamente.

La atención integral en esta modalidad contempla un servicio de educación y estimulación del desarrollo integral, alimentación saludable y nutritiva diaria (4 ingestas), y la ejecución de acciones de prevención en salud, respetando la equidad, las prácticas y valores culturales de los pueblos y nacionalidades. Todo esto con la responsabilidad de la familia, la corresponsabilidad de la comunidad, en articulación intersectorial.

Los CIBV se encuentran operando a nivel nacional, en un horario de hasta 8 horas diarias. El equipo que atiende a los niños y niñas está conformado por: una profesional responsable de la gestión del CIBV, que asume el rol de Coordinadora y las Asistentes de Cuidado, que son personas preferentemente de la comunidad y con perfil de educadora parvularia o áreas afines, responsable de las actividades educativas de 10 niños y niñas cada una, en términos generale.

Los CIBV parten de 2 formas de administración:

1.1.1 CIBV de atención Directa:

Unidades de atención cuya administración es directamente del MIES para: implementación, ejecución, monitoreo y evaluación.

1.1.2 CIBV operado por terceros:

Unidades de atención cuya administración está a cargo de entidades prestadoras de servicios y de cooperación como: Gobiernos autónomos descentralizados GADs, organizaciones de la sociedad civil OSC, organizaciones no gubernamentales ONG. Para la ejecución de este servicio el MIES establece lineamientos técnicos, metodológicos, administrativos y financieros

Beneficios Cualitativos

Contar con Centros infantiles del Buen Vivir administrados directamente por el MIES que cumplan con estándares, protocolos y normas.

Tipo de Beneficiario

Niños y niñas de 0 a 3 años de edad principalmente de pobreza y extrema pobreza.

Familias que requieren esta atención para sus hijos e hijas

Restricciones


La población atendida se limita al grupo etario de 0 a 3 años priorizando a aquellos en pobreza y extrema pobreza.

La alimentación es externalizada

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.99 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 **Fecha de Fin:** 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	42 %	47 %	52 %	57 %	62 %	67 %	72 %	77 %	82 %	87 %	92 %	100 %
	Avance real acumulado											
	42 %	52 %	52 %	57 %	62 %	67 %	72 %	77 %	82 %	87 %		
Estado												

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>INFORME EJECUTIVO OCTUBRE.- Se realiza seguimiento a la zona 3, y zona 9 con Memorando Nro. MIES-SDII-2017-0892-M y Memorando Nro. MIES-SDII-2017-0891-M respectivamente emitido el 24 de octubre del 2017, en el cual se solicita las acciones realizadas y en que proceso se encuentra la liquidación para finiquito y cierre del Convenio de Desarrollo, La coordinación zonal 2 con fecha 30 de octubre solicita el pago mediante CUR 393 y el ministerio de finanzas acredita en cuenta 31 de octubre del 2017.</p>	Vela, Soledad	31/10/2017 - 04:13 PM
<p>INFORME EJECUTIVO DE SEPTIEMBRE Se realiza seguimiento a la zona 3, y con Memorando Nro. MIES-SDII-2017-0708-M, se solicita el pago, con fundamento en el Acuerdo Ministerial 000024 de fecha 14 de agosto de 2014 y por los antecedentes y situación actual expuestos, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil concluye en que compete a la EOD 280-3000 Coordinación Zonal 3- MIES, ejecutar el pago de la deuda pendiente con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO y finiquitar el convenio D01 012-UAJ DI-CP-MIES-CC-2013-CHIMBORAZO y su Adenda.</p>	Vela, Soledad	10/10/2017 - 11:52 AM
<p>INFORME EJECUTIVO DE AGOSTO Se realiza seguimiento a la zona 9 para el saneamiento obligación pendiente por el valor de USD. 10.679,76, convenio 030-INFA-AJ-DPP-2012 y el Adendum 004-AJ-DPP-2012, suscrito por la Dirección Provincial MIES - INFA Pichincha y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esperan, informar el estricto cumplimiento de ésta disposición, a fin de contar con los insumos que permitirá a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil culminar con el proceso de CIERRE del Proyecto de Desarrollo Infantil 2010-2013, con Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0338-M.</p>	Vela, Soledad	10/10/2017 - 11:49 AM
<p>INFORME EJECUTIVO DE JULIO Se realiza monitorio y seguimiento para el cumplimiento de la ejecución a las zonas 3 y 9, sin embargo hasta la presente fecha no se ha obtenido resultados de las zonas.</p>	Vela, Soledad	10/10/2017 - 11:48 AM
<p>INFORME EJECUTIVO DE JUNIO Se verifica y se realiza seguimiento y monitoreo desde el área financiera.</p>	Vela, Soledad	10/10/2017 - 11:47 AM
<p>INFORME EJECUTIVO DE MAYO Ejecución al cumplimiento de asignación de recursos en territorio, se verifica el pago realizado de la zona 1 por deuda pendiente del convenio de cierre y liquidación del año 2013.</p>	Vera Mejía, Martha Karla	29/06/2017 - 10:50 AM
<p>INFORME EJECUTIVO DE ABRIL Monitoreo al cumplimiento a los valores asignados a territorio que se encuentra codificado y determinar el cumplimiento de pago para de esta manera liquidar el proyecto de inversión al 100%. Se identifica que la zona 1 es la única zona que el monto asignado se encuentra comprometido para realizar el pago.</p>	Vera Mejía, Martha Karla	29/06/2017 - 10:46 AM
<p>INFORME EJECUTIVO MARZO Seguimiento y monitoreo al Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2017 aprobado del Ministerio de Inclusión Económica y Social.</p>	Vera Mejía, Martha Karla	29/06/2017 - 10:37 AM
<p>INFORME EJECUTIVO DE FEBRERO Continuidad para el cierre.- El proyecto Desarrollo Infantil se encuentra en la etapa de cierre a partir del 2014 el proyecto va a formar parte del gasto corriente del MIES.</p>	Vera Mejía, Martha Karla	29/06/2017 - 10:37 AM
<p>INFORME EJECUTIVO DE ENERO Antecedentes.- El proyecto de Desarrollo Infantil fue creado con el objetivo de garantizar la protección integral, asegurando la provisión de los servicios indispensables para el crecimiento y maduración de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad en igualdad de oportunidades y condiciones, logrando su pleno desarrollo en armonía con su entorno sociocultural y ambiental, con la participación y corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.</p>	Vera Mejía, Martha Karla	29/06/2017 - 10:23 AM
<p>INFORMA EJECUTIVO DE DICIEMBRE -Seguimiento técnico a las actividades previas para la inauguración de 4 CIBV Emblemáticos; Zonal 5: "Juan Franco Guerra", cantón Salitre, parroquia Vernaza. Zonal 4: "Luz del Mañana", "Horizontes de Oportunidades" y "Tejiendo el Futuro", cantón Santo Domingo. Producto: Matriz de CIBV Emblemáticos en funcionamiento durante el 2013 -Bienvenida y acompañamiento técnico a las visitas realizadas por el señor parlamentario de Albania, Namik Dokle, en 3 CIBV en la Zonal 9 y 4 CIBV en la Zonal 2, en coordinación con la Dirección de Relaciones Internacionales.</p>	Vera Mejía, Martha Karla	29/06/2017 - 10:16 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Producto: Cuadro de actividades realizadas con el señor parlamentario de Albania -Propuesta para la construcción de CIBV Emblemáticos para el 2014, en coordinación con la Dirección de Gestión del Conocimiento y Gerencia de CIBV Emblemáticos.</p> <p>INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013</p> <p>-Jornada de acompañamiento y apoyo a coordinaciones zonales en la implementación de norma técnica y guías metodológicas en la ejecución de servicios de la modalidad CIBV en las áreas de gestión de la Coordinadora CIBV, aplicación de Indicadores de Desarrollo, Aplicación de componentes de la modalidad y participación familiar y comunitaria Producto: Informe de Seguimiento y Acompañamiento a las Zonales Oct.</p> <p>-Seguimiento técnico de las actividades previas para la inauguración de 4 CIBV Emblemáticos en la Zonal 1; 3 en Carchi y 1 en San Lorenzo. Seguimiento a la Inauguración de 3 CIBV Emblemáticos en los cantones de Twintza, Huamboya y Macas en la provincia de Morona Santiago, Zonal 6. Producto: Matriz de CIBV Emblemáticos Inaugurados</p> <p>-Propuesta para diseño y contenido de material de promoción y difusión de servicios de DII y la política pública de DII Producto: Tríptico de CIBV Emblemáticos</p> <p>-Coordinación con el MCDS y presentación de propuesta para la atención a hijos e hijas de personas privadas de su libertad y que permanecen en los centros de rehabilitación del país Producto: Proyecto Piloto de Atención en Servicios de DII en el CRS de Guayaquil</p> <p>-Mesa Técnica a elaborarse el 05 y 06 de noviembre, para validación: Guías metodológicas CIBV, protocolo de planificaciones socioeducativas, protocolo de participación familiar y comunitaria, protocolo de gestión técnica y protocolo de externalización del servicio de alimentación.</p> <p>-Base de datos para reportes octubre. Producto: Matriz de cobertura unidades de atención y convenios - ZONALES Producto: Reporte de cobertura, unidades de atención y convenios - SIPI Producto: Base de datos de Coordinadoras CIBV por unidad de atención - ZONALES Producto: Base de datos de personal técnico de seguimiento a servicios de DII - ZONALES Producto: Base de datos de educadoras de cuidado de CIBV de atención Directa - ZONALES</p> <p>-Coordinación y definición de participantes la modalidad CIBV en procesos de formación continua con el apoyo del SECAP y la UTPL. Producto: Resumen del listado de Participantes para Capacitación de UTPL Producto: Resumen del listado del Grupo 1 para Capacitación SECAP Producto: Resumen del listado del Grupo 2 para Capacitación SECAP</p> <p>-Información enviada a la Comisión de Transición para la Definición de la institucionalidad Pública acerca de los servicios que presta el Estado a través de los CIBV Producto: Respuesta enviada a la Comisión de Transición acerca de los servicios que presta el Estado a través de los CIBV</p> <p>-Externalización del servicio de alimentación Producto: Informe resumen del Proceso de externalización del Servicio de Alimentación</p> <p>-Borrador del modelo de convenio a ser suscrito entre el MIES y GADs, ONG y OSC para la operación de servicios de DII.</p> <p>-Programación mensual enviada a la Dirección de Planificación e inversión Producto: Matriz de Programación Mensual</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>La Mesa Técnica Nacional de DII desarrollado el 3 y 4 de septiembre, evento en el cual se validaron y retroalimentaron las herramientas para los procesos de evaluación, planificación y ejecución de las Programaciones Técnicas Trimestrales de los servicios de DII en los niveles distritales, zonales y nacional. Seguimiento, asistencia técnica y evaluación en las zonas, a la Programación Técnica Trimestral de las Coordinaciones Zonales, construida a partir de los resultados del SOTSIDII en el marco del mejoramiento continuo de la calidad de atención, en las zonas.</p>	<p>Otavalo Paredes, Elizabeth de los Angeles</p>	<p>01/11/2013 - 02:35 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Propuesta de participación comunitaria para la veeduría ciudadana a la externalización del servicio de alimentación de los CIBV en coordinación con la Dirección de participación.</p> <p>AGOSTO 2013 A través de los técnicos se está verificando el cumplimiento de la normativa de la externalización del servicio de alimentación de los CIBV. Seguimiento al cumplimiento del receso a nivel de la sierra y la amazonía. Coordinación y seguimiento al cumplimiento de hoja de ruta para previo funcionamiento de los CIBV emblemáticos en coordinación con los técnicos zonales y la gerencia de los centros emblemáticos.</p>		
<p>JULIO 2013</p> <p>Propuesta de seguimiento a los proveedores del servicio externalizado de alimentación de los CIBV realizada conjuntamente con la Gerencia de PANI. Informe para la priorización de la rehabilitación de los 9 CIBV de atención directa en el país, en coordinación con la Gerencia de CIBV Emblemáticos, Coordinación de Infraestructura y Asesora del Despacho.</p>	Orellana López, Soraya Elizabeth	09/08/2013 - 08:44 AM
<p>JUNIO 2013</p> <p>Se dio seguimiento técnico para la adquisición de material didáctico y mobiliario del centro emblemático, coordinación con el Municipio, apoyo en el proceso de selección de personal.</p> <p>Al evento realizado se le denominó "Recorrido de avance de obra", donde el Gerente del proyecto de CIBV emblemático se dirigió a los asistentes informando el por qué no era una inauguración sino un recorrido por el avance de obra.</p> <p>Fortaleciendo con apoyo técnico y seguimiento a los procesos de los centros emblemáticos a nivel nacional en coordinación con los técnicos zonales y la gerencia de los centros emblemáticos.</p> <p>Envío de circular actualizando la información sobre el proceso y difundiendo la hoja de ruta (Se adjunta la Circular)</p> <p>Estableciendo una hoja de ruta de seguimiento para los centros de atención directa de la Zona 9 en coordinación con los técnicos zonales y distritales para realizar el levantamiento de información de las unidades de atención y realizar acciones que permitan mejorar su funcionamiento.</p> <p>Definición de los nombres de los CIBV Emblemáticos por inaugurar (Se adjunta el listado)</p> <p>Ubicación de la construcción de 250 CIBV Emblemáticos (Se adjunta la lista de los 250 CIBV Emblemáticos)</p> <p>Estrategias de intervención y mejoramiento de calidad en centros de atención directa en la zona 9 (Se adjunta la estrategias y acuerdos)</p> <p>Socialización y asistencia técnica de la hoja de ruta previo al funcionamiento de CIBV Emblemáticos (Se adjunta hoja de ruta).</p>	Orellana López, Soraya Elizabeth	26/06/2013 - 10:35 AM
<p>MAYO 2013</p> <p>Reunión con infraestructura para definir el equipamiento, menaje y mobiliario en las especificaciones técnicas para los centros emblemáticos.</p> <p>Coordinación con ICO, la gerencia de CIBV emblemáticos y el MCDS para reajustar cronograma de entregas de los centros emblemáticos.</p> <p>Se visita el Centro Emblemático de Ventanas el 22-05-2013 y el 30-05-2013 para coordinar actividades técnicas, lógicas, administrativas para la inauguración del mismo el 04/06/2013.</p> <p>Coordinación con la zona 9 para implementar una propuesta al centro directo "Aprendiendo a Vivir" aprovechando la capacidad en el espacio físico y aumentar la cobertura.</p>	Orellana López, Soraya Elizabeth	30/05/2013 - 01:09 PM
<p>ABRIL 2013</p>	Rosero Palacios, Sylvia Tatiana	03/05/2013 - 12:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Elaboración de hoja de ruta para el seguimiento de los CIBV Emblemáticos. / Seguimiento y monitoreo al servicio CIBV con asistencia técnica en territorio / Actualización de información de Talento Humano de las Coordinadoras y Asistentes de Cuidado de los centros de atención directa y bajo convenio / Externalización de los servicios de alimentación en los CIBV / Inauguración del primer centro emblemático en la ciudad de Guayaquil .</p>		
<p>MARZO 2013</p> <p>Realización del evento de Sociabilización Plan Familia realizado el 08 de marzo 2013, en el Hotel Quito.</p> <p>Encuentro por la Revolución tiene rostro de mujer realizado el 08 de marzo 2013, en la plaza grande de Quitumbe.</p> <p>Participación en el Encuentro Binacional Ecuador- Perú, en función de responder a la Agenda establecida en el marco de las relaciones binacionales Ecuador - Perú en el marco del taller intercambio de experiencia, mejores prácticas para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y Programas de Desarrollo Infantil Integral en la ciudad de Tumbes, los días 18 y 19 de marzo 2013, en la ciudad de Huaquillas en los centros de atención directa.</p> <p>Participación en la campaña de servicios sociales dignos del MCDS para los Centros Infantiles del Buen Vivir.</p>	<p>Rosero Palacios, Sylvia Tatiana</p>	<p>05/04/2013 - 10:09 AM</p>
<p>FEBRERO 2013</p> <p>Seguimiento a los procesos de externalización de servicios en centros directos y por convenio</p> <p>Seguimiento a los centros infantiles de atención directa del 18 al 23 de febrero 2013.</p> <p>Taller didáctico-metodológico el jueves 21 de febrero 2013, con la/os coordinadores de los Centros de Atención Directa a nivel nacional.</p> <p>Minga y mantenimiento de los CIBV de atención directa/Ambientación de espacios recreativos y de aprendizaje del CIBV, sábado 23 de febrero 2013.</p>	<p>Rosero Palacios, Sylvia Tatiana</p>	<p>05/04/2013 - 10:05 AM</p>
<p>ENERO 2013</p> <p>Durante este mes se trabajó en el ajuste del PAPP 2013 para su presentación a la autoridad para su respectiva aprobación.</p> <p>Se realizó un levantamiento de información para la contratación de alimentación y personal de los centros CIBVs.</p> <p>Como resultado de la implementación de un nuevo modelo de gestión por procesos institucionalmente establecido en el MIES, ha sido necesario replantear y ajustar las directrices de gestión de Desarrollo Infantil a la nueva estructura, por zonas, distritos y circuitos. Proceso que ha demandado que esta Subsecretaría trabaje intensamente en la actualización en el Sistema de Información de Protección Integral -SIPI a nivel de las direcciones distritales.</p> <p>Hasta fines del año 2012 se mantenía la actualización de información en este sistema, el mismo que facilitaba contar con reportes mensuales y trimestrales, sin embargo en la reestructuración institucional del 2013, el sistema deja de ser utilizado para la actualización de información y a la vez se analizan desde diferentes espacios de toma de decisiones otros instrumentos y sistema que lo sustituya. Es así que al no contar con otro sistema en ese tiempo y en vista de la necesidad de ingresar la información, con fecha 20 de febrero 2013, por medio de correo electrónico institucional (anexo), se dispone desde la Directora de Servicios Centros Infantiles del Buen Vivir - Tatiana Rosero, el registro de información de convenios, unidades de atención CIBV -CNH y coberturas en el SIPI.</p> <p>Socialización de directrices, estatuto orgánico y otras normas técnicas.</p> <p>Propuesta de recuperación de los centros de atención directa a nivel nacional.</p> <p>Coordinación de mesas de trabajo con técnicos de desarrollo infantil responsables de zonas y distritos.</p> <p>Acompañamiento y evaluación de los procesos de mejoramiento propuestos desde el convenio de cooperación con CELEP-Cuba./ Talleres zonales con técnicas del CELEP y técnicos locales MIES.</p>	<p>Rosero Palacios, Sylvia Tatiana</p>	<p>04/04/2013 - 04:14 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Taller nacional final con técnicas CELEP a cargo del equipo de la subsecretaría.		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
No contar con un sistema de ingreso de información.	01/11/2013		80	50	40	0/3

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. El incumplimiento de los procesos administrativo CAUSARÍA que la ejecución presupuestaria se mantenga vigente	25/05/2017		60 %	80	48	0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Norma técnica para la externalización del servicio de alimentación en los centros de atención directa elaborada por esta dirección y difundida a nivel nacional para su aplicación y cumplimiento.	1-Solicitud de Información	28/01/2013		28/01/2013		Sí	3.0
2	Revisión del Informe final de las técnicas cubanas del acuerdo de cooperación CELEP- Cuba y realización del taller final para presentación del informe para conocimiento del trabajo realizado y su aplicación.	9-Entregables Formales	28/01/2013		28/01/2013		Sí	3.0
3	Guía metodológica de los Centros Infantiles del Buen Vivir.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	5.0
4	Consolidación de informes de seguimiento y acompañamiento técnico a los centros emblemáticos a nivel nacional y entregados para su cumplimiento en el segundo semestre.	1-Solicitud de Información	01/07/2013		01/07/2013		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	Consolidación de informes de seguimiento y acompañamiento técnico a los centros de atención directa a nivel nacional y entregados para su cumplimiento en el segundo semestre.	1-Solicitud de Información	05/07/2013		05/07/2013		Sí	4.0
6	Consolidación de datos remitida según la guía para el análisis de información del sistema SOTSDII del 1er trimestre terminada.	5-Entregables Intermedios	25/07/2013		25/07/2013		Sí	5.0
7	Documento de niñas y niños atendidos en servicios de desarrollo infantil integral mayores de tres años de edad entregados para su análisis y acciones.	1-Solicitud de Información	30/09/2013		30/09/2013		Sí	5.0
8	Documento de niñas y niños atendidos en servicios de desarrollo infantil integral menores de tres años de edad entregados para su análisis y acciones.	1-Solicitud de Información	30/09/2013		30/09/2013		Sí	5.0
9	Propuesta de participación familiar y comunitaria para la veduría ciudadana en Desarrollo Infantil Integral.	1-Solicitud de Información	21/11/2013		21/11/2013		Sí	4.0
10	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	30/01/2017		30/01/2017		Sí	5.0
11	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	5.0
12	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		28/02/2017		Sí	5.0
13	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	5.0
14	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	5.0
15	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	5.0
16	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	5.0
17	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	5.0
18	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	5.0
19	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	5.0
20	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	30/11/2017	30/11/2017			No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	Ejecución: Informe de Seguimiento a las Unidades ejecutoras	5-Entregables Intermedios	20/12/2017	20/12/2017			No	5.0
22	Cierre: Informe final de ejecución del proyecto	9-Entregables Formales	26/12/2017	26/12/2017			No	3.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHILANES	Coronel Monar, Anibal Alejandrino	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/10/2017
2	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	31/03/2017
3	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/12/2013
4	SUPERVISIÓN	Trujillo Castro, Jorge Eduardo	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	30/11/2013
5	CIBV en el Cantón Azogues	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	06/09/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,047,112.84 **
Costo Total:	2,322,607.04
Total Devengado:	2,995,094.05
% Costo Total Devengado:	128.95 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 128.95 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,641,804.81	0.00	0.00	3,641,804.81
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,271,864.76	0.00	0.00	2,271,864.76
Ppto. Codificado	2,971,265.43	96,683.00	0.00	3,067,948.43
Ppto. Comprometido	627,822.80	44,664.21	0.00	672,487.01
Planeado - Codificado (2017)		-96,683.00		
Programado a Devengar	2,950,429.84	96,683.00	0.00	3,047,112.84
Ppto. Devengado	2,950,429.84	44,664.21	0.00	2,995,094.05
Estimado a fin de año	* 2,950,429.84	0.00	0.00	2,950,429.84
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	96,683.00	0.00	96,683.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	46.20 %	0.00 %	98.29 %
Ppto. Codificado 998	155,632.80	0.00	0.00	155,632.80
Ppto. Devengado 998	155,630.60	0.00	0.00	155,630.60

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

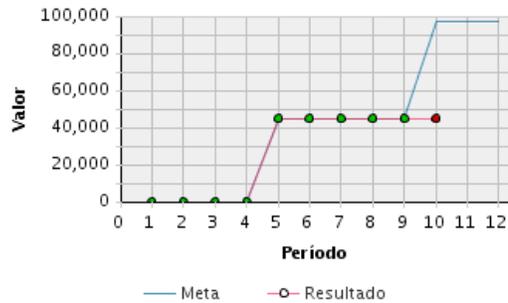

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	44,664.21	44,664.21	44,664.21	44,664.21	100.00 %		46.20 %
Jun	0.00	0.00	44,664.21	44,664.21	100.00 %		46.20 %
Jul	0.00	0.00	44,664.21	44,664.21	100.00 %		46.20 %
Ago	0.00	0.00	44,664.21	44,664.21	100.00 %		46.20 %
Sep	0.00	0.00	44,664.21	44,664.21	100.00 %		46.20 %
Oct	52,018.79	0.00	96,683.00	44,664.21	46.20 %		46.20 %
Nov	0.00		96,683.00				
Dic	0.00		96,683.00				
Total	96,683.00	44,664.21					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar la promoción del desarrollo de niñas y niños de 1 a 3 años de edad MEDIANTE el acceso, la calidad, y la rectoría de los servicios CIBV de atención directa y operado por terceros con la corresponsabilidad de las familias, la comunidad y el Estado.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		2._CALCULO_DENOMINADOR_GPR.xls	29/11/2013
2		COBERTURA_DICIEMBRE_2013_pdf.pdf	19/12/2013
3		EMBLEMATICOS.PDF	19/12/2013
4	BORRADOR A LA PROPUESTA DE PARTICIPACION FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA LA VEEDURIA CIUDADANA EN DII	BORRADOR__VEEDURÍA_CIUADADANA_GPR_OCTUBRE.pdf	27/11/2013
5	CENTROS INAUGURADOS EN EL MES DE OCTUBRE Y QUE SE TRANSFORMAN EN ATENCIÓN DIRECTA	3._CIBV_Emblematicos_oct.pdf	04/11/2013
6	COBERTURA CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (DIRECTOS)	1._REPORTE_SIPI_28-NOV..pdf	29/11/2013
7	COBERTURA DE NIÑAS Y NIÑOS EN CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MES DE AGOSTO 2013	COBERTURA_AGOSTO_DIRECTA.xls	27/09/2013
8	COBERTURA DE NN EN CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MES DE JULIO 2013	7._COBERTURA_JULIO_2013-2.xls	09/08/2013
9	COBERTURA DE NN EN CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MES DE JUNIO 2013	cobertura_atencion_directa_junio.pdf	27/06/2013
10	COBERTURA OCTUBRE CENTROS DE ATENCION DIRECTA	1._Grupo_etario_SIPI_oct.pdf	04/11/2013
11	DENOMINADOR	CALCULO_DENOMINADOR_DICIEMBRE.pdf	19/12/2013
12	EXTERNALIZACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIBV DEL MES DE AGOSTO	EXTERNALIZACION_AGOSTO_CONSOLIDADO_NACIONAL	27/09/2013
13	EXTERNALIZACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIBV DEL MES DE SEPTIEMBRE	EXTERNALI_SEPTIEMB_SERVICIO_DE_ALIMENTACIÓN	27/09/2013
14	HITO 1 - Externalización de la alimentación	TERMINOS_DE_REFERENCIA_INFIMA_CUANTÍA_(1)_EXTERNALIZACIÓN_DE_ALIMENTACIÓN	05/06/2013
15	HITO 10 ANTECEDENTE DEL PROYECTO DE INVERSION PARA LIQUIDACION RESEPECTIVA	PROYECTO_INVERSION_ANTECEDENTE.pdf	06/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	HITO 10 MEMORANDO SOLICITANDO PAPP 2017	Memorando_solicitando_PAPP_2017.pdf	06/06/2017
17	HITO 11 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CIERRE AL PROYECTO DE INVERSION 2013.	MEMORANDO_APERTURA_ESIGEF_PROG_12_PROY_23.pdf	06/06/2017
18	HITO 11 PAPP APROBADO PARA CIERRA PROYECTO DE INVERSION AL 2017	PAPP_DESARROLLO_INFANTIL_2103_2017_INVERSION.xls	06/06/2017
19	HITO 12 Seguimiento al cumplimiento a la ejecución.	Seguimiento_y_monitoreo_marzo.doc	06/06/2017
20	HITO 13 Monitorio a valores asignados seguimiento y monitoreo	Monitoreo_a_Valores_Asignados_Seguimiento__abril.doc	06/06/2017
21	HITO 14 EJECUCION AL CUMPLIMIENTO DE ASIGANACION DE RESURSOS 2017	ESIGEF_CORTE_06-06-2017.xls	06/06/2017
22	HITO 14 MONITORIO VALORES ASIGANDOS	CUR_328_PAGO_ZONA_1_CIERRE_PROYECTO_DI-2010-20106201	06/06/2017
23	HITO 15 seguimiento y monitoreo convenio 2013	MIES_PAGO_CONVENIO_AÑO_2013_-PROGRAMA_12_-PROYECTO_023_CZ-_A_UNIV._NACIONAL_CHIMBORAZO.doc	07/08/2017
24	HITO 16 SEGUIMIENTO Y MONITOREO MES JULIO	Seguimiento_y_monitoreo_Julio.doc	10/10/2017
25	HITO 17 SEGUIMIENTO Y MONITOREO ZONA 9	MIES-SDII-DSCDI-2017-0338-M_Respuesta_al_memo_MIES-CZ-9-2017-1653-M_-AGOSTO.pdf	10/10/2017
26	HITO 18 SGUIMIENTO Y MONITOREO ZONA 3	MIES-SDII-2017-0708-M_Respuesta_al_memo_MIES-CZ-3-2017-1961-M_SEPTIEMBRE.pdf	10/10/2017
27	HITO 19 CANCELACION VALORES PENDIENTES ZONA 3 CONVENIO CON LA "UNACH"	VALORES_LIQUIDADOS_CONVENIO_UNACH_ZONA_3.pdf	31/10/2017
28	HITO 19 MEMORANDO SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A ZONA 3	MIES-SDII-2017-0892-M_.pdf	31/10/2017
29	HITO 19 MEMORANDO SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A ZONA 9	MIES-SDII-2017-0891-M_Seguimiento_a_pago_oblicacion_Zona_9.pdf	31/10/2017
30	HITO 4 250 CIBV EMBLEMATICOS CON COBERTURA	HITO_4_250_CIBV_EMBLEMATICOS_CON_COBERTURA.pdf	26/06/2013
31	HITO 4 CIRCULAR INFOR TAMAÑO CIBV POR COBERTURAS EMBLEM.	HITO_4_CIRDULAR_INFOR_TAMAÑO_CIBV_POR_COBERTURAS_EMBLEM..pdf	26/06/2013
32	HITO 4 HOJA DE RUTA EMBLEMÁTICOS	HITO_4_hoja_ruta_emblematicos.pdf	26/06/2013
33	HITO 6 INFORME ZONA 9	HITO_6_informe_zona_9.doc	26/06/2013
34	Listado de centros infantiles administrados y financiados directamente por el MIES al 31 dic 2013	CIBV_de_Administración_Directa_-_emblemáticos_y_preexistentes_al_31_dic_2013.xls	27/12/2013
35	NUMERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS ATENCION DIRECTO BASADA EN LA NORMATIVA VIGENTE (10 NIÑOS 1 EDUCADORA)	2._Personal_CIBV_Directos_oct..pdf	04/11/2013
36	VISITAS A CIBV DE CAYAMBE Y DIRCTOS CON PARLAMENTARIO ALVARES	VISITA_PARLAMENTARIO.PDF	19/12/2013

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	http://www.inclusion.gob.ec/
	http://Página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Andrade Saeteros, Judith Lorena	Técnica de Desarrollo Infantil	Técnica Desarrollo Infantil Integral	lorena.andrade@inclusion.gob.ec	
Cajas Lara, Susana Valeria	Directora de servicios de Centros Infantiles de Buen Vivir	Subsecretaria de Participación Ciudadana	susana.cajas@politica.gob.ec	2976700
Chavez Cruz , Ana del Rocío	Técnica de Desarrollo Infantil CIBV	Técnica de Desarrollo Infantil Integral	rocio.chavez@inclusion.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Orellana López, Soraya Elizabeth	Técnica de Desarrollo Infantil CIBV	Técnica de Desarrollo Infantil Integral	soraya.orellana@inclusion.gob.ec	
Otavalo Paredes, Elizabeth de los Angeles	Técnica de Desarrollo Infantil CIBV	Técnica de Servicios de Centros Infantiles del Buen Vivir	elizabeth.otavalo@inclusion.gob.ec	
Pacheco Costales, Eve Marylhein	Técnica de Desarrollo Infantil CIBV	Técnico de Desarrollo Infantil	eve.pacheco@inclusion.gob.ec	
Toscano Galarza, Luis Marcelo	Técnica de Desarrollo Infantil CIBV	Analista	luis.toscano@inclusion.gob.ec	
