

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Discapacidades

Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad

PROYECTO: K002 MIES-Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa.

Líder del Proyecto:	Lascano Gomez, Mercedes Liliana (mercedes.lascano@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	
Titular:	González Cuero, Mónica Delia	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	1.16
CUP:	102800000.0000.383964	TIR:	27.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	886,685.48
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,700,000.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	25/11/2021 - 25/11/2024
Fecha de última actualización:	22/09/2022	Fecha de Fin Base:	25/11/2024
Modificado por:	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	Fecha del siguiente Hito:	10/10/2022

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto busca fortalecer la inclusión social a personas cuidadoras de personas con discapacidad, con la implementación de un modelo de apoyo integral, con el fin de mejorar la calidad de cuidado, autocuidado y las condiciones de vida del cuidador y disminuir el síndrome de sobrecarga del cuidador mediante el fortalecimiento de sus capacidades para mejorar la calidad de cuidado a personas con discapacidad severa.

Beneficios Cualitativos

- Con el fortalecimiento de las capacidades de las personas cuidadores principales y suplentes, se reduce la sobrecarga del cuidador y se mejora la calidad en el cuidado a personas con discapacidad severa.
- Con la certificación de las personas cuidadores principales y suplentes, se obtendrá un fortalecimiento en el el cuidado de personas con discapacidad severa obteniendo un tiempo de respiro.

Tipo de Beneficiario

La población objetivo del proyecto está basada en el número de asistentes del cuidado de usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara que asciende a un total de 22.548 personas entre principales y suplentes del cuidado de las personas con discapacidad severa.


Restricciones

- Alcance: Será beneficiarios solo los cuidadores principales y suplentes de las personas usuarias que reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara.
- Tiempo: Tiene una duración de 5 años, por la pandemia de la COVID-19 no se ha ejecutado.
- Recursos: Es necesario contar con el Modelo de Redes de Apoyo a las personas con discapacidad atendidas por el MIES y sus familias.
- Costo: No se puede exceder los recursos definidos por la fuente de financiamiento.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 28.71 %
 Fecha de Inicio: 25/11/2021 Fecha de Fin: 25/11/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

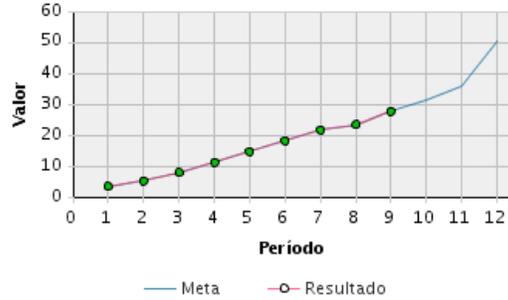

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	3 %	5 %	8 %	11 %	15 %	18 %	22 %	23 %	28 %	31 %	36 %	50 %
	Avance real acumulado											
	3 %	5 %	8 %	11 %	15 %	18 %	22 %	23 %	28 %			
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de agosto 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria mensual de agosto de 2022 es de USD 4.284,04 equivalente al 0,94% del presupuesto total y corresponde al pago de los servicios de la consultoría de los especialistas legal y adquisiciones. Además, se tienen comprometido un valor de USD 40.698,37.</p> <p>03. La ejecución presupuestaria acumulada a agosto de 2022 es de USD 19.278,18 equivalente al 4,22% del presupuesto total y corresponde al pagos de los servicios de la consultoría de los especialistas legal y adquisiciones.</p> <p>04. Respecto al proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos, se envió los términos de referencia, la invitación de expresiones de interés y la solicitud de propuestas al BID para contar con la correspondiente no objeción.</p> <p>05. El proceso de contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, se están realizando ajustes a los términos de referencia en conjunto con la consultora externa del BID Cinthia Rosero.</p> <p>06. El proceso de contratación de la Línea Base, se solicitó apoyo y soporte al BID para la elaboración de los términos de referencia, se está por definir las fechas para realizar avances en el documento preliminar.</p>	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	22/09/2022 - 05:28 PM
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de julio 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria mensual de julio de 2022 es de USD 4.284,04 equivalente al 0,59% del presupuesto total y corresponde al pago de los servicios de la consultoría del especialista legal. Además, se tienen comprometido un valor de USD 40.698,37.</p> <p>03. La ejecución presupuestaria acumulada a julio de 2022 es de USD 14.994,14 equivalente al 2,06% del presupuesto total y corresponde al pagos de los servicios de la consultoría del especialista legal.</p> <p>04. El proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos, se envió el pedido para la actualización de proformas en razón de los cambios a los términos de referencia, en lo que respecta al plazo de 180 días a 210 días.</p> <p>05. El proceso de contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, hay una versión preliminar de los términos de referencia que fueron enviados el 26 de julio de 2022 a la consultora externa Ma. Elena Ramirez del BID.</p> <p>06. El proceso de contratación de la Línea Base, se solicitó apoyo y soporte al BID para la elaboración de los términos de referencia, se está por definir las fechas para realizar avances en el documento preliminar.</p>	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	25/08/2022 - 11:08 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de junio 2022:</p> <p>01. Postulación del proyecto de inversión denominado: "Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa" para la proforma presupuestaria del Plan Anual de Inversiones - PAI 2023.</p> <p>02. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2022.</p> <p>03. Se realizó y se aprobó los informes del segundo trimestre de 2022 de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo.</p> <p>04. La ejecución presupuestaria acumulada en el grupo de gasto 73 con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 10.710,10 equivalente al 1,47% del presupuesto total, no incluye los USD 970.464,20*.</p> <p>05. El proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos tuvo un avance hasta la calificación de las expresiones de interés, sin embargo, se tuvo que declarar el proceso en desierto, conforme Comunicación del BID Nro. CAN/CEC-647. Se está reestructurando los términos de referencia, para el nuevo proceso de contratación.</p> <p>06. Los términos de referencia de la contratación del seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad, están siendo reestructurados conforme las recomendaciones realizadas por el BID.</p> <p>07. Los términos de referencia de la contratación de la línea base, se encuentran en proceso de reestructuración, conforme las sugerencias realizadas por el BID, la Subsecretaría de Discapacidades, se encuentran realizando los ajustes.</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>13/07/2022 - 04:04 PM</p>
<p>Hitos cumplidos correspondiente al mes de mayo 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria mensual de mayo de 2022 es de USD 2.142,02 equivalente al 0,29% del total (no incluye los USD 970.464,20.) y corresponde al pago de los servicios de la consultoría del especialista legal del mes de mayo 2022.</p> <p>03. La ejecución presupuestaria acumulada en el grupo de gasto 73 con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 8,568.08 equivalente al 1,17% del presupuesto total, no incluye los USD 970.464,20.</p> <p>04. El 31 de mayo de 2022, se firmó el contrato con el consultor individual, especialista de adquisiciones como parte del equipo ejecutor de la operación CP Nro. 4634 OC/EC - L1236.</p> <p>05. Recepción de expresiones de interés para el proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos.</p> <p>06. Los términos de referencia de la contratación de la línea base, fueron devueltos por el BID con observaciones y se encuentran realizando los ajustes la Subsecretaría de Discapacidades.</p> <p>07. El 19 de mayo de 2022, mediante memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0346-M se solicitó la reducción presupuestaria por USD 970.464,20 con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable. Al 31 de mayo de 2022, conforme reporte del ESIGEF la reforma se encuentra plantea, y se encuentra en estado consolidado.</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>21/06/2022 - 06:53 PM</p>
<p>Hitos cumplido correspondiente al mes de abril 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2022.</p> <p>02. El 26 de abril de 2022 mediante Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0302-M se remitió la programación de los desembolsos actualizados para el ejercicio fiscal 2022, considerando el flujo de caja de la operación L1236.</p> <p>03. Se tiene la "No objeción" a los términos de referencia y el estudio de mercado para el proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos.</p> <p>04. Se realizó la resolución administrativa Nro. FAISDI-MIES-001-002-2022-CP4634-DD de fecha 05 de abril de 2022, con la declaración de desierto del proceso de contratación del especialista de adquisiciones.</p> <p>05. Se tiene estructurado los términos de referencia de la contratación de la línea base, y se remitió al BID para la "No Objeción".</p> <p>06. La ejecución presupuestaria mensual en abril de 2022 es de USD 2.142,02 equivalente al 0,13% y correspondiente al pago de los servicios de la consultoría del especialista legal correspondiente al mes de marzo 2022.</p> <p>07. La ejecución presupuestaria acumulada es en el grupo de gasto 73 con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 6.426,06 equivalente al 0,38% del presupuesto total.</p> <p>08. Se mantiene en fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 el valor ejecutable por USD 729.535,80. Sin embargo, con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable por el monto de USD 970.464,20.</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>10/05/2022 - 06:59 PM</p>
<p>Hitos cumplido correspondiente al mes de marzo 2022:</p> <p>1.- Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2022.</p>	<p>León Suqui, Fernando David</p>	<p>11/04/2022 - 08:46 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- Se elaboró y se aprobó los informes de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo del primer trimestre del 2022.</p> <p>3.- Se realizó el proceso para la contratación del especialista de adquisiciones, sin embargo, por una error de cálculo en la calificación no se pudo tener una terna, por lo tanto, no se obtuvo la "No Objeción" del BID y se declarará en de cierto. Se prevé un nuevo proceso de contratación y se estima tener la contratación hasta el 01 de mayo de 2022.</p> <p>4.-El 03 de marzo 2022 se verificó en el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF la reforma DIS 50 y AMP 51 por el valor de USD 1.700.000,00 en estado aprobado, en función de lo siguiente: en fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 se tiene un valor ejecutable por USD 729.535,80. Pero con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable por el monto de USD 970.464,20.</p> <p>5. El 22 de marzo de 2022 mediante Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0206-M se remitió el detalle de los desembolsos actualizados para el ejercicio fiscal 2022, con la información en el formato establecido considerando los respectivos flujos de caja de las operaciones actualizadas a la fecha.</p> <p>6.- La ejecución presupuestaria en el grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 4.284,04 equivalente al 7% del presupuesto de la actividad 07 que tiene un monto de USD 57.577,52. La erogación antes mencionada representa el pago de los servicios de la consultoría del especialista legal correspondiente al mes de enero y febrero de 2022.</p>		
<p>Hitos cumplido correspondiente al mes de febrero 2022:</p> <p>1. El 10 de febrero de 2022 se realizó el seguimiento a la reforma planteada con Nro. MIES-VIS-FGICPDS-2022-01, y solicitado mediante el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF Nro. DIS 50 y AMP 51 por el valor de USD 1.7 millones para el proyecto de discapacidad severa. Asimismo, se realizó una insistencia el 15 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0032-O dirigido a la Subsecretaria de Presupuesto, Olga Núñez y a la Directora de Egresos no Permanentes, Tatiana Calán. La reforma se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.</p> <p>2. El 10 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MSP-MSP-2022-0450-O la Gerencia de Financiamiento Exerno del Ministerio de Salud Pública - MSP, solicitó se informe sobre desembolsos, suscripción de contratos y pagos realizados. Al respecto, el 11 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0027-O se remitió información sobre un contrato suscrito (especialista de legal), asimismo, se informó que no se ha realizado ningún pago ni desembolso hasta la presente fecha, por parte del Ministerio de Inclusión Económica y social - MIES.</p> <p>3. El 24 de febrero de 2022 mediante documento Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0036-O se solicitó al Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF el primer desembolso de recursos del Contrato de Préstamo Nro. 4634/OC-EC L1236 por un valor de USD 100.000,00 dólares.</p> <p>4. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 28 de febrero de 2022.</p>	León Suqui, Fernando David	11/03/2022 - 08:08 AM
<p>Hitos cumplido correspondiente al mes de enero 2022:</p> <p>1- El 27 de enero de 2022 se remitió el Plan Anual de la Política Pública - PAPP del proyecto de "Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa", para el ejercicio fiscal 2022.</p> <p>2. El 31 de enero de 2022 se realizó la reforma Nro. MIES-VIS-FGICPDS-2022-01 para ajustar la planificación y el presupuesto con el organismos 2002 y correlativo 5086.</p>	León Suqui, Fernando David	03/03/2022 - 11:05 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General. Retraso en el proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos CAUSARÍA la demora en la contratación de los demás procesos programados</p>	26/08/2022	Mercedes Liliana Lascano Gomez	40 %	50	20	1/1
<p>5- PROYECTO. * General. Demora en la solicitud y entrega de las certificaciones presupuestarias plurianuales CAUSARÍA el retraso en la contratación del equipo de gestión</p>	26/08/2022	Mercedes Liliana Lascano Gomez	40 %	50	20	1/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
(Especialista de Adquisiciones, Financiero y Monitoreo).						

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planeación: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2022).	9-Entregables Formales	27/01/2022		27/01/2022		Sí	1.72
2	Ejecución: Elaboración de la reforma presupuestaria en función de los saldos disponibles en el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF (Reforma presupuestaria).	9-Entregables Formales	31/01/2022		31/01/2022		Sí	1.72
3	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de febrero (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de febrero).	9-Entregables Formales	28/02/2022		28/02/2022		Sí	1.72
4	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2021 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	04/03/2022		04/03/2022		Sí	2.64
5	Ejecución: Elaboración de los informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.72
6	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de marzo (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de marzo).	9-Entregables Formales	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.72
7	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de abril (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de abril).	9-Entregables Formales	09/05/2022		09/05/2022		Sí	1.72
8	Ejecución: Consultoría técnica especializada para la planificación, coordinación y ejecución de las adquisiciones	9-Entregables Formales	31/05/2022		31/05/2022		Sí	1.72

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y contrataciones / Especialista de adquisiciones (Contrato suscrito con el especialista de adquisiciones).							
9	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de mayo (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de mayo).	9-Entregables Formales	13/06/2022		13/06/2022		Sí	1.72
10	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023).	9-Entregables Formales	25/06/2022		25/06/2022		Sí	1.72
11	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de junio (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de junio).	9-Entregables Formales	07/07/2022		07/07/2022		Sí	1.72
12	Ejecución: Elaboración de los informes del segundo trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del segundo trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	10/07/2022		10/07/2022		Sí	1.72
13	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de julio (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de julio).	9-Entregables Formales	16/08/2022		16/08/2022		Sí	1.72
14	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2022 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	01/09/2022		01/09/2022		Sí	2.64
15	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de agosto (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de agosto).	9-Entregables Formales	14/09/2022		14/09/2022		Sí	1.72
16	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de septiembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de septiembre).	9-Entregables Formales	10/10/2022	10/10/2022			No	1.72
17	Ejecución: Elaboración de los informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	17/10/2022	17/10/2022			No	1.72
18	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de	9-Entregables Formales	09/11/2022	09/11/2022			No	1.72

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	octubre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de octubre.							
19	Ejecución: Consultoría técnica especializada para la coordinación y asistencia técnica para la ejecución de levantamiento de línea base y la evaluación de impacto del componente 3 (Contrato suscrito para la consultoría).	9-Entregables Formales	22/11/2022	22/11/2022			No	2.87
20	Ejecución: Consultoría de asesoría técnica especializada para la coordinación y seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad (Contrato suscrito para la consultoría).	9-Entregables Formales	02/12/2022	02/12/2022			No	2.87
21	Ejecución: Consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión y el esquema de incentivos del "Modelo Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad Atendidas por el MIES y sus Familias" (Contrato suscrito para Modelo Redes).	9-Entregables Formales	09/12/2022	09/12/2022			No	2.87
22	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de noviembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de noviembre).	9-Entregables Formales	09/12/2022	09/12/2022			No	1.72
23	Ejecución: Consultoría levantamiento de línea base para evaluación (Contrato suscrito sobre la consultoría para el "Levantamiento de línea base para evaluación").	9-Entregables Formales	29/12/2022	29/12/2022			No	1.72
24	Ejecución: Elaboración de los informes del cuarto trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del cuarto trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	29/12/2022	29/12/2022			No	1.72
25	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de diciembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de diciembre).	9-Entregables Formales	29/12/2022	29/12/2022			No	1.72
26	Ejecución: Servicio de impresión para material accesible de formación y capacitación, impreso y distribuido (Contrato suscrito sobre la consultoría para el "servicio de impresión para material accesible de formación y capacitación").	9-Entregables Formales	29/12/2022	29/12/2022			No	1.72

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2023).	9-Entregables Formales	31/01/2023	31/01/2023			No	3.58
28	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2022 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2023	28/02/2023			No	3.58
29	Ejecución: Consultoría para diseñar el plan de formación y capacitación a asistentes de apoyo a personas con discapacidad (Contrato suscrito para "diseñar el plan de formación y capacitación").	9-Entregables Formales	31/03/2023	31/03/2023			No	1.72
30	Ejecución: Elaboración de los informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo 2023 (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo 2023)	9-Entregables Formales	03/04/2023	03/04/2023			No	3.58
31	Ejecución: Elaboración de los informes del segundo trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo 2023 (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo 2023)	9-Entregables Formales	03/07/2023	03/07/2023			No	3.58
32	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2023 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	31/07/2023	31/07/2023			No	3.58
33	Ejecución: Elaboración de los informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo 2023 (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo 2023).	9-Entregables Formales	02/10/2023	02/10/2023			No	3.58
34	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023).	9-Entregables Formales	31/10/2023	31/10/2023			No	3.58
35	Ejecución: Elaboración de los informes del cuarto trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo 2023 (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo 2023)	9-Entregables Formales	29/12/2023	29/12/2023			No	3.58
36	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan	9-Entregables Formales	31/01/2024	31/01/2024			No	2.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Anual de la Política Pública 2024).							
37	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2023 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2024	28/02/2024			No	3.58
38	Ejecución: Elaboración de los informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo 2024 (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo 2024)	9-Entregables Formales	01/04/2024	01/04/2024			No	3.58
39	Ejecución: Elaboración de los informes del segundo trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo 2024 (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo 2024)	9-Entregables Formales	05/07/2024	05/07/2024			No	2.58
40	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2024 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	31/07/2024	31/07/2024			No	3.58
41	Cierre: Cierre y baja del proyecto de inversión (Informe sobre el cierre y baja del proyecto de inversión).	9-Entregables Formales	30/09/2024	30/09/2024			No	3.46

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de una consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión y el esquema de incentivos del "Modelo Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad Atendidas por el MIES, y sus Familias"		0.00 %	0.5	0	01/01/2022	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,700,000.00 **
Costo Total:	8,770,830.00
Total Devengado:	19,278.18
% Costo Total Devengado:	0.22 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.22 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
Ppto. Codificado	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
Ppto. Devengado	0.00	19,278.18	0.00	19,278.18
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	1.13 %	0.00 %	1.13 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	9,596.24	0.00	9,596.24	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	9,596.24	0.00	19,192.48	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	9,596.24	4,284.04	28,788.72	4,284.04	14.88 %		0.25 %
Abr	45,346.24	2,142.02	74,134.96	6,426.06	8.67 %		0.38 %
May	18,846.24	2,142.02	92,981.20	8,568.08	9.21 %		0.50 %
Jun	494,828.34	2,142.02	587,809.54	10,710.10	1.82 %		0.63 %
Jul	85,898.24	4,284.04	673,707.78	14,994.14	2.23 %		0.88 %
Ago	9,596.24	4,284.04	683,304.02	19,278.18	2.82 %		1.13 %
Sep	96,068.76		779,372.78				
Oct	261,364.32		1,040,737.10				
Nov	649,666.50		1,690,403.60				
Dic	9,596.40		1,700,000.00				
Total	1,700,000.00	19,278.18					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la eficiencia en la gestión de protección al cuidado de las Personas con Discapacidad MEDIANTE la aplicación de la normativa legal y protocolo de atención integral intra e interinstitucional.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A0 - Actualizacion Dictamen Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0904-OF	A0_-_Actualizacio	03/03/2022
2	A0 - Proyecto Discapacidad Severa 2021-11-23	A0_-_Proyecto_Discapacidad_Severa_2021-11-23.pdf	03/03/2022
3	A0 - Saldo Inicial Discapacidad Severa	A0_-_Saldo_Inicial_Discapacidad_Severa.pdf	03/03/2022
4	B1 - PAPP Discapacidad Severa 2022-01-31 Asociación al hito Nro. 01.	A1_-_PAPP_Discapacidad_Severa_2022-01-31.xlsx	25/02/2022
5	B2 - Reforma MIES-VIS-FGICPDS-2022-01 Asociación al hito Nro. 02	A2_-_Reforma_MIES-VIS-FGICPDS-2022-01.xlsx	25/02/2022
6	B3 - Informe Financiero DisSev Febrero 2022 Asociación al hito Nro. 03.	A3_-_Informe_Financiero_DisSev_Febrero_2022-signed.pdf	09/03/2022
7	B4 - Informe Gestio#n 2do Semestre 2021 - L1236 Asociación al hito Nro. 04	A4_-_Informe_Gestio	09/03/2022
8	C1 - Informe Financiero DisSev Marzo 2022 Asociación al hito Nro. 06.	C1_-_Informe_Financiero_DisSev_Marzo_2022-signed.pdf	05/04/2022
9	C2 - Cierre de Riesgo - No Objecio#n TDR Modelo de Redes Asociación al hito Nro. 18.	C2_-_Riesgo_-_No_Objecio	05/04/2022
10	C3 - Informe Legal L1236 1er Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 05	C3_-_Informe_Legal_L1236_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	05/04/2022
11	C4 - Informe Adquisiciones L1236 1er Trimestre Asociación al hito Nro. 05.	C4_-_Informe_Adquisiciones_L1236_1er_Trimestre-signed.pdf	06/04/2022
12	C5 - Informe Seguimiento y Monitoreo L1236 1er Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 05	C5_-_Informe_SegMonitoreo_L1236_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	06/04/2022
13	D1 - Informe Financiero DisSev Abril 2022 Asociación al hito Nro. 07	Informe_Financiero_DisSev_Abril_2022-signed.pdf	09/05/2022
14	E1 - Informe Financiero DisSev Mayo 2022 Asociación al hito Nro. 09	E1_-_Informe_Financiero_DisSev_Mayo_2022-signed.pdf	13/06/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	F1 - Envío proforma presupuestaria PAI 2023 Asociación al hito Nro. 10.	F1_-_MIES-VIS-FAISDI-2022-0431-M_Respuesta_Envio_PAI_2023.pdf	12/07/2022
16	F2 - Proforma presupuestaria PAI 2023 Discapacidad Severa Asociación al hito Nro. 10.	F2_-_Discapacidad_Severa_Proforma_PAI_2023.zip	12/07/2022
17	F3 - Informe financiero DisSev Junio 2022 Asociación al hito Nro. 11.	F3_-_Informe_Financiero_DisSev_Junio-signed.pdf	12/07/2022
18	F4 - Informe legal L1236 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F4_-_Informe_Legal_L1236_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
19	F5 - Informe Seguimiento y Monitoreo L1236 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F5_-_Informe_SegMonitoreo_L1236_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
20	F6 - Informe Adquisiciones L1236 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F6_-_Informe_Adquisiciones_L1236_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
21	G1 - Informe Financiero DisSev Julio 2022 Asociación al hito Nro. 13.	G1_-_Informe_Financiero_DisSev_Julio_2022-signed.pdf	17/08/2022
22	H1 - Informe Gestio#n 1er Semestre 2022 - L1236 - Asociado al hito Nro. 14.	H1_-_Informe_Gestio	15/09/2022
23	H2 - Informe Financiero DisSev Agosto 2022 - Asociado al hito Nro. 15.	H2_-_Informe_Financiero_DisSev_Agosto_2022-signed.pdf	15/09/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lascano Gomez, Mercedes Liliana	Líder del Proyecto de Inversión de Discapacidad Severa	Gerente proyecto MT	mercedes.lascano@inclusion.gob.ec	0992749238
León Suqui, Fernando David	Analista del Proyecto de Inversión de Discapacidad Severa	Analista de proyectos de inversión 3	fernando.leon@inclusion.gob.ec	
