

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Protección Especial**  
**Dirección de Servicios de Protección Especial**

**PROYECTO: K015** MIES-Implementar y Fortalecer Servicios de Atención de Movilidad Humana y Modalidades Alternativas para la Protección, Atención y Restitución de Derechos Vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes.

Líder del Proyecto:	Lascano Gomez, Mercedes Liliana (mercedes.lascano@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jurado Velastegui, Estefany Malena	Programas Relacionados:	
Titular:	Chala Angulo, Sonia Catherine	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.385568	TIR:	28.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	2,543,438.96
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,193,471.80
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/12/2021 - 01/12/2025
Fecha de última actualización:	03/10/2022	Fecha de Fin Base:	01/12/2025
Modificado por:	León Suqui, Fernando David	Fecha del siguiente Hito:	07/10/2022

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El proyecto busca fortalecer e implementar servicios de protección especial para la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana, y en situación de vulneración y riesgo de pérdida del cuidado familiar.

**Beneficios Cualitativos**

- Con la brigadas multidisciplinarias de apoyo, información y referencia en la modalidad "Ciudadades de Acogida", se atenderá a las niñas, niños y adolescentes acompañados y sus familias en situación de vulnerabilidad, riesgo, calle o mendicidad y personas adultas con doble vulnerabilidad.
- Con los servicios de atención y protección emergente "Casas de Abrigo Temporal", se atenderá a niñas, niños y adolescentes no acompañados, o separados de su medio familiar; en los cuales no se haya podido realizar una reunificación familiar inmediata.
- Con los equipos multidisciplinarios para el apoyo familiar, se atenderá a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en situación de riesgo identificado como negligencia, violencia intrafamiliar que no constituyan delito. Asimismo, en custodia familiar se atenderá a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad cuyo medio familiar nuclear constituye una amenaza, riesgo y/o vulneración de sus derechos.

**Tipo de Beneficiario**

El proyecto está dirigido a los beneficiarios siguientes:  
 La población objetivo del proyecto está basada en las niñas, niños, adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana y en situación de vulneración y riesgo de pérdida del cuidado familiar, en las modalidades de ciudades de acogida, casas de abrigo temporal, y, apoyo y custodia familiar.


**Restricciones**

- Alcance: Será beneficiarios las niñas, niños, adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana, en situación de vulneración y riesgo de pérdida del cuidado familiar que se ejecutará en las ciudades priorizadas.
- Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 5 años, por situación de la pandemia de la COVID-19 no se ha ejecutado en el 2021.
- Recursos: Equipo técnico necesario contratado para la atención integral de las niñas, niños, adolescentes y sus familias para la ejecución del proyecto.
- Costo: No se puede exceder los recursos definidos en la fuente de financiamiento establecida en el contrato de préstamo y el convenio de financiamiento no reembolsable.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 21.14 %  
 Fecha de Inicio: 01/12/2021 Fecha de Fin: 01/12/2025

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

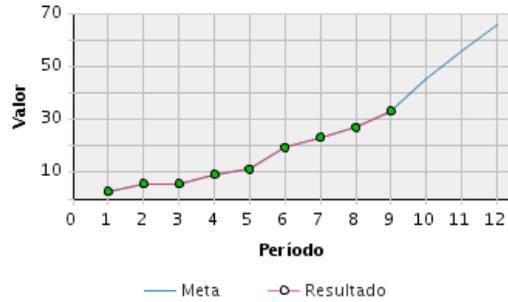

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	3 %	6 %	6 %	9 %	11 %	19 %	23 %	27 %	33 %	45 %	56 %	66 %
	Avance real acumulado											
	3 %	6 %	6 %	9 %	11 %	19 %	23 %	27 %	33 %			
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hitos y avances correspondiente al mes de septiembre de 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó los informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo al 30 de septiembre de 2022.</p> <p>02. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2022.</p> <p>03. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 0,00 al 30 de septiembre de 2022.</p> <p>04. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 0,00 al 30 de septiembre de 2022.</p> <p>05. El 01-09-2022 inició el servicio de atención en la modalidad de "Ciudades de Acogida", y mediante seguimiento continuo se solicitó la entrega los planes de acción y de riesgo, para realizar el primer pago a las OSC correspondiente al mes de septiembre de 2022.</p> <p>06. Se encuentra en elaboración el anexo 3 para la modalidad del servicio de Apoyo y Custodia Familiar mismo que iniciará a partir del 01-12-2022, se solicitó estudio de mercado.</p> <p>07. Se encuentra en elaboración el anexo 4 para la modalidad del servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal) mismo que iniciará a partir del 01-12-2022. Asimismo, se tiene que realizar una modificación de la norma técnica del servicio hasta el 15-10-2022.</p>	León Suqui, Fernando David	03/10/2022 - 03:43 PM
<p>Hitos y avances correspondiente al mes de agosto de 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 0,00 al 31 de agosto de 2022.</p> <p>03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 0,00 31 de agosto de 2022.</p> <p>04. Se encuentra en proceso la resolución de adjudicación y firmas de contratos con las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC para la modalidad del servicio de Ciudades de Acogida.</p> <p>05. Se encuentra en elaboración el anexo 3 para la modalidad del servicio de Apoyo y Custodia Familiar mismo que iniciará a partir del 01-10-2022.</p> <p>06. Se encuentra en elaboración el anexo 4 para la modalidad del servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal) mismo que iniciará a partir del 01-10-2022.</p>	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	22/09/2022 - 05:29 PM
<p>Hitos y avances correspondiente al mes de julio 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2022.</p> <p>02. La ejecución presupuestaria mensual es de USD 0,00 al 31 de julio de 2022.</p> <p>03. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 0,00 31 de julio de 2022.</p>	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	25/08/2022 - 11:09 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>04. Se encuentra en proceso precontractual (Recepción de ofertas de las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC) la modalidad del servicio de Ciudades de Acogida y está distribuidos en 12 provincias, 13 ciudades y 18 contratos.</p> <p>05. Se encuentra en construcción el anexo 3 para la modalidad del servicio de Apoyo y Custodia Familiar mismo que iniciará a partir del 01-10-2022.</p> <p>06. Se encuentra en construcción el anexo 4 para la modalidad del servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal) mismo que iniciará a partir del 01-10-2022.</p>		
<p>Hitos y avances correspondiente al mes de junio 2022:</p> <p>01. Se obtuvo la "No Objeción" del anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP con el proceso para la contratación en la modalidad de "Ciudades de Acogida".</p> <p>02. Se realizó la postulación del proyecto de inversión: "Implementar y Fortalecer Servicios de Atención de Movilidad Humana y Modalidades Alternativas para la Protección, Atención y Restitución de Derechos Vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes" en el Plan Anual de Inversiones - PAI 2023.</p> <p>03. Se realizó y se aprobó los informes del segundo trimestre de 2022 de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo.</p> <p>04. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2022</p> <p>05. La ejecución presupuestaria acumulada es de USD 0,00 al 30 de junio de 2022. La ejecución se realizará con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5091 del Contrato de Préstamo BID 4923/OC-EC y con fuente 701, organismo 2002 y correlativo 9980 del Convenio de Financiamiento No Reembolsable Nro. 4924 GR-EC, esto con la finalidad de dar cumplimiento al paripasu del 80/20.</p> <p>06. Se encuentra en el inicio del proceso precontractual (Informe de necesidad, informe de viabilidad, términos de referencia y certificaciones presupuestarias) para las 19 ciudades de acogida.</p> <p>07. El 30-06-2022 se aprobó mediante Acuerdo Ministerio Nro. 0042 la ampliación del ítem presupuestario 730607 denominado servicios técnicos especializados.</p> <p>08. La contratación el equipo de gestión (especialista financiero y especialista de monitoreo) por temas técnicos se realizará desde proyecto de inversión de Discapacidad Severa, financiado mediante el Contrato de Préstamo Nro. 4634/OC-EC - L1236.</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Lilliana</p>	<p>13/07/2022 - 04:03 PM</p>
<p>Hitos y avances correspondiente al mes de mayo 2022:</p> <p>01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2022.</p> <p>02. Al 31 de mayo de 2022, la ejecución presupuestaria es del 0,00%, se ejecutará mediante un paripasu del 80/20 previsto dentro del ROP, POD y Contrato de Préstamo BID 4923/OC-EC y ATN 4924 GR-EC.</p> <p>03. En proceso de construcción del anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP para el proceso de contratación de GADs y OSCs para la modalidad de "Brigadas Multidisciplinarias de Apoyo, Información y Referencia en la Modalidad (Ciudades de Acogida)", en el mes de mayo se han mantenido Talleres entre el Equipo Técnico del BID, la Subsecretaría de Protección Especial y la Gerencia del Proyecto para avanzar en la definición del mencionado Anexo al ROP. Al 31 de mayo de 2022, se encuentran en revisión del BID el documento preliminar.</p> <p>04. Sobre el ítem presupuestario en el grupo de gasto 73, el MEF ha indicado que utilizará el ítem presupuestario 730607 denominado: "servicios técnicos especializados" y se realizará una ampliación a la descripción del ítem para que se consideren la atención a persona en situación de vulnerabilidad. El clasificador presupuestario se actualizará y será aprobado mediante un Acuerdo Ministerial por el MEF.</p> <p>05. El 31 de mayo de 2022, con memorando MIES-VIS-FAISDI-2022-0367-M se realizó una reforma presupuestaria por el valor de USD 387.592,65 con la finalidad de cubrir el presupuesto para los procesos de contratación con GAD y OSCs para la modalidad de "Brigadas Multidisciplinarias de Apoyo, Información y Referencia en la Modalidad (Ciudades de Acogida)".</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Lilliana</p>	<p>21/06/2022 - 06:55 PM</p>
<p>Hitos y avances correspondiente al mes de abril 2022:</p> <p>01.- Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2022.</p> <p>02.- Al 30 de abril de 2022 la ejecución presupuestaria es del 0,00%, se ejecutará mediante un paripasu del 80/20 previsto dentro del ROP, POD y Contrato de Préstamo BID 4923/OC-EC y ATN 4924 GR-EC.</p> <p>03.- Sigue en proceso de construcción del anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP con el proceso de contratación para las tres modalidades, en el mes de abril se han mantenido Talleres entre el Equipo Técnico del BID, la Subsecretaría de Protección Especial y la Gerencia del Proyecto para avanzar en la definición del mencionado Anexo al ROP.</p> <p>04.- Se encuentra pendiente en el Ministerio de Economía y Finanzas, la creación de los ítems presupuestarios tanto con financiamiento corriente e inversión en los grupos de gasto 53 y 73, hasta el 30 de abril no se contraba con una respuesta favorable. Sin embargo, se ha indicado de</p>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Lilliana</p>	<p>10/05/2022 - 07:00 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>manera verbal por el MEF, que se utilizará el ítem presupuestario 730607 denominado: "servicios técnicos especializados" y se realizará una ampliación a la descripción del ítem para que se consideren la atención a persona en situación de vulnerabilidad.</p>		
<p>Hitos y avances correspondiente al mes de marzo 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Se procedió a cerrar el riesgo sobre la Norma Técnica del Servicio de Atención y Protección Emergente "Casas de Abrigo Temporal", misma que fue aprobada mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2022-012 de fecha 09 de marzo de 2022.</li> <li>2.- Se elaboró y se aprobó los informes de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo del primer trimestre del 2022.</li> <li>3.- Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2022.</li> <li>4.- Al 31 de marzo de 2022 la ejecución presupuestaria es del 0,00%, debido a que en el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF recién aprobó la reforma el 22 de marzo de 2022 para obtener el organismo 2022 y correlativo 9980 con fuentes de financiamiento 701, esto con la finalidad de dar cumplimiento al paripasu del 80/20 previsto dentro del ROP, POD y Contrato de Préstamo BID 4923/OC-EC y ATN 4924 GR-EC.</li> <li>5.- Sigue en procesos de construcción del anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP con el proceso de contratación para las tres modalidades, desde el mes de marzo se han mantenido Talleres con el Equipo Técnico del BID y de la Subsecretaría de Protección Especial, para avanzar en la definición del mencionado Anexo al ROP.</li> </ol>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>06/04/2022 - 01:27 PM</p>
<p>Hitos cumplido correspondiente al mes de febrero 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El 01 de febrero de 2022 se remitió el formulario de reforma Nro. MIES-VIS-MOVHUM-2022-01 con la finalidad de ajustar la planificación al presupuesto con su correspondiente organismo 2002, correlativo 5091 del contrato de préstamo y correlativo 9980 del convenio de financiamiento no reembolsable con fuente 701.</li> <li>2. El 11 de febrero de 2022 mediante memorando Nro. MIES-VIS-2022-0108-M se solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera, se gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la creación de los ítems presupuestarios tanto con financiamiento corriente como inversión en los grupos de gasto 53 y 73, para firma de contratos de prestación de servicios para personas en situación de vulnerabilidad.</li> <li>3. El 14 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0029-O enviado a la Subsecretaría de Presupuesto, Olga Núñez y al Subsecretario de Financiamiento Público, Carlos Carrera, se realizó una insistencia sobre la asignación de fuentes de financiamiento 202 y 701 para el proyecto de movilidad humana. La reforma se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.</li> <li>4. El 16 de febrero de 2022 a través de oficio Nro. MIES-CGAF-2022-0035-O al Ministerio de Economía y Finanzas, la Coordinación General Administrativa Financiera solicitó se incorpore un ítem presupuestario tanto en gasto corriente como gasto inversión, a fin de facilitar de manera adecuada la contratación de servicios relacionados con prestación de servicios sociales de atención integral a personas en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.</li> <li>5. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 28 de febrero de 2022.</li> <li>6. Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2021 del programa L1258 para el BID.</li> </ol>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>10/03/2022 - 05:26 PM</p>
<p>Hitos cumplido correspondiente al mes de enero 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.El 28 de enero de 2022 se remitió el Plan Anual de la Política Pública - PAPP del proyecto de "Implementar y fortalecer servicios de atención de movilidad humana y modalidades alternativas para la protección, atención y restitución de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes", para el ejercicio fiscal 2022.</li> <li>2.Se realizaron varias reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo, para generar avances en la estructura del contenido del Anexo al Reglamento Operativo del Programa, de la modalidad de atención "Ciudades de Acogida".</li> <li>3.Entrega del informe y herramientas de gestión al BID, correspondiente al segundo semestre del 2021.</li> <li>4.El 31 de enero de 2022 se realizó la reforma Nro. MIES-VIS-MOVHUM-2022-01 para ajustar la planificación al presupuesto con el organismo 2002, correlativo 5091.</li> </ol>	<p>Lascano Gomez, Mercedes Liliana</p>	<p>02/03/2022 - 10:03 AM</p>

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> No contar con la aprobación del anexo 3 al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP, CAUSARÍA que no se puedan contratar con las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC y generaría un impacto en la prestación del servicio de apoyo y custodia.	26/08/2022	Mercedes Liliana Lascano Gomez	30 %	50	15	1/1
<b>5- PROYECTO. * General.</b> No contar con la aprobación del anexo 2 al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP, CAUSARÍA que no se puedan contratar con las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC y generaría un impacto en la prestación del servicio de Ciudades de Acogida.	26/08/2022	Mercedes Liliana Lascano Gomez	30 %	50	15	1/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planeación: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2022)	9-Entregables Formales	27/01/2022		27/01/2022		Sí	0.85
2	Ejecución: Elaboración de la reforma presupuestaria en función de los saldos disponibles en el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF (Reforma presupuestaria).	9-Entregables Formales	31/01/2022		31/01/2022		Sí	1.85
3	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de febrero (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de febrero 2022).	9-Entregables Formales	28/02/2022		28/02/2022		Sí	1.0
4	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2021 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2022		28/02/2022		Sí	1.85
5	Ejecución: Elaboración de los informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de marzo (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de marzo 2022).	9-Entregables Formales	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.85
7	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de abril (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de abril 2022).	9-Entregables Formales	09/05/2022		09/05/2022		Sí	1.85
8	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de mayo (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de mayo 2022).	9-Entregables Formales	09/06/2022		09/06/2022		Sí	1.85
9	Ejecución: Elaboración del anexo 2 al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP con el proceso para la contratación en la modalidad de "Ciudades de Acogida" (Anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP aprobado).	9-Entregables Formales	23/06/2022		23/06/2022		Sí	4.68
10	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023).	9-Entregables Formales	25/06/2022		25/06/2022		Sí	1.85
11	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de junio (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de junio 2022).	9-Entregables Formales	08/07/2022		08/07/2022		Sí	1.85
12	Ejecución: Elaboración de los informes del segundo trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	10/07/2022		10/07/2022		Sí	1.85
13	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2022 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	01/08/2022		01/08/2022		Sí	1.85
14	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de julio (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de julio 2022).	9-Entregables Formales	16/08/2022		16/08/2022		Sí	1.85
15	Ejecución: Gestionar la suscripción de los contratos de cooperación económica con las OCS para brigadas	9-Entregables Formales	01/09/2022		01/09/2022		Sí	4.27

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	multidisciplinarias, funcionando en ciudades de acogida.							
16	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de agosto (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de agosto 2022).	9-Entregables Formales	15/09/2022		15/09/2022		Sí	1.85
17	Ejecución: Elaboración de los informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	07/10/2022	07/10/2022			No	1.85
18	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de septiembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de septiembre 2022).	9-Entregables Formales	07/10/2022	07/10/2022			No	1.85
19	Ejecución: Efectuar la para la capacitación especializada de los equipos de gestión de las modalidades de atención y de los sistemas de protección (Contrato suscrito para la capacitación).	9-Entregables Formales	14/10/2022	14/10/2022			No	1.85
20	Ejecución: Contratación del equipo de gestión - Especialista Financiero y Monitoreo (Contratos suscritos con los especialistas financiero y monitoreo y evaluación).	9-Entregables Formales	28/10/2022	28/10/2022			No	1.85
21	Ejecución: Efectuar la capacitación del programa de sensibilización masiva diseñado e implementado para la población sobre la problemática de movilidad humana y el acceso a los servicios MIES (Contrato suscrito para la capacitación).	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	4.68
22	Ejecución: Elaboración del anexo 3 al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP con el proceso para la contratación en la modalidad de "Apoyo y Custodia Familiar" (Anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP aprobado).	9-Entregables Formales	04/11/2022	04/11/2022			No	4.35
23	Ejecución: Elaboración del anexo 4 al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP con el proceso para la contratación en la modalidad de "Casa de Abrigo Temporal" (Anexo al Reglamento Operativo del Proyecto - ROP aprobado).	9-Entregables Formales	04/11/2022	04/11/2022			No	4.68
24	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de	9-Entregables Formales	04/11/2022	04/11/2022			No	1.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	octubre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de octubre 2022).							
25	Ejecución: Gestionar la suscripción de los contrato para equipos multidisciplinarios y en funcionamiento para el apoyo y custodia familiar.	9-Entregables Formales	01/12/2022	01/12/2022			No	1.85
26	Ejecución: Gestionar la suscripción de los contrato para la atención residencial a los NNA no acompañados en situación de vulnerabilidad, aplicando la modalidad de atención: servicio, atención y protección emergente (casas de abrigo temporal).	9-Entregables Formales	01/12/2022	01/12/2022			No	4.27
27	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de noviembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de noviembre 2022).	9-Entregables Formales	05/12/2022	05/12/2022			No	1.85
28	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de diciembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de diciembre 2022).	9-Entregables Formales	30/12/2022	30/12/2022			No	1.85
29	Ejecución: Elaboración de los informes del cuarto trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo (Informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo).	9-Entregables Formales	06/01/2023	06/01/2023			No	2.83
30	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP.	9-Entregables Formales	31/01/2023	31/01/2023			No	1.9
31	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2022 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2023	28/02/2023			No	2.83
32	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2023 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	31/07/2023	31/07/2023			No	2.83
33	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2024 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2024).	9-Entregables Formales	31/10/2023	31/10/2023			No	2.83
34	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2024).	9-Entregables Formales	31/01/2024	31/01/2024			No	2.83

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
35	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2023 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2024	28/02/2024			No	2.83
36	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2024 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	31/07/2024	31/07/2024			No	2.83
37	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2025 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2025).	9-Entregables Formales	31/10/2024	31/10/2024			No	2.83
38	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2025).	9-Entregables Formales	31/01/2025	31/01/2025			No	2.42
39	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2024 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2025	28/02/2025			No	2.42
40	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2025 del programa L1258 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	31/07/2025	31/07/2025			No	2.42
41	Cierre: Cierre y baja del proyecto de inversión (Informe sobre el cierre y baja del proyecto de inversión).	9-Entregables Formales	30/11/2025	30/11/2025			No	2.42

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de personas atendidas bajo las brigadas multidisciplinares de apoyo, información y referencia en la modalidad de Ciudades de Acogida.		0.00 %	4,875	0	03/01/2022	Ene-Jun
2	Número de niñas, niños y adolescentes atendidos bajo la modalidad del servicio de atención y protección emergente (Casas de Abrigo Temporal).		0.00 %	40	0	03/01/2022	Ene-Jun
3	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por los equipos multidisciplinares en la modalidad de Apoyo y Custodia Familiar.		0.00 %	330	0	01/01/2022	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,193,471.80 **
Costo Total:	16,973,057.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	3,193,471.80	0.00	3,193,471.80
Ppto. Externo Planeado	0.00	3,193,471.80	0.00	3,193,471.80
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	3,193,471.80	0.00	3,193,471.80
Ppto. Codificado	0.00	3,193,471.80	0.00	3,193,471.80
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	3,193,471.80	0.00	3,193,471.80
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	3,193,471.80	0.00	3,193,471.80
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	13,076.62	0.00	13,076.62	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	13,076.62	0.00	26,153.24	0.00	0.00 %		0.00 %
May	13,076.62	0.00	39,229.86	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	138,076.62	0.00	177,306.48	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	13,076.62	0.00	190,383.10	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	586,643.34	0.00	777,026.44	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	970,862.63	0.00	1,747,889.07	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	13,076.62		1,760,965.69				
Nov	75,076.62		1,836,042.31				
Dic	1,357,429.49		3,193,471.80				
<b>Total</b>	<b>3,193,471.80</b>	<b>0.00</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la calidad y eficiencia de los Servicios de Protección Especial MEDIANTE la actualización de normas técnicas y modelos de atención, capacitación, asistencia técnica, esclarecimiento legal y seguimiento a la implementación de la política pública de protección especial

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A0 - Actualización Dictamen Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0941-OF.pdf	A0_-_Actualizacio	03/03/2022
2	A0 - Documento de Proyecto 2021-11-26	A0_-_Documento_de_Proyecto_2021-11-26.pdf	03/03/2022
3	A0 - Saldo Inicial Movilidad Humana	A0_-_Saldo_Inicial_Movilidad_Humana.pdf	03/03/2022
4	B1 - PAPP Movilidad Humana 2022-01-31 Asociación al hito Nro. 01.	A1_-_PAPP_Movilidad_Humana_2022-01-31.xlsb	25/02/2022
5	B2 - Reforma MIES-VIS-MOVHUM-2022-01 Asociación al hito Nro. 02.	A2_-_Reforma_MIES-VIS-MOVHUM-2022-01.xlsx	25/02/2022
6	B3 - Informe Financiero MovHum Febrero 2022 Asociación al hito Nro. 03.	A3_-_Informe_Financiero_MovHum_Febrero_2022-signed.pdf	09/03/2022
7	B4 - Informe Gestio#n 2do Semestre 2021 - L1258 Asociación al hito Nro. 04.	A4_-_Informe_Gestio	09/03/2022
8	C1 - Informe Financiero MovHum Marzo 2022 Asociación al hito Nro. 06.	C1_-_Informe_Financiero_MovHum_Marzo_2022-signed.pdf	05/04/2022
9	C2 - Cierre de Riesgo AM Nro. 012 - Norma Te#cnica	C2_-_Riesgo_AM_Nro._012_-_Norma_Te	05/04/2022
10	C3 - Informe Legal L1258 1er Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 05.	C3_-_Informe_Legal_L1258_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	05/04/2022
11	C4 - Informe Adquisiciones L1258 1er Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 05.	C4_-_Informe_Adquisiciones_L1258_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	06/04/2022
12	C5 - Informe Seguimiento y Monitoreo L1258 1er Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 05.	C5_-_Informe_SegMonitoreo_L1258_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	06/04/2022
13	D1 - Informe Financiero MovHum Abril 2022 Asociación al hito Nro. 07.	Informe_Financiero_MovHum_Abril_2022-signed.pdf	09/05/2022
14	E1 - Informe Financiero MovHum Mayo 2022 Asociación al hito Nro. 08.	E1_-_Informe_Financiero_MovHum_Mayo_2022-signed.pdf	09/06/2022

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	F1 - Envío proforma presupuestaria PAI 2023 Asociación al hito Nro. 10.	F1_-_MIES-VIS-FAISDI-2022-0431-M_Respuesta_Envio_PAI_2023.pdf	12/07/2022
16	F2 - Proforma presupuestaria PAI 2023 Movilidad Humana Asociación al hito Nro. 10.	F2_-_Movilidad_Humana_Proforma_PAI_2023.zip	12/07/2022
17	F3 - Informe financiero MovHum Junio 2022 Asociación al hito Nro. 11.	F3_-_Informe_Financiero_MovHum_Junio_2022-signed.pdf	12/07/2022
18	F4 - No Objeción Anexo ROP Ciudades de Acogida Asociación al hito Nro. 09.	F4_-_CAN:CEC-691:2022_Anexo_ROP_Ciudades_de_Acogida.pdf	12/07/2022
19	F5 - Informe Legal L1258 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F5_-_Informe_Legal_L1258_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
20	F6 - Informe SegMonitoreo L1258 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F6_-_Informe_SegMonitoreo_L1258_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
21	F7 - Informe Adquisiciones L1258 2do Trimestre 2022 Asociación al hito Nro. 12.	F7_-_Informe_Adquisiciones_L1258_2do_Trimestre_2022-signed.pdf	12/07/2022
22	G1 - Informe Semestral L1258 - 2022-08-01 - Asociado al hito Nro. 13.	G1_-_Informe_Semestral_L1258_-_2022-08-01.zip	05/09/2022
23	G2 - Informe Financiero MovHum Julio 2022 Asociación al hito Nro. 14.	G1_-_Informe_Financiero_MovHum_Julio_2022-signed.pdf	18/08/2022
24	H1 - Resolucio#n Administrativa de Adjudicacio#n - Asociado al hito Nro. 15	H1_-_Resolucio	05/09/2022
25	H2 - Resolucio#n de Adjudicacio#n Aclaratoria - Asociado al hito Nro. 15	H2_-_Resolucio	05/09/2022
26	H3 - Informe Financiero MovHum Agosto 2022 - Asociado al hito Nro. 16.	H3_-_Informe_Financiero_MovHum_Agosto_2022-signed.pdf	15/09/2022

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lascano Gomez, Mercedes Liliana	Líder del Proyecto de Inversión de Movilidad Humana	Gerente proyecto MT	mercedes.lascano@inclusion.gob.ec	0992749238
León Suqui, Fernando David	Analista del Proyecto de Inversión de Movilidad Humana	Analista de proyectos de inversión 3	fernando.leon@inclusion.gob.ec	
