

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Atención Intergeneracional
Dirección de la Población Adulta Mayor

PROYECTO: K003 IE-MMA- MIES- Incremento de cobertura y calidad de los servicios de la "Misión Mis Mejores Años".

Líder del Proyecto:	Proaño Checa, Sylvia Janeth (sylvia.proano@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	IE-MMA-Mis Mejores Años
Titular:	Florencia Mosquera, Jenniffer	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.383743	TIR:	15.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	17,458,299.41
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	43,180,681.47
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2019 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	25/11/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Ortega Herreria, Segundo Rubén	Fecha del siguiente Hito:	08/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

"Incrementar la cobertura y calidad de los servicios gerontológicos de la Misión Mis Mejores Años en las modalidades de atención, de acuerdo con las características socio-demográficas y de funcionalidad de las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema.

Fortalecer la política pública del MIES y otras Carteras de Estado para la protección de derechos de las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema.

Promover procesos participativos de las personas adultas mayores en el ámbito nacional.

"

Beneficios Cualitativos

"Promover el mantenimiento o la ganancia funcional de las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema usuarias del Bono Mis Mejores Años

Tipo de Beneficiario

Personas adultas mayores en situación de pobreza extrema


Restricciones

- . Alcance: El diseño de una estructura organizada de las bases de datos
- . Costo: No se contempla presupuesto
- . Tiempo: El proyecto tiene una proyección de realizar la reestructuración de las bases de datos desde febrero a diciembre 2019.
- Recursos: Equipo técnico limitado

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 31.39 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

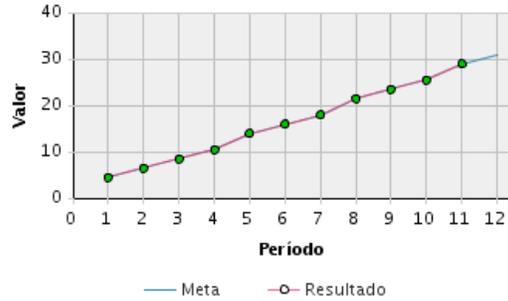

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	4 %	6 %	8 %	10 %	14 %	16 %	18 %	22 %	24 %	26 %	29 %	31 %
	Avance real acumulado											
	4 %	6 %	8 %	10 %	14 %	16 %	18 %	22 %	24 %	26 %	29 %	
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2019: El proyecto de inversión logra un recurso devengado de \$1.932.808,31 con una asistencia en coberturas de 52.079 adultos mayores en todo el territorio nacional, se realiza la transferencia de recursos para la construcción del Centro Gerontológico El Cóndor que será realizado por el SECOB	Florencia Mosquera, Jennifer	16/10/2019 - 09:42 AM
AGOSTO 2019: El proyecto de inversión logra un recurso devengado de \$3.953.490,26 con una asistencia en coberturas de 51.002 adultos mayores en todo el territorio nacional, se iniciar el proceso financiero para la transferencia de recursos para la construcción del Centro Gerontológico El Cóndor	Florencia Mosquera, Jennifer	16/10/2019 - 09:40 AM
JULIO 2019: Se inicia los procesos de negociación en territorio para la suscripción de convenios correspondientes al segundo semestre y se emiten los lineamientos para la focalización de usuarios pobres (100.00) para la inclusión en los servicios atención domiciliaria y espacios activos de la segunda FASE II	Chávez Chávez, Rolando Sigifredo	08/08/2019 - 12:13 PM
JUNIO 2019: El Gabinete Sectorial de lo Social mediante Oficio Nro. GS-2019-0104-O del 20 de junio de 2019 emite el dictamen de prioridad del proyecto de "Incremento de cobertura y calidad de los servicios de la Misión Mis Mejores Años" y se cierra una ejecución semestral de \$ 14.038.327,60 según el valor devengado en el e-SIGEF con corte al 30 de junio de 2019.	Chávez Chávez, Rolando Sigifredo	31/07/2019 - 11:38 AM
MAYO 2019: Se continua con los trámites correspondientes con el Ministerio de Finanzas para la emisión de avales del segundo y tercer grupo enviado por esta Subsecretaría logrando culminar el primer desembolso de todos los grupos solicitados para la prestación de servicios de la Misión Mis Mejores Años a nivel territorial.	Chávez Chávez, Rolando Sigifredo	31/07/2019 - 11:32 AM
ABRIL 2019: Una vez recibidos los proyectos de cooperación desde los territorios se realiza el trámite con el Ministerio de Finanzas para la emisión de avales para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, logrando obtener el primer grupo de avales con lo que se realiza el primer desembolso para que se ejecuten los convenios desde los territorios.	Chávez Chávez, Rolando Sigifredo	31/07/2019 - 11:29 AM
MARZO 2019: Los territorios a nivel nacional empiezan el proceso de negociación con cooperantes para la suscripción de convenios a fin de cubrir la prestación de los servicios definidos para la Misión Mis Mejores Años en favor de la población adulta mayor.	Chávez Chávez, Rolando Sigifredo	31/07/2019 - 11:27 AM
FEBRERO 2019: Se emiten los lineamientos a territorio para la ejecución de la Misión Mis Mejores Años, en los que se especifican los criterios de selección de la población objetiva (adultos mayores en extrema pobreza 80% de la población vinculada a los servicios) y (adultos	Chávez Chávez, Rolando Sigifredo	31/07/2019 - 11:24 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
mayores en pobreza 20% de la población vinculada a los servicios) vinculaciones realizadas en función del registro social MIES.		
ENERO 2019: Se aprueba el Plan Anual de Política Pública de la Misión Mis Mejores Años para el ejercicio fiscal 2019 en función del recurso asignado según consta en el presupuesto codificado e-SIGEF por el valor de \$ 43.534.276,21	Chávez Chávez, Rolando Sigfredo	31/07/2019 - 11:16 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. Falta de equipo técnico capacitado CAUSARÍA retraso en los procesos de seguimiento	16/10/2019	Sylvia Janeth Proaño Checa	10 %	10	1	0/2

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
2	Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
3	Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
4	Zona 4 - Pacífico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
5	Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
6	Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
7	Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
8	Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
9	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	(Definición) Dictamen de prioridad del proyecto	9-Entregables Formales	01/01/2019		01/01/2019		Sí	3.0
2	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	9-Entregables Formales	10/01/2019		10/01/2019		Sí	1.5
3	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/02/2019		08/02/2019		Sí	1.0
4	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/02/2019		08/02/2019		Sí	1.0
5	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/03/2019		08/03/2019		Sí	1.0
6	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/03/2019		08/03/2019		Sí	1.0
7	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/04/2019		08/04/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/04/2019		08/04/2019		Sí	1.0
9	(Ejecución) Informe de primer desembolso	9-Entregables Formales	08/05/2019		08/05/2019		Sí	1.5
10	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/05/2019		08/05/2019		Sí	1.0
11	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/05/2019		08/05/2019		Sí	1.0
12	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/06/2019		08/06/2019		Sí	1.0
13	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/06/2019		08/06/2019		Sí	1.0
14	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/07/2019		08/07/2019		Sí	1.0
15	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/07/2019		08/07/2019		Sí	1.0
16	(Ejecución) Informe de segundo desembolso	9-Entregables Formales	08/08/2019		08/08/2019		Sí	1.5
17	(Ejecución) Informe de TDR's para la adquisición de equipamiento de centros gerontológicos elaborados	5-Entregables Intermedios	08/08/2019		08/08/2019		Sí	1.0
18	(Ejecución) Informe de transferencia monetaria para la construcción del Centro Gerontológico El Cóndor	5-Entregables Intermedios	08/08/2019		08/08/2019		Sí	1.0
19	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/09/2019		08/09/2019		Sí	1.0
20	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/09/2019		08/09/2019		Sí	1.0
21	(Ejecución) Informe de brigadas intersectoriales para la atención a personas adultas mayores	5-Entregables Intermedios	08/10/2019		08/10/2019		Sí	1.0
22	(Ejecución) Informe de elaboración del Reglamento a la LOPAM	5-Entregables Intermedios	08/10/2019		08/10/2019		Sí	1.0
23	(Ejecución) Informe de tercer desembolso	9-Entregables Formales	08/11/2019		08/11/2019		Sí	1.5
24	(Ejecución) Informe del evento por el día Internacional de las personas adultas mayores	5-Entregables Intermedios	08/11/2019		08/11/2019		Sí	1.0
25	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/11/2019		08/11/2019		Sí	1.0
26	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/12/2019	08/12/2019			No	1.0
27	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	12/12/2019	08/12/2019			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
28	(Ejecución) Informe anual de la ejecución presupuestaria ejecutada por la Misión Mis Mejores Años	5-Entregables Intermedios	08/01/2020	08/01/2020			No	1.0
29	(Ejecución) Informe anual de las coberturas de los servicios que oferta la Misión Mis Mejores Años	5-Entregables Intermedios	08/01/2020	08/01/2020			No	1.0
30	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	9-Entregables Formales	10/01/2020	10/01/2020			No	1.5
31	(Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto	9-Entregables Formales	15/01/2020	15/01/2020			No	1.5
32	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/03/2020	08/03/2020			No	1.0
33	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/03/2020	08/03/2020			No	1.0
34	(Ejecución) Informe de primer desembolso	9-Entregables Formales	08/05/2020	08/05/2020			No	1.5
35	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/07/2020	08/07/2020			No	1.0
36	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/07/2020	08/07/2020			No	1.0
37	(Ejecución) Informe de segundo desembolso	9-Entregables Formales	08/08/2020	08/08/2020			No	1.5
38	(Ejecución) Informe de tercer desembolso	9-Entregables Formales	08/11/2020	08/11/2020			No	1.5
39	(Ejecución) Informe anual de la ejecución presupuestaria realizada por la Misión Mis Mejores Años	5-Entregables Intermedios	08/01/2021	08/01/2021			No	1.0
40	(Ejecución) Informe anual de las coberturas realizadas por los servicios de la Misión Mis Mejores Años	5-Entregables Intermedios	08/01/2021	08/01/2021			No	1.0
41	(Planeación) PAPP del proyecto aprobado	9-Entregables Formales	10/01/2021	10/01/2021			No	1.5
42	(Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto	9-Entregables Formales	15/01/2021	15/01/2021			No	1.5
43	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/02/2021	08/02/2021			No	1.0
44	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/02/2021	08/02/2021			No	1.0
45	(Ejecución) Informe de primer desembolso	9-Entregables Formales	08/05/2021	08/05/2021			No	1.5
46	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/05/2021	08/05/2021			No	1.0
47	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/05/2021	08/05/2021			No	1.0
48	(Ejecución) Informe de segundo desembolso	9-Entregables Formales	08/08/2021	08/08/2021			No	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
49	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	08/10/2021	08/10/2021			No	1.0
50	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	08/10/2021	08/10/2021			No	1.0
51	(Ejecución) Informe de tercer desembolso	9-Entregables Formales	08/11/2021	08/11/2021			No	1.5
52	(Cierre) Informe final de ejecución de proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	2.5
53	(Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	1.5
54	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0
55	(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	35.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	IE-MMA-Entornos-Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que acceden a los servicios públicos de adulto mayor a nivel nacional		97.15 %	53,056	51,544	01/01/2019	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	43,180,681.47 **
Costo Total:	315,065,216.86
Total Devengado:	22,206,317.17
% Costo Total Devengado:	7.05 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 7.05 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	43,180,681.47	0.00	43,180,681.47
Ppto. Devengado	0.00	22,206,317.17	0.00	22,206,317.17
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	43,180,681.47	0.00	43,180,681.47
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	51.43 %	0.00 %	51.43 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,253,805.93	1,253,805.93	1,253,805.93	1,253,805.93	100.00 %		2.90 %
Mar	764,836.70	764,836.70	2,018,642.63	2,018,642.63	100.00 %		4.67 %
Abr	8,593,336.79	8,593,336.79	10,611,979.42	10,611,979.42	100.00 %		24.58 %
May	2,476,065.04	2,476,065.04	13,088,044.46	13,088,044.46	100.00 %		30.31 %
Jun	1,051,757.55	1,051,757.55	14,139,802.01	14,139,802.01	100.00 %		32.75 %
Jul	2,180,216.59	2,180,216.59	16,320,018.60	16,320,018.60	100.00 %		37.79 %
Ago	16,434,230.06	3,953,490.26	32,754,248.66	20,273,508.86	61.90 %		46.95 %
Sep	927,898.65	1,932,808.31	33,682,147.31	22,206,317.17	65.93 %		51.43 %
Oct	7,904,035.17		41,586,182.48				
Nov	796,846.26		42,383,028.74				
Dic	797,652.73		43,180,681.47				
Total	43,180,681.47	22,206,317.17					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar el acceso y la calidad de la atención de la población adulta mayor MEDIANTE la generación de políticas públicas, normativas técnicas, modelos de atención y gestión de las modalidades del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1_HITO_1: (Definición) Dictamen de prioridad del proyecto	oficio_nro._semplades-sgpd-2019-0109-of.pdf	01/08/2019
2	A2_HITO_2: (Planeación) PAPP del proyecto aprobado	Matriz_PAPP_2019_MMA_16.01.2019.zip	01/08/2019
3	A3_HITO_3_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	A3_HITO_3_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf	02/08/2019
4	A4_HITO_4_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	A4_HITO_4_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf	02/08/2019
5	A5_HITO_5_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	A5_HITO_5_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf	02/08/2019
6	A6_HITO_6_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	A6_HITO_6_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf	02/08/2019
7	A7_HITO_7_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	A7_HITO_7_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf	02/08/2019
8	A8_HITO_8_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	A8_HITO_8_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf	02/08/2019
9	A9_HITO_9_ (Ejecución) Informe de primer desembolso	A9_HITO_9_(Ejecución)_Informe_de_primer_desembolso.pdf	02/08/2019
10	B1_HITO_10_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	B1_HITO_10_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf	02/08/2019
11	B2_HITO_11_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	B2_HITO_11_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf	02/08/2019
12	B3_HITO_12_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	B3_HITO_12_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf	05/08/2019
13	B4_HITO_13_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	B4_HITO_13_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf	02/08/2019
14	B5_HITO_14_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	B5_HITO_14_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf	02/08/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	B6_HITO_15_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	B6_HITO_15_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento	02/08/2019
16	B7_HITO_16_(Ejecución) Informe de segundo desembolso	B7_HITO_16_(Ejecución)_Informe_de_segundo_desembolso	10/10/2019
17	B8_HITO_17_(Ejecución) Informe de TDR's para la adquisición de equipamiento de centros gerontológicos elaborados	B8_HITO_17_(Ejecución)_Informe_de_TDR's_para_la_adquisición	20/10/2019
18	B9_HITO_18_(Ejecución) Informe de transferencia monetaria para la construcción del Centro Gerontológico El Cóndor	B9_HITO_18_(Ejecución)_Informe_de_transferencia_monetaria	21/10/2019
19	C1_HITO_19_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria	C1_HITO_19_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento	16/10/2019
20	C2_HITO_20_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	C2_HITO_20_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento	16/10/2019
21	C3_HITO_22_(Ejecución) Informe de elaboración del Reglamento a la LOPAM	C4_HITO_22_(Ejecución)_Informe_de_elaboración_del_Reglamento	16/10/2019
22	C5_HITO_23_(Ejecución) Informe de Tercer desembolso	C5_HITO_23_(Ejecución)_Informe_de_tercer_desembolso	19/11/2019
23	C6_HITO_25_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias	C6_HITO_25_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento	13/12/2019
24	C7-HITO_24 (Ejecución) Informe del evento por el día internacional de las personas Adultas Mayores	(Ejecución)_Informe_del_evento_por_el_día_internacional_de	25/11/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Torres León, Irina Xiomar	Lider del proyecto	Gerente del proyecto Emblemático Adultos Mayores	xiomar.torres@inclusio n.gob.ec	0995026194
