

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento
Dirección de Gestión del Conocimiento

PROYECTO: K001 MIES - Inclusión en el sistema formal productivo de las mujeres en condiciones de Vulnerabilidad, Pobreza y Pobreza Extrema

Líder del Proyecto:	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth (lorena.quinteros@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Burgos Carrera, Arianna Stephany	Programas Relacionados:	
Titular:	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387547	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	28/03/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	01/11/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	Fecha del siguiente hito:	11/11/2022

DATOS GENERALES

Descripción

Fomentar la Inclusión en el sistema formal productivo de las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza.

Beneficios Cualitativos

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza y sus familias

Tipo de Beneficiario

Mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza que sean usuarias de algún servicios MIES


Restricciones

COSTO: Restricciones Fiscales para la ejecución al proyecto
 ALCANCE: A nivel nacional
 TIEMPO: Limitado para incluir usuarios
 RECURSOS: Equipos técnicos territoriales

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 16.29 %

Fecha de Inicio: 28/03/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

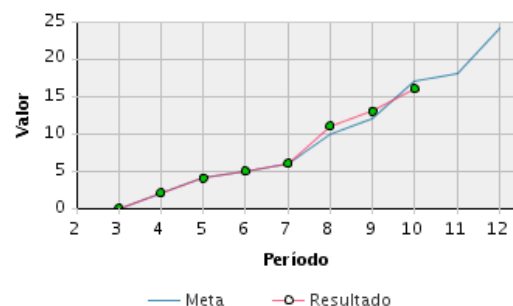

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
			0 %	2 %	4 %	5 %	6 %	10 %	12 %	17 %	18 %	24 %
	Avance real acumulado											
			0 %	2 %	4 %	5 %	6 %	11 %	13 %	16 %		
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2022 (i) Lanzamiento Crédito al 1% anual hasta 30 años plazo, Guayaquil 07Oct; (ii) Activación de Plataforma de Inscripción MIES para Crédito: 1.413 nuevas usuarias inscritas al 31 octubre 2022 (iii) Envío de Base de Remisión de Usuarías MIES - Piloto 2022 con 15.779 postulantes a Crédito; (iv) Recepción de Base de 8.249 Precalificadas a Crédito por BanEcuador B.P.; (v) Campaña Comunicacional de notificación y guía para usuarias precalificadas a Crédito (2.194 contactadas, 1.397 interesadas en Crédito); (vi) Colocación de Crédito por BanEcuador (123 Créditos por 302.620 al 31Oct2022); (vii) Capacitación Proceso Crédito al 1% a Técnicos UIE (12Oct2022), Call Center y Balcón de Servicios (17Oct2022), Gerentes Agencias BanEcuador B.P. (19Oct2022); (viii) Desarrollo de Informe Técnico Situacional del Proyecto, al 26Oct2022.	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	01/11/2022 - 12:39 PM
SEPTIEMBRE 2022 (i) Coordinación con DGD y Atención Ciudadana para dar inicio al proceso de contacto con primeras usuarias precalificadas al crédito, a partir del 5 de septiembre; (ii) Reunión con BanEcuador para revisión de: a) información a ser proporcionada por parte de MIES y medios de consumo, b) control en entrega de créditos al momento de la colocación, y c) recursos y tiempos destinados para puesta en operación; (iii) Requerimiento funcional para desarrollo de Formulario de Registro para usuarias MIES interesadas en acceder al crédito; (iv) Levantamiento de información del crédito para visualización en página WEB MIES; (v) 3 Talleres virtuales de socialización del crédito al 1% a usuarias MIES (15, 16 y 19 septiembre 2022) a fin de conocer de los emprendimientos de cada una de las usuarias MIES y brindar información sobre Solicitud de Crédito y documentación requisito a presentar en BanEcuador; (vi) Remisión a BanEcuador de base de 4.182 mujeres emprendedoras y usuarias de servicios MIES, para que sean precalificadas; (vii) Coordinación de Eventos de Lanzamiento y Entrega de primeros Créditos al 1 % anual, para usuarias de Servicios MIES de las provincias de Imbabura -suspendido- y de Guayas.	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	01/11/2022 - 12:36 PM
JULIO 2022 Para la contratación del personal de seguimiento: 1 SP7 y 2 SP5 se ha gestionado la revisión de perfiles de puesto, la certificación presupuestaria y se ha gestionado con la Dirección de Talento Humano el proceso de contratación, para que el personal se incorpore el 01 de agosto de 2022. Para la firma del Convenio MIES-BanEcuador se realizó el ajuste del texto recibido por BanEcuador, se incluyeron los datos de certificación presupuestaria del grupo 78 y se realizó el Informe Técnico de Viabilidad. El convenio borrador está en revisión por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica y se envió a BanEcuador. Para la entrega de 1.900 créditos en 2022, se ha consultado a BanEcuador los criterios, restricciones e información requerida en la base de usuarias. Con esta información, el Equipo de la SEGC coordina acciones para la gestión de la base de usuarias de la DE y de la Dirección de Protección Familiar, para envío de la primera base.	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	08/09/2022 - 10:40 AM
AGOSTO 2022 (i) Tres funcionarias incorporadas al MIES, para la ejecución del Proyecto de Inversión; (ii) Capacitación solicitada y recibida respecto a la metodología de monitoreo y acompañamiento a beneficiarios de los créditos y pensiones por parte de la Dirección de Emprendimiento y a la SANCCO, (iii) Capacitación solicitada y recibida en cuanto al manejo del SIPPs; (iv) Hoja de Ruta de Gestión del proyecto elaborada y aprobada, (v) Flujo de otorgación del crédito elaborado y aprobado; (vi) Informe de pertinencia elaborado y remitido a la Coordinación jurídica, (vii) la Coordinación Jurídica elaboró el "Informe jurídico" y remitió el Convenio para la respectiva suscripción de las partes, (viii) El día 26 de agosto de 2022, se suscribió el Convenio de	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	05/09/2022 - 05:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
cooperación entre BanEcuador y MIES; (ix) Se otorgó dos capacitaciones a los compañeros de Balcón de Servicios y Call Center a nivel nacional, previo al inicio al proceso de contactabilidad con las usuarias, (x) Se solicitó a la DGD dar inicio al proceso de contactabilidad con las usuarias MIES; (xi) Se ha construido una metodología de monitoreo y seguimiento borrador, con el objetivo de establecer un proceso de monitoreo y seguimiento técnico a las usuarias que hayan accedido al crédito del 1% mujeres, (xii) Requerimiento funcional para el desarrollo de un web service, elaborado; (xiii) Requerimiento funcional elaborado, para la creación de un formulario de registro, que permita a las usuarias interesadas en acceder al crédito, registrarse de manera online, a través de un link que se publicará en la página web.		
JUNIO 2022 Se gestionó la asignación presupuestaria para el proyecto, misma que fue confirmada el 15 de junio de 2022, en base a lo cual se ha gestionado la cédula presupuestaria del proyecto, la certificación de actividad grupo 78, y certificación presupuestaria de los grupo de gasto 71 y 78. Ambas certificaciones son la base para la solicitud de contratación de personal de seguimiento del proyecto, como para la firma del Convenio MIES-BanEcuador para la ejecución de los créditos. Se realizó el proceso de postulación al PAI 2023, para el proyecto, para lo cual se realizó un ajuste de acuerdo a las necesidades institucionales y se logró la postulación y registro en el SIPEIP por 5 millones para el 2023. Para la firma del Convenio MIES-BanEcuador se realizó el ajuste del texto recibido en marzo 2022, se incluyeron los datos de certificación presupuestaria del grupo 78 y se realizó el Informe Técnico de Viabilidad. El convenio borrador está en revisión por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica y envío a BanEcuador. Para la entrega de 1.900 créditos en 2022 se ha consultado a BanEcuador los criterios, restricciones e información requerida en la base de usuarias. Con esta información, el Equipo de la SEGC coordina acciones para la gestión de la base de usuarias de la DE y de la Dirección de Protección Familiar, para envío de la primera base, se calcula 400 créditos mensuales hasta diciembre 2022. Para la contratación del personal de seguimiento: 1 SP7 y 2 SP5 se ha gestionado la revisión de perfiles de puesto, la certificación presupuestaria y se ha gestionado con la Dirección de Talento Humano que el personal que se incorpore el 01 de agosto de 2022.	López Moreta, José Luis	29/08/2022 - 11:43 AM
MAYO 2022 Preparación del Cronograma Valorado del proyecto, que implicó una reducción presupuestaria de acuerdo a necesidad institucional. Proceso de modificación del PAI y PAPP para que el presupuesto del proyecto se incluya en el presupuesto institucional	Muso Farinango, Carmen Myriam	07/06/2022 - 12:23 PM
ABRIL 2022 DICTAMEN "Inclusión en el Sistema Formal Productivo de Mujeres en Condiciones de Vulnerabilidad Pobreza y Extrema Pobreza"	Muso Farinango, Carmen Myriam	07/06/2022 - 12:23 PM
Conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nro. 284 de fecha 10 de diciembre de 2021, que dispone como prioridad nacional el otorgamiento de créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcrédito al 1% anual y hasta treinta (30) años plazo, a través de la banca pública; y de acuerdo lo señalado en el Artículo 3 que menciona: "Establecer una subvención parcial de acuerdo con los montos sustentados en los informes técnicos y que no sean cubiertos por la tasa del 1%, para cubrir los costos y gastos operativos y financieros, incluyendo los costos de riesgo de crédito, fondeo y operativo, que demande el crédito referido en este Decreto Ejecutivo, el cual será otorgado a través de BANEQUADOR B.P". El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento (SEGC), se encuentra impulsando el programa "IMPULSO VIOLETA EC" como una estrategia nacional de reducción de desigualdades económicas de género, que promueve oportunidades para la movilidad social, es decir, romper los círculos de pobreza. El programa "IMPULSO VIOLETA EC" busca promover los derechos de las mujeres usuarias de bonos, pensiones y servicios del MIES en condiciones de equidad, con la finalidad de eliminar toda forma de discriminación y violencia basada en género. "IMPULSO VIOLETA EC" nace como un programa del MIES que busca soluciones eficientes que puedan reducir las desigualdades de género y promuevan oportunidades para la movilidad social, es decir, romper los círculos de pobreza.	Baca Terán, Yadira Paulina	07/04/2022 - 04:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Los objetivos del programa "IMPULSO VIOLETA EC .Promover el fortalecimiento de capacidades para fortalecer emprendimientos los derechos de las mujeres usuarias de bonos, pensiones y servicios del MIES en condiciones de equidad, con la finalidad de eliminar toda forma de discriminación y violencia basada en género. .Capacitar a los equipos técnicos en áreas transversales al proceso de empoderamiento, a través de temáticas vinculadas con prevención de violencias, género, derechos humanos, empoderamiento e igualdad y no discriminación. .Dinamizar la economía rural, fortalecer los conocimientos técnicos en el agro y promover el desarrollo integral de la mujer. .Facilitar y fomentar la participación en el mercado social y privado, de los productos y servicios de los emprendimientos activos de los usuarios del CDH y de los Servicios MIES a través de prácticas económicas y solidarias basadas en los principios de la Economía Popular y Solidaria. .Articular con la empresa privada, organismos internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil, la inserción laboral formal de nuestras beneficiarias con discapacidad. Esta estrategia está dirigida en beneficio a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza, y será implementado con la participación del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS). El objetivo de este programa, es dotar a la mujer ecuatoriana de herramientas para lograr su autonomía, independencia económica y ejecutar su plan de vida.		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Retraso en la entrega de créditos por parte de BanEcuador	29/09/2022	Lorena Elizabeth Quinteros Ávila	80	50	40	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Retraso en la entrega de créditos por parte de BanEcuador	13/09/2022	Lorena Elizabeth Quinteros Ávila	50 %	80	40	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Perfil de proyecto, aprobado	4-Inicio de Trabajo	18/04/2022		18/04/2022		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN: El Dictamen de Prioridad emitido por La Secretaría Nacional de Planificación	5-Entregables Intermedios	28/04/2022		28/04/2022		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Informe justificativo para incremento presupuestario	5-Entregables Intermedios	19/05/2022		19/05/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	EJECUCIÓN: Solicitud enviada, para conocer la fuente de financiamiento del proyecto	5-Entregables Intermedios	31/05/2022		31/05/2022		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Asignación presupuestaria - Certificación presupuestaria gestionada	5-Entregables Intermedios	15/06/2022		15/06/2022		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Convenio MIES - BanEcuador borrador revisado por la Dirección de Asesoría Jurídica del MIES y enviado a BanEcuador.	5-Entregables Intermedios	15/07/2022		15/07/2022		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Contratación realizada, del equipo del proyecto para la ejecución, monitoreo y seguimiento.	5-Entregables Intermedios	01/08/2022		01/08/2022		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Informe de pertinencia elaborado y enviado a la Coordinación Jurídica	5-Entregables Intermedios	23/08/2022		23/08/2022		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Convenio entre BanEcuador y MIES, subscrito por las partes	9-Entregables Formales	26/08/2022		26/08/2022		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Informe jurídico elaborado y Convenio enviado para la subscripción de las partes	5-Entregables Intermedios	26/08/2022		26/08/2022		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Levantamiento de un formulario de registro en la página web, para las usuarias que quieran acceder al crédito al 1 % anual	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Planificación y ejecución del Evento de Entrega Primeros Créditos al 1 % anual para usuarias MIES	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Lanzamiento de Producto Crédito al 1% anual hasta 30 años plazo para Mujeres Emprendedoras Usuaris de Servicios MIES	5-Entregables Intermedios	07/10/2022		07/10/2022		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Plataforma de Inscripción Usuaris MIES - Crédito 1% Operativa	5-Entregables Intermedios	07/10/2022		07/10/2022		Sí	1.0
15	Carga de Bases Precalificadas en el Sistema de BanEcuador	9-Entregables Formales	14/10/2022		14/10/2022		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Capacitación informativa Crédito dictada a Balcón de Servicios, Call Center, Técnicos UIE, Personal BanEcuador	5-Entregables Intermedios	19/10/2022		30/08/2022		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Estrategia de Comunicación Crédito 1% diseñada y operativa	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	30/11/2022			No	1.0
18	EJECUCIÓN: Socialización de la metodología para seguimiento y monitoreo de los créditos al 1 % anual, aprobada	9-Entregables Formales	11/11/2022	11/11/2022			No	1.0
19	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	9-Entregables Formales	15/12/2022	15/12/2022			No	1.0
20	EJECUCIÓN: Crear una actividad nueva para los ítems:	5-Entregables Intermedios	15/12/2022	15/12/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	1) Viáticos y subsistencias; y, 2) Viáticos al interior							
21	EJECUCIÓN: Informe trimestral de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a usuarias MIES, firmado.	5-Entregables Intermedios	26/12/2022	26/12/2022			No	1.0
22	EJECUCIÓN: Informe trimestral de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a usuarias MIES, firmado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2022	30/12/2022			No	1.0
23	EJECUCIÓN: Informe trimestral de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a usuarias MIES, firmado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2022	30/12/2022			No	1.0
24	EJECUCIÓN: Eventos de Visibilidad de Colocación de Crédito al 1% - año 2022	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
25	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	05/01/2023	05/01/2023			No	1.0
26	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	5-Entregables Intermedios	10/01/2023	10/01/2023			No	1.0
27	EJECUCIÓN: Informe trimestral de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a usuarias MIES, firmado.	5-Entregables Intermedios	15/01/2023	15/01/2023			No	1.0
28	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	16/01/2023	16/01/2023			No	1.0
29	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	9-Entregables Formales	20/01/2023	20/01/2023			No	1.0
30	EJECUCIÓN: Informe trimestral de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a usuarias MIES, firmado.	5-Entregables Intermedios	30/01/2023	31/01/2023			No	1.0
31	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	28/02/2023	28/02/2023			No	1.0
32	EJECUCIÓN: Informe trimestral de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a usuarias MIES, firmado.	5-Entregables Intermedios	15/03/2023	15/03/2023			No	1.0
33	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	15/03/2023	15/03/2023			No	1.0
34	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	9-Entregables Formales	20/03/2023	20/03/2023			No	1.0
35	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	05/04/2023	05/04/2023			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
36	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	9-Entregables Formales	19/05/2023	19/05/2023			No	1.0
37	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	30/05/2023	30/05/2023			No	1.0
38	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	15/06/2023	15/06/2023			No	1.0
39	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	05/07/2023	05/07/2023			No	1.0
40	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	9-Entregables Formales	20/07/2023	20/07/2023			No	1.0
41	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	30/08/2023	30/08/2023			No	1.0
42	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	15/09/2023	15/09/2023			No	1.0
43	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	20/09/2023	20/09/2023			No	1.0
44	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	05/10/2023	05/10/2023			No	1.0
45	EJECUCIÓN: Envío de bases bimensuales para la pre-calificación a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	20/11/2023	20/11/2023			No	1.0
46	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	30/11/2023	30/11/2023			No	1.0
47	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	15/12/2023	15/12/2023			No	1.0
48	EJECUCIÓN: Eventos de Visibilidad de Colocación de Crédito al 1% - año 2023	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
49	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	05/01/2024	05/01/2024			No	1.0
50	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	19/01/2024	19/01/2024			No	1.0
51	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	29/02/2024	29/02/2024			No	1.0
52	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	15/03/2024	15/03/2024			No	1.0
53	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	20/03/2024	20/03/2024			No	1.0
54	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	05/04/2024	05/04/2024			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
55	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	20/05/2024	20/05/2024			No	1.0
56	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	30/05/2024	30/05/2024			No	1.0
57	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	14/06/2024	14/06/2024			No	1.0
58	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	05/07/2024	05/07/2024			No	1.0
59	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	19/07/2024	19/07/2024			No	1.0
60	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	30/08/2024	30/08/2023			No	1.0
61	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	13/09/2024	13/09/2024			No	1.0
62	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	20/09/2024	20/09/2024			No	1.0
63	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	04/10/2024	04/10/2024			No	1.0
64	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	20/11/2024	20/11/2024			No	1.0
65	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	29/11/2024	29/11/2024			No	1.0
66	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	13/12/2024	13/12/2024			No	1.0
67	EJECUCIÓN: Eventos de Visibilidad de Colocación de Crédito al 1% - año 2024	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
68	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	03/01/2025	03/01/2025			No	1.0
69	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	20/01/2025	20/01/2025			No	1.0
70	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	28/02/2025	28/02/2025			No	1.0
71	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	14/03/2025	14/03/2025			No	1.0
72	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	20/03/2025	20/03/2025			No	1.0
73	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	04/04/2025	04/04/2025			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
74	EJECUCIÓN: Envío de bases bimensuales para la pre-calificación a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	20/05/2025	20/05/2025			No	1.0
75	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	30/05/2025	30/05/2025			No	1.0
76	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	13/06/2025	13/06/2025			No	1.0
77	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	04/07/2025	04/07/2025			No	1.0
78	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	18/07/2025	18/07/2025			No	1.0
79	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	29/08/2025	29/08/2025			No	1.0
80	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	15/09/2025	15/09/2025			No	1.0
81	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	19/09/2025	19/09/2025			No	1.0
82	EJECUCIÓN: Comité de Seguimiento trimestral ejecutado	9-Entregables Formales	03/10/2025	03/10/2025			No	1.0
83	Carga de Bases precalificadas en el Sistema de BanEcuador	5-Entregables Intermedios	20/11/2025	20/11/2025			No	1.0
84	EJECUCIÓN: Informe trimestral de Validación de las colocaciones de créditos otorgadas por BanEcuador	9-Entregables Formales	28/11/2025	28/11/2025			No	1.0
85	EJECUCIÓN: Solicitud trimestral a la Dirección Financiera para la transferencia de recursos a BanEcuador	9-Entregables Formales	15/12/2025	15/12/2025			No	1.0
86	CIERRE: Informe final de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a usuarias MIES, aprobado.	5-Entregables Intermedios	26/12/2025	26/12/2025			No	4.0
87	EJECUCIÓN: Informe final de proyecto de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza del monitoreo y seguimiento.	5-Entregables Intermedios	26/12/2025	26/12/2025			No	10.0
88	EJECUCIÓN: Eventos de Visibilidad de Colocación de Crédito al 1% - año 2025	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de seguimientos ejecutados a los emprendimientos que recibieron el crédito al 1 %.		-	-	-	03/10/2022	-
2	Número de bases de usuarias MIES remitidas a BanEcuador para el proceso de precalificación al crédito al 1 %.		-	-	-	01/11/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la inclusión económica de la población en situación de pobreza MEDIANTE la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, para mejorar las capacidades integrales para el desarrollo de emprendimientos productivos y sostenibles; desarrollo de prácticas productivas, habilidades y destrezas personales, para la empleabilidad y el autoempleo.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Hito 1. Perfil de proyecto, aprobado	_11_informe_justificativo_proy_inv_creditos_1_banecuator signed.pdf	29/04/2022
2	Hito 10. Decreto Ejecutivo Aprobado y Publicado en el Registro Oficial	decreto_ejecutivo_no__2840859492001648824304.pdf	09/09/2022
3	Hito 10. Informe Jurídico elaborado y Convenio enviado	Informe_jurídico_MIES-CGAJ-2022-1023-M.pdf	09/09/2022
4	Hito 11. Solicitud de Creación de Formulario de Registro de Postulación a precalificación para Crédito a 1% anual	RFC_Formulario_de_registro_TICS_- _070922_Versión_Final-signed.pdf	04/10/2022
5	Hito 12. Ficha Información Técnica Crédito para Evento	AM_CRE	04/10/2022
6	Hito 12. Ficha Organización Evento Lanzamiento Crédito	FICHA_DE_EVENTO_Crédito_1_FERIA.xlsx	04/10/2022
7	Hito 13. Video Lanzamiento Crédito	Video_Crédito_1%_Gobierno_Nacional.mp4	01/11/2022
8	Hito 14. Plataforma de Inscripción	Plataforma_Inscripción_Usuarías_Servicios_MIES_Crédito_1_0301112	01/11/2022
9	Hito 14. Reporte Octubre 2022 Inscritos Plataforma	ReporteCredito1PBanEcuador.xlsx	01/11/2022
10	Hito 15. Base Datos Remisión usuarios BanEcuador	Base_Consolidado_Usuarías_MIES_Piloto_2022.xlsx	31/10/2022
11	Hito 15. Base datos Usuarías Precalificadas BanEcuador	Base_Consolidado_Usuarías_MIES_Precalificadas_Piloto_2022.xlsx	31/10/2022
12	Hito 16. Capacitación a Call Center y Balcón de Servicios	8_registro_de_asistencia_grupo_1_30-08_(1).pdf	05/09/2022
13	Hito 16. Presentación Informativa Crédito - Usuarías, Call Center, Balcón de Servicios, Gerentes Agencia BanEcuador	Taller_de_Socialización_Crédito_- _Usuarías_MIES_12102022.pdf	01/11/2022
14	Hito 17. Campaña Comunicacional Informativa Crédito y Notificación Precalificados	Campaña_Comunicacional_Crédito_Octubre_2022.zip	31/10/2022
15	Hito 2. Dictamen de Prioridad emitido por La Secretaría Nacional de Planificación	10_nro_snp-spn-2022-0626-of_dictamen_favorable_para_increm_PAI_20abr22.pdf	07/06/2022
16	Hito 3. Informe justificativo para incremento presupuestario	A3_SNP_informe_justificativo_proyecto_inv_cred_banecuator signed.pdf	07/06/2022
17	Hito 4. Solicitud sobre la fuente de financiamiento del proyecto	MEF-SP-2022-0447_correlativo_y_fuente_24my22.pdf	07/06/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	Hito 5. Convenio MIES - BanEcuador borrador revisado por la Dirección de Asesoría Jurídica del MIES y enviado a BanEcuador	MIES-SEGC-2022-0071-O_envio_convenio_21jul22.pdf	05/08/2022
19	Hito 6. Memorando de envío del Convenio MIES - BanEcuador borrador e Informe técnico, al área jurídica del MIES	MIES-SEGC-2022-0482-M_solicitud_criterio_juridico_01jul22.pdf	05/08/2022
20	Hito 7. Contratación realizada, del equipo del proyecto	2._MIES-SEGC-2022-0526-M_solicitud_de_contrat_3_personas_14jul22.pdf	05/09/2022
21	Hito 8. Informe de pertinencia elaborado y enviado a la Coordinación Jurídica	MIES-SEGC-2022-0482-M_solicitud_criterio_juridico_01jul22.pdf	05/08/2022
22	Hito 9. Convenio suscrito entre BanEcuador y MIES	7.CONVENIO_MIES-BANECUADOR_FIRMADO_30-08.pdf	05/09/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Baquerizo Narváez, Thalía Fernanda	Miembro de equipo	Analista de Diálogo y generación de oportunidades 2	thalia.baquerizo@inclusion.gob.ec	0983174840
Burgos Carrera, Arianna Stephany	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento	arianna.burgos@inclusion.gob.ec	
Quimbiulco Lanchimba, Lorena Dayana	Miembro de equipo	Analista de Diálogo y generación de oportunidades 2	lorena.quimbiulco@inclusion.gob.ec	0993837809
Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	Líder del proyecto	Directora de Gestión del Conocimiento Encargada	lorena.quinteros@inclusion.gob.ec	0958685413
Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	Titular de la Unidad	Directora de Gestión del Conocimiento Encargada	lorena.quinteros@inclusion.gob.ec	0958685413
Rodríguez Flores, Diana Alexandra	Miembro de equipo	Analista de Diálogo y generación de oportunidades 3	diana.rodriguez@inclusion.gob.ec	0980689195
