

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

PROYECTO: K004 Puesta en Marcha y Desarrollo de Instrumentos para la Gestión de la Estrategia de Desarrollo Infantil

Líder del Proyecto:	León Hinojosa, Ritha Carolina (ritha.leon@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	López Bermeo, Lucy Janeth	Programas Relacionados:	PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL.
Titular:	Vera Mejía, Martha Karla	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30380000000372000	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	158,772.76
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/03/2013 - 15/03/2018
Fecha de última actualización:	05/12/2016	Fecha de Fin Base:	15/03/2018
Modificado por:	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	Fecha del siguiente Hito:	30/12/2016

DATOS GENERALES

Descripción

COMPONENTE Nro. 2 "Servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT - hasta 36 meses)

El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES realizará las actividades de este componente. El componente financiará asistencia técnica para el fortalecimiento del modelo de atención y gestión de los servicios de DIT, incluyendo la definición de estándares de calidad, diseño de materiales, y desarrollo de un sistema de capacitación y formación de los promotores de DIT, con enfoque territorial, intercultural y de género, mediante tres subcomponentes.

Subcomponente 2.1. Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBVs). Bajo este subcomponente se financiará la construcción, rehabilitación, y equipamiento de los CIBVs, incluyendo la inversión en materiales didácticos y juegos educativos. Los modelos arquitectónicos funcionales se adecuarán a las condiciones climáticas y a los aspectos culturales de las comunidades beneficiarias. El subcomponente financiará: (i) asistencia técnica para consolidar el nuevo modelo de atención y gestión de los centros, junto con el desarrollo e implementación de una estrategia de edu-comunicación orientada a las familias, fomentando un enfoque de igualdad de género y el respeto a la diversidad; (ii) el diseño de materiales educativos escritos y juegos culturalmente apropiados; (iii) el diseño e implementación de un programa de formación y capacitación mediante "círculos de estudio" para los promotores de DIT de CIBVs; (iv) un programa de inducción para los nuevos parvularios en temas socio-culturales de la región de su asignación (similar al programa de inducción para los médicos rurales); (v) desarrollo e implementación de Planes de Mejora (PM) para los CIBVs existentes, que fortalecerán la calidad del servicio ; y (vi) los micronutrientes en polvo, que se proveerán con recursos del aporte local.

Subcomponente 2.2. Promoción de desarrollo infantil mediante visitas domiciliarias. Bajo este sub-componente se financiará la revisión y fortalecimiento de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) como estrategia de acompañamiento familiar integral , incluyendo la redefinición de los estándares de atención, el diseño de materiales, y el desarrollo e implementación de un programa de formación y capacitación para los promotores de la modalidad y asistencia técnica para apoyar la adecuación intercultural de los servicios, aprovechando la experiencia Wawakamayuk Wasi .

Subcomponente 2.3. Fortalecimiento del sistema de información y capacitación virtual. A través de este subcomponente se financiará el desarrollo de un sistema para el procesamiento de información administrativa y de seguimiento de los niños atendidos por las dos modalidades (CNH y CIBV), y la implementación de una plataforma tecnológica que facilitará procesos virtuales de capacitación.

Beneficios Cualitativos


- . Costo Evitado de Tratamiento de Desnutrición:
- . Disminución de Rezagos en el Desarrollo Infantil
- . Ahorro en Gastos de Personal
- . Sustitución Atención CIBVs por CNH

Tipo de Beneficiario
Niños y niñas hasta 36 meses en condiciones de pobreza. Familias
Restricciones
Tiempo Recursos Calidad

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 77.01 %
 Fecha de Inicio: 15/03/2013 Fecha de Fin: 15/03/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

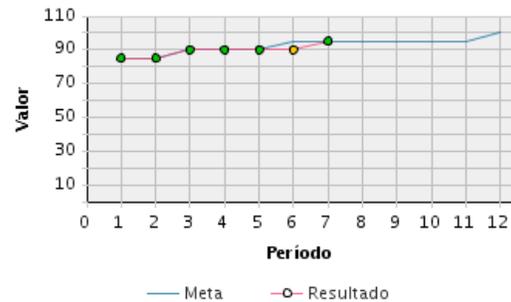

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %					
Estado												
	●	●	●	●	●	▼	●					

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2016: Seguimiento a SECOB por la construcción y fiscalización de los CIVB'S de Sucua y Tarqui. Definición del proceso con SECOB y BID para el cambio de CIBV de Tonsupa por Muisne, construcción de CIBV de Atacames y fiscalización de los CIBV de Muisne y Atacames.	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	05/12/2016 - 12:06 PM
Octubre 2016: Seguimiento con SECOB al proceso de contratación para la construcción y fiscalización de los 4 CIVB'S. Sucua, Tarqui, Tonsupa, Atacames.	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	07/11/2016 - 09:39 AM
Septiembre 2016: Seguimiento con SECOB al proceso de contratación para la construcción y fiscalización de los 4 CIVB'S. Sucua, Tarqui, Tonsupa, Atacames.	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	05/10/2016 - 04:16 PM
Agosto 2016: Seguimiento con SECOB al proceso de contratación para la construcción y fiscalización de los 4 CIVB'S. Sucua, Tarqui, Tonsupa, Atacames.	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	05/10/2016 - 04:13 PM
Julio 2016: desembolso a "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral, en los temas del Examen Nacional para la Educación Superior - ENES. realizado	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	05/10/2016 - 04:11 PM
Junio 2016: Seguimiento a la ejecución del desembolso a "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral, en los temas del Examen Nacional para la Educación Superior - ENES.	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	05/10/2016 - 04:11 PM
Hito 16: No se actualio el hito debido al no desembolso planificado por la falta de recursos.		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2016: Seguimiento a la ejecución del desembolso a "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral, en los temas del Examen Nacional para la Educación Superior - ENES.	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	05/10/2016 - 04:09 PM
Abril 2016 : Seguimiento a la ejecución del desembolso a "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral, en los temas del Examen Nacional para la Educación Superior - ENES.	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	05/10/2016 - 04:08 PM
Marzo 2016: Seguimiento a la ejecución del desembolso a "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral, en los temas del Examen Nacional para la Educación Superior - ENES.	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	05/10/2016 - 04:08 PM
Febrero 2016: Seguimiento a la ejecución del desembolso a "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral, en los temas del Examen Nacional para la Educación Superior - ENES.	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	05/10/2016 - 04:07 PM
Enero 2016: Se asignó presupuesto al proyecto, para cancelación de la consultoría "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral, en los temas del Examen Nacional para la Educación Superior - ENES, mismo que se realiza informe y seguimiento de ejecución	Nancy Consuelo, Sancho Montalvo	05/10/2016 - 04:07 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. El retraso en la publicación de los procesos de contratación y adquisición CAUSARÍA la no ejecución del presupuesto asignado y demora en los tiempos programados para la ejecución del proyecto.	04/05/2016		40 %	10	4	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del proyecto año 2014, presentado	5-Entregables Intermedios	05/01/2015		05/01/2015		Sí	5.0
2	EJECUCIÓN: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Junio pagado	5-Entregables Intermedios	25/06/2015		25/06/2015		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Julio, pagado	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Primer desembolso a Producto 1 de la consultoría "Diseño, especificaciones técnicas y propuesta de uso de material didáctico para las dos modalidades de atención CIBVs y CNH ." Pagado	5-Entregables Intermedios	25/08/2015		25/08/2015		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	EJECUCIÓN: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Agosto , pagado	5-Entregables Intermedios	29/08/2015		29/08/2015		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Septiembre, pagado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Octubre, pagado	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: IVA 12% Producto 2 y 3 de la consultoría "Diseño, especificaciones técnicas y propuesta de uso de material didáctico para las dos modalidades de atención CIBVs y CNH", pagado	5-Entregables Intermedios	17/11/2015		17/11/2015		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: IVA 12% Producto 1, 2 Y 3 de la consultoría "Contratación de una consultoría que se encargue del diseño y definición de las características técnicas que debe cumplir el mobiliario a emplearse en los CIBV con enfoque intercultural", pagado	5-Entregables Intermedios	23/11/2015		23/11/2015		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Noviembre, pagado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: IVA 12% Producto 4 consultoría "Diseño, especificaciones técnicas y propuesta de uso de material didáctico para las dos modalidades de atención CIBVs y CNH", pagado.	5-Entregables Intermedios	16/12/2015		16/12/2015		Sí	10.0
12	EJECUCIÓN: Producto 2 de la consultoría, e IVA 12% "Contratación de una consultoría que se encargue del diseño y definición de las características técnicas que debe cumplir el mobiliario a emplearse en los CIBV con enfoque intercultural", pagado	5-Entregables Intermedios	21/12/2015		21/12/2015		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha, pagado	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		30/12/2015		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del proyecto año 2015, presentado	5-Entregables Intermedios	02/01/2016		02/01/2016		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Solicitud de desembolso "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral, en los temas del Examen Nacional para la Educación Superior - ENES.	5-Entregables Intermedios	09/03/2016		09/03/2016		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
16	EJECUCIÓN: Desembolso a "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral, en los temas del Examen Nacional para la Educación Superior - ENES.	5-Entregables Intermedios	14/06/2016		29/07/2016		Sí	5.0
17	CIERRE: Informe Final de ejecución del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	30/12/2016	30/12/2016			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	158,772.76 **
Costo Total:	228,750.00
Total Devengado:	158,772.76
% Costo Total Devengado:	69.41 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 69.41 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	54,772.76	228,750.00	0.00	283,522.76
Ppto. Externo Planeado	54,772.76	228,750.00	0.00	283,522.76
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	565,357.81	104,000.00	0.00	669,357.81
Ppto. Comprometido	209,059.62	104,000.00	0.00	313,059.62
Planeado - Codificado (2016)		124,750.00		
Programado a Devengar	54,772.76	104,000.00	0.00	158,772.76
Ppto. Devengado	54,772.76	104,000.00	0.00	158,772.76
Estimado a fin de año	* 54,772.76	0.00	0.00	54,772.76
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
Ppto. Devengado 998	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	100.00 %		100.00 %
Total	104,000.00	104,000.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar la promoción del desarrollo de niñas y niños de 1 a 3 años de edad MEDIANTE el acceso, la calidad, y la rectoría de los servicios CIBV de atención directa y operado por terceros con la corresponsabilidad de las familias, la comunidad y el Estado.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO 10 : Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Noviembre	B.1.pdf	09/05/2016
2	HITO 11: Pago IVA 12% Producto 4 consultoría "Diseño, especificaciones técnicas y propuesta de uso de material didáctico "	B.2.pdf	09/05/2016
3	HITO 12: Pago Producto 2 de la consultoría, e IVA 12% "Contratación de una consultoría que se encargue del diseño y definición de las características técnicas"	B.3.pdf	09/05/2016
4	HITO 13: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Diciembre	B.4.pdf	09/05/2016
5	HITO 14: Informe de HITO del proyecto año 2015	B.5.pdf	09/05/2016
6	HITO 15: Solicitud de desembolso "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de DII, en los temas del ENES.	B.6.pdf	09/05/2016
7	HITO 16. Desembolso "Contratación de servicio para capacitar al personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral, en los temas del Examen Nacional para la Educación Superior - ENES.	B.7.pdf	05/10/2016
8	HITO 1: Informe de ejecución del proyecto año 2014	A.1.pdf	09/05/2016
9	HITO 2: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Junio	A.2.pdf	09/05/2016
10	HITO 3: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Julio	A.3.pdf	09/05/2016
11	HITO 4 : Primer desembolso a Producto 1 de la consultoría "Diseño, especificaciones técnicas y propuesta de uso de material didáctico"	A.4.pdf	09/05/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	HITO 5 : Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Agosto	A.5.pdf	09/05/2016
13	HITO 6: Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Septiembre	A.6.pdf	09/05/2016
14	HITO 7 : Sueldos del Equipo de Gestión del Proyecto Puesto en Marcha - Octubre	A.7.pdf	09/05/2016
15	HITO 8: Pago del IVA 12% Producto 2 y 3 de la consultoría "Diseño, especificaciones técnicas y propuesta de uso de material didáctico"	A.8.pdf	09/05/2016
16	HITO 9: Pago IVA 12% Producto 1, 2 Y 3 de la consultoría "Contratación de una consultoría que se encargue del diseño y definición de las características técnicas "	A.9.pdf	09/05/2016
