

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Protección Especial
Dirección de Servicios de Protección Especial

PROYECTO: K011 MIES-Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional

Líder del Proyecto:	Vallejo Álvarez, Myrian Rocío (myrian.vallejo@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Alvear Calderón, María Eulalia	Programas Relacionados:	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL
Titular:	Basantes Castillo, Mariana Monserrath	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	1.09
CUP:	102800000.0000.376265	TIR:	29.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	7,924,111.86
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	95,718,721.21
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 30/04/2019
Fecha de última actualización:	09/01/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Suárez Salazar, Patricio Arturo	Fecha del siguiente hito:	04/03/2019

DATOS GENERALES

Descripción

El presente proyecto está enfocado a la atención y acompañamiento para la restitución de los derechos vulnerados para niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y sus familias que están involucradas en prácticas y/o culturas de violencia y redes; y la permanencia de prácticas de trabajo infantil peligroso y de las peores formas.

Mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes se brindarán servicios de protección especial de calidad para la atención del ciclo de vida. Cabe señalar que para la firma de convenios las organizaciones cooperantes deberán cumplir con la ficha de costos, la norma técnica y modelo de gestión emitido por el MIES.

Objetivo general o propósito:

Implementar servicios de Protección Especial de acuerdo a modelos de atención y normativa técnica en el ciclo de vida con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad en el Ecuador.

Objetivos específicos o componentes:

a) Suscribir convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES, para atender a las personas que hayan sido violentadas en sus derechos.

b) Gestionar Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos.

c) Administrar Centros de Atención Directa en las modalidades de Acogimiento Institucional y Casa Hogar en situación Emergente.

Beneficios Cualitativos

Atención a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes.

Prestación de servicios de Protección Especial con calidad y calidez que cumplan el modelo de atención y las normas técnicas para erradicar el trabajo infantil y la mendicidad; y ofreciendo los servicios de acogimiento institucional y familiar

Administración temporal de los centros de atención directa en la modalidad de acogimiento.

Tipo de Beneficiario

Niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que estén en situación de riesgo o vulneración de sus derechos.

Restricciones

"Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 4 años

Costo total asignado para el proyecto es 105.676.466,29


Restricciones

Alcance: Este proyecto se ejecutará a nivel nacional
 Recursos Humanos: Técnicos contratados para la ejecución del proyecto a nivel nacional.
 Recursos Materiales: Materiales de oficina y Equipos Tecnológicos existentes en la institución."

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 94.24 %

Fecha de Inicio: 01/01/2014

Fecha de Fin: 30/04/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

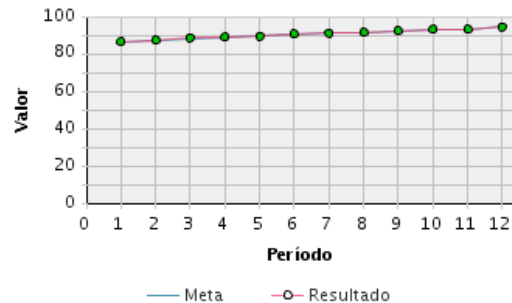

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	86 %	87 %	88 %	88 %	90 %	90 %	91 %	92 %	92 %	93 %	93 %	94 %
	Avance real acumulado											
	86 %	88 %	88 %	89 %	90 %	90 %	91 %	92 %	92 %	93 %	93 %	94 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2018: 1. Al 31 de DICIEMBRE 2018, se mantiene un presupuesto codificado de \$ 17.954.179,27 para grupo de gasto 0078, \$ 220.369,89 para grupo de gasto 0071, y para el grupo de gasto 0073 un valor codificado de \$ 21.313,33 además en este ítem se ejecuta una reforma presupuestaria La ejecución total proyecto de inversión es de 91,40%, con un avance respecto al mes de noviembre 2018, de 5,21%. 2. De los 219 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el mes de diciembre 2018, existen 213 convenios "generados formato", 1 "ingresado", y 2 "finalizado", 3 convenios en estado "liquidado" 3. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, que permitirá examinar cualitativamente y cuantitativamente de la parte programática, de los programas, servicios de atención convenios de cooperación 4. Se realiza evaluación de Programas de Atención basado en derechos a las casas de acogida por convenio y directas utilizando las herramientas, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02), 5. Veinte y seis convenios por liquidar años anteriores 2014-2017, además 213 convenios por liquidar del periodo 2018.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	09/01/2019 - 02:47 PM
NOVIEMBRE 2018: 1. Al 30 de NOVIEMBRE 2018, se mantiene un presupuesto codificado de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y para el grupo de gasto 0073 se ejecuta una reforma presupuestaria , con una ejecución total proyecto de inversión del 86,19%, con un avance respecto al mes de octubre 2018, es de el 11,45%. 2. De los 219 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el mes de noviembre 2018, existen 214 convenios "generados formato", 1 "ingresado", y 1 "finalizado", 3 convenio "liquidado" este 3. Elaboración y desarrollo en la plataforma SIIMIES, de la Metodología dirigida al Monitoreo y Evaluación, que permitirá examinar cualitativamente y cuantitativamente de la parte programática, de los programas, servicios de atención que oferta el MIES. Documento de treinta páginas,	Suárez Salazar, Patricio Arturo	17/12/2018 - 04:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
completamente estructurado y argumentado, en el que se describe sus cuatro grandes grupos de derechos, que lo constituyen, y describe la forma como va a ser aplicada, de manera eficaz en el sistema de Información del SIIMIES. 4. Se incorpora al Sistema SIIMIES cinco instrumentos de evaluación, con los que se levantará la información de losservicios. Dos destinados a una autoevaluación, que serán Evaluación subjetiva, tres destinados a la evaluación de los programas y servicios, los que permitirán identificar la calidad de la gestión, y su comprensión y compromiso con los Derechos Humanos, desarrollado en un sistema informático que proyecte resultados para la consecución de los objetivos de prioridad que son, la restitución de derechos a niñas, niñas, y adolescentes en todos los servicios que el Mies presta a lacomunidad. 5. Se realiza evaluaciónde Programas de Atención basado en derechos a las casas de acogida por convenio y directas utilizando las herramientas, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02), 6. Veinte y seis convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.		
OCTUBRE 2018: 1. Al 31 de octubre 2018, se mantiene un presupuesto codificado de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 74,74%, con un avance respecto al mes anterior de septiembre 2018, del 9,01%. 2.De los 218 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el mes de octubre 2018, existen 214 convenios "generados formato", 1 "ingresado", y 1 "finalizado", 3 convenio "liquidado" este 3. 3. Se realizó el Primer Taller Nacional para Evaluación Diagnóstica de Servicios y Programas de Protección Especial. 3.Elaboración y desarrollo en la plataforma SIIMIES, de la Metodología dirigida al Monitoreo y Evaluación, que permitirá examinar cualitativamente y cuantitativamente de la parte programática, de los programas, servicios de atención que oferta el MIES. Documento de treinta páginas, completamente estructurado y argumentado, en el que se describe sus cuatro grandes grupos de derechos, que lo constituyen, y describe la forma como va a ser aplicada, de manera eficaz en el sistema de Información del SIIMIES. 4.Se incorpora al Sistema SIIMIES cinco instrumentos de evaluación, con los que se levantará la información de los programas y servicios. Dos destinados a una autoevaluación, que serán Evaluación subjetiva, tres destinados a la evaluación de los programas y servicios, los que permitirán identificar la calidad de la gestión, y su comprensión y compromiso con los Derechos Humanos, desarrollado en un sistema informático que proyecte resultados para la consecución de los objetivos de prioridad que son, la restitución de derechos a niñas, niñas, y adolescentes en todos los servicios que el Mies presta a la 5.comunidad. 6.Elaboración de Formatos para la Identificación de Programas de Atención, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02), Evaluación Institucional en cumplimiento de Derechos. (M-EPA03), para el proceso de evaluación de programas basado en derechos humanos. 7.Veinte y ocho convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	16/11/2018 - 10:03 AM
SEPTIEMBRE 2018: 1. Con fecha 30 de septiembre 2018 se asigna un presupuesto de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 65,73%, con un avance respecto al mes anterior del mes de agosto 2018, del 6,24%. 2. De los 217 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existen 214 convenios "generados formato", 1 "ingresado", y 1 "finalizado", 1 convenio "liquidado" este 3. Se realizó el Primer Taller Nacional para Evaluación Diagnóstica de Servicios y Programas de Protección Especial. 3. Elaboración de los instrumentos de Seguimiento Programático. Estos se dividen y caracterizan por la información especializada. 4. Elaboración de Formatos para la Identificación de Programas de Atención, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02), Evaluación Institucional en cumplimiento de Derechos. (M-EPA03), para el proceso de evaluación de programas basado en derechos humanos. 5. Treinta y cuatro convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	16/10/2018 - 11:24 AM
AGOSTO 2018: 1. Con fecha 31 de agosto 2018 se asigna un presupuesto de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 59,49%. 2. De los 217 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existen 214 convenios "generados formato", 1 "ingresado", y 1 "finalizado", 1 convenio "liquidado" este convenio se firmó con la Fundación Construyamos un Sueño, que paso su cobertura y presupuesto al cooperante Fundación Jardín del Edén en la Coordinación Zonal 3 DD-Latacunga. San Lorenzo convenio nuevo registra como ingresado gobierno autónomo Cantón Rio Verde, DD-Esmeraldas firma por un semestre y se renueva para el segundo semestre registra	Suárez Salazar, Patricio Arturo	19/09/2018 - 01:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
emitido- finalizado. El avance de firma de convenios a la fecha es de del 98,16%, generados para su respectiva suscripción. 3. Se realizó el Primer Taller Nacional para Evaluación Diagnóstica de Servicios y Programas de Protección Especial 4. Elaboración conjunta del proceso de automatización del sistema de calidad e impacto para evaluación de los servicios y programas de protección especial del MIES, con el personal de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación 5. Elaboración de la proyección del presupuesto del Proyecto Emblemático de implementar estrategias de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a nivel nacional, que constituye los anexos del mismo, así como también el cronograma anual del 2014 al 2021, cronograma mensual del 2019 y la viabilidad económica 6. Elaboración de los instrumentos de Seguimiento Programático. Estos se dividen y caracterizan por la información especializada y detallada que cada uno de estos recuperará. 7. Se ingresa al SIPEIP - Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, la información del proyecto "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL" , cuyos instrumentos informativos son: marco lógico, ubicación geográfica, indicadores, estudios técnicos 8. Identificación de Programas de Atención, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02), Evaluación Institucional en cumplimiento de Derechos. (M-EPA03) 9. 34 convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.		
JULIO 2018: 1. Con fecha 31 de julio 2018 se asigna un presupuesto de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 48,84%. 2. De los 217 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existen 213 convenios "generados formato", 1 "ingresado", 1 "emitido", y 1 "finalizado", 1 convenio "liquidado", 1 este convenio se firmó con la Fundación Construyamos un Sueño, que paso su cobertura y presupuesto al cooperante Fundación Jardín del Edén en la Coordinación Zonal 3 DD- Latacunga. San Lorenzo convenio nuevo registra como ingresado gobierno autónomo Cantón Río Verde, DD-Esmeraldas firma por un semestre y se renueva para el segundo semestre registra emitido- finalizado. El avance de firma de convenios a la fecha es de del 98,16%, generados para su respectiva suscripción. 3. Con memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0078-M del 12 de julio de 2018 se da respuesta a la Dirección de Planificación e Inversión en referencia a "Solicitud de propuesta de reducción, en función de normas de optimización y austeridad del gasto público", el mismo se realizó el análisis de los recursos presupuestarios de valores devengados e-Sigef versus valores PAPP 2018 del Proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", se ha realizado el seguimiento a las direcciones distritales para la verificación de la reducción del 5%, quienes han manifestado se de las directrices para la disponibilidad de los valores 4. Se ejecuta un monto de \$ 8.854.407,51 correspondiente al primero, segundo y tercer desembolso al 31 julio 2018. Cláusula Sexta de los convenios suscritos a nivel nacional se determina que para realizar el tercer desembolso se requiere la justificación del segundo, lo que retrasa la ejecución por la demora de las Entidades Cooperantes en entregar la documentación requerida. 5. Elaboración de los instrumentos de Seguimiento Programático. Estos se dividen y caracterizan por la información especializada y detallada que cada uno de estos recuperará. Identificación de Programas de Atención, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02), Evaluación Institucional en cumplimiento de Derechos. (M-EPA03) 6. 41 convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	19/09/2018 - 01:54 PM
1.- Con fecha 02 de junio 2018 se asigna un presupuesto de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 42,94%. 2.- 215 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existe 213 convenios generados formato, 1 ingresados, 0 emitidos, y 0 recibido, 1 LIQUIDADO con un avance del 99,07% de convenios generados para su respectiva firma. 3.- Se ejecuta un monto de \$ 7.790.163,01 correspondiente al primero y segundo desembolso al 02 de julio 2018. Cláusula Sexta de los convenios suscritos a nivel nacional se determina que para realizar el tercer desembolso se requiere la justificación del segundo, lo que retrasa la ejecución por la demora de las Entidades Cooperantes en entregar la documentación requerida. 4.- 41 convenios por liquidar años anteriores 2014-2017. 5.-Se solicita a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Reforma de incremento del techo presupuestario del Proyecto Emblemático "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL", por el valor de USD\$ 1.549.086,00 para ser transferidos al Ministerio de Justicia	Suárez Salazar, Patricio Arturo	03/07/2018 - 05:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
6.- Reforma para Firma de convenios en la modalidad acogimiento familia ampliada para hijos (as) de hppl, de conformidad con la norma técnica, por un monto de \$1.549.086,00, (un millón quinientos cuarenta y nueve mil ochenta y seis 00/100 dólares americanos); de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nro. 1288, de 3 de enero de 2017, Artículo 1.- "Transfiérase del Ministerio de Inclusión Económica y Social al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la gestión y provisión de los servicios de acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes de padres privados de libertad, MIES-CGPGE-2018-0394-M		
MAYO 2018: 1.- Con fecha 31 de mayo 2018 se asigna un presupuesto de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 36,36%. 2.- 212 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existe 210 convenios generados formato, 2 ingresados, 0 emitidos, y 0 recibido, con un avance del 99,00% de convenios generados para su respectiva firma. 3.- Se ejecuta un monto de \$ 6.596.613,16 correspondiente al primero y segundo desembolso al 31 de mayo 2018. 4.- 52 convenios por liquidar años anteriores 2014-2017 5.-Se solicita a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Reforma de incremento del techo presupuestario del Proyecto Emblemático "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL", por el valor de USD\$ 1.549.086,00 para ser transferidos al Ministerio de Justicia.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	24/06/2018 - 02:26 PM
ABRIL 2018: 1.En cumplimiento a solicitud de reforma de disminución mediante Oficio Nro.SENPLADES-2018-0303-OF de fecha 11 de abril del 2018 y Memorando Nro.MIES-CGPGE-DPI-2018-0170-M del 12 de abril 2018, en referencia a la Optimización Plan Anual de Inversión a marzo la Política Pública 2018 de los Proyectos y en observancia del Acuerdo Ministerial No. 014 de 18 de Agosto de 2017, la Gerencia de Protección Especial ha procedido a realizar la reducción de recursos del proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional" CUP 102800000.0000.376265, por el valor referido en memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2018-0170-M, del 12 de abril 2018, UDS 2'175.957,04 (dos millones ciento setenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete dólares con 04/100ctvs.). 2.Asignación presupuestaria con corte al 02 de mayo 2018 para transferencias y donaciones para inversión grupo de gasto 0078, un monto de \$ 18.337.496,41 con una ejecución del 27,76%, bienes y servicios grupo de gasto 0073, un monto de \$ 29.223,54, y gestionar servicios de protección especial grupo de gasto 0071, un monto de \$ 212.459,68, con una ejecución de 26,91%. 3.Se ejecuta un monto de \$ 5.022.963,98 del primer y segundo desembolso al 02 de mayo 2018. 4.Para la suscripción de convenios 2018, 212 se registra en el sistema SIIMIES, existe 206 convenios generados formato, 3 ingresados, 2 emitidos, y 1 recibido, con un avance del 97,17% de convenios generados para su respectiva firma. 5.Existen 61 convenios de años anteriores (2015-2017) en proceso de liquidación. 6.Con Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0037-M del 05 de abril de 2018 se remite la Actualización del proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional" período 2014-2018, a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	24/06/2018 - 02:02 PM
MARZO 2018: .Asignación presupuestaria con corte al 02 de abril 2018 para transferencias y donaciones para inversión \$ 20.141.770,23, con una ejecución del 20,72% .211 convenios se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existe 206 convenios generados formato, 3 ingresados, 1 emitidos, y 1 recibido, con un avance del 97,63% de convenios generados para su respectiva firma .Existen 62 convenios de años anteriores (2015-2017) en proceso de liquidación. .Se procede a la actualización del documento proyecto Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional. (actualización del proyecto de inversión). El mismo que se actualiza revisando los principales componentes del proyecto como: Datos Generales, Marco Lógico, Ubicación Geográfica, Estudios Técnicos, Financiamiento. .Se elabora plan de acciones para agilizar el proceso de liquidación de convenios suscritos en los años 2015, 2016, 2017 mediante visitas a territorio.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	24/06/2018 - 11:33 AM
FEBRERO 2018:	Suárez Salazar, Patricio Arturo	24/06/2018 - 11:04 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Asignación presupuestaria con corte al 28 de febrero 2018 para transferencias y donaciones para inversión \$ 20.141.770,23 con una ejecución del 1,38%. .Con Oficio Nro. MEF-SP-2018-0115, 16 de febrero de 2018 se aprueban los avales del primer envío para suscripción de convenios de Protección Especial. .Existen 117 convenios generados formato, 52 ingresados, 35 emitidos, y 8 recibidos, con un total de 212 con una firma de convenios del 52,94%, del total de 221 convenios programados. .Al 28 de febrero 2018, existen 66 convenios de años anteriores (2015-2017) en proceso de liquidación. .Mediante memorando MIES-SPE-GPEPE-2018-0009-M, del 22 de febrero 2018, se solicita autorización para Proceso de traspaso presupuestario de acogimiento familiar en familia para hijas e hijos de personas privadas de libertad (HPPL) al Ministerio de Justicia.		
ENERO 2018: .Se planifica una cobertura de 14.218 niñas, niños, adolescentes para los servicios de Erradicación del trabajo infantil, Acogimiento, y Mendicidad. .Codificación presupuestaria de 24.024.515, dolares corte al 02/02/2018. .Asignación presupuestaria por el Ministerio de Economía y Finanzas, para la suscripción de convenios por un monto de 18.751.173,54. dolares .Un presupuesto devengado de 134.855,93 con una ejecución total del proyecto 0,56% corte al 02/02/2018. .En proceso de suscripción de convenios para el año en curso. Consolidación de información cooperante. .En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, que dispone la co ejecución entre MIES y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la transferencia de la modalidad de atención acogimiento familia ampliada para hijos de personas privadas de libertad (HPPL) que consta de 12 convenios con una cobertura 958, con su presupuesto.	Suárez Salazar, Patricio Arturo	24/06/2018 - 09:39 AM
DICIEMBRE 2017: 1. Codificación presupuestaria de USD 22'595.079,90 corte al 31/12/2017 2. Un presupuesto devengado de USD 20'397.167,12 corte al 31/12/2017 3. Ejecución presupuestaria inversión al mes de diciembre 2017, 90,27%, corte al 31/12/2017 4. Cobertura de 13.655 personas, convenios suscritos 2017. Cobertura "Campaña Da Dignidad 2017" 3.350NNA. 5.- Se suscribe nuevos convenios en la modalidad de atención de erradicación del trabajo infantil en la Dirección Distrital Esmeraldas con una cobertura de 360NNA 6. En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES se transfiere la modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 12 convenios con una cobertura 958, y un presupuesto de 1 '539.079,00	González, Augusto	08/01/2018 - 04:31 PM
NOVIEMBRE 2017: 1. Codificación presupuestaria de USD 22.609.431,68 corte al 04/12/2017 2. Un presupuesto devengado de USD 18.047.713,49 corte al 04/12/2017 3. Ejecución presupuestaria inversión al mes de NOVIEMBRE 2017, 79,82%, corte al 04/12/2017 4. Cobertura de 13.655 personas, convenios suscritos 2017. Cobertura "Campaña Da Dignidad 2017" 3.350NNA 5. En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en revisión, verificación y aprobación de documentación remitida por distritos MIES	González, Augusto	05/12/2017 - 02:08 PM
OCTUBRE 2017: 1. Codificación presupuestaria de USD 22.473.758,35 corte al 06/11/2017 2. Un presupuesto devengado de USD 13.575.185,30 corte al 06/11/2017 3. Ejecución presupuestaria inversión al mes de OCTUBRE 2017, 71,58%, corte al 06/11/2017 4. Cobertura de 13.767 personas, convenios suscritos 2017 5. En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en revisión, verificación y aprobación de documentación remitida por distritos MIES. 6. Al corte de este informe convenios suscritos se cuantifican en 176.	González, Augusto	08/11/2017 - 10:51 AM
SEPTIEMBRE 2017: 1.- Codificación presupuestaria de \$ USD 22.117.178,52 corte al 02/10/2017 2.- Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2017 es de 67,10%, corte al 02/10/2017 3.- Cobertura de 13.767 personas, convenios suscritos hasta 02 de octubre 2017	González, Augusto	12/10/2017 - 11:14 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en proceso de aprobación de prioridad de transferencias. 5.- Al corte de este informe se suscriben convenios pendientes los mismos que se cuantifican en 176 en relación antes pasado se mantenía en 173.		
AGOSTO 2017: 1.- Codificación presupuestaria de \$ 21'379.990,44 corte al 31/08/2017 2.- Ejecución presupuestaria al mes agosto 2017 es de 54,61%, corte al 31/08/2017 3.- Cobertura de 13.447 personas, convenios suscritos hasta 31 de agosto 2017 4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en proceso de aprobación de prioridad de transferencias. 5.- Con fecha 28 de agosto 2017, el Ministerio de Finanzas realiza modificación presupuestaria en incremento según documento Nro. 331, por un monto 2'307.761,34 en el programa 55, proyecto 001, actividad 004, ítem 730417 Infraestructura, al 31 de agosto 2017.	González, Augusto	05/09/2017 - 04:10 PM
JULIO 2017. 1.- Codificación presupuestaria de \$ 19.867.726,45 2.- Ejecución presupuestaria al mes junio 2017 es de 46,82%, corte al 31/07/2017 3.- Cobertura de 13.252 personas, convenios suscritos hasta 31 de julio 2017 4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en proceso de aprobación de prioridad de transferencias.	González, Augusto	15/08/2017 - 11:46 AM
JUNIO 2017. 1.- Codificación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45 2.- Ejecución presupuestaria al mes junio 2017 es de 40,29 % corte al 03/07/2017 3.- Cobertura de 13.282 personas, suscripción de convenio FUNDACIÓN ALBERGUE PARA NIÑOS ONCOLÓGICOS FANO. CZ8. DD-TARQUI-GUAYAS, cobertura 50 nna, modalidad ACOGIMIENTO FAMILIAR. 4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, proceso de aprobación de prioridad para transferencias.	González, Augusto	05/07/2017 - 02:11 PM
MAYO 2017 1.- Codificación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45 2.- Ejecución presupuestaria al mes MAYO 2017 es de 31,73%, 3.- Cobertura de 13.232 personas 4.- INCREMENTO PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 51, DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 73. Por el valor total de \$282.569,60 respectivamente. 5.- Proceso de Avals Ministerio de Finanzas CZ 8, CZ9. 6.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos	González, Augusto	07/06/2017 - 12:51 PM
ABRIL 2017 1.- Codificación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45 2.- Ejecución presupuestaria al mes ABRIL 2017 es de 20,75%, 3.- Cobertura de 12.764 4.- INCREMENTO PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 51, DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 73. Por el valor total de \$282.569,60 respectivamente. 5.- Proceso de Avals Ministerio de Finanzas CZ 8, CZ9. 6.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos	González, Augusto	10/05/2017 - 10:29 AM
MARZO 2017 Asignación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2017 es de 4,99%, * Cobertura de 12.764 * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional 24, ingresados 43, recibidos 6, emitidos 28. Total 101 convenios. * Proceso de Avals Ministerio de Finanzas CZ 8, CZ9. * Liquidación de convenios 2016 , finalizado 245, liquidado 31, con avance de 88,77%	González, Augusto	05/05/2017 - 03:01 PM
FEBRERO 2017 Asignación presupuestaria de \$ 19'949.796,05 * Ejecución presupuestaria al mes FEBRERO 2017 es de 0,12%, * Cobertura de 12.764	González, Augusto	05/05/2017 - 02:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional 24, ingresados 43, recibidos 6, emitidos 28. Total 101 convenios. * Proceso de Avals Ministerio de Finanzas * Liquidación de convenios 2016, finalizado 245, liquidado 31, con avance de 88,77%		
ENERO 2017 * Asignación presupuestaria de \$ 19'949.796,05 * Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2017 es de 0%, * Cobertura de 12.764 * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. -0- * Proceso de Avals Ministerio de Finanzas.	González, Augusto	05/05/2017 - 02:59 PM
DICIEMBRE 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes DICIEMBRE 2016 es de 97,92%, * Cobertura de 43.726 personas, suscripciones de adendas a los convenios de cooperación. * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 274, suscripciones de adendas a los convenios de cooperación. * 1er Desembolso.- Se encuentra el 100,00% de convenios pagados * 2do Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagados * 3er Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagados * 4to Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagado * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, 276 corresponde al 92,93%; y 21 convenios están en estado finalizado corresponde al 7,07%.	González, Augusto	06/01/2017 - 12:47 PM
NOVIEMBRE 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes NOVIEMBRE 2016 es de 89,56%, * Cobertura de 40.625 personas, suscripción de adendas a los convenios de cooperación. * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 267 suscripción de adendas a los convenios de cooperación. * 1er Desembolso.- Se encuentra el 99,20% de convenios pagados y el 0,80% no pagado, que corresponde a 2 convenios pendientes en el Ministerio de Finanzas * 2do Desembolso.- El 98,40% de los convenios están pagados, 0,80% pendientes de pago, 1 por parte del Ministerio de Finanzas y 1 convenio pendientes de solicitar el pago desde el MIES * 3er Desembolso.- El 87,20% de los convenios están pagados, 12,80% pendientes de pago, 23 convenios por parte del Ministerio de Finanzas Y 9 pendientes de solicitar el pago desde el MIES. Según el sistema eSIGEF con corte al mes de noviembre * 4to Desembolso.- El 69,52% de los convenios están pagados, 30,48% pendientes de pago, 47 convenios por parte del Ministerio de Finanzas Y 35 pendientes de solicitar el pago desde el MIES * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, corresponde al 92,57%; y 23 convenios están en estado finalizado 7,43%,	González, Augusto	05/12/2016 - 12:55 PM
OCTUBRE 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes OCTUBRE 2016 es de % 77,63%, * Cobertura de 37.216 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251 * 1er Desembolso.- Se encuentra el 99,20% de convenios pagados y el 0,80% no pagado, que corresponde a 2 convenios pendientes de aval. * 2do Desembolso.- El 98,40% de los convenios están pagados, 1,60% pendientes de pago, 2 por parte del Ministerio de Finanzas y 2 convenios pendientes de solicitar el pago desde el MIES. Según el sistema eSIGEF * 3er Desembolso.- El 52,59% de los convenios están pagados, 47,41% pendientes de pago, 75 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 44 pendientes de solicitar el pago desde el MIES * 4to Desembolso.- El 11,16% de los convenios están pagados, 88,84% pendientes de pago, 128 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 95 pendientes de solicitar el pago desde el MIES * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, corresponde al 89,19%; y 32 convenios están en estado finalizado 10,81%	González, Augusto	02/11/2016 - 09:58 AM
SEPTIEMBRE 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 57,85 * Cobertura de 37.216 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015	González, Augusto	05/10/2016 - 02:42 PM
AGOSTO 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56	González, Augusto	05/09/2016 - 03:24 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* La ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión, reflejan un 50,22% de acuerdo al sistema eSIGEF del mes de agosto, en el cual se registra un incremento de 3,79% en relación al mes anterior. * Desembolsos cooperantes -1er Desembolso.- 98% pagados y 2% no pagados, que corresponde a 3 convenios pendientes MF. -2do Desembolso.- 95% pagados y 5% pendientes de pago, 6 por parte del Ministerio de Finanzas y 6 convenios pendientes de solicitar el pago desde el MIES. -3er Desembolso.- El 2% de los convenios están pagados, que corresponde a 6 convenios; 98% pendientes de pago, 31 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 218 pendientes de solicitar el pago desde el MIES. * Cobertura de 37.216 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.		
JULIO 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * La ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión, reflejan un 46,43% de acuerdo al sistema eSIGEF al 29 de julio, en el cual se registra un incremento de 1,64% en relación al mes anterior. * Desembolsos cooperantes -1er Desembolso.- 98% pagados y 2% no pagados, que corresponde a 4 convenios pendientes MF. -2do Desembolso.- 35% pagados que corresponde a 88 convenios, 65% pendientes, MIES 14 pendientes * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.	González, Augusto	07/08/2016 - 10:33 AM
JUNIO 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes JUNIO 2016 es de 44.88 % * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 255 (cuatro de gasto corriente) * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.	González, Augusto	06/07/2016 - 04:30 PM
MAYO 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 39.35 * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primer trimestre.	González, Augusto	06/06/2016 - 08:13 AM
ABRIL 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 34,78 * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primer trimestre.	González, Augusto	06/05/2016 - 08:39 AM
MARZO 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 18,71 * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015 OBSERVACIÓN: Por error de digitación se encuentra duplicado el mes de febrero 2016, se realiza la corrección pertinente.	González, Augusto	06/04/2016 - 08:46 AM
FEBRERO 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 18,71 * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015	González, Augusto	06/04/2016 - 08:28 AM
FEBRERO 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2016 es de 1,26 % * Cobertura de 33.125 * Suscripción de 224 convenios generados - firmados a nivel nacional.	González, Augusto	04/03/2016 - 04:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015		
ENERO 2016: * Asignación presupuestaria de \$ 20'410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2016 es de 0.08 % * Cobertura de 31.468 * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015	González, Augusto	04/03/2016 - 04:52 PM
DICIEMBRE 2015: * Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes DICIEMBRE 2015 es de 94,70 % * Cobertura de 45749 * Suscripción de 291 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015	González, Augusto	05/01/2016 - 03:15 PM
OCTUBRE 2015: * Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2015 es de 84,80 %. * Cobertura de 42724 * Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015 NOVIEMBRE 2015: * Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes noviembre 2015 es de 88,30 % * Cobertura de 43164 * Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015	González, Augusto	11/12/2015 - 02:46 PM
SEPTIEMBRE 2015: * Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2015 es de 80,91 %. * Cobertura de 41.421. * Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015	González, Augusto	05/10/2015 - 12:56 PM
AGOSTO 2015: * Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 78,00 %. * Cobertura de 41.639. * Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015	González, Augusto	09/09/2015 - 08:38 AM
JULIO 2015: * Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 63,33 %. * Cobertura de 41.489 personas. * Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015. Maya Romero, María José 03/07/2015 - 12:10 PM	González, Augusto	06/08/2015 - 09:34 AM
JUNIO 2015: * Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 44,79%. * Cobertura de 40.435 personas. * Suscripción de 268 convenios generados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015. * Seguimiento a la liquidación de conenios 2014, con 207 convenios liquidados en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.	González, Augusto	03/07/2015 - 12:10 PM
Mayo 2015: * Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes Mayo 2015 es de 42,21%. * Cobertura de 38.142 personas. * Suscripción de 261 convenios generados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación de conenios 2014, con 203 convenios liquidados en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional	González, Augusto	22/06/2015 - 09:41 AM
Abril 2015: * Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes de Abril 2015 es de 37.56%.	González, Augusto	05/05/2015 - 04:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* Cobertura de 34.901 personas. * Renovación de convenios con entidades cooperantes con un total de 264 generados. * Seguimiento a la liquidación de 176 convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional		
MARZO 2015: 1.- Mediante memorando Nro. MIES-SPE-2015-0245-M de 9 de marzo se remite la ficha de Proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta Gobierno Por Resultados. 2.- Propuesta de cambio de coberturas a la Microplanificación de la Subsecretaría de Protección Especial, con el propósito de operar un quiebre en los procesos de erradicación del trabajo infantil y mendicidad, dirigiendo los esfuerzos a lograr resultados medibles y evaluables en concordancia con el nuevo modelo de atención en función a la línea base proporcionada por el Registro Social. 3.- Entrega del primer documento final al Modelo de Gestión para la Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial y Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial en Construcción a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Berenice Cordero (hito cumplido 47). 4.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenio para liquidación 2014 con un avance del 50% de acuerdo al siguiente detalle: Informe Técnico realizado 17, Informe Financiero 42, Informe Jurídico realizado 45, con Acta de Finiquito Firmada 110, no presentan documentos 2. Con un total de 222 convenios. 5.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenios para firma 2015 de acuerdo al sistema SIIMIES, de acuerdo al siguiente detalle: Ingresados 20, Emitido 22, Recibido 8, Generados 200. Con un total de 250 convenios.	Quisintuña Telenchana, María Josefa	07/04/2015 - 12:02 PM
FEBRERO 2015: 1.- Asignación de recursos el 13 de febrero 2015 para el Grupo de Gasto 78 el monto de \$ 21 '274.525 para la suscripción de convenios a nivel nacional. 2.- Planificación de cobertura y presupuesto a nivel distrital y zonal en la modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial y Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial en Construcción, de acuerdo a la ficha de costos y techo presupuestario panificado. 3.- Asignación de recursos a la Coordinación Zonal 8, para el funcionamiento del servicio del Centro de Acogimiento de Recuperación para adolescentes "Juan Elias". 4.- Elaboración de matriz de convenio para liquidación 2014 con un avance del 25% de acuerdo al siguiente detalle: Informe Técnico realizado 14, Informe Financiero 29, Informe Jurídico realizado 22, con Acta de Finiquito Firmada 56, no presentan documentos 101. Con un total de 222 convenios. 5.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenios para firma 2015 de acuerdo al sistema SIIMIES, de acuerdo al siguiente detalle: Ingresados 54, Emitido 5, Recibido 2, Generados 71. Con un total de 130 convenios.	Quisintuña Telenchana, María Josefa	07/04/2015 - 11:58 AM
Enero 2015: - o Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1248-OF, del 31 de diciembre 2014 la SENPLADES remite la Actualización al Dictamen de Prioridad del proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional" para el año 2015 - o Presupuesto Planificado en PAPP: \$ 21'720.525,00 - o Asignación en sistema eSIGEF: \$ 9'505.819,00 al 30 de enero 2015. Grupo de gasto 73: USD\$ 9.220.819. Grupo de gasto 71: USD\$ 285.000 - o Ejecución presupuestaria: 0% - o Estado Actual del Proyecto: Vigente desde enero 2014 hasta diciembre 2017 - o El proyecto planifica atender una cobertura de 29.290 personas en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Trabajo Infantil y Mendicidad. - o Seguimiento en el sistema SIIMIES para la firma de convenios 2015 en las modalidades de Acogimiento Institucional y Familiar.	Quisintuña Telenchana, María Josefa	06/04/2015 - 09:38 AM
Diciembre 2014: * Asignación presupuestaria de \$ 21.040.653,32 * Ejecución presupuestaria del mes de Diciembre 2014 es de 97.61%. * Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. * Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional.	Chavez Morales, Luis Felipe	30/12/2014 - 02:48 PM
Noviembre 2014: * Asignación presupuestaria de \$ 21.052.480,13 * Ejecución presupuestaria del mes de octubre 2014 es de 89.19%.	Chavez Morales, Luis Felipe	05/12/2014 - 04:31 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. * Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional.		
Octubre 2014: * Asignación presupuestaria de \$ 21.584.074,15 * Ejecución presupuestaria del mes de octubre 2014 es de 84.34%. * Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. * Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional.	Chavez Morales, Luis Felipe	05/11/2014 - 06:50 PM
AGOSTO 2014: * Asignación presupuestaria de \$ 21.584.074,15 * Ejecución presupuestaria con corte 29 de agosto de 2014 es de 82.13%. * Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. Reajuste de acuerdo a liquidacion 1er desembolso. * Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.	Chavez Morales, Luis Felipe	01/09/2014 - 04:48 PM
JULIO 2014: * Asignación presupuestaria de \$ 21.584.074,15 * Ejecución presupuestaria con corte 31 de julio de 2014 es de 79.36%. * Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. Reajuste de acuerdo a liquidacion 1er desembolso. * Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales. * Atención a las observaciones de SENPLADES y MCDS a proyecto de inversión	Chavez Morales, Luis Felipe	01/08/2014 - 07:53 PM
JUNIO 2014: * Ejecución presupuestaria con corte 30 de junio de 2014 es de 68%. * Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales. * Financiamiento y seguimiento al evento "Día contra el Trabajo Infantil".	Chavez Morales, Luis Felipe	01/07/2014 - 05:00 PM
MAYO 2014: * Ejecución presupuestaria con corte 27 de mayo de 2014 es de 50.13%. * Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados. * Seguimiento a la cobertura de convenios 2014 * Evaluación de calidad a las Unidades de Atención en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales. * Financiamiento y seguimiento al evento "Día contra el Trabajo Infantil".	Chavez Morales, Luis Felipe	27/05/2014 - 01:54 PM
A continuación se detalla la Información del Proyecto: * Ejecución presupuestaria con corte 28 de abril de 2014 es de 49.52%. * Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados. * Elaboración de la matriz de presupuesto y cobertura de las organizaciones cooperantes, para la suscripción de convenios, con la finalidad de realizar el seguimiento respectivo. * Actualización del PAPP con nuevo techo presupuestario de \$ 21'165.715,49 USD.	Chavez Morales, Luis Felipe	28/04/2014 - 12:45 PM
A continuación se adjuntan los principales logros del proyecto comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2014. * Ejecución presupuestaria con corte al 31 de marzo 2014 es de 49,62%. * Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados. * Elaboración de la matriz de presupuesto y cobertura de las organizaciones cooperantes, para la suscripción de convenios, con la finalidad de realizar el seguimiento respectivo. * Actualización del PAPP con nuevo techo presupuestario de \$ 21'166.407,00 USD.	Olivo Plazas, Julio Adolfo	04/04/2014 - 05:15 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de ejecución presupuestaria en Direcciones distritales	08/04/2015	Augusto González	10	20	2	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Retraso en la transferencia de recursos a los cooperantes CAUSARÍA retraso en la ejecución de las actividades planificadas	24/05/2018		50 %	40	20	0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Bolívar
2	Zona 1 - Norte > Carchi > Mira
3	Zona 1 - Norte > Carchi > Montufar
4	Zona 1 - Norte > Carchi > Tulcán
5	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Eloy Alfaro
6	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
7	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Muisne
8	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Quininde
9	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Rioverde
10	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > San Lorenzo
11	Zona 1 - Norte > Imbabura > Antonio Ante
12	Zona 1 - Norte > Imbabura > Cotacachi
13	Zona 1 - Norte > Imbabura > Ibarra
14	Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo
15	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrio
16	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Cayambe
17	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Mejía
18	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pedro Moncayo
19	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñahui
20	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos
21	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Alausi
22	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chambo
23	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chunchi
24	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta
25	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guamate
26	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guano
27	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Pallatanga
28	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba
29	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > La Mana
30	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Latacunga
31	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pangua

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
32	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pujili
33	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Salcedo
34	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Saquisilí
35	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos
36	Zona 3 - Centro > Pastaza > Mera
37	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Ambato
38	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa
39	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Patate
40	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Quero
41	Zona 3 - Centro > Tungurahua > San Pedro de Pelileo
42	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone
43	Zona 4 - Pacífico > Manabí > El Carmen
44	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jama
45	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jaramijo
46	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jipijapa
47	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Junín
48	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta
49	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Montecristi
50	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Paján
51	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales
52	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pichincha
53	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Portoviejo
54	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Puerto López
55	Zona 4 - Pacífico > Manabí > San Vicente
56	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Santa Ana
57	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Sucre
58	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Tosagua
59	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > La Concordia
60	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Santo Domingo
61	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
62	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda
63	Zona 5 - Litoral > Guayas > Alfredo Baquerizo M. (Jujan)
64	Zona 5 - Litoral > Guayas > Coronel Marcelino Maridueña
65	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Empalme
66	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo
67	Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro
68	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal
69	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjito
70	Zona 5 - Litoral > Guayas > Pedro Carbo
71	Zona 5 - Litoral > Guayas > Salitre (Urbina Jado)
72	Zona 5 - Litoral > Guayas > Santa Lucía
73	Zona 5 - Litoral > Guayas > Sn. Jacinto de Yaguachi
74	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Babahoyo
75	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Buena Fe
76	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Mocache
77	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Palenque
78	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Pueblo Viejo
79	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo
80	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Urdaneta

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
81	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Valencia
82	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas
83	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Vinces
84	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena
85	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > La Libertad
86	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Salinas
87	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca
88	Zona 6 - Austro > Azuay > Paute
89	Zona 6 - Austro > Azuay > Sigsig
90	Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues
91	Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar
92	Zona 6 - Austro > Cañar > La Troncal
93	Zona 6 - Austro > Cañar > Suscal
94	Zona 7 - Sur > El Oro > Arenillas
95	Zona 7 - Sur > El Oro > Atahualpa
96	Zona 7 - Sur > El Oro > Balsas
97	Zona 7 - Sur > El Oro > Chilla
98	Zona 7 - Sur > El Oro > El Guabo
99	Zona 7 - Sur > El Oro > Huaquillas
100	Zona 7 - Sur > El Oro > Las Lajas
101	Zona 7 - Sur > El Oro > Machala
102	Zona 7 - Sur > El Oro > Marcabelli
103	Zona 7 - Sur > El Oro > Pasaje
104	Zona 7 - Sur > El Oro > Piñas
105	Zona 7 - Sur > El Oro > Portovelo
106	Zona 7 - Sur > El Oro > Santa Rosa
107	Zona 7 - Sur > El Oro > Zaruma
108	Zona 7 - Sur > Loja > Calvas
109	Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo
110	Zona 7 - Sur > Loja > Chaguarpamba
111	Zona 7 - Sur > Loja > Loja
112	Zona 7 - Sur > Loja > Puyango
113	Zona 7 - Sur > Loja > Saraguro
114	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora
115	Zona 8 - DMG > Guayas > Durán
116	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil
117	Zona 8 - DMG > Guayas > Samborondon
118	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2014	4-Inicio de Trabajo	15/01/2014		15/01/2014		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN: Informe de Dictamen de Prioridad de SENPLADES.	4-Inicio de Trabajo	16/01/2014		16/01/2014		Sí	1.0
3	PLANIFICACIÓN: Perfiles de convenios presentados a	9-Entregables Formales	22/01/2014		22/01/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	los distritos por parte de las organizaciones cooperantes.							
4	DEFINICIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.5
5	EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Familiar.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.5
6	EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Institucional.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	1.5
7	EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de de Acogimiento Casa Hogar.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	1.5
8	EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Erradicación de la Mendicidad.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	1.5
9	EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	1.5
10	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios, desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	31/01/2014		31/01/2014		Sí	1.5
11	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios, desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.5
12	EJECUCIÓN: Matriz de convenios firmados por zona y modalidad.	9-Entregables Formales	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Informe de certificaciones presupuestarias realizadas de acuerdo al PAPP.	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.5
14	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.5
15	EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Casa Hogar	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
17	EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil.	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidades de la Mendicidad.	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	30/04/2014		28/04/2014		Sí	0.5
21	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	31/05/2014		29/05/2014		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN: Directrices financieras para la ejecución presupuestaria de la partida 78	9-Entregables Formales	23/06/2014		23/06/2014		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.5
24	EJECUCIÓN: Informe de liquidación del primer desembolso a nivel desconcentrado.	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.5
26	EJECUCIÓN: Informe de reformas presupuestarias.	9-Entregables Formales	06/08/2014		06/08/2014		Sí	0.5
27	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar.	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional.	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Casa Hogar.	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil.	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
31	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de la Mendicidad.	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito del Ecuador	9-Entregables Formales	31/08/2014		29/08/2014		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN: Informe de ejecución y reformas presupuestarias de las casas de acogimiento mixtas	9-Entregables Formales	23/09/2014		23/09/2014		Sí	0.5
34	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zonas.	9-Entregables Formales	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.5
35	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento matriz de convenios 2014.	9-Entregables Formales	03/10/2014		03/10/2014		Sí	0.5
36	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y ejecución presupuestaria a nivel desconcentrado.	9-Entregables Formales	22/10/2014		22/10/2014		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	31/10/2014		30/10/2014		Sí	0.5
38	EJECUCIÓN: Seguimiento liquidación de los convenios 1er desembolso.	9-Entregables Formales	14/11/2014		13/11/2014		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Documento PAPP 2014 actualizado.	9-Entregables Formales	20/11/2014		19/11/2014		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	30/11/2014		28/11/2014		Sí	0.5
41	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria 2014.	9-Entregables Formales	10/12/2014		10/12/2014		Sí	0.5
42	EJECUCIÓN: Informe de cierre del Ejercicio fiscal 2014.	9-Entregables Formales	15/12/2014		15/12/2014		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Informe del tercer desembolso de convenios a nivel distrital para todas las modalidades	9-Entregables Formales	15/12/2014		15/12/2014		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	30/12/2014		29/12/2014		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de costos de Erradicación de Trabajo Infantil, presentada.	5-Entregables Intermedios	20/02/2015		20/02/2015		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para la modalidad de trabajo infantil de acuerdo al Registro Social, presentado	5-Entregables Intermedios	20/02/2015		20/02/2015		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Elaboración del modelo de gestión para la	9-Entregables Formales	16/03/2015		16/03/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	modalidad de erradicación de trabajo infantil, presentada							
48	PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2015, presentado.	9-Entregables Formales	16/03/2015		16/03/2015		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. presentado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN: Informe de liquidación de convenios firmados año 2014, presentado	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Informe del número de convenios firmados y coberturas en base al SIIMIES para la modalidad de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado.	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado	4-Inicio de Trabajo	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. presentado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
54	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
55	EJECUCIÓN: Informe del número de convenios firmados y coberturas en base al SIIMIES para la modalidad de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado.	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
56	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	29/05/2015		29/05/2015		Sí	0.5
57	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
58	EJECUCIÓN: Informe Evento Día Contra el Trabajo Infantil a Nivel Zona, presentado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
59	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
60	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.5
61	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.5
62	EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del primer desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
64	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
65	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	1.0
66	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.5
67	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
69	EJECUCIÓN: eLaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016, presentado.	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
70	EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2015. presentado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
71	EJECUCIÓN: Informe de gestión del proyecto, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
72	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado							
73	PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016.	9-Entregables Formales	01/01/2016		01/01/2016		Sí	0.0
74	EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada.	9-Entregables Formales	30/01/2016		30/01/2016		Sí	0.5
75	EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada	9-Entregables Formales	30/01/2016		30/01/2016		Sí	0.5
76	EJECUCIÓN: PAPP del proyecto de inversión 2016, aprobado.	9-Entregables Formales	30/01/2016		30/01/2016		Sí	0.5
77	EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado	9-Entregables Formales	02/02/2016		02/02/2016		Sí	1.0
78	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado	9-Entregables Formales	20/02/2016		20/02/2016		Sí	0.5
79	EJECUCION: Informe consolidado de los convenios sucritos de todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado.	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.5
80	EJECUCION: Informe de liquidacion de convenios 2015, presentado.	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0
81	EJECUCIÓN: Informe de gestión cuatrimestral de la Gerencia, presentado.	9-Entregables Formales	29/04/2016		29/04/2016		Sí	1.0
82	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del proyecto de inversión, presentado.	9-Entregables Formales	30/05/2016		30/05/2016		Sí	1.0
83	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
84	EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado.	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.5
85	EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado	9-Entregables Formales	29/07/2016		29/07/2016		Sí	0.5
86	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.2
87	EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
88	EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.3
89	EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.5
90	EJECUCIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2017, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
91	EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
92	EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016.presentado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
93	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
94	EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
95	EJECUCIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2017.	9-Entregables Formales	02/01/2017		02/01/2017		Sí	1.0
96	EJECUCIÓN: Ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada.	9-Entregables Formales	04/01/2017		04/01/2017		Sí	1.0
97	EJECUCIÓN: PAPP 2017 aprobado	9-Entregables Formales	04/01/2017		04/01/2017		Sí	0.5
98	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado	9-Entregables Formales	04/01/2017		04/01/2017		Sí	0.5
99	EJECUCIÓN: Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado	9-Entregables Formales	01/02/2017		01/02/2017		Sí	0.5
100	EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada	9-Entregables Formales	01/02/2017		01/02/2017		Sí	0.5
101	EJECUCION: Informe consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención, presentado.	9-Entregables Formales	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.5
102	EJECUCION: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	9-Entregables Formales	17/04/2017		17/04/2017		Sí	0.5
103	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.	9-Entregables Formales	15/05/2017		15/05/2017		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
104	EJECUCIÓN: Informe de gestión del primer cuatrimestral del proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	15/05/2017		15/05/2017		Sí	0.5
105	EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado	9-Entregables Formales	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.5
106	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	15/07/2017		15/07/2017		Sí	0.5
107	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	01/08/2017		01/08/2017		Sí	0.5
108	EJECUCIÓN: Informe de gestión del segundo cuatrimestral del proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	08/09/2017		08/09/2017		Sí	0.5
109	EJECUCION: Informe de la entrega del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	9-Entregables Formales	15/09/2017		15/09/2017		Sí	0.5
110	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.	9-Entregables Formales	15/09/2017		15/09/2017		Sí	0.5
111	EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado	9-Entregables Formales	03/10/2017		03/10/2017		Sí	0.5
112	EJECUCION: Informe de la entrega del tercer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	9-Entregables Formales	22/12/2017		22/12/2017		Sí	0.5
113	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	22/12/2017		22/12/2017		Sí	0.5
114	EJECUCIÓN: Informe final de gestión de la Gerencia, presentado.	9-Entregables Formales	22/12/2017		22/12/2017		Sí	0.5
115	EJECUCIÓN: Ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada, año 2018	9-Entregables Formales	04/01/2018		04/01/2018		Sí	0.5
116	EJECUCIÓN: PAPP 2018 aprobado	9-Entregables Formales	04/01/2018		04/01/2018		Sí	0.5
117	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado	9-Entregables Formales	04/01/2018		04/01/2018		Sí	0.5
118	EJECUCIÓN: Distribución de cobertura y presupuesto a	9-Entregables Formales	01/02/2018		01/02/2018		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado							
119	EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada	9-Entregables Formales	01/02/2018		01/02/2018		Sí	0.5
120	EJECUCION: Cierre y liquidación de convenios suscritos en el 2017, presentado.	9-Entregables Formales	03/03/2018		03/03/2018		Sí	0.5
121	EJECUCION: Informe consolidado de los convenios sucritos de todas las modalidades de atención, presentado.	9-Entregables Formales	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.5
122	EJECUCION: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	9-Entregables Formales	17/04/2018		17/04/2018		Sí	0.5
123	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.	9-Entregables Formales	15/05/2018		15/05/2015		Sí	0.5
124	EJECUCIÓN: Informe de gestión del primer cuatrimestral del proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	15/05/2018		15/05/2018		Sí	0.5
125	EJECUCIÓN: Informe de gestión del segundo cuatrimestral del proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	29/06/2018		29/06/2018		Sí	0.5
126	EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado	9-Entregables Formales	29/06/2018		29/06/2018		Sí	0.5
127	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	16/07/2018		16/07/2018		Sí	0.5
128	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	01/08/2018		01/08/2018		Sí	0.5
129	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.	9-Entregables Formales	14/09/2018		14/09/2018		Sí	0.5
130	EJECUCION: Informe de la entrega del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	9-Entregables Formales	15/09/2018		15/09/2018		Sí	0.5
131	EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del segundo desembolso de los convenios	9-Entregables Formales	03/10/2018		03/10/2018		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	suscritos en todas las modalidades de atención, presentado							
132	EJECUCION: Informe de la entrega del tercer desembolso desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	9-Entregables Formales	20/12/2018		20/12/2018		Sí	0.5
133	EJECUCIÓN: Informe final de gestión de la Gerencia, presentado.	9-Entregables Formales	21/12/2018		21/12/2018		Sí	0.5
134	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.5
135	EJECUCION: Cierre y liquidación de convenios suscritos en el 2018, presentado.	9-Entregables Formales	04/03/2019	04/03/2019			No	0.5
136	CIERRE: Informe de cierre del Proyecto.	9-Entregables Formales	30/03/2019	30/03/2019			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de NNA que acceden en la modalidad de erradicación del trabajo infantil por convenio.		98.83 %	9,390	9,280	01/03/2015	Diciembre
2	Número de NNA que acceden en la modalidad de acogimiento por convenio.		105.23 %	2,220	2,336	01/01/2015	Diciembre
3	Número de niños, niñas y adolescentes que acceden en la modalidad de erradicación de mendicidad por convenio.		96.97 %	1,650	1,600	01/01/2017	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	95,718,721.21 **
Costo Total:	96,621,805.71
Total Devengado:	94,013,043.10
% Costo Total Devengado:	97.30 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 97.30 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	41,720,525.00	0.00	0.00	41,720,525.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	55,567,698.76	20,513,453.45	0.00	76,081,152.21
Ppto. Codificado	81,520,541.84	18,195,862.49	0.00	99,716,404.33
Ppto. Comprometido	78,381,842.59	17,068,482.19	0.00	95,450,324.78
Planeado - Codificado (2018)		-18,195,862.49		
Programado a Devengar	83,381,934.16	18,337,496.41	0.00	101,719,430.57
Ppto. Devengado	77,381,224.80	16,631,818.30	0.00	94,013,043.10
Pagado Real	73,357,259.41	15,831,173.99	0.00	89,188,433.40
Estimado a fin de año	* 77,381,224.80	0.00	0.00	77,381,224.80
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	6,000,709.36	18,337,496.41	0.00	24,338,205.77
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 92.80 %	90.70 %	0.00 %	92.42 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

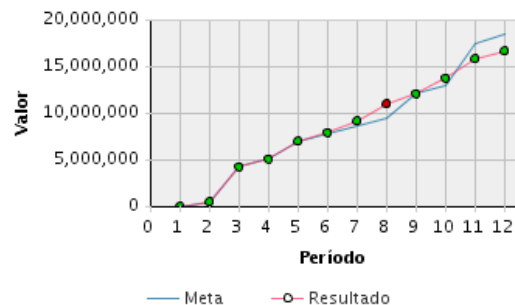

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	493,498.10	493,498.10	493,498.10	493,498.10	100.00 %		2.69 %
Mar	3,723,779.47	3,723,779.47	4,217,277.57	4,217,277.57	100.00 %		23.00 %
Abr	862,859.45	862,859.45	5,080,137.02	5,080,137.02	100.00 %		27.70 %
May	1,898,516.60	1,898,516.60	6,978,653.62	6,978,653.62	100.00 %		38.06 %
Jun	739,395.36	894,884.76	7,718,048.98	7,873,538.38	102.01 %		42.94 %
Jul	862,859.45	1,272,671.12	8,580,908.43	9,146,209.50	106.59 %		49.88 %
Ago	862,859.45	1,846,630.63	9,443,767.88	10,992,840.13	116.40 %		59.95 %
Sep	2,628,031.63	1,059,732.28	12,071,799.51	12,052,572.41	99.84 %		65.73 %
Oct	864,799.45	1,652,695.27	12,936,598.96	13,705,267.68	105.94 %		74.74 %
Nov	4,538,037.63	2,100,386.62	17,474,636.59	15,805,654.30	90.45 %		86.19 %
Dic	862,859.82	826,164.00	18,337,496.41	16,631,818.30	90.70 %		90.70 %
Total	18,337,496.41	16,631,818.30					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar la calidad y eficiencia de los Servicios de Protección Especial, en corresponsabilidad con la familia y comunidad MEDIANTE actualización de normas técnicas y modelos de atención, capacitación, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de la política pública de protección especial para la atención de niñas, niños y adolescentes en riesgo o vulneración de sus derechos.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
MIES-007	Atención en Centros de Acogimiento Institucional
MIES-008	Erradicación del Trabajo Infantil
MIES-009	Atención en Acogimiento Familiar (Familia ampliada)
MIES-010	Erradicación progresiva de la mendicidad

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 33 EJECUCIÓN: Informe de ejecución y reformas presupuestarias de las casas de acogimiento mixtas	C.2.pdf	17/04/2015
2	ASOCIACION HITO 35: Informe de seguimiento de matriz de convenios 2014	C.4.pdf	17/04/2015
3	ASOCIACION Hito 36: Ejecución: Informe de seguimiento y ejecución presupuestaria a nivel desconcentrado	C.5.docx	17/04/2015
4	ASOCIACION HITO 3: Perfiles de convenios presentados a los distritos por parte de las organizaciones cooperantes	A.3.pdf	08/04/2015
5	ASOCIACION HITO 40: EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	C.9.pdf	17/04/2015
6	ASOCIACION HITO 84 :EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado.	H4..pdf	05/07/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
7	ASOCIACION HITO 85. EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado+	H.6.pdf	29/07/2016
8	Informe de la ejecución presupuestaria de Casa de Acogida "Dueña de Mi" SEPTIEMBRE	EJECU.PRESUPUET._DUÑA_DE_MI_SEPTIEMBRE.pdf	30/09/2015
9	Informe de la ejecución presupuestaria de CASA DE ACOGIDA DUEÑA DE MI, entregado	CASA_DUEÑA_DE_MI_30.10.2015.pdf	04/11/2015
10	Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Dueña de Mi-Machala, entregado	Informe_de_la_ejecución_presupuestaria_de_Centro_de_Acogida_Dueña_de_Mi-Machala_entregado.pdf	30/07/2015
11	ASOCIACION HITO 43:EJECUCIÓN: Informe del tercer desembolso de convenios a nivel distrital para todas las modalidades 2014	D.3.pdf	17/04/2015
12	ASOCIACION HITO 100 : Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada	J.1..pdf	04/05/2017
13	ASOCIACION HITO 101 : INFORME CONSOLIDADO DE LOS CONVENIOS SUCRITOS DE TODAS LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN	J.2.pdf	04/05/2017
14	ASOCIACION HITO 102 : EJECUCION: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	J.3..pdf	04/05/2017
15	ASOCIACION HITO 103 : EJECUCION: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.	J.4..pdf	16/05/2017
16	ASOCIACION HITO 105 : : Informe de la liquidación del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención	J.6.pdf	30/06/2017
17	ASOCIACION HITO 106 : : EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	J.7..PDF	01/08/2017
18	ASOCIACION HITO 107 : EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.	J.8.PDF	02/08/2017
19	ASOCIACION HITO 108 : EJECUCION: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.	J.9.PDF	20/09/2017
20	ASOCIACION HITO 109 : EJECUCION: Informe de la entrega del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.	K.2.PDF	20/09/2017
21	ASOCIACION HITO 110 : EJECUCION: Informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.	K.1.PDF	20/09/2017
22	ASOCIACION HITO 111 : Informe de la liquidación del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado	K.3.PDF	03/10/2017
23	ASOCIACION HITO 112: Informe de la liquidación del tercer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado	K.4.PDF	01/06/2018
24	ASOCIACION HITO 113: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto	K_5..PDF	27/12/2017
25	ASOCIACION HITO 99 : Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado	I.9..pdf	04/05/2017
26	ASOCIACION HITO. 53 Informe d ejecución presupuestaria a nivel zonal y distrital abril 2015	E.3.pdf	30/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
27	ASOCIACION : Informe de la ejecución presupuestaria de CASA ACOGIDA DUEÑA DE MI. 30.11.2015	EJECUCION_CASA_DUEÑA_DE_MI_30.11.2015.pdf	30/11/2015
28	ASOCIACION : Informe de la ejecución presupuestaria de CASA ACOGIDA DUEÑA DE MI. 30.12.2015	CASA_DUEÑA_DE_MI.pdf	31/12/2015
29	ASOCIACION Cronograma valorado para el 2015	D.6.xls	27/04/2015
30	ASOCIACION HITO 88: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto	H.9..pdf	07/11/2016
31	ASOCIACION HITO 89: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto	I.1.docx	05/12/2016
32	ASOCIACION HITO 1 - Ficha de costos de ETI	D.9.pdf	27/04/2015
33	ASOCIACION HITO 114: Informe final de gestión de la Gerencia, presentado.	K_6..PDF	27/12/2017
34	ASOCIACION HITO 115 Cierre y liquidación de convenios suscritos en el 2017, presentado.	K.7..pdf	03/04/2018
35	ASOCIACION HITO 116: PAPP 2018 aprobado	K.8..xls	14/06/2018
36	ASOCIACION HITO 117: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado	K.9..xlsx	14/06/2018
37	ASOCIACION HITO 118: Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención 2018	L.1..xlsx	14/06/2018
38	ASOCIACION HITO 119: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada	L.2..PDF	14/06/2018
39	ASOCIACION HITO 120: Cierre y liquidación de convenios suscritos en el año 2017	L.3..PDF	14/06/2018
40	ASOCIACION HITO 121: Consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención,	L.4.PDF	21/06/2018
41	ASOCIACION HITO 122 Y 126dup:Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado	L.5...PDF	25/06/2018
42	ASOCIACION HITO 123:Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado	L.6..PDF	25/06/2018
43	ASOCIACION HITO 124:Informe de gestión del primer cuatrimestral del proyecto.	L.7..PDF	26/06/2018
44	ASOCIACION HITO 127: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto.	L.8.PDF	27/07/2018
45	ASOCIACION HITO 129: Informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del proyecto de inversión.	L.9.PDF	21/09/2018
46	ASOCIACION HITO 130: Informe de la entrega del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención	M.1.PDF	21/09/2018
47	ASOCIACION HITO 131:Informe de la liquidación del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención.	M.2.pdf	26/10/2018
48	ASOCIACION HITO 1: ELABORACION PAPP 2014.	A.1.pdf	08/04/2015
49	ASOCIACION HITO 2. A - Proyecto Presentado a SENPLADES	A.2.pdf	23/04/2015
50	ASOCIACION HITO 26 - Informe de reformas presupuestarias	B.4.pdf	17/04/2015
51	ASOCIACION HITO 27: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar	B.5.pdf	17/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
52	ASOCIACION HITO 28: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional	B.6.pdf	17/04/2015
53	ASOCIACION HITO 29:EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Casa Hogar	B.7.pdf	17/04/2015
54	ASOCIACION HITO 30: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de erradicación del trabajo infantil.	B.8.pdf	17/04/2015
55	ASOCIACION HITO 34 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito.	C.3.pdf	27/04/2015
56	ASOCIACION HITO 37: Informe de ejecución presupuestaria y seguimiento de convenios por zona y distritos	C.6.pdf	17/04/2015
57	ASOCIACION HITO 38 EJECUCIÓN: Seguimiento liquidación de los convenios 1er desembolso.	C.7.pdf	17/04/2015
58	ASOCIACION HITO 39: EJECUCIÓN: Documento PAPP 2014 actualizado.	C.8.pdf	17/04/2015
59	ASOCIACION HITO 4 Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios.	A.4.pdf	09/04/2015
60	ASOCIACION HITO 41: EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria 2014	D.1.pdf	17/04/2015
61	ASOCIACION HITO 42: EJECUCIÓN Informe de cierre del Ejercicio fiscal 2014.	D.2.pdf	17/04/2015
62	ASOCIACION Hito 44 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito. 2014	D.4.pdf	17/04/2015
63	ASOCIACION HITO 45: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2015	D.5.pdf	27/04/2015
64	ASOCIACION HITO 46: EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para la modalidad de trabajo infantil de acuerdo al Registro Social, presentado - Redistribución de coberturas en ETI	D.7.pdf	27/04/2015
65	ASOCIACION HITO 5 -10 - Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Familiar y Ejecución presupuestaria	A.5.pdf	13/04/2015
66	ASOCIACION HITO 55. Informe numero de convenios firmados y cobertura en base al SIIMIES para las modalidades de AF,AI,ETI.M	E.1.pdf	30/04/2015
67	ASOCIACION HITO 59: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elías del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	E.7.pdf	31/08/2015
68	ASOCIACION HITO 64: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elías del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	F.1.pdf	30/09/2015
69	ASOCIACION HITO 65: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elías del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	F.4.pdf	04/11/2015
70	ASOCIACION HITO 66: EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad	F.6.pdf	30/11/2015
71	ASOCIACION HITO 67: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elías del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	F.5.pdf	30/11/2015
72	ASOCIACION HITO 68: EJECUCION_PRESUPUESTARIA_DESAGREGADA_POR_DISTritos_DIC_2015.pdf	F.7.pdf	05/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
73	ASOCIACION HITO 69: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016	F.8.xlsx	05/01/2016
74	ASOCIACION HITO 70: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2015.	F.9.pdf	05/01/2016
75	ASOCIACION HITO 71: Informe de Gestion del Proyecto	G.1.pdf	05/01/2016
76	ASOCIACION HITO 72: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas,	G.2.pdf	05/01/2016
77	ASOCIACION HITO 73: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016	G.3.xlsx	05/01/2016
78	ASOCIACION HITO 74: EJECUCION: Elaboracion de la ficha de costos con todas las modalidades de atención, aprobada	G4.xlsx	20/02/2016
79	ASOCIACION HITO 75: EJECUCION: Elaboracion de la ficha de proyecto para la suscripción de convenios en todas las modalidades de atención presentada.	G5..pdf	20/02/2016
80	ASOCIACION HITO 76: EJECUCIÓN: PAPP del proyecto de inversión 2016, aprobado.	G6..xlsx	20/02/2016
81	ASOCIACION HITO 77 EJECUCIÓN: Resdistribucion de cobertura y presupuesto nivel distrital para todas las modalidades de atención presentado.	G7..xls	20/02/2016
82	ASOCIACION HITO 78 EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado	G8.pdf	20/02/2016
83	ASOCIACION HITO 79 EJECUCIÓN: Informe consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención a nivel distrital	G.9.pdf	31/03/2016
84	ASOCIACION HITO 84 :EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado	H.5.pdf	05/07/2016
85	ASOCIACION HITO 86 EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	H.7.PDF	05/09/2016
86	ASOCIACION HITO 90-95 ELABORACIÓN PAPP 2017.	I.3.pdf	31/01/2017
87	ASOCIACION HITO 91,92 Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016	I.2..docx	06/01/2017
88	ASOCIACION HITO 93 Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	I.5.pdf	02/03/2017
89	ASOCIACION HITO 94:Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital	I.4.pdf	21/02/2017
90	ASOCIACION Hito 96: EJECUCIÓN: Ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada.	I.7..pdf	04/05/2017
91	ASOCIACION HITO 97. PAPP 2017 aprobado	I_6..pdf	04/05/2017
92	ASOCIACION HITO 98: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado 2017	I.8..pdf	04/05/2017
93	ASOCIACION HITO.54 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS ABRIL 2015	E.2.pdf	30/04/2015
94	ASOCIACION HITO.56 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS MAYO 2015	E.4.pdf	29/05/2015
95	ASOCIACION HITO.57 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS JUNIO 2015	E.5.pdf	30/06/2015
96	ASOCIACION HITO.58 INFORME EJECUCIÓN ACTIVIDAD DIA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL	E.6.pdf	30/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
97	ASOCIACION INFORME DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - MES ENERO 2015	D.8.pdf	27/04/2015
98	ASOCIADO HITO 11 - 12. Matriz de convenios, cobertura, ejecución pto por zona y distrito	A.6.ppt	13/04/2015
99	ASOCIADO HITO 23 - 24 Informe de Ejecución del Presupuesto, seguimiento de Convenios y Liquidación del primer desembolso a nivel desconcentrado	B.2.doc	13/04/2015
100	ASOCIADO HITO 104:EJECUCIÓN: Informe de gestión del primer cuatrimestral del proyecto, presentado.	J.5..pdf	16/05/2017
101	ASOCIADO HITO 13- 19. Informe de primer desembolso por zona y distrito	A.7.pdf	13/04/2015
102	ASOCIADO HITO 132: Informe de la entrega del tercer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención.	M.3.pdf	21/12/2018
103	ASOCIADO HITO 133: Informe final de gestión de la Gerencia, presentado.	M.4.pdf	09/01/2019
104	ASOCIADO HITO 134:EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	M.5.pdf	09/01/2019
105	ASOCIADO HITO 20 Informe a la Ejecución del presupuesto	A.8.pdf	13/04/2015
106	ASOCIADO HITO 21 Informe a la Ejecución del presupuesto mes Mayo 2014	A.9.pdf	13/04/2015
107	ASOCIADO HITO 22 Informe - Directrices Financieras para la ejecución presupuestaria de la partida 78	B.1.docx	13/04/2015
108	ASOCIADO HITO 25 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	B.3.docx	13/04/2015
109	ASOCIADO HITO 31: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de la Mendicidad	B.9.pdf	17/04/2015
110	ASOCIADO HITO 60: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito	E.8..pdf	31/08/2015
111	ASOCIADO HITO 61: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elías del Distrito García Moreno-Guayas,	E.9.pdf	31/08/2015
112	ASOCIADO HITO 62: Liquidación del primer desembolso modalidades acogimiento-mendicidad.trabajo infantil a nivel distrital	F.3.pdf	30/09/2015
113	ASOCIADO HITO 63: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito	F.2.pdf	30/09/2015
114	ASOCIADO HITO 80: INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS AÑO 2015 PRESENTADO	H.1.pdf	31/03/2016
115	ASOCIADO HITO 81: INFORME GESTIÓN CUATRIMESTRAL DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL ENERO-ABRIL 2016	H.2..pdf	04/05/2016
116	ASOCIADO HITO 82: EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del proyecto de inversión, presentado.	H.3.pdf	30/05/2016
117	ASOCIADO HITO 83: EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	H_4..pdf	01/07/2016
118	ASOCIADO HITO 87: EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado	H.8.pdf	03/10/2016
119	Informe de gestion -Reforma presupuestaria Ministerio de Finanzas.AGOSTO 2017	INF.AGOSTO_2017-REFORMA_PRES..PDF	05/09/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
120	PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL"	PROYECTO_DE_PROTECCION_ESPECIAL-1.pdf	14/06/2017
121	PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL"-2014-2021 PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DICTÁMENES DE PRIORIDAD Y/O DE APROBACIÓN	PROYECTO_2021-21-09-2018.pdf	21/09/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Torres León, Irina Xiomar	Gerente	Gerente del Proyecto Emblemático del Proyecto de Protección especial para Niños, Niñas y Adolescentes en situación de Vulnerabilidad en el País.	xiomar.torres@inclusio n.gob.ec	
