

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

PROYECTO: K001 Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.

Líder del Proyecto:	Morales Moncayo, Aida Monserrat (aida.morales@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Lara Cobo, Nelly Beatriz	Programas Relacionados:	
Titular:	Cobo Giler, José Alfonso	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.384446	TIR:	32.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	42,404,618.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,886,221.72
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	20/06/2019 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	26/06/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	León Suqui, Fernando David	Fecha del siguiente Hito:	15/07/2020

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto busca la sostenibilidad socio-económica de la población en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad, a través del acceso a servicios de inclusión económica como el crédito de desarrollo humano, capacitación y acompañamiento técnico; y el fortalecimiento de los servicios de inclusión social que permitan mejorar las condiciones de vida de la población en atención prioritaria principalmente niños, niñas y adultos mayores.

Beneficios Cualitativos

El proyecto tiene como beneficios:

1. Con el Crédito de Desarrollo Humano - CDH, la población logra su sostenibilidad socio-económica;
2. Con el Bono de Desarrollo Humano Variable - BDH-V, los núcleos familiares con hijos menores de edad, romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza;
3. Con la Pensión Mis Mejores Años - PMMA, se reduce la desigualdad de ingresos de las personas adultas mayores.

Tipo de Beneficiario

El proyecto está dirigido a 3 tipos de usuarios:

1. Hogares pobres y no pobres que recibirán un crédito de desarrollo humano;
2. Niños menores de 3 años de hogares extremadamente pobres que acceden al BDH-V y a servicios para la primera infancia;
3. Adultos mayores de hogares extremadamente pobres que reciben PMMA y tienen acceso a servicios de atención.


Restricciones

Alcance: Inclusión y exclusión de la base de datos del registro social 2018.
 Tiempo: El tiempo de ejecución es limitado hasta diciembre de 2022.
 Recursos: Liberación oportuna de la base de datos del registro social 2018.
 Costo: No se puede exceder los recursos definidos por la fuente de financiamiento.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 29.82 %
 Fecha de Inicio: 20/06/2019 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

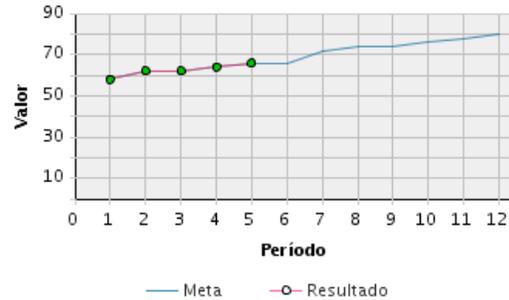

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	58 %	62 %	62 %	64 %	66 %	66 %	72 %	74 %	74 %	76 %	78 %	80 %
	Avance real acumulado											
	58 %	62 %	62 %	64 %	66 %							
Estado												
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Avance físico del proyecto en junio 2020: Informe de justificación para el reembolso por el valor máximo de USD 20 millones en cumplimiento del DLI 4, aprobado.	León Suqui, Fernando David	16/06/2020 - 04:46 PM
Avance físico del proyecto en mayo 2020: - Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 0.83 millones en cumplimiento del DLI 5, aprobado.	León Suqui, Fernando David	08/06/2020 - 03:29 PM
Avance físico del proyecto en abril 2020: - Actualización del Manual Operativo del Proyecto - MOP, aprobado.	León Suqui, Fernando David	13/05/2020 - 12:23 PM
Avance físico del proyecto en febrero 2020: - Plan de Adquisiciones para el Banco Mundial, aprobado; - Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre 2019 para el Banco Mundial, aprobado.	León Suqui, Fernando David	23/03/2020 - 02:32 PM
Avance físico del proyecto en enero 2020: - Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 6.1 millones en cumplimiento del DLI 3, aprobado. - Informe de reprogramación presupuestaria de ingresos (DLI) y gastos (Asistencia Técnica) 2020, 2021 y 2022 del Proyecto de Red de Protección Social (BIRF-8946-EC) conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado. - Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado. - Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2019, aprobado.	León Suqui, Fernando David	23/03/2020 - 02:29 PM
Avance físico del proyecto en diciembre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de diciembre 2019 elaborado. - Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR's de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años". - Términos de referencia - TDR de la Verificación Técnica elaborados. - Cotizaciones para la auditoría financiera recibidos.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 03:17 PM
Avance físico del proyecto en noviembre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de noviembre 2019 elaborado. - Términos de referencia - TDR para la contratación de la auditoría financiera elaborado. - Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados. - Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 11:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Avance físico del proyecto en octubre 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de octubre 2019 elaborado. - Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020 elaborado. - Informe de justificación del recorte presupuestario al proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado. - Plan operativo de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. 	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 11:07 AM
<p>Avance físico del proyecto en septiembre 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró un documento preliminar con el plan de adquisiciones. - Se realizó los términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados. 	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 10:13 AM
<p>Avance físico del proyecto en agosto 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo Ministerial Nro. 125 emitido por el MIES para calificar como emblemático al proyecto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES". - Acuerdo Ministerial emitido por el MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial. 	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 09:48 AM
<p>Avance físico del proyecto en Julio 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se suscribió el acta resolutive suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US\$ 350 millones. -Se firmó el acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US\$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social. 	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 09:36 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General. Si el Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES y el BanEcuador no se firma CAUSARÍA un impedimento en la entrega del Crédito de Desarrollo Humano - CDH a los beneficiarios.</p>	16/06/2020	Aida Monserrat Morales Moncayo	30 %	30	9	0/1
<p>5- PROYECTO. * General. Variación en la fecha en la liberación del Registro Social 2018 CAUSARÍA demora en la entrega de las transferencias monetarias a los beneficiarios.</p>	16/06/2020	Aida Monserrat Morales Moncayo	30 %	30	9	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición: Acta resolutive suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US\$ 350 millones.	Z - Compromiso Ministerial	10/07/2019		10/07/2019		Sí	3.0
2	Planeación: Acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US\$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	Z - Compromiso Ministerial	22/07/2019		22/07/2019		Sí	3.0
3	Planeación: Acuerdo Ministerial emitido por la Ministra del MIES para calificar como emblemático al proyecto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".	Z - Compromiso Ministerial	14/08/2019		14/08/2019		Sí	3.0
4	Planeación: Acuerdo Ministerial por la Ministra del MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	Z - Compromiso Ministerial	27/08/2019		27/08/2019		Sí	3.0
5	Ejecución: Plan de Adquisiciones elaborado.	4-Inicio de Trabajo	20/09/2019		20/09/2019		Sí	3.0
6	Ejecución: Términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.	9-Entregables Formales	27/09/2019		27/09/2019		Sí	2.0
7	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de octubre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	04/10/2019		04/10/2019		Sí	2.0
8	Ejecución: Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	18/10/2019		18/10/2019		Sí	3.0
9	Ejecución: Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	21/10/2019		21/10/2019		Sí	3.0
10	Ejecución: Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020 elaborado.	9-Entregables Formales	21/10/2019		21/10/2019		Sí	3.0
11	Ejecución: Informe de justificación del recorte presupuestario al proyecto "Diseño e Implementación	9-Entregables Formales	22/10/2019		22/10/2019		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.							
12	Ejecución: Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado.	9-Entregables Formales	23/10/2019		23/10/2019		Sí	2.0
13	Ejecución: Plan operativo de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	2.0
14	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de noviembre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	05/11/2019		05/11/2019		Sí	2.0
15	Ejecución: Términos de referencia - TDR para la contratación de la auditoría financiera elaborado.	9-Entregables Formales	20/11/2019		20/11/2019		Sí	2.0
16	Ejecución: Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados.	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	2.0
17	Ejecución: Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	2.0
18	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de diciembre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	05/12/2019		05/12/2019		Sí	2.0
19	Ejecución: Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR's de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años".	9-Entregables Formales	10/12/2019		10/12/2019		Sí	2.0
20	Ejecución: Términos de referencia - TDR de la Verificación Técnica elaborados.	9-Entregables Formales	10/12/2019		10/12/2019		Sí	2.0
21	Ejecución: Cotizaciones para la auditoría financiera recibidos.	9-Entregables Formales	15/12/2019		15/12/2019		Sí	2.0
22	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 6.1 millones en cumplimiento del DLI 3, aprobado.	5-Entregables Intermedios	06/01/2020		06/01/2020		Sí	2.0
23	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2019, aprobado.	9-Entregables Formales	10/01/2020		10/01/2020		Sí	2.0
24	Planeación: Programación de ingresos (DLI) y gastos (Asistencia Técnica) 2020, 2021 y 2022 del Proyecto de Red de Protección Social	9-Entregables Formales	14/01/2020		14/01/2020		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(BIRF-8946-EC) conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.							
25	Planeación: Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.	Z - Compromiso Ministerial	16/01/2020		16/01/2020		Sí	2.0
26	Ejecución: Plan de Adquisiciones para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	11/02/2020		11/02/2020		Sí	2.0
27	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre 2019 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	14/02/2020		14/02/2020		Sí	2.0
28	Ejecución: Actualización del Manual Operativo del Proyecto - MOP, aprobado.	9-Entregables Formales	08/04/2020		08/04/2020		Sí	2.0
29	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 0.83 millones en cumplimiento del DLI 5, aprobado.	9-Entregables Formales	18/05/2020		18/05/2020		Sí	2.0
30	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	15/07/2020	15/07/2020			No	2.0
31	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública ejecutado primer semestre 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	20/07/2020	20/07/2020			No	2.0
32	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 5 millones en cumplimiento del DLI 6, aprobado.	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	2.0
33	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre del 2020 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	14/08/2020	14/08/2020			No	2.0
34	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por un valor máximo de USD 60.6 millones en cumplimiento del DLI 7, aprobado.	9-Entregables Formales	15/10/2020	15/10/2020			No	2.0
35	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor máximo de USD 20 millones en cumplimiento del DLI 4, aprobado.	9-Entregables Formales	16/11/2020	16/11/2020			No	2.0
36	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública ejecutado segundo semestre 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	30/12/2020	30/12/2020			No	2.0
37	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del	9-Entregables Formales	29/01/2021	29/01/2021			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	segundo semestre de 2020, aprobado.							
38	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre de 2020 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	15/02/2021	15/02/2021			No	2.0
39	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2021, aprobado.	9-Entregables Formales	16/07/2021	16/07/2021			No	2.0
40	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre de 2021 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	13/08/2021	13/08/2021			No	2.0
41	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2021, aprobado.	9-Entregables Formales	14/01/2022	14/01/2022			No	2.0
42	Ejecución: Informe de financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre de 2021 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	15/02/2022	15/02/2022			No	2.0
43	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2022, aprobado.	9-Entregables Formales	15/07/2022	15/07/2022			No	2.0
44	Ejecución: Informe de financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre de 2022 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	15/08/2022	15/08/2022			No	2.0
45	Cierre: Informe de financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre de 2022 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	30/12/2022	30/12/2022			No	2.0
46	Cierre: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2022, aprobado.	9-Entregables Formales	30/12/2022	30/12/2022			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de usuarios del MIES fortalecidos en los servicios de inclusión económica y social.		-	-	-	01/01/2020	-
2	Número de informes de ejecución del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".		100.00 %	1	1	01/07/2019	Jul-Dic

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
3	Número de informes financieros a nivel desconcentrado conforme a las Misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años"		100.00 %	1	1	01/07/2019	Jul-Dic
4	Número de procesos de contratación que incluye verificación técnica y auditoría financiera iniciados		33.33 %	6	2	01/07/2019	Jul-Dic
5	Número de manuales operativos presentados al Banco Mundial.		100.00 %	1	1	01/07/2019	Jul-Dic
6	Entregar Créditos de Desarrollo Humano - CDH a los usuarios beneficiarios de los programas de inclusión económica.		-	-	-	01/01/2020	-
7	Elaborar instrumentos para servicios de inclusión económica y social y fortalecer las microredes de emprendimiento, capacidades y acceso a mercados, modalidades de Crédito de Desarrollo Humano - CDH y una estrategia de tecnología social.		-	-	-	01/01/2020	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,886,221.72 **
Costo Total:	180,486,200.00
Total Devengado:	118,886.70
% Costo Total Devengado:	0.07 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.07 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	161,722.29	6,835,807.05	0.00	6,997,529.34
Ppto. Externo Planeado	66,943,285.71	0.00	0.00	66,943,285.71
Ppto. Aprobado Inicial	61,604.52	11,200,000.00	0.00	11,261,604.52
Ppto. Codificado	61,604.52	6,835,807.05	0.00	6,897,411.57
Ppto. Comprometido	50,414.67	116,035.82	0.00	166,450.49
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	67,105,008.00	6,835,807.05	0.00	73,940,815.05
Ppto. Devengado	50,414.67	68,472.03	0.00	118,886.70
Pagado Real	50,414.67	65,503.03	0.00	115,917.70
Estimado a fin de año	* 50,414.67	6,835,807.05	0.00	6,886,221.72
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	67,054,593.33	0.00	0.00	67,054,593.33
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.08 %	1.00 %	0.00 %	0.16 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	13,522.76	0.00	13,522.76	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	13,522.76	11,536.48	27,045.52	11,536.48	42.66 %		0.17 %
Mar	13,522.76	26,262.81	40,568.28	37,799.29	93.17 %		0.55 %
Abr	13,522.76	764.83	54,091.04	38,564.12	71.29 %		0.56 %
May	20,665.71	12,032.37	74,756.75	50,596.49	67.68 %		0.74 %
Jun	27,569.63	17,875.54	102,326.38	68,472.03	66.92 %		1.00 %
Jul	398,254.43		500,580.81				
Ago	586,481.78		1,087,062.59				
Sep	1,411,270.11		2,498,332.70				
Oct	1,498,206.39		3,996,539.09				
Nov	2,024,442.84		6,020,981.93				
Dic	814,825.12		6,835,807.05				
Total	6,835,807.05	68,472.03					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la efectividad en la prestación de los servicios financieros y no financieros a los usuarios del BDH, BDHV y Pensiones MEDIANTE la implementación de acuerdos interinstitucionales generados con carácter popular y solidario.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta resolutive suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US\$ 350 millones.	2._Acta_Resolutiva_Nro_19_del_2019-07-10.pdf	24/12/2019
2	Acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US\$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	3._Acuerdo_de_Pre	24/12/2019
3	Acuerdo Ministerial emitido por el MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	6._Acuerdo_Ministerial_Nro._128_MOP.pdf	24/12/2019
4	Acuerdo Ministerial emitido por la Ministra del MIES para calificar como emblemático al proyecto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".	7._Acuerdo_Ministerial_Nro._125_Proj_Embl.pdf	24/12/2019
5	Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados.	14._Anexo_2_-_Certificacio	24/12/2019
6	Cotizaciones para la auditoría financiera recibidas	Cotizaciones_Auditori	24/12/2019
7	Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR's de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años".	Informe_1er_Reembolso_BIRF-8946.pdf	24/12/2019
8	Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	Incremento_presupuestario_del_proyecto_DISIES.pdf	24/12/2019
9	Informe de justificación del recorte presupuestario al proyecto DISIES.	Justificacio	24/12/2019
10	Informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Presupuestaria del 2do semestre de 2019	Informe_Seg_y_Eval_Presupuestaria.pdf	12/02/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	Informe Desembolso DLI 3 Aprobado por el Banco Mundial	Informe_Desembolso_DLI_3_Aprobado_BM.zip	12/02/2020
12	Informe Desembolso DLI 5 Aprobado por el Banco Mundial	Informe_Desembolso_DLI_5_Aprobado_BM.zip	08/06/2020
13	Informe Financiero Interino IFR del 2do Semestre de 2019	Informe_Financiero_Interino_IFR_2do_Sem_2019.zip	23/03/2020
14	Informe Técnico del Proyecto Red de Protección Social en Aplicación del Acuerdo Ministerial 001	Informe_Te	12/02/2020
15	Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.	Informe_Te	12/02/2020
16	Manual Operativo del Proyecto - MOP 2020-04-08	Manual_Operativo_del_Proyecto_Actualizado_al_08_Abril_2020.pdf	23/05/2020
17	Plan anual de la política pública - PAPP de diciembre de 2019	PAPP_2019-12-04.xls	24/12/2019
18	Plan anual de la política pública - PAPP de noviembre de 2019	PAPP_2019-11-05.xls	24/12/2019
19	Plan anual de la política pública - PAPP de octubre de 2019	PAPP_2019-10-02.xls	24/12/2019
20	Plan de Adquisiciones Banco Mundial 2020/02/11	Plan_de_Adquisiciones_para_el_Banco_Mundial_aprobado_2020.pdf	23/03/2020
21	Plan de Adquisiciones elaborado.	Plan_de_Adquisiciones_2019-09-21.xlsx	24/12/2019
22	Plan operativo anual de los proyectos RSS y DISIES	Plan_Operativo_Anual_RSS-DISIES.xlsx	24/12/2019
23	Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto DISIES.	Proforma_Presupuestaria_2020.xls	24/12/2019
24	Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto.	Programacio	24/12/2019
25	Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020.	Reporte_Ajuste_Techos_Presupuestarios_2020_.xlsx	24/12/2019
26	Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado.	Reporte_de_Gasto_Retroactivo_y_no_Retroactivo_de_las_Misiones_2019.pdf	24/12/2019
27	Términos de referencia - TDR para la auditoría Técnica elaborados.	TDR_Auditori	24/12/2019
28	Términos de referencia - TDR para la verificación técnica elaborados.	TDR_Verificacio	24/12/2019
29	Términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.	TDR_de_los_Especialistas.pdf	24/12/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Morales Moncayo, Aida Monserrat	Lider del proyecto	Gerente Proyecto	aida.morales@inclusion.gob.ec	
