

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

PROYECTO: K003 Fortalecimiento, ampliación e innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura.

Líder del Proyecto:	Pérez Ruales, Nicole Alexandra (nicole.perez@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jalón Garces, Alba Lorena	Programas Relacionados:	IE-MT-MISION TERNURA
Titular:	Vergara Linto, Juana Katherine	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.383775	TIR:	46.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	214,811,888.16
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	47,760,735.61
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2019 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	07/07/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Palma Arias, Andrea Margarita	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2020

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones en la calidad de los servicios de desarrollo infantil a través de las modalidades CDI, CNH y CCRA para niñas y niños de 0 a 3 años de edad y mujeres gestantes, mediante estrategias de articulación intersectorial y el involucramiento de la familia para el Desarrollo Infantil Integral lo que permitirá mejorar la priorización de los mismos e incrementar año tras año, usuarios en la modalidad CCRA, enfocada al fortalecimiento del tejido social a través de consejerías grupales y apoyos nutricionales en zonas de alta dispersión, emergencia o vulnerabilidad. Para conseguir los objetivos planteados se han establecido los siguientes componentes:

1. Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil.
2. Calidad de la Gestión de Servicios de Desarrollo Infantil.
3. Marco Normativo e Institucional para la Primera Infancia.
4. Personal técnico - operativo capacitado para cubrir la nueva cobertura de los Servicios de Desarrollo Infantil.
5. Evaluación del Proyecto.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la calidad estructural y de procesos de los servicios de desarrollo infantil.

Tipo de Beneficiario

*Niños menores de 3 años y madres gestantes, que se encuentran en áreas focalizadas y en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que residan en zonas de menor consolidación y zonas de mayor dispersión geográfica y poblacional, o que atraviesan situaciones de emergencia o requieren de atención prioritaria (96 cantones priorizados).

* Técnicos de Desarrollo Infantil Integral a nivel nacional.

Restricciones

Alcance: A nivel nacional

Tiempo: El tiempo de ejecución es limitado por el número de personal asignado al proyecto.


Costo: Falta de asignación presupuestaria

Recursos: Personal limitado para la ejecución del proyecto / Rotación de funcionarios y analistas.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 29.19 %
 Fecha de Inicio: 01/02/2019 Fecha de Fin: 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

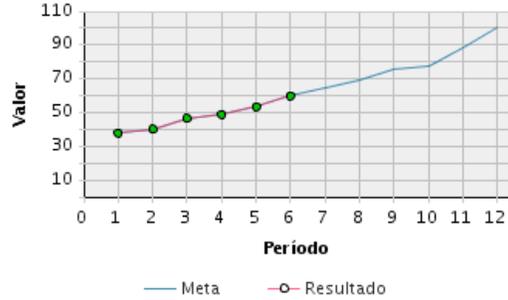

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	38 %	40 %	47 %	49 %	53 %	60 %	64 %	69 %	75 %	78 %	89 %	100 %
	Avance real acumulado											
	38 %	40 %	47 %	49 %	53 %	60 %						
Estado												
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Junio 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación en Taller de arranque parte 2, para revisión del contrato de préstamo 4607/OC-EC "Inversión en calidad de los servicios de Desarrollo Infantil". - Envío de respuestas al MEF con los avances de los acuerdos alcanzados entre el MIES, BID y MEF en las reuniones de revisión de cartera del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC y Contrato de Préstamo 4634/OC-EC. - Trabajo en equipo con a la Subsecretaría de Discapacidades y Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, asesorando en los temas de adquisiciones y en la elaboración de la documentación precontractual. - Socialización del ROP contrato de préstamo L1236, a la Subsecretaría de Discapacidades, detallando los responsables y sus actividades. - Coordinación con Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral y el BID, para la determinación de la línea base y evaluación de impacto del proyecto L1235. - Envío de la solicitud de aprobación del Equipo de Gestión de los proyectos L1235 y L1236, al MEF con base en los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida el 08 de junio. Mef otorga no objeción para la contratación de 5 especialistas en total. - Elaboración de ajustes a la propuesta de ROP L1235, con base en observaciones del BID, previo envío de la solicitud de no objeción al BID. - Ajuste de Términos de Referencia del Equipo de Gestión, PEP, Plan de Adquisiciones y SEPA, de los proyectos L1235 y L1236, con base en los acuerdos alcanzados con el MEF y BID. - Actualización del Cronograma Valorado del Proyecto Misión Ternura. - Envío de memorando a la Dirección de Comunicación Social, para la publicación de los perfiles del equipo de gestión en la página web del MIES. - Gestión para el envío de solicitudes de certificaciones plurianuales una vez que el BID remitió la no objeción respecto a los pliegos para la contratación de auditorías financieras del Préstamo 4607/OC-EC. - Armonización del PAP con base en el recorte presupuestario remitido por el MEF, Proyecto Misión Ternura. - Acompañamiento a los Administradores en la ejecución de los contratos de las LPI1 y LPI2, Préstamo 4607/OC-EC. - Revisión y envío al BID de formulario de reconocimiento de gastos del Contrato de Talleres de Capacitación para el Fortalecimiento de Capacidades de los Sistemas Especializados de Protección Integral de Derechos. - Envío de comunicaciones para las Subsecretarías de Desarrollo Infantil Integral y de Discapacidades con el seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas y pendientes, de acuerdo a la información del PEP. - Inicio de elaboración de Informes Semestrales de los préstamos L1235 y L1236, para envío al BID. 	Palma Arias, Andrea Margarita	05/07/2020 - 03:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mayo 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación de la revisión de cartera del contrato de préstamo L1235, con el MEF, BID, seguimiento a compromisos y remisión de informe - Reunión con el BID y el equipo de la Subsecretaría de Protección Especial, para analizar el cambio de actividades del ATN considerando que por la emergencia del COVID no se podrá aplicar la encuesta prevista para el 2020. - Envío de oficio con la Justificación de Gastos, ficha de Desembolsos y Estado de Gastos al MEF préstamo L1235. - Gestión de observaciones del BID al formulario de reconocimiento de gastos del Contrato de talleres de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de los Sistemas Especializados de Protección Integral de Derechos. - Comunicación con la Coordinación de Planificación para conocer el estado del Proyecto y el CUP del Contrato de Préstamo "Inclusión de la Población Migrante y Receptora en los Servicios Sociales en Ecuador" (EC-L1258). - Seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas, de acuerdo al PEP, remitiendo comunicación con el detalle de actividades pendientes y las que deben ejecutarse durante mayo, préstamo L1235. - Remisión de PEP y PMR mediante Oficio Nro. MIES-SDII-FAISDI-2020-0028-O actualizados y ajustados del préstamo L1235, para revisión y aprobación del BID y actualización en sistema SEPA. - Envío de los informes técnicos de justificación para la contratación de los equipos de gestión al MEF, de los contratos de préstamo 4607/OC-EC y 4634/OC-EC. - Seguimiento al estado de los documentos precontractuales enviados a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a fin de obtener aprobación. - Elaboración del borrador de la propuesta del ROP L1235 previo envío de la solicitud de no objeción al BID. - Reprogramación al PAP con base en la última versión del PEP del préstamo L1235. - Coordinación y análisis de los saldos pendientes para liquidación de haberes de los ex servidores del Proyecto Misión Ternura 2020 en territorio. - Actualización de los cronogramas valorados de la Gerencia Misión Ternura. - Envío de herramientas de gestión, correspondientes al préstamo L1236, actualizadas y ajustadas para revisión y aprobación del BID. Elaboración de cronogramas valorados - Se expide el Acuerdo Ministerial No. 028 con fecha 30 de mayo, mediante el cual la Máxima Autoridad aprueba el ROP del Contrato de Préstamo No. 4634/OC-EC. - Reunión para presentación y revisión del ROP 1236, al Equipo de la Subsecretaría de Discapacidades. 	<p>Palma Arias, Andrea Margarita</p>	<p>05/06/2020 - 09:31 AM</p>
<p>Abril 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización del ROP L1235, preparación de matriz de cambios y/o reformas, además de la revisión y estructuración de propuestas a partir del nuevo ROP L1236. - Análisis para el incremento del presupuesto y la emisión de la reforma presupuestaria de los saldos disponibles para el pago de liquidaciones de haberes 2019 y 2020. - Seguimiento al cumplimiento de la planificación de acuerdo a la información del PEP Préstamo 4607/OC-EC, detallando las actividades que se encuentran pendientes y las que deben ejecutarse durante todo el mes. - Participación en la coordinación y en el seguimiento al proceso de Transferencia para la Asistencia de Alimentación para hogares en vulnerabilidad transitoria. Reunión de coordinación para asistencia humanitaria con ONG CARE, Plan Internacional y Child Found por la emergencia del COVID-19. Elaboración de informe de viabilidad con al incorporación de un apartado de marco teórico (del manual esfera). - Aprobación del Informe Técnico de Viabilidad y solicitud de no objeción al ROP Contrato de Préstamo 4634/OC-EC "Programa de Apoyo a la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en Ecuador". - Envío del Plan de Adquisiciones al BID para aprobación, Préstamo 4607/OC-EC. - Reunión de gerencia para analizar y validar las actividades, productos y presupuestos de los contratos de préstamos considerando las directrices presupuestarias emitidas por el MEF para el segundo trimestre 2020. - Elaboración de propuesta de PMR del préstamo L1235 para presentación a las máximas autoridades sobre la nueva reprogramación del crédito. - Participación en reunión con el equipo del BID, Viceministra e Inclusión Social, Subsecretaría de Desarrollo Infantil para revisión de actividades del préstamo L1235 con base a emergencia COVID19 - Participación en la reunión para revisión de cartera del préstamo L1236 con el BID, Secretaría de Planificación, Ministerio de Finanzas y equipo técnico del MIES. - Mediante reuniones virtuales se trabajó en la revisión de herramientas de gestión PEP, PMR y equipo técnico del préstamo L1236. 	<p>Palma Arias, Andrea Margarita</p>	<p>05/05/2020 - 11:04 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con el equipo sectorial del BID para priorizar los contratos de los préstamos L1235 y L1236, tomando en cuenta la situación actual por la emergencia del COVID19 		
<p>Marzo 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión con el equipo sectorial del BID a fin de validar el cambio del valor de la línea base 2017 de 49,85% a 54,31% del indicador de resultados del componente 1: "Calidad Estructural CNH: Ratio promedio de porcentajes de visitas efectivas CNH por niño de 0-18 meses, del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC. - Revisión de la última versión del PEP y del PMR, donde se ajustó la reprogramación respecto al Acuerdo 001 del MEF. Con lo que queda aprobada la nueva tabla de costos del contrato de préstamo. -Análisis del diseño del componente 1 del Préstamo 4607/OC-EC y revisión del estado de contratación de la consultoría de Guía y contenidos CDI para el soporte en la definición de TDRs y la consecución de los productos, con el equipo del BID y la Subsecretaría de Desarrollo Infantil. - Elaboración y ajuste de las herramientas para dar cumplimiento a las condiciones previas del Préstamo 4634/ OC-EC "Apoyo a la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en Ecuador". (ROP- matriz de resultados y PEP) - Mediante reuniones virtuales se trabajó en las herramientas: Matriz de resultados y Plan de ejecución del proyecto (PEP). - Realización del taller de arranque del Préstamo 4634/ OC-EC, en los que se realizaron ajustes a las herramientas y validación con el equipo fiduciario del BID. - Posteriormente se mantuvieron reuniones para ajustar el PEP con base a los lineamientos del BID considerando también la situación de emergencia del país y los plazos establecidos para los procesos de contratación. - Taller de capacitación en el sistema SEPA al equipo de la Gerencia Misión Ternura. - Reuniones para la definición del nuevo préstamo emergente para la entrega del bono por concepto de la emergencia sanitaria a la población más vulnerable a cargo del Viceministerio de Inclusión Económica. - Envío de los informes para la aplicación del acuerdo ministerial 001 del MEF de los siguientes contratos: Préstamo No. 4607/OC-EC- Programa "Inversión en Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil", se remitió el informe con la reprogramación del presupuesto y actividades, se solicitó la cancelación parcial del préstamo; del Contrato de préstamo 4634/OC-EC, "Componente 3 (MIES): Proyecto: "Fortalecimiento a la gestión e innovación en el cuidado de personas con discapacidad severa"; y del Contrato de préstamo 4923/OC-EC, se envió el Informe con el Componente 1 "Protección social de población migrante y receptora vulnerable". -Se informó a la Administradora del Contrato que se efectuó el pago de los antipios de la LPI1 y LPI2 por lo que empezó a correr el plazo de los contratos, para sus acciones pertinentes. -Ajustes permanentes a la planificación y presupuesto programado considerando las reformas y disminuciones al presupuesto que realizó el MEF. 	<p>Palma Arias, Andrea Margarita</p>	<p>03/04/2020 - 11:09 AM</p>
<p>Febrero 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armonización del PAPP con la cédula presupuestaria, solicitando las reformas respectivas para la corrección de los organismos y correlativos entre fuentes de financiamiento. - Seguimiento permanente a la Coordinación Administrativa Financiera y al MEF para la corrección y reforma presupuestarias a fin de que todos los pagos por concepto de remuneración del grupo sean cancelados. - Ajuste de las herramientas de gestión (PEP, PMR, PA, Plan Financiero y Flujo de caja) del contrato de préstamo 4607/OC-EC para dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial 001 del Ministerio de Economía y Finanzas en lo referente al PEP se propuso la desactivación de algunos productos del componente 3 por no ser competencia del MIES sin que afecten el indicador de resultados. - Elaboración y revisión de los TDR y solicitudes de propuesta para el equipo de gestión y coordinador del Préstamo 4607/OC-EC. De igual manera, se realizó la valoración de las hojas de vida para la determinación de las calificaciones. - Revisión y envío de observaciones a los TDRs del equipo técnico remitido por la Subsecretaría de Desarrollo Infantil a fin de que se inicie el proceso precontractual. - Elaboración y revisión de los TDR y pliegos para la contratación de la auditoría externa del contrato de préstamo 4607/OC-EC y de la ATN/MG-16956-EC. - Coordinación con la Subsecretaría de Discapacidades y el BID para el cumplimiento de las condiciones previas para la elegibilidad del préstamo 4634/OC-EC. - Programación 2020 en el módulo SIPeIP del proyecto de inversión con base a presupuesto asignado 2020. - Se preparó la información adicional sobre el Seguimiento y Evaluación de Ejecución Presupuestaria Institucional del año 2019. - En el mes de febrero se coordinaron varias reuniones interinstitucionales con el Equipo Consultor del BID. - Reuniones periódicas con el MEF a fin de cumplir con las obligaciones financieras pendientes del Proyecto. 	<p>Palma Arias, Andrea Margarita</p>	<p>12/03/2020 - 03:45 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Se ha puesto en conocimiento y aprobación del Viceministerio de Inclusión Social el Informe Técnico de Viabilidad FAISDI-2020-001 para la reforma de los Acuerdos Ministeriales 120 y 127.</p>		
<p>Enero 2020</p> <p>.Reuniones situacionales para establecer la planificación del año 2020 del proyecto considerando el Acuerdo Ministerial 001 emitido por el MEF, en el que se establece que en los proyectos con financiamiento externo el monto del IVA se incluya en los recursos del préstamo</p> <p>.Revisión y propuesta del organigrama del equipo de gestión (fiduciario) de todos los convenios (préstamos y ATNs) con fondos BID.</p> <p>.Elaboración de informe semestral de progreso del contrato de préstamo 4607 (período 01 de julio al 31 de diciembre de 2019) anexos (PEP, PMR, Flujo de caja, PA, Plan Financiero y Matriz de Riesgos).</p> <p>.Definición de la planificación PAPP 2020 del Proyecto con base en techo presupuestario aprobado</p> <p>.Informe institucional para el MEF sobre la ejecución presupuestaria y avances físicos del proyecto.</p> <p>.Informe semestral para reporte al SIPeP sobre avances físicos del Proyecto Mision Ternura.</p> <p>.Elaboración de instrumentos para el Plan Anual Comprometido (PAC) 2020 e insumos GPR- establecimiento de hitos e indicadores para el 2020.</p> <p>.Regularización de reporte de resumen ejecutivo, ejecución presupuestaria, reporte de hitos del último trimestre de 2019.</p> <p>.Revisión de la metodología de la evaluación del impacto del préstamo 4607 a fin de iniciar la medición de la línea base.</p> <p>.Gestiones pertinentes para dar seguimiento al pago de los valores devengados de anticipos de procesos de licitación y contratación realizados en el 2019.</p> <p>.Asesoría a los equipos de las Subsecretarías para elaboración de los TDRs de los equipos técnicos (figura de consultoría).</p> <p>.Propuesta de acuerdo ministerial para delimitar la autorización de gasto dependiendo de las fuentes de financiamiento para que en cada proyecto se tenga claramente establecidas las atribuciones y responsabilidades de cada autoridad delegada, lo que mejoraría la articulación y ejecución de los mismos.</p> <p>.Gestiones para iniciar los procesos precontractuales para la contratación del equipo ejecutor, equipo técnico y auditoría externa.</p>	<p>Palma Arias, Andrea Margarita</p>	<p>12/02/2020 - 03:35 PM</p>
<p>Diciembre 2019</p> <p>Culminación de los procesos de licitación pública internacional</p> <p>1.Licitación Pública Internacional LPI01 para la adquisición de 2016 KITS de material didáctico CDI y 4939 KITS para CNH.</p> <p>2.Licitación Pública Internacional LPI02 para la adquisición de 2016 KITS de material impreso y 4939 CNH.</p> <p>Contratación de 4 consultores, los cuales tienen como objetivo 1. Capacitación en protección de derechos NNA 2. Elaborar propuestas de normativas para protección de derechos de NNA en el marco del contrato de préstamo 4607 3. Mecanismos en participación ciudadana 4. Construcción de implementación del sistema de información de igualdad y no discriminación con prioridad en protección integral NNA, los consultores procedieron con la entrega de los productos establecidos en los TDRs.</p> <p>Entrega de los productos de la consultoría para elaborar la Ley de Política de la Primera Infancia por un valor de \$ 35.000,00</p> <p>Contratación de talleres de capacitación en consulta nacional a niños, niñas y adolescentes realizados en noviembre y diciembre.</p> <p>En el mes de diciembre se devengó un presupuesto total de: \$3.028.212,25</p> <p>Información tomada del informe de fin de gestión del Ing. Carlos Caicedo Valladares remitido mediante Memorando Nro. MIES-SDII-FAISDI-2019-0228-M de fecha 31 de diciembre de 2019</p>	<p>Palma Arias, Andrea Margarita</p>	<p>07/01/2020 - 03:03 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>Avance en la ejecución de los procesos de licitación pública internacional</p> <p>1.Licitación Pública Internacional LPI01 para la adquisición de 2016 KITS de material didáctico CDI y 4939 KITS para CNH.</p> <p>2.Licitación Pública Internacional LPI02 para la adquisición de 2016 KITS de material impreso y 4939 CNH.</p>	<p>Palma Arias, Andrea Margarita</p>	<p>07/01/2020 - 02:33 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Contratación de 4 consultores, los cuales tienen como objetivo 1. Capacitación en protección de derechos NNA 2. Elaborar propuestas de normativas para protección de derechos de NNA en el marco del contrato de préstamo 4607 3. Mecanismos en participación ciudadana 4. Construcción de implementación del sistema de información de igualdad y no discriminación con prioridad en protección integral NNA, actualmente los consultores están entregando productos para proceder al pago.</p> <p>En el mes de noviembre se devengó un presupuesto total de: \$1.498.008.28</p> <p>Información tomada del informe de fin de gestión del Ing. Carlos Caicedo Valladares remitido mediante Memorando Nro. MIES-SDII-FAISDI-2019-0228-M de fecha 31 de diciembre de 2019</p>		
OCTUBRE 2019. Avance en la ejecución de los procesos de licitación pública internacional (LPI 01 y LPI 02) para el equipamiento e impresión de material para los CDI y CNH a nivel nacional.	Palma Arias, Andrea Margarita	06/01/2020 - 12:02 PM
SEPTIEMBRE 2019. El proyecto se enfoca a la sistematización de datos para el Informe mensual de seguimiento a la ejecución enmarcadas al Modelo de Gestión territorial establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.	López Moreta, José Luis	14/10/2019 - 02:34 PM
AGOSTO 2019. Elaboración de Término de Referencia para realizar la impresión de material didáctico; pliegos aprobados por parte del BID respecto a los insumos para la normativa nacional de niños, niñas y adolescentes, e Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria; todas estas acciones enmarcadas al Modelo de Gestión territorial establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.	López Moreta, José Luis	14/10/2019 - 02:33 PM
JULIO 2019: El proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y continuar con la consecución de los hito previstos para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil, adicional se presenta a la Dirección de Seguimiento el Informe mensual a la ejecución presupuestaria.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:29 PM
JUNIO 2019: Elaboración de Términos de Referencia para realizar la contratación de los especialistas del equipo de gestión del proyecto BID "Inversión en Calidad de los Servicios" y elaboración de Términos de Referencia para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil en aplicación al Modelo de Gestión territorial en función a lo establecido en el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:29 PM
MAYO 2019: Consecución de procesos para avanzar en la realización de los Términos de Referencia para la Impresión de material didáctico y/o curricular.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:28 PM
ABRIL 2019: Elaboración y envío de Términos de Referencia para la Adquisición de material didáctico CDI y CNH los cuales son procesos de Licitación Pública Internacional.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:28 PM
MARZO 2019: La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), emite el Dictámen de Prioridad al Proyecto y se presenta a la Dirección de Seguimiento el Informe mensual a la ejecución presupuestaria.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:27 PM
FEBRERO 2019: Se obtuvo la aprobación del PAPP del proyecto, en las partidas presupuestarias y se redistribuyó a cada Entidad Operativa Desconcentrada (EOD), para el arranque del proyecto.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:27 PM
ENERO 2019: El proyecto realizó acciones para la asignación de recursos presupuestarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, al proyecto.	López Moreta, José Luis	29/08/2019 - 03:26 PM
JULIO 2019: El proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y continuar con la consecución de los hito previstos para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil	López Moreta, José Luis	12/08/2019 - 03:06 PM
JUNIO 2019: Con el objetivo de garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, el proyecto realiza las acciones iniciales para contar con un espacio presupuestario y empezar procesos de contratación	López Moreta, José Luis	11/07/2019 - 04:37 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Político. Demoras en la asignación y/o no asignación de presupuesto en fuente BID y de contrapartida necesarios	06/07/2020	Nicole Alexandra Pérez Ruales	80 %	90	72	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
para iniciara ejecución del Programa CAUSARIA retraso en la consecución de los productos planificados, lo cual afecta el desempeño del Programa						
2- NACIONAL. * General. Las adquisiciones no cumplen los requisitos de calidad en la elaboración de TDR, especificaciones técnicas y/o formulación de pliegos, esto CAUSARIA que el mercado no responda efectivamente a licitaciones y afecta la calidad de productos	06/07/2020	Nicole Alexandra Pérez Ruales	70 %	80	56	0/1
2- NACIONAL. Social / Laboral. La capacidad de la ejecución vulnerada por calidad y experticia técnica lo que CAUSARIA que los requerimientos técnicos sean deficientes en la formulación del alcance de actividades, lo que afecta la calidad de pliegos y productos del Programa.	06/07/2020	Nicole Alexandra Pérez Ruales	60 %	60	36	0/1
2- NACIONAL. Político. No se concreta o se retrasa la aprobación de las iniciativas y normas legales relacionadas al CONA lo que CAUSARIA que las inversiones realizadas a través del Programa como insumos al CONA perderían relevancia.	12/02/2020	Nicole Alexandra Pérez Ruales	70 %	50	35	0/1
2- NACIONAL. * General. Retraso en levantamiento de información implementación CAUSARÍA el desarrollo del mismo	04/02/2020	Nicole Alexandra Pérez Ruales	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 5

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Elaboración de proyecto	4-Inicio de Trabajo	01/02/2019		01/02/2019		Sí	2.22
2	PLANEACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto, elaborado	4-Inicio de Trabajo	08/02/2019		08/02/2019		Sí	2.22
3	PLANEACIÓN: Dictamen de prioridad del proyecto, aprobado	9-Entregables Formales	04/03/2019		04/03/2019		Sí	2.22
4	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	11/03/2019		11/03/2019		Sí	2.22
5	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de material didáctico para equipar las unidades de CDI y CNH, aprobado	5-Entregables Intermedios	18/04/2019		18/04/2019		Sí	2.22

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la contratación al equipo de Gestión para la Gerencia del Proyecto Misión Ternura, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/06/2019		05/06/2019		Sí	2.22
7	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la contratación de coordinadoras técnicas territoriales, coordinadoras de Centros de Desarrollo Infantil, Educadoras Familiares y Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil, elaborados	5-Entregables Intermedios	13/06/2019		13/06/2019		Sí	2.22
8	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	03/07/2019		03/07/2019		Sí	2.22
9	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	02/08/2019		02/08/2019		Sí	2.22
10	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la impresión de material didáctico y/o curricular desarrollado, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/08/2019		22/08/2019		Sí	2.22
11	EJECUCIÓN: Informe de insumos para la normativa nacional de niños, niñas y adolescentes, elaborados	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	2.22
12	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	04/09/2019		04/09/2019		Sí	2.22
13	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	9-Entregables Formales	03/10/2019		03/10/2019		Sí	2.22
14	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria, aprobado	5-Entregables Intermedios	06/11/2019		06/11/2019		Sí	2.22
15	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la capacitación al personal técnico operativo de CDI y/o CNH, aprobado	4-Inicio de Trabajo	21/11/2019		21/11/2019		Sí	2.22
16	EJECUCIÓN: Informe mensual de seguimiento a las asistencias , aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2019		22/12/2019		Sí	2.22
17	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria . (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	2.22
18	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	29/02/2020		29/02/2020		Sí	2.22
19	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	2.22
20	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	2.22

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	2.22
22	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/04/2020		30/04/2020		Sí	2.22
23	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/05/2020		31/05/2020		Sí	2.22
24	EJECUCIÓN: Elaborar las reformas al Reglamento Operativo Proyecto (ROP) - Contrato de préstamo EC-L1235. (Reglamento Operativo Proyecto (ROP) -Contrato de préstamo EC-L1235 reformado)	9-Entregables Formales	31/05/2020		31/05/2020		Sí	2.22
25	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	2.22
26	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	2.22
27	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	2.22
28	EJECUCIÓN: Elaboración del Informe semestral de progreso (Formato BID). (Informe semestral de progreso(Formato BID))	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	2.22
29	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	2.22
30	EJECUCIÓN: Contratar al equipo técnico y de gestión para la operación del contrato de préstamo 4607/OC-EC. (Informe de contratación del equipo técnico y de gestión)	9-Entregables Formales	31/08/2020	31/08/2020			No	2.22
31	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/08/2020	31/08/2020			No	2.22
32	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	2.22
33	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	2.22

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)							
34	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	2.22
35	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	31/10/2020	31/10/2020			No	2.22
36	EJECUCIÓN: Adquirir guías de actividades y metodología de trabajo a las intervenciones de CDI-BID (kit de material impreso para unidades de atención). (Informe de recepción de guías de actividades y metodologías de trabajo a las intervenciones de CDI-BID)	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	2.22
37	EJECUCIÓN: Adquirir material didáctico para los servicios de desarrollo infantil - unidades CDI, CNH, CCRA. (Informe de recepción de material didáctico para los servicios de desarrollo infantil;- unidades CDI,CNH,CCRA)	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	2.22
38	EJECUCIÓN: Contratación de Diseño y Aseguramiento de Calidad de la Encuesta de Línea Base	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	2.22
39	EJECUCIÓN: Contratar el diseño del nuevo modelo de cooperación y gestión entre MIES proveedores de servicios (cooperantes por convenio). (Informe de contratación/ licitación del proceso)	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	2.22
40	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria. (Informes financieros y de ejecución presupuestaria)	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	2.22
41	EJECUCIÓN: Elaboración de contenidos y metodologías de trabajo de CDI. (Documento de contenidos y metodologías de trabajo de CDI)	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.22
42	EJECUCIÓN: Elaboración de informes de asesoría legal. (Informes de asesoría legal)	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.22
43	EJECUCIÓN: Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del proyecto. (Informes de monitoreo y seguimiento)	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.22
44	EJECUCIÓN: Elaboración Informes financieros y ejecución presupuestaria.	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.22

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(Informes financieros y de ejecución presupuestaria)							
45	EJECUCIÓN: Realizar informe final de ejecución del proyecto 2020. (Documento compilado de los resultados obtenidos del proyecto a nivel nacional)	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	2.32

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de implementación del sistema de evaluación, seguimiento y monitoreo de la gestión de los servicios de desarrollo infantil integral.		-	-	-	01/07/2020	-
2	Porcentaje de documentos generados como propuesta del nuevo marco normativo e institucional para la primera infancia		-	-	-	01/07/2020	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	47,760,735.61 **
Costo Total:	214,689,779.55
Total Devengado:	28,567,409.72
% Costo Total Devengado:	13.31 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 13.31 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	22,412,639.84	26,201,981.84	0.00	48,614,621.68
Ppto. Externo Planeado	4,954,165.53	0.00	0.00	4,954,165.53
Ppto. Aprobado Inicial	27,376,805.37	0.00	0.00	27,376,805.37
Ppto. Codificado	27,366,805.37	0.00	0.00	27,366,805.37
Ppto. Comprometido	10,339,206.71	0.00	0.00	10,339,206.71
Planeado - Codificado (2020)		26,201,981.84		
Programado a Devengar	50,546,084.52	27,982,944.13	0.00	78,529,028.65
Ppto. Devengado	19,777,791.48	8,789,618.24	0.00	28,567,409.72
Pagado Real	10,330,926.56	0.00	0.00	10,330,926.56
Estimado a fin de año	* 19,777,791.48	0.00	0.00	19,777,791.48
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	30,768,293.04	27,982,944.13	0.00	58,751,237.17
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 39.13 %	31.41 %	0.00 %	36.38 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	958,323.15	958,323.15	958,323.15	958,323.15	100.00 %	●	3.42 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,653,375.72	1,653,375.72	2,611,698.87	2,611,698.87	100.00 %		9.33 %
Mar	4,282,266.97	2,030,086.31	6,893,965.84	4,641,785.18	67.33 %		16.59 %
Abr	1,518,557.82	1,518,557.82	8,412,523.66	6,160,343.00	73.23 %		22.01 %
May	1,180,765.40	1,180,765.40	9,593,289.06	7,341,108.40	76.52 %		26.23 %
Jun	1,567,803.73	1,448,509.84	11,161,092.79	8,789,618.24	78.75 %		31.41 %
Jul	1,628,501.52		12,789,594.31				
Ago	2,515,316.94		15,304,911.25				
Sep	1,565,882.47		16,870,793.72				
Oct	4,859,872.08		21,730,665.80				
Nov	3,851,603.35		25,582,269.15				
Dic	2,400,674.98		27,982,944.13				
Total	27,982,944.13	8,789,618.24					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la promoción del desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 3 años de edad MEDIANTE la generación de procesos de fortalecimiento técnico, metodológico, de acompañamiento y evaluación de la gestión del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Aprobación Modicación Reforma Presupuestaria PAPP Nro 5 y Nro 06	MODIFICACIÓN_REFORMA_PRESUPUESTARIA_Nro05_y_06.pdf	05/07/2020
2	ASOCIACIÓN HITO Nro 11	Pliegos_NO_objección_BID_Consulta_NNA_27_sept_2019_hito11.pdf	07/08/2019
3	ASOCIACIÓN HITO Nro 14	Informe_financiero_ene-oct_2019.pdf	07/01/2020
4	ASOCIACIÓN HITO Nro. 10	Especificaciones_Técnicas.pdf	30/09/2019
5	ASOCIACIÓN HITO Nro. 12	Informe_ejecución_presupuestaria_agosto_2019.pdf	27/09/2019
6	ASOCIACIÓN HITO Nro. 13	Informe_de_ejecución_presupuestaria_sept_2019.pdf	03/10/2019
7	ASOCIACIÓN HITO Nro. 15	TDRs_Capacitación_a_Juntas.pdf	09/12/2019
8	ASOCIACIÓN HITO Nro. 16	Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.xlsx	27/12/2019
9	ASOCIACIÓN HITO Nro. 2	Matriz_PAPP_Inversión_2019_FORTALECIMIENTO_MT_26	07/08/2019
10	ASOCIACIÓN HITO Nro. 3	oficio_de_prioridad_senplades-2018-1410-of.pdf	07/08/2019
11	ASOCIACIÓN HITO Nro. 4	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
12	ASOCIACIÓN HITO Nro. 5	PLiegos_LPI001_CDI_CNH_26_jul_2019.docx	08/08/2019
13	ASOCIACIÓN HITO Nro. 6	hito_contratación_personal_gerencia.rar	08/08/2019
14	ASOCIACIÓN HITO Nro. 7	contratacion_de_personal.rar	08/08/2019
15	ASOCIACIÓN HITO Nro. 8	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
16	ASOCIACIÓN HITO Nro. 9	INFORME_FINANCIERO_ENERO_JUNIO_2019.docx	08/08/2019
17	B8	ASOCIACIÓN_HITO_Nro_17.pdf	16/03/2020
18	B9	ASOCIACION_HITO_NRO_18.pdf	06/04/2020
19	C1	ASOCIACION_HITO_Nro._19.pdf	09/04/2020
20	C2	ASOCIACION_HITO_Nro._20.pdf	08/04/2020
21	C3	ASOCIACION_HITO_NRO_21.pdf	15/04/2020
22	C4	ASOCIACION_HITO_NRO._22.pdf	05/05/2020
23	C5	ASOCIACION_HITO_NRO_23.pdf	04/06/2020
24	C6	ASOCIACION_HITO_NRO._24.pdf.pdf	05/06/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
25	C7	ASOCIACION_HITO_NRO.25.pdf	07/07/2020
26	C8	ASOCIACION_HITO_NRO_26.pdf	07/07/2020
27	C9	ASOCIACION_HITO_NRO._27.pdf	07/07/2020
28	Cédulas presupuestarias	Cedulas_presupuestarias-_oct-nov-dic_2019.pdf	07/01/2020
29	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria- Ene- Dic 2019	Informe_financiero_ene-dic_2019.pdf	07/01/2020
30	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria- Ene- Nov 2019	Informe_financiero_ene-nov_2019.pdf	07/01/2020
31	RECORTE PRESUPUESTARIO MEF-MARZO	Recorte_Presupuestario_MEF.zip	01/04/2020

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	C4
	http://ASOCIACIÓN HITO NRO 22

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Báez Pérez, Blanca Marina	Lider del proyecto	Analsita de Servicios de Atención Domiciliar	blanca.baez@inclusion.gob.ec	
