MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Protección Especial
Dirección de Servicios de Protección Especial

PROYECTO: K011 MIES-Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional

Líder del Proyecto:	Mayanquer Escobar, Jose Oswaldo (jose.mayanquer@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mosquera Martinez, Guido Amauri	Programas Relacionados:	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL
Titular:	Macías Gómez, Ana Rosa	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	1.09
CUP:	102800000.0000.376265	TIR:	29.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	7,924,111.86
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	60,540,979.08
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/01/2018
Fecha de última actualización:	02/03/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Maya Romero, María José	Fecha del siguiente Hito:	31/01/2018

DATOS GENERALES

Descripción

El presente proyecto está enfocado a la atención y acompañamiento para la restitución de los derechos vulnerados para niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y sus familias que están involucradas en prácticas y/o culturas de violencia y redes; y la permanencia de prácticas de trabajo infantil peligroso y de las peores formas.

Mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes se brindarán servicios de protección especial de calidad para la atención del ciclo de vida. Cabe señalar que para la firma de convenios las organizaciones cooperantes deberán cumplir con la ficha de costos, la norma técnica y modelo de gestión emitido por el MIES.

Objetivo general o propósito:

Implementar servicios de Protección Especial de acuerdo a modelos de atención y normativa técnica en el ciclo de vida con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad en el Ecuador.

Objetivos específicos o componentes:

a) Suscribir convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES, para atender a las personas que hayan sido violentadas en sus derechos.

b) Gestionar Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos.
c) Administrar Centros de Atención Directa en las modalidades de Acogimiento Institucional y Casa Hogar en situación Emergente.

Beneficios Cualitativos

Atención a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes.
Prestación de servicios de Protección Especial con calidad y calidez que cumplan el modelo de atención y las normas técnicas para erradicar el trabajo infantil y la mendicidad; y ofreciendo los servicios de acogimiento institucional y familiar
Administración temporal de los centros de atención directa en la modalidad de acogimiento.

Tipo de Beneficiario

Niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que estén situación de riesgo o vulneración de sus derechos.

Restricciones

"Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 4 años
Costo total asignado para el proyecto es 105.676.466,29
Alcance: Este proyecto se ejecutará a nivel nacional

Restricciones
Recursos Humanos: Técnicos contratados para la ejecución del proyecto a nivel nacional. Recursos Materiales: Materiales de oficina y Equipos Tecnológicos existentes en la institución."

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 77.75 %
Fecha de Inicio: 01/01/2014 **Fecha de Fin:** 31/01/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2017	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Avance real acumulado											
	95 %											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes DICIEMBRE 2016 es de 97,92%, * Cobertura de 43.726 personas, suscripciones de adendas a los convenios de cooperación. * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 274, suscripciones de adendas a los convenios de cooperación. *1er Desembolso.- Se encuentra el 100,00% de convenios pagados *2do Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagados *3er Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagados *4to Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagado * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, 276 corresponde al 92,93%; y 21 convenios están en estado finalizado corresponde al 7,07%.	Maya Romero, María José	06/01/2017 - 12:47 PM
NOVIEMBRE 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes NOVIEMBRE 2016 es de 89,56%, * Cobertura de 40.625 personas, suscripción de adendas a los convenios de cooperación. * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 267 suscripción de adendas a los convenios de cooperación. *1er Desembolso.- Se encuentra el 99,20% de convenios pagados y el 0,80% no pagado, que corresponde a 2 convenios pendientes en el Ministerio de Finanzas *2do Desembolso.- El 98,40% de los convenios están pagados, 0,80% pendientes de pago, 1 por parte del Ministerio de Finanzas y 1 convenio pendientes de solicitar el pago desde el MIES *3er Desembolso.- El 87,20% de los convenios están pagados, 12,80% pendientes de pago, 23 convenios por parte del Ministerio de Finanzas Y 9 pendientes de solicitar el pago desde el MIES. Según el sistema eSIGEF con corte al mes de noviembre *4to Desembolso.- El 69,52% de los convenios están pagados, 30,48% pendientes de pago, 47 convenios por parte del Ministerio de Finanzas Y 35 pendientes de solicitar el pago desde el MIES	Maya Romero, María José	05/12/2016 - 12:55 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, corresponde al 92,57%; y 23 convenios están en estado finalizado 7,43%,		
OCTUBRE 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes OCTUBRE 2016 es de % 77,63%, * Cobertura de 37.216 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251 *1er Desembolso.- Se encuentra el 99,20% de convenios pagados y el 0,80% no pagado, que corresponde a 2 convenios pendientes de aval. *2do Desembolso.- El 98,40% de los convenios están pagados, 1,60% pendientes de pago, 2 por parte del Ministerio de Finanzas y 2 convenios pendientes de solicitar el pago desde el MIES. Según el sistema eSIGEF *3er Desembolso.- El 52,59% de los convenios están pagados, 47,41% pendientes de pago, 75 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 44 pendientes de solicitar el pago desde el MIES *4to Desembolso.- El 11,16% de los convenios están pagados, 88,84% pendientes de pago, 128 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 95 pendientes de solicitar el pago desde el MIES * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, corresponde al 89,19%; y 32 convenios están en estado finalizado 10,81%	Maya Romero, María José	02/11/2016 - 09:58 AM
SEPTIEMBRE 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 57,85 * Cobertura de 37.216 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015	Maya Romero, María José	05/10/2016 - 02:42 PM
AGOSTO 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * La ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión, reflejan un 50,22% de acuerdo al sistema eSIGEF del mes de agosto, en el cual se registra un incremento de 3,79% en relación al mes anterior. * Desembolsos cooperantes -1er Desembolso.- 98% pagados y 2% no pagados, que corresponde a 3 convenios pendientes MF. -2do Desembolso.- 95% pagados y 5% pendientes de pago, 6 por parte del Ministerio de Finanzas y 6 convenios pendientes de solicitar el pago desde el MIES. -3er Desembolso.- El 2% de los convenios están pagados, que corresponde a 6 convenios; 98% pendientes de pago, 31 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 218 pendientes de solicitar el pago desde el MIES. * Cobertura de 37.216 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.	Maya Romero, María José	05/09/2016 - 03:24 PM
JULIO 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * La ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión, reflejan un 46,43% de acuerdo al sistema eSIGEFal 29 de julio, en el cual se registra un incremento de 1,64% en relación al mes anterior. * Desenbolsos cooperantes -1er Desembolso.- 98% pagados y 2% no pagados, que corresponde a 4 convenios pendientes MF. -2do Desembolso.- 35% pagados que corresponde a 88 convenios, 65% pendientes, MIES 14 pendientes * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.	Maya Romero, María José	07/08/2016 - 10:33 AM
JUNIO 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes JUNIO 2016 es dE 44.88 % * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 255 (cuatro de gasto corriente) * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.	Maya Romero, María José	06/07/2016 - 04:30 PM
MAYO 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 39.35 * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primer trimestre.	Maya Romero, María José	06/06/2016 - 08:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 34,78 * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primer trimestre.	Maya Romero, María José	06/05/2016 - 08:39 AM
MARZO 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 18,71 * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015 OBSERVACIÓN: Por error de digitación se encuentra duplicado el mes de febrero 2016, se realiza la corrección pertinente.	Maya Romero, María José	06/04/2016 - 08:46 AM
FEBRERO 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 18,71 * Cobertura de 37.356 personas * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256 * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015	Maya Romero, María José	06/04/2016 - 08:28 AM
FEBRERO 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20.410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2016 es de 1,26 % * Cobertura de 33.125 * Suscripción de 224 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015	Maya Romero, María José	04/03/2016 - 04:53 PM
ENERO 2016: * Asignación presupuestaria de $ 20´410.108,56 * Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2016 es de 0.08 % * Cobertura de 31.468 * Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. * * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015	Maya Romero, María José	04/03/2016 - 04:52 PM
DICIEMBRE 2015: * Asignación presupuestaria de $ 21´720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes DICIEMBRE 2015 es de 94,70 % * Cobertura de 45749 * Suscripción de 291 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015	Maya Romero, María José	05/01/2016 - 03:15 PM
OCTUBRE 2015: * Asignación presupuestaria de $ 21´720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2015 es de 84,80 %. * Cobertura de 42724 * Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015 NOVIEMBRE 2015: * Asignación presupuestaria de $ 21´720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes novimbre 2015 es de 88,30 % * Cobertura de 43164 * Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015	Maya Romero, María José	11/12/2015 - 02:46 PM
SEPTIEMBRE 2015: * Asignación presupuestaria de $ 21´720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2015 es de 80,91 %. * Cobertura de 41.421. * Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015	Maya Romero, María José	05/10/2015 - 12:56 PM
AGOSTO 2015: * Asignación presupuestaria de $ 21´720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 78,00 %. * Cobertura de 41.639. * Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015	Maya Romero, María José	09/09/2015 - 08:38 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2015: * Asignación presupuestaria de $ 21´720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 63,33 %. * Cobertura de 41.489 personas. * Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015. Maya Romero, María José 03/07/2015 - 12:10 PM	Maya Romero, María José	06/08/2015 - 09:34 AM
JUNIO 2015: * Asignación presupuestaria de $ 21´720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 44,79%. * Cobertura de 40.435 personas. * Suscripción de 268 convenios generados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015. * Seguimiento a la liquidación de conenios 2014, con 207 convenios liquidados en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.	Maya Romero, María José	03/07/2015 - 12:10 PM
Mayo 2015: * Asignación presupuestaria de $ 21´720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes Mayo 2015 es de 42,21%. * Cobertura de 38.142 personas. * Suscripción de 261 convenios generados a nivel nacional. * Seguimiento a la liquidación de conenios 2014, con 203 convenios liquidados en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional	Maya Romero, María José	22/06/2015 - 09:41 AM
Abril 2015: * Asignación presupuestaria de $ 21´720.525,00 * Ejecución presupuestaria al mes de Abril 2015 es de 37.56%. * Cobertura de 34.901 personas. * Renovación de convenios con entidades cooperantes con un total de 264 generados. * Seguimiento a la liquidación de 176 convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional	Maya Romero, María José	05/05/2015 - 04:53 PM
MARZO 2015: 1.- Mediante memorando Nro. MIES-SPE-2015-0245-M de 9 de marzo se remite la ficha de Proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta Gobierno Por Resultados. 2.- Propuesta de cambio de coberturas a la Microplanificación de la Subsecretaria de Protección Especial, con el propósito de operar un quiebre en los procesos de erradicación del trabajo infantil y mendicidad, dirigiendo los esfuerzos a lograr resultados medibles y evaluables en concordancia con el nuevo modelo de atención en función a la línea base proporcionada por el Registro Social. 3.- Entrega del primer documento final al Modelo de Gestión para la Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial y Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial en Construcción a la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Berenice Cordero (hito cumplido 47). 4.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenio para liquidación 2014 con un avance del 50% de acuerdo al siguiente detalle: Informe Técnico realizado 17, Informe Financiero 42, Informe Jurídico realizado 45, con Acta de Finiquito Firmada 110, no presentan documentos 2. Con un total de 222 convenios. 5.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenios para firma 2015 de acuerdo al sistema SIIMIES, de acuerdo al siguiente detalle: Ingresados 20, Emitido 22, Recibido 8, Generados 200. Con un total de 250 convenios.	Quisintuña Telenchana, María Josefa	07/04/2015 - 12:02 PM
FEBRERO 2015: 1.- Asignación de recursos el 13 de febrero 2015 para el Grupo de Gasto 78 el monto de $ 21 ´274.525 para la suscripción de convenios a nivel nacional. 2.- Planificación de cobertura y presupuesto a nivel distrital y zonal en la modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial y Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial en Construcción, de acuerdo a la ficha de costos y techo presupuestario panificado. 3.- Asignación de recursos a la Coordinación Zonal 8, para el funcionamiento del servicio del Centro de Acogimiento de Recuperación para adolescentes "Juan Elias". 4.- Elaboración de matriz de convenio para liquidación 2014 con un avance del 25% de acuerdo al siguiente detalle: Informe Técnico realizado 14, Informe Financiero 29, Informe Jurídico realizado 22, con Acta de Finiquito Firmada 56, no presentan documentos 101. Con un total de 222 convenios.	Quisintuña Telenchana, María Josefa	07/04/2015 - 11:58 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
5.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenios para firma 2015 de acuerdo al sistema SIIMIES, de acuerdo al siguiente detalle: Ingresados 54, Emitido 5, Recibido 2, Generados 71. Con un total de 130 convenios.		
Enero 2015: o Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1248-OF, del 31 de diciembre 2014 la SENPLADES remite la Actualización al Dictamen de Prioridad del proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional" para el año 2015 o Presupuesto Planificado en PAPP: $ 21´720.525,00 o Asignación en sistema eSIGEF: $ 9´505.819,00 al 30 de enero 2015. Grupo de gasto 73: USD$ 9.220.819. Grupo de gasto 71: USD$ 285.000 o Ejecución presupuestaria: 0% o Estado Actual del Proyecto: Vigente desde enero 2014 hasta diciembre 2017 o El proyecto planifica atender una cobertura de 29.290 personas en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Trabajo Infantil y Mendicidad. o Seguimiento en el sistema SIIMIES para la firma de convenios 2015 en las modalidades de Acogimiento Institucional y Familiar.	Quisintuña Telenchana, María Josefa	06/04/2015 - 09:38 AM
Diciembre 2014: * Asignación presupuestaria de $ 21.040.653,32 * Ejecución presupuestaria del mes de Diciembre 2014 es de 97.61%. * Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. * Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciónes Distritales a Nivel Nacional.	Chavez Morales, Luis Felipe	30/12/2014 - 02:48 PM
Noviembre 2014: * Asignación presupuestaria de $ 21.052.480,13 * Ejecución presupuestaria del mes de octubre 2014 es de 89.19%. * Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. * Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciónes Distritales a Nivel Nacional.	Chavez Morales, Luis Felipe	05/12/2014 - 04:31 PM
Octubre 2014: * Asignación presupuestaria de $ 21.584.074,15 * Ejecución presupuestaria del mes de octubre 2014 es de 84.34%. * Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. * Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciónes Distritales a Nivel Nacional.	Chavez Morales, Luis Felipe	05/11/2014 - 06:50 PM
AGOSTO 2014: * Asignación presupuestaria de $ 21.584.074,15 * Ejecución presupuestaria con corte 29 de agosto de 2014 es de 82.13%. * Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. Reajuste de acuerdo a liquidacion 1er desembolso. * Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.	Chavez Morales, Luis Felipe	01/09/2014 - 04:48 PM
JULIO 2014: * Asignación presupuestaria de $ 21.584.074,15 * Ejecución presupuestaria con corte 31 de julio de 2014 es de 79.36%. * Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. Reajuste de acuerdo a liquidacion 1er desembolso. * Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales. * Atención a las observaciones de SENPLADES y MCDS a proyecto de inversión	Chavez Morales, Luis Felipe	01/08/2014 - 07:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2014: * Ejecución presupuestaria con corte 30 de junio de 2014 es de 68%. * Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados. * Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales. * Financiamiento y seguimiento al evento "Día contra el Trabajo Infantil".	Chavez Morales, Luis Felipe	01/07/2014 - 05:00 PM
MAYO 2014: * Ejecución presupuestaria con corte 27 de mayo de 2014 es de 50.13%. * Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados. * Seguimiento a la cobertura de convenios 2014 * Evaluación de calidad a las Unidades de Atención en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales. * Financiamiento y seguimiento al evento "Día contra el Trabajo Infantil".	Chavez Morales, Luis Felipe	27/05/2014 - 01:54 PM
A continuación se detalla la Información del Proyecto: * Ejecución presupuestaria con corte 28 de abril de 2014 es de 49.52%. * Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados. * Elaboración de la matriz de presupuesto y cobertura de las organizaciones cooperantes, para la suscripción de convenios, con la finalidad de realizar el seguimiento respectivo. * Actualización del PAPP con nuevo techo presupuestario de $ 21'165.715,49 USD.	Chavez Morales, Luis Felipe	28/04/2014 - 12:45 PM
A continuación se adjuntan los prinicipales logros del proyecto comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2014. * Ejecución presupuestaria con corte al 31 de marzo 2014 es de 49,62%. * Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados. * Elaboración de la matriz de presupuesto y cobertura de las organizaciones cooperantes, para la suscripción de convenios, con la finalidad de realizar el seguimiento respectivo. * Actualización del PAPP con nuevo techo presupuestario de $ 21'166.407,00 USD.	Olivo Plazas, Julio Adolfo	04/04/2014 - 05:15 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de ejecución presupuestaria en Direcciones distritales	08/04/2015	María José Maya Romero	10	20	2	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Tiempo. Dificultad al firmar los convenios CAUSARIA Retraso en la atención de las modalidades.	23/02/2017	Jose Oswaldo Mayanquer Escobar	70 %	80	56	0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Bolívar
2	Zona 1 - Norte > Carchi > Mira
3	Zona 1 - Norte > Carchi > Montufar
4	Zona 1 - Norte > Carchi > Tulcán
5	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Eloy Alfaro
6	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
7	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Muisne
8	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Quininde
9	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Rioverde
10	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > San Lorenzo
11	Zona 1 - Norte > Imbabura > Antonio Ante
12	Zona 1 - Norte > Imbabura > Cotacachi
13	Zona 1 - Norte > Imbabura > Ibarra
14	Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo
15	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrio
16	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Cayambe
17	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Mejía
18	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pedro Moncayo
19	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñaui
20	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos
21	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Alausi
22	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chambo
23	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chunchi
24	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta
25	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guamote
26	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guano
27	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Pallatanga
28	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba
29	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > La Mana
30	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Latacunga
31	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pangua
32	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pujili
33	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Salcedo
34	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Saquisili
35	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos
36	Zona 3 - Centro > Pastaza > Mera
37	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Ambato
38	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa
39	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Patate
40	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Quero
41	Zona 3 - Centro > Tungurahua > San Pedro de Pelileo
42	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone
43	Zona 4 - Pacífico > Manabí > El Carmen
44	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jama
45	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jaramijo
46	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jipijapa
47	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Junin
48	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta
49	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Montecristi
50	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pajan
51	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales
52	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pichincha
53	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Portoviejo
54	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Puerto López
55	Zona 4 - Pacífico > Manabí > San Vicente

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
56	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Santa Ana
57	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Sucre
58	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Tosagua
59	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > La Concordia
60	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Santo Domingo
61	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
62	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda
63	Zona 5 - Litoral > Guayas > Alfredo Baquerizo M. (Jujan)
64	Zona 5 - Litoral > Guayas > Coronel Marcelino Maridueña
65	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Empalme
66	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo
67	Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro
68	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal
69	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjito
70	Zona 5 - Litoral > Guayas > Pedro Carbo
71	Zona 5 - Litoral > Guayas > Salitre (Urbina Jado)
72	Zona 5 - Litoral > Guayas > Santa Lucía
73	Zona 5 - Litoral > Guayas > Sn. Jacinto de Yaguachi
74	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Babahoyo
75	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Buena Fe
76	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Mocache
77	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Palenque
78	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Pueblo Viejo
79	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo
80	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Urdaneta
81	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Valencia
82	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas
83	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Vinces
84	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena
85	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > La Libertad
86	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Salinas
87	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca
88	Zona 6 - Austro > Azuay > Paute
89	Zona 6 - Austro > Azuay > Sigsig
90	Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues
91	Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar
92	Zona 6 - Austro > Cañar > La Troncal
93	Zona 6 - Austro > Cañar > Suscal
94	Zona 7 - Sur > El Oro > Arenillas
95	Zona 7 - Sur > El Oro > Atahualpa
96	Zona 7 - Sur > El Oro > Balsas
97	Zona 7 - Sur > El Oro > Chilla
98	Zona 7 - Sur > El Oro > El Guabo
99	Zona 7 - Sur > El Oro > Huaquillas
100	Zona 7 - Sur > El Oro > Las Lajas
101	Zona 7 - Sur > El Oro > Machala
102	Zona 7 - Sur > El Oro > Marcabeli
103	Zona 7 - Sur > El Oro > Pasaje
104	Zona 7 - Sur > El Oro > Piñas

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
105	Zona 7 - Sur > El Oro > Portovelo
106	Zona 7 - Sur > El Oro > Santa Rosa
107	Zona 7 - Sur > El Oro > Zaruma
108	Zona 7 - Sur > Loja > Calvas
109	Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo
110	Zona 7 - Sur > Loja > Chaguarpamba
111	Zona 7 - Sur > Loja > Loja
112	Zona 7 - Sur > Loja > Puyango
113	Zona 7 - Sur > Loja > Saraguro
114	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora
115	Zona 8 - DMG > Guayas > Durán
116	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil
117	Zona 8 - DMG > Guayas > Samborondon
118	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2014	4-Inicio de Trabajo	15/01/2014		15/01/2014		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN: Informe de Dictamen de Prioridad de SENPLADES.	4-Inicio de Trabajo	16/01/2014		16/01/2014		Sí	2.0
3	PLANIFICACIÓN: Perfiles de convenios presentados a los distritos por parte de las organizaciones cooperantes.	9-Entregables Formales	22/01/2014		22/01/2014		Sí	0.5
4	DEFINICIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.5
5	EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Familiar.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.5
6	EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Institucional.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.5
7	EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de de Acogimiento Casa Hogar.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.5
8	EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Erradicación de la Mendicidad.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.5
9	EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.5
10	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto	9-Entregables Formales	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y seguimiento a convenios, desagregado por zona y por distrito.							
11	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios, desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.5
12	EJECUCIÓN: Matriz de convenios firmados por zona y modalidad.	9-Entregables Formales	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Informe de certificaciones presupuestarias realizadas de acuerdo al PAPP.	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.5
14	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.5
15	EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Casa Hogar	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.5
16	EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.5
17	EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.5
18	EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil.	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.5
19	EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidades de la Mendicidad.	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.5
20	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	30/04/2014		28/04/2014		Sí	0.5
21	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	31/05/2014		29/05/2014		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN: Directrices financieras para la ejecución presupuestaria de la partida 78	9-Entregables Formales	23/06/2014		23/06/2014		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	EJECUCIÓN: Informe de liquidación del primer desembolso a nivel desconcentrado.	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.5
26	EJECUCIÓN: Informe de reformas presupuestarias.	9-Entregables Formales	06/08/2014		06/08/2014		Sí	0.5
27	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar.	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.5
28	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional.	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.5
29	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Casa Hogar.	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.5
30	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil.	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.5
31	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de la Mendicidad.	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.5
32	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito del ecuador	9-Entregables Formales	31/08/2014		29/08/2014		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN: Informe de ejecución y reformas presupuestarias de las casas de acogimiento mixtas	9-Entregables Formales	23/09/2014		23/09/2014		Sí	0.5
34	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zonas.	9-Entregables Formales	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.5
35	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento matriz de convenios 2014.	9-Entregables Formales	03/10/2014		03/10/2014		Sí	0.5
36	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y ejecución presupuestaria a nivel desconcentrado.	9-Entregables Formales	22/10/2014		22/10/2014		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	31/10/2014		30/10/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
38	EJECUCIÓN: Seguimiento liquidación de los convenios 1er desembolso.	9-Entregables Formales	14/11/2014		13/11/2014		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Documento PAPP 2014 actualizado.	9-Entregables Formales	20/11/2014		19/11/2014		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	30/11/2014		28/11/2014		Sí	0.5
41	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria 2014.	9-Entregables Formales	10/12/2014		10/12/2014		Sí	0.5
42	EJECUCIÓN: Informe de cierre del Ejercicio fiscal 2014.	9-Entregables Formales	15/12/2014		15/12/2014		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Informe del tercer desembolso de convenios a nivel distrital para todas la modalidades	9-Entregables Formales	15/12/2014		15/12/2014		Sí	4.0
44	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito.	9-Entregables Formales	30/12/2014		29/12/2014		Sí	2.0
45	EJECUCIÓN: Elboración de la ficha de costos de Erradicación de Trabajo Infantil, presentada.	5-Entregables Intermedios	20/02/2015		20/02/2015		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para la modalidad de trabajo infantil de acuerdo al Registro Social, presentado	5-Entregables Intermedios	20/02/2015		20/02/2015		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Elaboración del modelo de gestión para la modalidad de erradicación de trabajo infantil, presentada	9-Entregables Formales	16/03/2015		16/03/2015		Sí	3.0
48	PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2015, presentado.	9-Entregables Formales	16/03/2015		16/03/2015		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. presentado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Informe de liquidación de convenios firmados año 2014, presentado	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Informe del número de convenios firmados y coberturas en base al SIIMIES para la modalidad de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado.	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado	4-Inicio de Trabajo	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	por zona y por distrito. presentado							
54	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
55	EJECUCIÓN: Informe del número de convenios firmados y coberturas en base al SIIMIES para la modalidad de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado.	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	29/05/2015		29/05/2015		Sí	0.5
57	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
58	EJECUCIÓN: Informe Evento Día Contra el Trabajo Infantil a Nivel Zona, presentado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	5.0
59	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.5
60	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.5
61	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.5
62	EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del primer desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.5
64	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.5
65	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado							
66	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.0
67	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
69	EJECUCIÓN: eLaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016, presentado.	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	2.0
70	EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2015. presentado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	2.0
71	EJECUCIÓN: Informe de gestión del proyecto, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	2.0
72	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
73	PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016.	9-Entregables Formales	01/01/2016		01/01/2016		Sí	0.0
74	EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada.	9-Entregables Formales	30/01/2016		30/01/2016		Sí	0.5
75	EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada	9-Entregables Formales	30/01/2016		30/01/2016		Sí	0.5
76	EJECUCIÓN: PAPP del proyecto de inversión 2016, aprobado.	9-Entregables Formales	30/01/2016		30/01/2016		Sí	0.5
77	EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado	9-Entregables Formales	02/02/2016		02/02/2016		Sí	1.0
78	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado	9-Entregables Formales	20/02/2016		20/02/2016		Sí	0.5
79	EJECUCION: Informe consolidado de los convenios sucritos de todas las	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	modalidades de atención a nivel distrital, presentado.							
80	EJECUCION: Informe de liquidacion de convenios 2015, presentado.	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.1
81	EJECUCIÓN: Informe de gestión cuatrimestral de la Gerencia, presentado.	9-Entregables Formales	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.2
82	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del proyecto de inversión, presentado.	9-Entregables Formales	30/05/2016		30/05/2016		Sí	0.2
83	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
84	EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado.	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.5
85	EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado	9-Entregables Formales	29/07/2016		29/07/2016		Sí	1.0
86	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.2
87	EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.0
88	EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.2
89	EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado.	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.2
90	EJECUCIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2017, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	3.4
91	EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejecicio fiscal 2016, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	2.0
92	EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016.presentado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
93	EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
94	EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
95	EJECUCIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2017.	9-Entregables Formales	02/01/2017		02/01/2017		Sí	5.0
96	EJECUCIÓN: Informe de cierre del Proyecto.	9-Entregables Formales	31/01/2018	31/01/2018			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de NNA que acceden en la modalidad de erradicación del trabajo infantil por convenio.	—	-	-	-	01/03/2015	-
2	Número de personas que acceden en la modalidad de erradicación de mendicidad por convenio.	—	-	-	-	01/03/2015	-
3	Número de NNA que acceden en la modalidad de acogimiento por convenio.	—	-	-	-	01/01/2015	-
4	Número de convenios suscritos en la modalidad de erradicaciòn de trabajo infantil.	—	-	-	-	01/01/2015	-
5	Nùmero de convenios suscritos en la modalidad de mendicidad	—	-	-	-	01/01/2015	-
6	Número de convenios suscritos en la modalidad acogimiento.	—	-	-	-	01/01/2015	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	60,540,979.08 **
Costo Total:	105,676,466.29
Total Devengado:	60,565,549.07
% Costo Total Devengado:	57.31 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 57.31 %

Perfil Económico 2017				
	Años Previos	**Año Actual (2017)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	41,720,525.00	0.00	0.00	**41,720,525.00**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	48,644,111.88	6,923,586.88	0.00	**55,567,698.76**
Ppto. Codificado	62,555,899.89	19,949,796.05	0.00	**82,505,695.94**
Ppto. Comprometido	61,386,141.36	53,349.27	0.00	**61,439,490.63**
Planeado - Codificado (2017)		-19,949,796.05		
Programado a Devengar	63,714,707.71	0.00	0.00	**63,714,707.71**
Ppto. Devengado	60,540,979.08	24,569.99	0.00	**60,565,549.07**
Estimado a fin de año	* 60,540,979.08	0.00	0.00	**60,540,979.08**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,173,728.63	0.00	0.00	**3,173,728.63**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 95.02 %	-	0.00 %	**95.06 %**
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

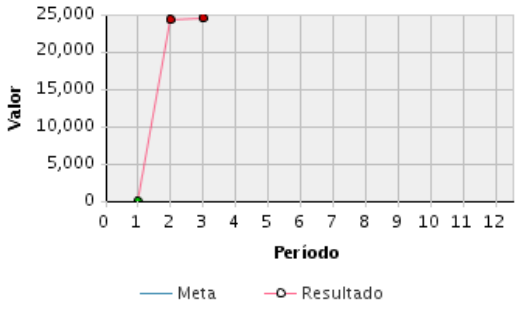

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Feb	0.00	24,360.10	0.00	24,360.10	115.00 %		115.00 %
Mar	0.00	209.89	0.00	24,569.99	115.00 %		115.00 %
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	**0.00**	**24,569.99**					

OBJETIVOS ALINEADOS

	Objetivos Operativos
2	Incrementar la calidad y eficiencia de los servicis de Protección Especial en corresponsabilidad con la familia y comunidad MEDIANTE capacitación, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de la política pública de Protección Especial para la atención de niñas, niños y adolescentes en riesgo o vulnerados en sus derechos.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
MIES-007	Atención en Centros de Acogimiento Institucional
MIES-008	Erradicación del trabajo infantil
MIES-009	Atención en Acogimiento Familiar (Familia ampliada)
MIES-010	Erradicación de la mendicidad

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 32 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	C.1.pdf	17/04/2015
2	ASOCIACION HITO 33 EJECUCIÓN: Informe de ejecución y reformas presupuestarias de las casas de acogimiento mixtas	C.2.pdf	17/04/2015
3	ASOCIACION HITO 35: Informe de seguimiento de matriz de convenios 2014	C.4.pdf	17/04/2015
4	ASOCIACION Hito 36: Ejecución: Informe de seguimiento y ejecución presupuestaria a nivel desconcentrado	C.5.docx	17/04/2015
5	ASOCIACION HITO 3: Perfiles de convenios presentados a los distritos por parte de las organizaciones cooperantes	A.3.pdf	08/04/2015
6	ASOCIACION HITO 40: EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	C.9.pdf	17/04/2015
7	ASOCIACION HITO 84 :EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado.	H4..pdf	05/07/2016
8	ASOCIACION HITO 85. EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado+	H.6.pdf	29/07/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
9	Informe de la ejecución presupuestaria de Casa de Acogida "Dueña de Mi" SEPTIEMBRE	EJECU.PRESUPUET._DUÑA_DE_MI_SEPTIEMBRE.pdf	30/09/2015
10	Informe de la ejecución presupuestaria de CASA DE ACOGIDA DUEÑA DE MI, entregado	CASA_DUEÑA_DE_MI_30.10.2015.pdf	04/11/2015
11	Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Dueña de Mi-Machala, entregado	Informe_de_la_ejecución_presupuestaria_de_Centro_de_Acogida_Dueña_de_Mi-Machala__entregado.pdf	31/10/2015
12	ASOCIACIION HITO 43:EJECUCIÓN: Informe del tercer desembolso de convenios a nivel distrital para todas la modalidades 2014	D.3.pdf	17/04/2015
13	ASOCIACION HITO. 53 Informe d ejecución presupuestaria a nivel zonal y distrital abril 2015	E.3.pdf	30/04/2015
14	ASOCIACION : Informe de la ejecución presupuestaria de CASA ACOGIDA DUEÑA DE MI. 30.11.2015	EJECUCION_CASA_DUEÑA_DE_MI_30.11.2015.pdf	30/11/2015
15	ASOCIACION : Informe de la ejecución presupuestaria de CASA ACOGIDA DUEÑA DE MI. 30.12.2015	CASA_DUEÑA_DE_MI.pdf	31/12/2015
16	ASOCIACION Cronograma valorado para el 2015	D.6.xls	27/04/2015
17	ASOCIACION HITO 88: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto	H.9..pdf	07/11/2016
18	ASOCIACION HITO 89: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto	I.1.docx	05/12/2016
19	ASOCIACION HITO 1 - Ficha de costos de ETI	D.9.pdf	27/04/2015
20	ASOCIACION HITO 1: ELABORACION PAPP 2014.	A.1.pdf	08/04/2015
21	ASOCIACION HITO 2. A - Proyecto Presentado a SENPLADES	A.2.pdf	23/04/2015
22	ASOCIACION HITO 26 - Informe de reformas presupuestarias	B.4.pdf	17/04/2015
23	ASOCIACION HITO 27: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar	B.5.pdf	17/04/2015
24	ASOCIACION HITO 28: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional	B.6.pdf	17/04/2015
25	ASOCIACION HITO 29:EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Casa Hogar	B.7.pdf	17/04/2015
26	ASOCIACION HITO 30: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de erradicación del trabajo infantil.	B.8.pdf	17/04/2015
27	ASOCIACION HITO 34 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito.	C.3.pdf	27/04/2015
28	ASOCIACION HITO 37: Informe de ejecución presupuestaría y seguimiento de convenios por zona y distritos	C.6.pdf	17/04/2015
29	ASOCIACION HITO 38 EJECUCIÓN: Seguimiento liquidación de los convenios 1er desembolso.	C.7.pdf	17/04/2015
30	ASOCIACION HITO 39: EJECUCIÓN: Documento PAPP 2014 actualizado.	C.8.pdf	17/04/2015
31	ASOCIACION HITO 4 Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios.	A.4.pdf	09/04/2015
32	ASOCIACION HITO 41: EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria 2014	D.1.pdf	17/04/2015
33	ASOCIACION HITO 42: EJECUCIÓN Informe de cierre del Ejercicio fiscal 2014.	D.2.pdf	17/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
34	ASOCIACION Hito 44 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito. 2014	D.4.pdf	17/04/2015
35	ASOCIACION HITO 45: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2015	D.5.pdf	27/04/2015
36	ASOCIACION HITO 46: EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para la modalidad de trabajo infantil de acuerdo al Registro Social, presentado - Redistribución de coberturas en ETI	D.7.pdf	27/04/2015
37	ASOCIACION HITO 5 -10 - Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Familiar y Ejecución presupuestaria	A.5.pdf	13/04/2015
38	ASOCIACION HITO 55. Informe numero de convenios firmados y cobertura en base al SIIMIES para las moadlidades de AF,AI,ETI.M	E.1.pdf	30/04/2015
39	ASOCIACION HITO 59: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	E.7.pdf	31/08/2015
40	ASOCIACION HITO 64: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	F.1.pdf	30/09/2015
41	ASOCIACION HITO 65: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	F.4.pdf	04/11/2015
42	ASOCIACION HITO 66: EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad	F.6.pdf	30/11/2015
43	ASOCIACION HITO 67: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado	F.5.pdf	30/11/2015
44	ASOCIACION HITO 68: EJECUCION_PRESUPUESTARIA_DESAGREGADA_POR_DISTRITOS_DIC_2015.pdf	F.7.pdf	05/01/2016
45	ASOCIACION HITO 69: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016	F.8.xlsx	05/01/2016
46	ASOCIACION HITO 70: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2015.	F.9.pdf	05/01/2016
47	ASOCIACION HITO 71: Informe de Gestion del Proyecto	G.1.pdf	05/01/2016
48	ASOCIACION HITO 72: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas,	G.2.pdf	05/01/2016
49	ASOCIACION HITO 73: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016	G.3.xlsx	05/01/2016
50	ASOCIACION HITO 74: EJECUCION: Elaboracion de la ficha de costos con todas las modalidades de atención, aprobada	G4.xlsx	20/02/2016
51	ASOCIACION HITO 75: EJECUCION: Elaboracion de la ficha de proyecto para la suscripción de convenios en todas las modalidades de atención presentada.	G5..pdf	20/02/2016
52	ASOCIACION HITO 76: EJECUCIÓN: PAPP del proyecto de inversión 2016, aprobado.	G6..xlsx	20/02/2016
53	ASOCIACION HITO 77 EJECUCIÓN: Resdistribucion de cobertura y presupuesto nivel distrital para todas las modalidades de atención presentado.	G7..xls	20/02/2016
54	ASOCIACION HITO 78 EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado	G8.pdf	20/02/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
55	ASOCIACION HITO 79 EJECUCIÓN: Informe consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención a nivel distrital	G.9.pdf	31/03/2016
56	ASOCIACION HITO 84 :EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado	H.5.pdf	05/07/2016
57	ASOCIACION HITO 86 EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	H.7.PDF	05/09/2016
58	ASOCIACION HITO 90-95 ELABORACIÓN PAPP 2017.	I.3.pdf	31/01/2017
59	ASOCIACION HITO 91,92 Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016	I.2..docx	06/01/2017
60	ASOCIACION HITO 93 Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	I.5.pdf	02/03/2017
61	ASOCIACION HITO 94:Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital	I.4.pdf	21/02/2017
62	ASOCIACION HITO.54 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS ABRIL 2015	E.2.pdf	30/04/2015
63	ASOCIACION HITO.56 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS MAYO 2015	E.4.pdf	29/05/2015
64	ASOCIACION HITO.57 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS JUNIO 2015	E.5.pdf	30/06/2015
65	ASOCIACION HITO.58 INFORME EJECUCIÓN ACTIVIDAD DIA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL	E.6.pdf	30/06/2015
66	ASOCIACION INFORME DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - MES ENERO 2015	D.8.pdf	27/04/2015
67	ASOCIADO HITO 11 - 12. Matriz de convenios, cobertura, ejecucion pto por zona y distrito	A.6.ppt	13/04/2015
68	ASOCIADO HITO 23 - 24 Informe de Ejecución del Presupuesto, seguimiento de Convenios y Liquidación del primer desembolso a nivel desconcentrado	B.2.doc	13/04/2015
69	ASOCIADO HITO 13- 19. Informe de primer desembolso por zona y distrito	A.7.pdf	13/04/2015
70	ASOCIADO HITO 20 Informe a la Ejecución del presupuesto	A.8.pdf	13/04/2015
71	ASOCIADO HITO 21 Informe a la Ejecución del presupuesto mes Mayo 2014	A.9.pdf	13/04/2015
72	ASOCIADO HITO 22 Informe - Directrices Financieras para la ejecución presupuestaria de la partida 78	B.1.docx	13/04/2015
73	ASOCIADO HITO 25 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.	B.3.docx	13/04/2015
74	ASOCIADO HITO 31: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de la Mendicidad	B.9.pdf	17/04/2015
75	ASOCIADO HITO 60: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito	E.8..pdf	31/08/2015
76	ASOCIADO HITO 61: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elías del Distrito García Moreno-Guayas,	E.9.pdf	31/08/2015
77	ASOCIADO HITO 62: Liquidación del primer desembolso modalidades acogimiento-mendicidad.trabajo infantil a nivle distrital	F.3.pdf	30/09/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
78	ASOCIADO HITO 63: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito	F.2.pdf	30/09/2015
79	ASOCIADO HITO 80: INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS AÑO 2015 PRESENTADO	H.1.pdf	31/03/2016
80	ASOCIADO HITO 81: INFORME GESTIÓN CUATRIMESTRAL DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL ENERO-ABRIL 2016	H.2..pdf	04/05/2016
81	ASOCIADO HITO 82: EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del proyecto de inversión, presentado.	H.3.pdf	30/05/2016
82	ASOCIADO HITO 83: EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado	H_4..pdf	01/07/2016
83	ASOCIADO HITO 87: EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado	H.8.pdf	03/10/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Maya Romero, María José	Líder Técnica	Gerente Encargada	mjose.maya@inclusion.gob.ec	
