Gobierno por Resultados

Ficha Informativa de Proyecto 2022

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Discapacidades
Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad

PROYECTO: K002 MIES-Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa.

Líder del Proyecto:	Lascano Gomez, Mercedes Liliana (mercedes.lascano@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Zanafria Minango, Liliana del Rocio	Programas Relacionados:	
Titular:	González Cuero, Mónica Delia	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	1.16
CUP:	102800000.0000.383964	TIR:	27.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	886,685.48
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,700,000.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	25/11/2021 - 25/11/2024
Fecha de última actualización:	10/05/2022	Fecha de Fin Base:	25/11/2024
Modificado por:	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	Fecha del siguiente Hito:	03/06/2022

DATOS GENERALES

Descripción
El proyecto busca fortalecer la inclusión social a personas cuidadoras de personas con discapacidad, con la implementación de un modelo de apoyo integral, con el fin de mejorar la calidad de cuidado, autocuidado y las condiciones de vida del cuidador y disminuir el síndrome de sobrecarga del cuidador mediante el fortalecimiento de sus capacidades para mejorar la calidad de cuidado a personas con discapacidad severa.
Beneficios Cualitativos
- Con el fortalecimiento de las capacidades de las personas cuidadores principales y suplentes, se reduce la sobrecarga del cuidador y se mejora la calidad en el cuidado a personas con discapacidad severa. - Con la certificación de las personas cuidadores principales y suplentes, se obtendrá un fortalecimiento en el el cuidado de personas con discapacidad severa obteniendo un tiempo de respiro.
Tipo de Beneficiario
La población objetivo del proyecto está basada en el número de asistentes del cuidado de usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara que asciende a un total de 22.548 personas entre principales y suplentes del cuidado de las personas con discapacidad severa.
Restricciones
- Alcance: Será beneficiarios solo los cuidadores principales y suplentes de las personas usuarias que reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara. - Tiempo: Tiene una duracción de 5 años, por la pandemia de la COVID-19 no se ha ejecutado. - Recursos: Es necesario contar con el Modelo de Redes de Apoyo a las personas con discapacidad atendidas por el MIES y sus familias. - Costo: No se puede exceder los recursos definidos por la fuente de financiemiento.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 17.59 %
Fecha de Inicio: 25/11/2021 **Fecha de Fin:** 25/11/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

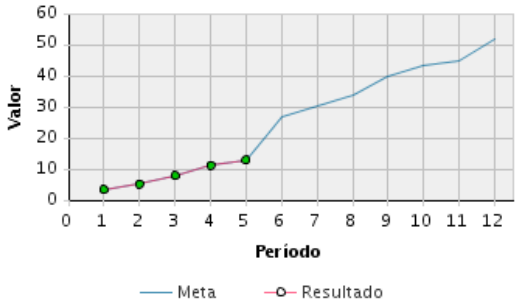

Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2022	Avance programado acumulado											
	3 %	5 %	8 %	11 %	13 %	27 %	30 %	34 %	40 %	43 %	45 %	52 %
	Avance real acumulado											
	3 %	5 %	8 %	11 %	13 %							
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Hitos cumplido correspondiente al mes de abril 2022: 01. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2022. 02. El 26 de abril de 2022 mediante Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0302-M se remitió la programación de los desembolsos actualizados para el ejercicio fiscal 2022, considerando el flujo de caja de la operació L1236. 03. Se tiene la "No objeción" a los términos de referencia y el estudio de mercado para el proceso de contratación de modelo de redes y esquema de incentivos. 04. Se realizó la resolución administrativa Nro. FAISDI-MIES-001-002-2022-CP4634-DD de fecha 05 de abril de 2022, con la declaración de desierto del proceso de contratación del especialista de adquisiciones. 05. Se tiene estructurado los términos de referencia de la contratación de la línea base, y se remitió al BID para la "No Objeción". 06. La ejecución presupuestaria mensual en abril de 2022 es de USD 2.142,02 equivalente al 0,13% y correspondiente al pago de los servicios de la consultoría del especialista legal correspondiente al mes de marzo 2022. 07. La ejecución presupuestaria acumulada es en el grupo de gasto 73 con fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 6.426,06 equivalente al 0,38% del presupuesto total. 08. Se mantiene en fuente 202, organismo 2002 y correlativo 5086 el valor ejecutable por USD 729.535,80. Sin embargo, con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable por el monto de USD 970.464,20.	Lascano Gomez, Mercedes Liliana	10/05/2022 - 06:59 PM
Hitos cumplido correspondiente al mes de marzo 2022: 1.- Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2022. 2.- Se elaboró y se aprobó los informes de los procesos legal, adquisiciones y monitoreo del primer trimestre del 2022. 3.- Se realizó el proceso para la contratación del especialista de adquisiciones, sin embargo, por una error de cálculo en la calificación no se puedo tener una terna, por lo tanto, no se obtuvo la "No Objerción" del BID y se declarará en decierto. Se prevé un nuevo proceso de contratación y se estima tener la contratación hasta el 01 de mayo de 2022. 4.-El 03 de marzo 2022 se verificó en el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF la reforma DIS 50 y AMP 51 por el valor de USD 1.700.000,00 en estado aprobado, en función de lo siguiente: en fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 se tiene un valor ejecutable por USD 729.535,80. Pero con fuente 202, organismo 9999 y correlativo 9999 no ejecutable por el monto de USD 970.464,20. 5. El 22 de marzo de 2022 mediante Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0206-M se remitió el detalle de los desembolsos actualizados para el ejercicio fiscal 2022, con la información en el formato	León Suqui, Fernando David	11/04/2022 - 08:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
establecido considerando los respectivos flujos de caja de las operaciones actualizadas a la fecha. 6.- La ejecución presupuestaria en el grupo de gasto 73 con fuente de financiamiento 202, organismo 2002 y correlativo 5086 es por el valor de USD 4.284,04 equivalente al 7% del presupuesto de la actividad 07 que tiene un monto de USD 57.577,52. La erogación antes mencionada representa el pago de los servicios de la consultoría del especialista legal correspondiente al mes de enero y febrero de 2022.		
Hitos cumplido correspondiente al mes de febrero 2022: 1. El 10 de febrero de 2022 se realizó el seguimiento a la reforma planteada con Nro. MIES-VIS-FGICPDS-2022-01, y solicitado mediante el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF Nro. DIS 50 y AMP 51 por el valor de USD 1.7 millones para el proyecto de discapacidad severa. Asimismo, se realizó una insistencia el 15 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0032-O dirigido a la Subsecretaria de Presupuesto, Olga Núñez y a la Directora de Egresos no Permanentes, Tatiana Calán. La reforma se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 2. El 10 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MSP-MSP-2022-0450-O la Gerencia de Financiamiento Exerno del Ministerio de Salud Pública - MSP, solicitó se informe sobre desembolsos, suscripción de contratos y pagos realizados. Al respecto, el 11 de febrero de 2022 mediante oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0027-O se remitió información sobre un contrato suscrito (especialista de legal), asimismo, se informó que no se ha realizado ningún pago ni desembolso hasta la presente fecha, por parte del Ministerio de Inclusión Económica y social - MIES. 3. El 24 de febrero de 2022 mediante documento Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-0036-O se solicitó al Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF el primer desembolso de recursos del Contrato de Préstamo Nro. 4634/OC-EC L1236 por un valor de USD 100.000,00 dólares. 4. Se elaboró y se aprobó el informe financiero con la ejecución presupuestaria al 28 de febrero de 2022.	León Suqui, Fernando David	11/03/2022 - 08:08 AM
Hitos cumplido correspondiente al mes de enero 2022: 1- El 27 de enero de 2022 se remitió el Plan Anual de la Política Pública - PAPP del proyecto de "Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa", para el ejercicio fiscal 2022. 2. El 31 de enero de 2022 se realizó la reforma Nro. MIES-VIS-FGICPDS-2022-01 para ajustar la planificación y el presupuesto con el organismos 2002 y correlativo 5086.	León Suqui, Fernando David	03/03/2022 - 11:05 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Demora en la solicitud y entrega de las certificaciones presupuestarias plurianuales CAUSARÍA el retraso en la contratación del equipo de gestión (Especialista de Adquisiciones, Financiero y Monitoreo).	24/02/2022	Mercedes Liliana Lascano Gomez	40 %	50	20	1/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planeación: Elaboración y/ o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan	9-Entregables Formales	27/01/2022		27/01/2022		Sí	1.72

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Anual de la Política Pública 2022).							
2	Ejecución: Elaboración de la reforma presupuestaria en función de los saldos disponibles en el Sistema de Administración Financiera - ESIGEF (Reforma presupuestaria).	9-Entregables Formales	31/01/2022		31/01/2022		Sí	1.72
3	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de febrero (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de febrero).	9-Entregables Formales	28/02/2022		28/02/2022		Sí	1.72
4	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2021 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	04/03/2022		04/03/2022		Sí	2.64
5	Ejecución: Elaboración de los informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo (Informes del primer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo).	9-Entregables Formales	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.72
6	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de marzo (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de marzo).	9-Entregables Formales	05/04/2022		05/04/2022		Sí	1.72
7	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de abril (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de abril).	9-Entregables Formales	09/05/2022		09/05/2022		Sí	1.72
8	Ejecución: Consultoría técnica especializada para la coordinación y asistencia técnica para la ejecución de levantamiento de línea base y la evaluación de impacto del componente 3 (Contrato suscrito para la consultoría).	9-Entregables Formales	03/06/2022	03/06/2022			No	1.72
9	Ejecución: Consultoría técnica especializada para la planificación, coordinación y ejecución de las adquisiciones y contrataciones / Especialista de adquisiciones (Contrato suscrito con el especialista de adquisiciones).	9-Entregables Formales	03/06/2022	03/06/2022			No	1.72
10	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de mayo (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de mayo).	9-Entregables Formales	06/06/2022	06/06/2022			No	1.72

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	Ejecución: Elaboración del Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2021 (Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2021).	9-Entregables Formales	15/06/2022	15/06/2022			No	1.72
12	Ejecución: Consultoría de asesoría técnica especializada para la coordinación y seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes para el apoyo de personas con discapacidad (Contrato suscrito para la consultoría).	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	1.72
13	Ejecución: Consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión y el esquema de incentivos del "Modelo Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad Atendidas por el MIES y sus Familias" (Contrato suscrito para Modelo Redes).	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	1.72
14	Ejecución: Elaboración de los informes del segundo trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo (Informes del segundo trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo).	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	1.72
15	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de junio (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de junio).	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	1.72
16	Ejecución: Elaboración del Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2021 (Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2021).	9-Entregables Formales	31/07/2022	31/07/2022			No	1.73
17	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de julio (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de julio).	9-Entregables Formales	31/07/2022	31/07/2022			No	1.72
18	Ejecución: Consultoría para diseñar el plan de formación y capacitación a asistentes de apoyo a personas con discapacidad (Contrato suscrito para "diseñar el plan de formación y capacitación").	9-Entregables Formales	31/08/2022	31/08/2022			No	1.72
19	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de agosto (Informe financiero con	9-Entregables Formales	31/08/2022	31/08/2022			No	1.72

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la ejecución presupuestaria de agosto).							
20	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2022 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	15/09/2022	15/09/2022			No	2.64
21	Ejecución: Elaboración de los informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo).	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	1.72
22	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de septiembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de septiembre).	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	1.72
23	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de octubre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de octubre.	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	1.72
24	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023).	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	1.72
25	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de noviembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de noviembre).	9-Entregables Formales	30/11/2022	30/11/2022			No	1.72
26	Ejecución: Consultoria levantamiento de línea base para evaluación (Contrato suscrito sobre la consultoría para el "Levantamiento de línea base para evaluación").	9-Entregables Formales	29/12/2022	29/12/2022			No	1.72
27	Ejecución: Elaboración de los informes del cuarto trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo (Informes del cuarto trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo).	9-Entregables Formales	29/12/2022	29/12/2022			No	1.72
28	Ejecución: Elaboración del informe financiero con la ejecución presupuestaria de diciembre (Informe financiero con la ejecución presupuestaria de diciembre).	9-Entregables Formales	29/12/2022	29/12/2022			No	1.72
29	Ejecución: Servicio de impresión para material accesible de formación y capacitación, impreso y distribuido (Contrato suscrito	9-Entregables Formales	29/12/2022	29/12/2022			No	1.72

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	sobre la consultoría para el "servicio de impresión para material accesible de formación y capacitación").							
30	Ejecución: Elaboración de los informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo 2022 (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo 2022.)	9-Entregables Formales	31/01/2023	31/01/2023			No	3.58
31	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2023).	9-Entregables Formales	31/01/2023	31/01/2023			No	3.58
32	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2022 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2023	28/02/2023			No	3.58
33	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2022 (Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2022).	9-Entregables Formales	28/02/2023	28/02/2023			No	3.58
34	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2023 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	31/07/2023	31/07/2023			No	3.58
35	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2023 (Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2023).	9-Entregables Formales	31/07/2023	31/07/2023			No	3.58
36	Ejecución: Postulación del proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023 (Proyecto de inversión en el Plan Anual de Inversiones 2023).	9-Entregables Formales	31/10/2023	31/10/2023			No	3.58
37	Ejecución: Elaboración de los informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo 2023 (Informes del tercer trimestre de los procesos legal, adquisiciones y monitreo 2023).	9-Entregables Formales	31/01/2024	31/01/2024			No	3.58
38	Ejecución: Elaboración y/o ajustes al Plan Anual de la Política Pública - PAPP (Plan Anual de la Política Pública 2024).	9-Entregables Formales	31/01/2024	31/01/2024			No	2.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del segundo semestre de 2023 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	28/02/2024	28/02/2024			No	3.58
40	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2023 (Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2023).	9-Entregables Formales	28/02/2024	28/02/2024			No	3.58
41	Ejecución: Informe de monitoreo y evaluación del primer semestre de 2024 del programa L1236 (Informe de monitoreo y evaluación para el BID).	9-Entregables Formales	31/07/2024	31/07/2024			No	3.58
42	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2024 (Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2024).	9-Entregables Formales	31/07/2024	31/07/2024			No	2.58
43	Cierre: Cierre y baja del proyecto de inversión (Informe sobre el cierre y baja del proyecto de inversión).	9-Entregables Formales	30/09/2024	30/09/2024			No	3.46

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de una consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión y el esquema de incentivos del "Modelo Redes de Apoyo a las Personas con Discapacidad Atendidas por el MIES, y sus Familias".		-	-	-	03/01/2022	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,700,000.00 **
Costo Total:	8,770,830.00
Total Devengado:	6,426.06
% Costo Total Devengado:	0.07 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.07 %

Perfil Económico 2022				
	Años Previos	**Año Actual (2022)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	0.00	1,700,000.00	0.00	**1,700,000.00**
Ppto. Externo Planeado	0.00	1,700,000.00	0.00	**1,700,000.00**
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,700,000.00	0.00	**1,700,000.00**
Ppto. Codificado	0.00	1,700,000.00	0.00	**1,700,000.00**
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	1,700,000.00	0.00	**1,700,000.00**
Ppto. Devengado	0.00	6,426.06	0.00	**6,426.06**
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 0.00	1,700,000.00	0.00	**1,700,000.00**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	**0.00**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.38 %	0.00 %	**0.38 %**
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

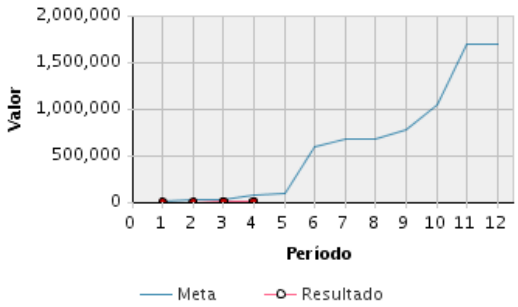

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	9,596.24	0.00	9,596.24	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	9,596.24	0.00	19,192.48	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	9,596.24	4,284.04	28,788.72	4,284.04	14.88 %		0.25 %
Abr	45,346.24	2,142.02	74,134.96	6,426.06	8.67 %		0.38 %
May	18,846.24		92,981.20				
Jun	494,828.34		587,809.54				
Jul	85,898.24		673,707.78				
Ago	9,596.24		683,304.02				
Sep	96,068.76		779,372.78				
Oct	261,364.32		1,040,737.10				
Nov	649,666.50		1,690,403.60				
Dic	9,596.40		1,700,000.00				
Total	**1,700,000.00**	**6,426.06**					

OBJETIVOS ALINEADOS

	Objetivos Operativos
16	Incrementar la eficiencia en la gestión de protección al cuidado de las Personas con Discapacidad MEDIANTE la aplicación de la normativa legal y protocolo de atención integral intra e interinstitucional.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A0 - Actualizacion Dictamen Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0904-OF	A0_-_Actualizacio	03/03/2022
2	A0 - Proyecto Discapacidad Severa 2021-11-23	A0_-_Proyecto_Discapacidad_Severa_2021-11-23.pdf	03/03/2022
3	A0 - Saldo Inicial Discapacidad Severa	A0_-_Saldo_Inicial_Discapacidad_Severa.pdf	03/03/2022
4	B1 - PAPP Discapacidad Severa 2022-01-31	A1_-_PAPP_Discapacidad_Severa_2022-01-31.xlsb	25/02/2022
5	B2 - Reforma MIES-VIS-FGICPDS-2022-01	A2_-_Reforma_MIES-VIS-FGICPDS-2022-01.xlsx	25/02/2022
6	B3 - Informe Financiero DisSev Febrero 2022	A3_-_Informe_Financiero_DisSev_Febrero_2022-signed.pdf	09/03/2022
7	B4 - Informe Gestio#n 2do Semestre 2021 - L1236	A4_-_Informe_Gestio	09/03/2022
8	C1 - Informe Financiero DisSev Marzo 2022	C1_-_Informe_Financiero_DisSev_Marzo_2022-signed.pdf	05/04/2022
9	C2 - Cierre de Riesgo - No Objecio#n TDR Modelo de Redes	C2_-_Riesgo_-_No_Objecio	05/04/2022
10	C3 - Informe Legal L1236 1er Trimestre 2022	C3_-_Informe_Legal_L1236_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	05/04/2022
11	C4 - Informe Adquisiciones L1236 1er Trimestre	C4_-_Informe_Adquisiciones_L1236_1er_Trimestre-signed.pdf	06/04/2022
12	C5 - Informe Seguimiento y Monitoreo L1236 1er Trimestre 2022	C5_-_Informe_SegMonitoreo_L1236_1er_Trimestre_2022-signed.pdf	06/04/2022
13	D1 - Informe Financiero DisSev Abril 2022	Informe_Financiero_DisSev_Abril_2022-signed.pdf	09/05/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lascano Gomez, Mercedes Liliana	Líder del Proyecto de Inversión de Discapacidad Severa	Gerente proyecto MT	mercedes.lascano@inclusion.gob.ec	0992749238
