MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social

Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

PROYECTO: K001 Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.

Líder del Proyecto:	Morales Moncayo, Aida Monserrat (aida.morales@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Lara Cobo, Nelly Beatriz	Programas Relacionados:	
Titular:	Cobo Giler, José Alfonso	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.384446	TIR:	32.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	42,404,618.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,886,221.72
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	20/06/2019 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	07/08/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	León Suqui, Fernando David	Fecha del siguiente Hito:	14/08/2020

DATOS GENERALES

Descripción
El proyecto busca la sostenibilidad socio-económica de la población en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad, a través del acceso a servicios de inclusión económica como el crédito de desarrollo humano, capacitación y acompañamiento técnico; y el fortalecimiento de los servicios de inclusión social que permitan mejorar las condiciones de vida de la población en atención prioritaria principalmente niños, niñas y adultos mayores.
Beneficios Cualitativos
El proyecto tiene como beneficios: 1. Con el Crédito de Desarrollo Humano - CDH, la población logra su sostenibilidad socio-económica; 2. Con el Bono de Desarrollo Humano Variable - BDH-V, los núcleos familiares con hijos menores de edad, romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza; 3. Con la Pensión Mis Mejores Años - PMMA, se reduce la desigualdad de ingresos de las personas adultas mayores.
Tipo de Beneficiario
El proyecto está dirigido a 3 tipos de usuarios: 1. Hogares pobres y no pobres que recibirán un crédito de desarrollo humano; 2. Niños menores de 3 años de hogares extremadamente pobres que acceden al BDH-V y a servicios para la primera infancia; 3. Adultos mayores de hogares extremadamente pobres que reciben PMMA y tienen acceso a servicios de atención.
Restricciones
Alcance: Inclusión y exclusión de la base de datos del registro social 2018. Tiempo: El tiempo de ejecución es limitado hasta diciembre de 2022. Recursos: Liberación oportuna de la base de datos del registro social 2018. Costo: No se puede exceder los recursos definidos por la fuente de financiemiento.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 34.47 %
Fecha de Inicio: 20/06/2019 **Fecha de Fin:** 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

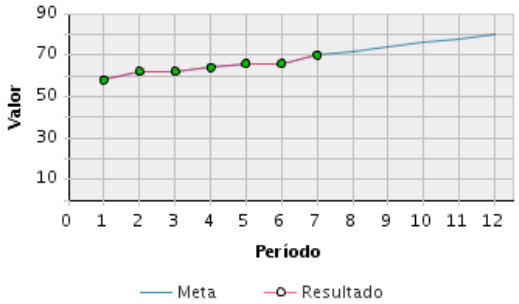

Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2020	Avance programado acumulado											
	58 %	62 %	62 %	64 %	66 %	66 %	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %
	Avance real acumulado											
	58 %	62 %	62 %	64 %	66 %	66 %	70 %					
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Avance físico del proyecto en julio 2020: - Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020, aprobado. - Plan Anual de la Política Pública ejecutado primer semestre 2020, aprobado. - Informe ejecutivo sobe la actualización del proyecto de inversión de Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.	León Suqui, Fernando David	07/08/2020 - 11:41 AM
Avance físico del proyecto en mayo 2020: - Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 0.83 millones en cumplimiento del DLI 5, aprobado.	León Suqui, Fernando David	08/06/2020 - 03:29 PM
Avance físico del proyecto en abril 2020: - Actualización del Manual Operativo del Proyecto - MOP, aprobado.	León Suqui, Fernando David	13/05/2020 - 12:23 PM
Avance físico del proyecto en febrero 2020: - Plan de Adquisiciones para el Banco Mundial, aprobado; - Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre 2019 para el Banco Mundial, aprobado.	León Suqui, Fernando David	23/03/2020 - 02:32 PM
Avance físico del proyecto en enero 2020: - Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 6.1 millones en cumplimiento del DLI 3, aprobado. - Informe de reprogramación presupuestaria de ingresos (DLI) y gastos (Asistencia Técnica) 2020, 2021 y 2022 del Proyecto de Red de Protección Social (BIRF-8946-EC) conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado. - Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado. - Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2019, aprobado.	León Suqui, Fernando David	23/03/2020 - 02:29 PM
Avance físico del proyecto en diciembre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de diciembre 2019 elaborado. - Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR´s de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años". - Términos de referencia - TDR de la Verificación Técnica elaborados. - Cotizaciones para la auditoría financiera recibidos.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 03:17 PM
Avance físico del proyecto en noviembre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de noviembre 2019 elaborado. - Términos de referencia - TDR para la contratación de la auditoría financiera elaborado. - Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 11:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.		
Avance físico del proyecto en octubre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de octubre 2019 elaborado. - Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020 elaborado. - Informe de justificación del recorte presupuestario al proyceto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado. - Plan operativo de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 11:07 AM
Avance físico del proyecto en septiembre 2019: - Se elaboró un documento preliminar con el plan de adquisiciones. - Se realizó los términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 10:13 AM
Avance físico del proyecto en agosto 2019: - Acuerdo Ministerial Nro. 125 emitido por el MIES para calificar como emblemático al proyeto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES". - Acuerdo Ministerial emitido por el MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 09:48 AM
Avance físico del proyecto en Julio 2019: -Se suscribió el acta resolutiva suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US$ 350 millones. -Se firmó el acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 09:36 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Si el Acuerdo Interinstutcional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES y el BanEcuador no se firma CAUSARÍA un impedimiento en la entrega del Crédito de Desarrollo Humano - CDH a los beneficiarios.	07/08/2020	Aida Monserrat Morales Moncayo	30 %	30	9	0/1
5- PROYECTO. * General. Variación en la fecha en la liberación del Registro Social 2018 CAUSARÍA demora en la entrega de las transferencias monetarias a los beneficiarios.	16/06/2020	Aida Monserrat Morales Moncayo	30 %	30	9	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición: Acta resolutiva suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US$ 350 millones.	Z - Compromiso Ministerial	10/07/2019		10/07/2019		Sí	3.0
2	Planeación: Acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	Z - Compromiso Ministerial	22/07/2019		22/07/2019		Sí	3.0
3	Planeación: Acuerdo Ministerial emitido por la Ministra del MIES para calificar como emblemático al proyeto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".	Z - Compromiso Ministerial	14/08/2019		14/08/2019		Sí	3.0
4	Planeación: Acuerdo Ministerial por la Ministra del MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	Z - Compromiso Ministerial	27/08/2019		27/08/2019		Sí	3.0
5	Ejecución: Plan de Adquisiciones elaborado.	4-Inicio de Trabajo	20/09/2019		20/09/2019		Sí	3.0
6	Ejecución: Términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.	9-Entregables Formales	27/09/2019		27/09/2019		Sí	2.0
7	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de octubre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	04/10/2019		04/10/2019		Sí	2.0
8	Ejecución: Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	18/10/2019		18/10/2019		Sí	3.0
9	Ejecución: Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	21/10/2019		21/10/2019		Sí	3.0
10	Ejecución: Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020 elaborado.	9-Entregables Formales	21/10/2019		21/10/2019		Sí	3.0
11	Ejecución: Informe de justificación del recorte presupuestario al proyceto "Diseño e Implementación	9-Entregables Formales	22/10/2019		22/10/2019		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.							
12	Ejecución: Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado.	9-Entregables Formales	23/10/2019		23/10/2019		Sí	2.0
13	Ejecución: Plan operativo de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	2.0
14	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de noviembre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	05/11/2019		05/11/2019		Sí	2.0
15	Ejecución: Términos de referencia - TDR para la contratación de la auditoría financiera elaborado.	9-Entregables Formales	20/11/2019		20/11/2019		Sí	2.0
16	Ejecución: Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados.	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	2.0
17	Ejecución: Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	2.0
18	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de diciembre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	05/12/2019		05/12/2019		Sí	2.0
19	Ejecución: Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR ´s de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años".	9-Entregables Formales	10/12/2019		10/12/2019		Sí	2.0
20	Ejecución: Términos de referencia - TDR de la Verificación Técnica elaborados.	9-Entregables Formales	10/12/2019		10/12/2019		Sí	2.0
21	Ejecución: Cotizaciones para la auditoría financiera recibidos.	9-Entregables Formales	15/12/2019		15/12/2019		Sí	2.0
22	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 6.1 millones en cumplimiento del DLI 3, aprobado.	5-Entregables Intermedios	06/01/2020		06/01/2020		Sí	2.0
23	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2019, aprobado.	9-Entregables Formales	10/01/2020		10/01/2020		Sí	2.0
24	Planeación: Programación de ingresos (DLI) y gastos (Asistencia Técnica) 2020, 2021 y 2022 del Proyecto de Red de Protección Social	9-Entregables Formales	14/01/2020		14/01/2020		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(BIRF-8946-EC) conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.							
25	Planeación: Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.	Z - Compromiso Ministerial	16/01/2020		16/01/2020	●	Sí	2.0
26	Ejecución: Plan de Adquisiciones para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	11/02/2020		11/02/2020	●	Sí	2.0
27	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre 2019 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	14/02/2020		14/02/2020	●	Sí	2.0
28	Ejecución: Actualización del Manual Operativo del Proyecto - MOP, aprobado.	9-Entregables Formales	08/04/2020		08/04/2020	●	Sí	2.0
29	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 0.83 millones en cumplimiento del DLI 5, aprobado.	9-Entregables Formales	18/05/2020		18/05/2020	●	Sí	2.0
30	Ejecución: Informe ejecutivo sobe la actualización del proyecto de inversión de Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.	9-Entregables Formales	22/07/2020		22/07/2020	●	Sí	1.0
31	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020	●	Sí	2.0
32	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública ejecutado primer semestre 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020	●	Sí	1.0
33	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre del 2020 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	14/08/2020	14/08/2020		▼	No	2.0
34	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 5 millones en cumplimiento del DLI 6, aprobado.	9-Entregables Formales	15/09/2020	15/09/2020		●	No	2.0
35	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por un valor máximo de USD 60.6 millones en cumplimiento del DLI 7, aprobado.	9-Entregables Formales	15/10/2020	15/10/2020		●	No	2.0
36	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor máximo de USD 20 millones en cumplimiento del DLI 4, aprobado.	9-Entregables Formales	16/11/2020	16/11/2020		●	No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
37	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública ejecutado segundo semestre 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	30/12/2020	30/12/2020			No	2.0
38	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	29/01/2021	29/01/2021			No	2.0
39	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre de 2020 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	15/02/2021	15/02/2021			No	2.0
40	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2021, aprobado.	9-Entregables Formales	16/07/2021	16/07/2021			No	2.0
41	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre de 2021 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	13/08/2021	13/08/2021			No	2.0
42	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2021, aprobado.	9-Entregables Formales	14/01/2022	14/01/2022			No	2.0
43	Ejecución: Informe de financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre de 2021 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	15/02/2022	15/02/2022			No	2.0
44	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2022, aprobado.	9-Entregables Formales	15/07/2022	15/07/2022			No	2.0
45	Ejecución: Informe de financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre de 2022 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	15/08/2022	15/08/2022			No	2.0
46	Cierre: Informe de financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre de 2022 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	30/12/2022	30/12/2022			No	2.0
47	Cierre: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2022, aprobado.	9-Entregables Formales	30/12/2022	30/12/2022			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de usuarios del MIES fortalecidos en los servicios de inclusión económica y social.		-	-	-	01/01/2020	-
2	Número de informes de ejecución del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".		100.00 %	1	1	01/07/2019	Jul-Dic
3	Número de informes financieros a nivel desconcentrado conforme a las Misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años"		100.00 %	1	1	01/07/2019	Jul-Dic
4	Número de procesos de contratación que incluye verificación técnica y auditoría financiera iniciados		33.33 %	6	2	01/07/2019	Jul-Dic
5	Número de manuales operativos presentandos al Banco Mundial.		100.00 %	1	1	01/07/2019	Jul-Dic
6	Entregar Créditos de Desarrollo Humano - CDH a los usuarios beneficiarios de los programas de inclusión económica.		-	-	-	01/01/2020	-
7	Elaborar instrumentos para servicios de inclusión económica y social y fortalecer las microredes de emprendimiento, capacidades y acceso a mercados, modalidades de Crédito de Desarrollo Humano - CDH y una estrategia de tecnología social.		-	-	-	01/01/2020	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,886,221.72 **
Costo Total:	180,486,200.00
Total Devengado:	141,397.07
% Costo Total Devengado:	0.08 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.08 %

Perfil Económico 2020				
	Años Previos	**Año Actual (2020)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	161,722.29	6,835,807.05	0.00	**6,997,529.34**
Ppto. Externo Planeado	66,943,285.71	0.00	0.00	**66,943,285.71**
Ppto. Aprobado Inicial	61,604.52	11,200,000.00	0.00	**11,261,604.52**
Ppto. Codificado	61,604.52	6,835,807.05	0.00	**6,897,411.57**
Ppto. Comprometido	50,414.67	116,035.82	0.00	**166,450.49**
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	67,105,008.00	6,835,807.05	0.00	**73,940,815.05**
Ppto. Devengado	50,414.67	90,982.40	0.00	**141,397.07**
Pagado Real	50,414.67	65,503.03	0.00	**115,917.70**
Estimado a fin de año	* 50,414.67	6,835,807.05	0.00	**6,886,221.72**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	67,054,593.33	0.00	0.00	**67,054,593.33**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.08 %	1.33 %	0.00 %	**0.19 %**
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

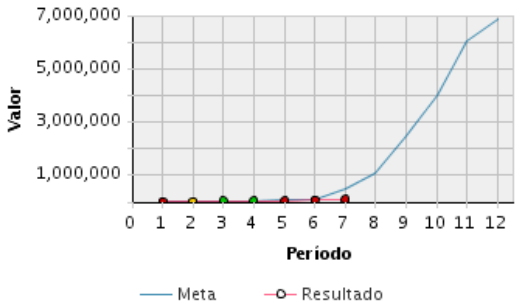

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	13,522.76	10,911.26	13,522.76	10,911.26	80.69 %		0.16 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	13,522.76	13,374.21	27,045.52	24,285.47	89.79 %		0.36 %
Mar	13,522.76	13,513.82	40,568.28	37,799.29	93.17 %		0.55 %
Abr	13,522.76	11,676.09	54,091.04	49,475.38	91.47 %		0.72 %
May	20,665.71	4,090.11	74,756.75	53,565.49	71.65 %		0.78 %
Jun	27,569.63	27,278.80	102,326.38	80,844.29	79.01 %		1.18 %
Jul	398,254.43	10,138.11	500,580.81	90,982.40	18.18 %		1.33 %
Ago	586,481.78		1,087,062.59				
Sep	1,411,270.11		2,498,332.70				
Oct	1,498,206.39		3,996,539.09				
Nov	2,024,442.84		6,020,981.93				
Dic	814,825.12		6,835,807.05				
Total	**6,835,807.05**	**90,982.40**					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la efectividad en la prestación de los servicios financieros y no financieros a los usuarios del BDH, BDHV y Pensiones MEDIANTE la implementación de acuerdos interinstitucionales generados con carácter popular y solidario.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta resolutiva suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US$ 350 millones.	2._Acta_Resolutiva_Nro_19_del_2019-07-10.pdf	24/12/2019
2	Acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	3._Acuerdo_de_Pre	24/12/2019
3	Acuerdo Ministerial emitido por el MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	6._Acuerdo_Ministerial_Nro._128_MOP.pdf	24/12/2019
4	Acuerdo Ministerial emitido por la Ministra del MIES para calificar como emblemático al proyeto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".	7._Acuerdo_Ministerial_Nro._125_Proy_Embl.pdf	24/12/2019
5	Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados.	14._Anexo_2_-_Certificacio	24/12/2019
6	Cotizaciones para la auditoría financiera recibidas	Cotizaciones_Auditori	24/12/2019
7	Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR´s de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años".	Informe_1er_Reembolso_BIRF-8946.pdf	24/12/2019
8	Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	Incremento_presupuestario_del_proyecto_DISIES.pdf	24/12/2019
9	Informe de justificación del recorte presupuestario al proyecto DISIES.	Justificacio	24/12/2019
10	Informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Presupuestaria del 2do semestre de 2019	Informe_Seg_y_Eval_Presupuestaria.pdf	12/02/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	Informe de seguimiento y evaluación presupuestaria del primer semestre 2020	Informe_de_Seguimiento_y_Evaluacio	07/08/2020
12	Informe Desembolso DLI 3 Aprobado por el Banco Mundial	Informe_Desembolso_DLI_3_Aprobado_BM.zip	12/02/2020
13	Informe Desembolso DLI 5 Aprobado por el Banco Mundial	Informe_Desembolso_DLI_5_Aprobado_BM.zip	08/06/2020
14	Informe Financiero Interino IFR del 2do Semestre de 2019	Informe_Financiero_Interino_IFR_2do_Sem_2019.zip	23/03/2020
15	Informe Técnico del Proyecto Red de Protección Social en Aplicación del Acuerdo Ministerial 001	Informe_Te	12/02/2020
16	Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.	Informe_Te	12/02/2020
17	Manual Operativo del Proyecto - MOP 2020-04-08	Manual_Operativo_del_Proyecto_Actualizado_al_08_Abril_2020.zip	23/06/2020
18	Plan Anual de la Política Públcia ejecutado en el primer semestre 2020	PAPP_Ejecutado_Primer_Semestre_2020.zip	07/08/2020
19	Plan anual de la política pública - PAPP de diciembre de 2019	PAPP_2019-12-04.xls	24/12/2019
20	Plan anual de la política pública - PAPP de noviembre de 2019	PAPP_2019-11-05.xls	24/12/2019
21	Plan anual de la política pública - PAPP de octubre de 2019	PAPP_2019-10-02.xls	24/12/2019
22	Plan de Adquisiciones Banco Mundial 2020/02/11	Plan_de_Adquisiciones_para_el_Banco_Mundial__aprobado.zip	23/03/2020
23	Plan de Adquisiciones elaborado.	Plan_de_Adquisiciones_2019-09-21.xlsx	24/12/2019
24	Plan operativo anual de los proyectos RSS y DISIES	Plan_Operativo_Anual_RSS-DISIES.xlsx	24/12/2019
25	Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto DISIES.	Proforma_Presupuestaria_2020.xls	24/12/2019
26	Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto.	Programacio	24/12/2019
27	Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020.	Reporte_Ajuste_Techos_Presupuestarios_2020_.xlsx	24/12/2019
28	Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado.	Reporte_de_Gasto_Retroactivo_y_no_Retroactivo_de_las_Misiones.pdf	24/12/2019
29	Términos de referencia - TDR para la auditoría Técnica elaborados.	TDR_Auditori	24/12/2019
30	Términos de referencia - TDR para la verificación técnica elaborados.	TDR_Verificacio	24/12/2019
31	Términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.	TDR_de_los_Especialistas.pdf	24/12/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Morales Moncayo, Aida Monserrat	Lider del proyecto	Gerente Proyecto	aida.morales@inclusion .gob.ec	
