Gobierno por Resultados

Ficha Informativa de Proyecto 2024

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Discapacidades
Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad

PROYECTO: K004 MIES-Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES.

Líder del Proyecto:	RON ARIAS, DIEGO JAVIER (diego.ron@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bazán Lucas, Manuel Alejandro	Programas Relacionados:	
Titular:	Ñauñay Guerrero, Doris Yolanda	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387167	TIR:	23.65 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	7,959,744.68
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,975,535.87
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	05/11/2024	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Ron Arias, Diego Javier	Fecha del siguiente Hito:	13/11/2024

DATOS GENERALES

Descripción
El proyecto de inversión se plantea con la finalidad de fortalecer la gestión que la Subsecretaría realiza para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus redes de apoyo, a través de servicios institucionalizados con los Centros Diurnos de desarrollo Integral para personas con discapacidad , Centros de Referencia y Acogida y Atención en el Hogar y la Comunidad para personas con discapacidad, además del seguimiento a la gestión y proceso de corresponsabilidad de los beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, así como a las personas responsables del cuidado a ser atendidas bajo la modalidad de Comités de Personas Responsables del Cuidado.
Beneficios Cualitativos
- Contribuir a la construcción de un sistema integral de servicios adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad que aporte a mejorar su calidad de vida. - Elevar los niveles de autonomía e independencia de las personas con discapacidad, para su inclusión social y económica, a través del desarrollo de sus habilidades. - Gestionar las acciones que permitan fortalecer los círculos de apoyo a personas con discapacidad; y, la actoría de las personas responsables del cuidado. - Desarrollar estrategias para el cuidado y la atención a personas con discapacidad a través de talento humano
Tipo de Beneficiario
Personas con discapacidad de 18 a 64 años, once meses y veintinueve días; con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad, tal como se indica en la misión de la Subsecretaría de Discapacidades Acuerdo Ministerial 030, de 16 de junio de 2020. Usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, - Personas con discapacidad grave, muy Grave y completa en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. - Personas con Enfermedades Catastróficas, Raras y Huérfanas en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. - Niños, Niñas y Adolescentes menores de 18 años viviendo con VIH-SIDA en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. Tal como se indica en el Acuerdo Ministerial 033, de 21 de mayo de 2021.
Restricciones
Recursos: déficit en el número de personal técnico contratado para la ejecución de los componentes, debido a la disminución de recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 71.18 %
Fecha de Inicio: 01/01/2022 **Fecha de Fin:** 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

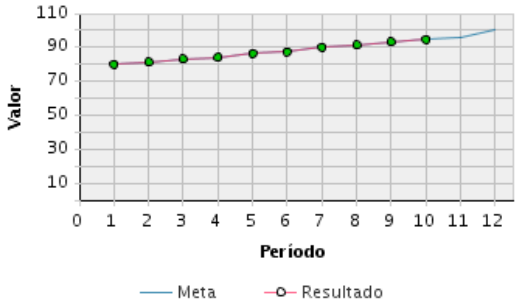

Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2024	Avance programado acumulado											
	80 %	81 %	83 %	84 %	86 %	88 %	90 %	91 %	93 %	94 %	96 %	100 %
	Avance real acumulado											
	80 %	81 %	83 %	84 %	86 %	88 %	90 %	91 %	93 %	94 %		
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2024: El proyecto tiene al 31 de OCTUBRE como codificado un valor de USD 4.511.052,03, esto debido al incremento de recursos para la suscripción de convenios modificatorios, al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 2.584.978,87 del 27,30%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios.	Ron Arias, Diego Javier	05/11/2024 - 09:09 AM
SEPTIEMBRE 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 3.855.828,93, para su ejecución al 30 de SEPTIEMBRE al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 2.439.963,58 del 63,37.65%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios.	Ron Arias, Diego Javier	05/10/2024 - 07:19 PM
AGOSTO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 3.855.828,93, para su ejecución al 31 de AGOSTO al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 2.145.903,56 del 55.65%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de AGOSTO se cuenta con 117 convenios	Ron Arias, Diego Javier	02/09/2024 - 02:38 PM
JULIO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 3.855.828,93, para su ejecución al 31 de JULIO al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 1.636.736,09 del 42.45%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de JULIO se cuenta con 115 convenios	Ron Arias, Diego Javier	02/08/2024 - 03:24 PM
JUNIO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 3.855.828,93, para su ejecución al 30 de JUNIO al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 209.837,19 del 5.44%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 30 de JUNIO se cuenta con 84 convenios lo que significa una ejecución del 71.2%.	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	04/07/2024 - 03:04 PM
MAYO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 4.700.000,00, para su ejecución al 31 de MAYO al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 175.868,09 del 3.70%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de MAYO se cuenta con 0 convenios lo que significa una ejecución del 0%, esto debido a que no se contaba con organismo y correlativo, sin embargo a finales de mes, ya se cuenta con el recurso y se inicia el trámite de avales.	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	04/06/2024 - 09:32 AM
ABRIL 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 4.207.426,77, para su ejecución al 30 de ABRIL al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria de 140.224,91 del 28.47%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 30 de ABRIL se cuenta con 0 convenios lo que significa una ejecución del 0%, esto debido a que no se cuenta con organismo y correlativo, lo que implica que no se puedan realizar lo trámites de reforma PAPP y avales ante el MEF	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	02/05/2024 - 02:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 4675861,94, para su ejecución, al 31 de enero se cuenta con un codificado de USD 4.666.867,09 al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria del 2,22%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de marzo se cuenta con 0 convenios lo que significa una ejecución del 01%, esto debido a que no se cuenta con organismo y correlativo, lo que implica que no se puedan realizar lo trámites de reforma PAPP y avales ante el MEF	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	01/04/2024 - 04:05 PM
FEBRERO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 4675861,94, para su ejecución, al 31 de enero se cuenta con un codificado de USD 4675861,94 al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria del 1.34%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los 1cuales al 31 de enero se cuenta con 0 convenios lo que significa una ejecución del 01%, esto debido a que no se cuenta con organismo y correlativo, lo que implica que no se puedan realizar lo trámites de reforma PAPP y avales ante el MEF	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	15/03/2024 - 12:47 AM
ENERO 2024: El proyecto tiene como codificado un valor de USD 4675861,94, para su ejecución, al 31 de enero se cuenta con un codificado de USD 4675861,94 al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria del 00%, para el año 2024 se planificó la suscripción de 118 convenios para la atención de 11700 usuarios, de los cuales al 31 de enero se cuenta con 0 convenios lo que significa una ejecución del 01%, esto debido a que no se cuenta con organismo y correlativo, lo que implica que no se puedan realizar lo trámites de reforma PAPP y avales ante el MEF	Intriago Bravo, Yaromi Oriana	15/03/2024 - 12:42 AM
DICIEMBRE: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 31 de DICIEMBRE se cuenta con un codificado de USD 4.287.868,89 al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria del 97.00%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de diciembre se cuenta con 111 convenios lo que significa una ejecución del 100.91%, esto debido a que se reemplazo un convenio en la Coordinación Zonal 5, sin embrago no implica aumento de cobertura o de presupuesto.	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	04/01/2024 - 03:09 PM
NOVIEMBRE: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 30 de NOVIEMBRE se cuenta con un codificado de USD 4.074.197,12 al momento se cuenta con una ejecución presupuestaria del 90.80%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 30 de noviembre se cuenta con 111 convenios lo que significa una ejecución del 100.91%, esto debido a que se reemplazo un convenio en la Coordinación Zonal 5, sin embrago no implica aumento de cobertura o de presupuesto.	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	04/12/2023 - 08:46 AM
OCTUBRE: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 31 de OCTUBRE se cuenta con un codificado de USD 4.551.667,75 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 78.80%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de octubre se cuenta con 111 convenios lo que significa una ejecución del 100.91%, esto debido a que se reemplazo un convenio en la Coordinación Zonal 5, sin embrago no implica aumento de cobertura o de presupuesto.	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	01/11/2023 - 11:06 AM
SEPTIEMBRE: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 30 de SEPTIEMBRE se cuenta con un codificado de USD 4937357,92 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 73.62%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 30 de septiembre se cuenta con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	02/10/2023 - 04:08 PM
AGOSTO: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 31 de AGOSTO se cuenta con un codificado de USD 4.977.357,92 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 64.37%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de agosto se cuenta con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	27/09/2023 - 03:49 PM
JULIO: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 31 de JULIO se cuenta con un codificado de USD 5.023.857,92 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 40.5%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de julio se cuenta con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Mackliff Jacome, Alberto Vicente	03/08/2023 - 10:58 AM
JUNIO: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 30 de JUNIO se cuenta con un codificado de USD 5.023.857,92 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 43.77%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 30 de junio se cuenta con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Chamba Revilla, Miro Fernando	05/07/2023 - 10:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO: El proyecto recibió un valor de USD 5.115.000, para su ejecución, al 31 de mayo se cuenta con un codificado de USD 5.044.990,82 al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 40.95%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de mayo se cuenta con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Sarzosa, Luis	01/06/2023 - 11:17 AM
ABRIL: El proyecto cuenta con un presupuesto de USD 5.115.000, al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 37.03%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 30 de abril de se cuentan con 110 convenios lo que significa una ejecución del 100.0%	Sarzosa, Luis	03/05/2023 - 11:13 PM
MARZO: El proyecto cuenta con un presupuesto de USD 5.115.000, al momento se tiene una ejecución presupuestaria del 13.23%, para el año 2023 se planificó la suscripción de 110 convenios para la atención de 10440 usuarios, de los cuales al 31 de marzo de se cuentan con 109 convenios lo que significa una ejecución del 99.09%	Sarzosa, Luis	04/04/2023 - 02:48 PM
FEBRERO: este mes se han suscrito 104 convenios y se ha ejecutado el 3.36% del presupuesto asignado	Sarzosa, Luis	07/03/2023 - 09:42 AM
ENERO: para el año 2023 se ha planificado la suscripción de 110 convenios de inversión, de los cuales al 31 de enero de 2023 se han suscrito 70 convenios.	Sarzosa, Luis	07/03/2023 - 08:55 AM
DICIEMBRE 2022: en este mes se ha ejecutado el 92,11 del presupuesto asignado para el proyecto, además de que existen 117 convenios suscritos que se encuentran brindando servicios.	Sarzosa, Luis	04/01/2023 - 09:06 PM
NOVIEMBRE 2022: en este mes se ha ejecutado el 75,85 del presupuesto asignado para el proyecto, además de que existen 117 convenios suscritos que se encuentran brindando servicios.	Sarzosa, Luis	05/12/2022 - 08:05 PM
OCTUBRE 2022: en este mes se cuenta con una ejecución del 70.33%, y la firma de 117 convenios.	Sarzosa, Luis	07/11/2022 - 09:09 AM
SEPTIEMBRE 2022: en este mes se cuenta con una ejecución del 57.74%, y la firma de 117 convenios.	Sarzosa, Luis	05/10/2022 - 07:51 AM
AGOSTO 2022: en este mes se cuenta con una ejecución del 54.87%, y la firma de 117 convenios.	Sarzosa, Luis	01/09/2022 - 03:27 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de julio se cuenta con una ejecución del 45, 81%, y la firma de 117 convenios	Sarzosa, Luis	05/08/2022 - 10:47 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de junio se cuenta con una ejecución del 45, 81%, y la firma de 117 convenios	Obando Ortiz, Zoila Gabriela	05/08/2022 - 09:26 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de junio se cuenta con una ejecución del 36, 89%, y la firma de 116 convenios	Sarzosa, Luis	05/07/2022 - 11:57 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de mayo se cuenta con una ejecución del 26, 74%, y la firma de 113 convenios	Sarzosa, Luis	05/07/2022 - 11:53 AM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 -	Sarzosa, Luis	06/05/2022 - 08:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de abril se cuenta con una ejecución del 10, 20%, y la firma de 68 convenios		
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de marzo se cuenta con una ejecución del 20%,	Pozo Fierro, Gabriela Alexandra	06/04/2022 - 12:32 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00, el mes de febrero cuanta con una ejecución del 13%.	Sarzosa Mossot, Luis Alberto	05/03/2022 - 09:22 PM
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1123-OF, de 14 de diciembre de 2021, se emite el dictamen de prioridad para el Proyecto: "Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el MIES", con número de CUP: 102800000.0000.387167, por un monto total de USD 42.164.298,74, para el período: 2022 - 2025, siendo que para el 2022 se ejecutará 5.500.000,00.	Sarzosa Mossot, Luis Alberto	04/02/2022 - 03:19 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La disminución o falta de asignación presupuestaria para el proyecto de inversión CAUSARÍA el retraso en el cumplimiento de los componentes.	01/03/2024		60 %	50	30	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición. Dictamen de prioridad, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/01/2022		05/01/2022		Sí	0.3
2	Planificación: Fichas de Costos, entregadas	5-Entregables Intermedios	05/01/2022		05/01/2022		Sí	0.3
3	Planificación: Matriz de Microplanificación, entregado	5-Entregables Intermedios	13/01/2022		13/01/2022		Sí	0.3
4	Planificación: Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2022, entregado	5-Entregables Intermedios	31/01/2022		31/01/2022		Sí	0.3
5	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria enero, entregado	5-Entregables Intermedios	07/02/2022		07/02/2022		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	Ejecución: Informe de cobertura mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2022		10/02/2022		Sí	0.3
7	Ejecución: Informe y ficha al mes enero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2022		10/02/2022		Sí	0.3
8	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	07/03/2022		07/03/2022		Sí	0.3
9	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	09/03/2022		09/03/2022		Sí	0.3
10	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	09/03/2022		09/03/2022		Sí	0.3
11	Ejecución: Informe de cobertura mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2022		10/03/2022		Sí	0.3
12	Ejecución: Informe y ficha al mes febrero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2022		10/03/2022		Sí	0.3
13	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	05/04/2022		05/04/2022		Sí	0.3
14	Ejecución: Informe de cobertura mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	11/04/2022		11/04/2022		Sí	0.3
15	Ejecución: Informe y ficha al mes marzo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/04/2022		11/04/2022		Sí	0.3
16	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/05/2022		05/05/2022		Sí	0.3
17	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria abril, entregado	5-Entregables Intermedios	05/05/2022		05/05/2022		Sí	0.3
18	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	09/05/2022		09/05/2022		Sí	0.3
19	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	09/05/2022		09/05/2022		Sí	0.3
20	Ejecución: Informe de cobertura mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2022		10/05/2022		Sí	0.3
21	Ejecución: Informe y ficha al mes abril de la gerencia	5-Entregables Intermedios	10/05/2022		10/05/2022		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	sobre la ejecución del proyecto entregado							
22	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	05/06/2022		05/06/2022		Sí	0.3
23	Ejecución: Informe de cobertura mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	10/06/2022		10/06/2022		Sí	0.3
24	Ejecución: Informe y ficha al mes mayo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/06/2022		10/06/2022		Sí	0.3
25	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	0.3
26	Ejecución: Informe consolidado del segundo desembolso a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	0.3
27	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria junio, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	0.3
28	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	07/07/2022		07/07/2022		Sí	0.3
29	Ejecución: Informe de cobertura mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	0.3
30	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	0.3
31	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	0.3
32	Ejecución:Informe y ficha al mes junio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2022		13/07/2022		Sí	0.3
33	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria julio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/08/2022		05/08/2022		Sí	0.3
34	Ejecución: Informe de cobertura mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	11/08/2022		11/08/2022		Sí	0.3
35	Ejecución: Informe y ficha al mes julio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/08/2022		11/08/2022		Sí	0.3
36	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	05/09/2022		05/09/2022		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
37	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	05/09/2022		05/09/2022		Sí	0.3
38	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	07/09/2022		07/09/2022		Sí	0.3
39	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	07/09/2022		07/09/2022		Sí	0.3
40	Ejecución: Informe y ficha al mes agosto de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	12/09/2022		12/09/2022		Sí	0.3
41	Ejecución:Informe de cobertura mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	12/09/2022		12/09/2022		Sí	0.3
42	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	0.3
43	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	0.0
44	Ejecución: Matriz proforma presupuestaría 2023, entregada	5-Entregables Intermedios	07/10/2022		07/10/2022		Sí	0.3
45	Ejecución:Informe de cobertura mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		11/10/2022		Sí	0.3
46	Ejecución:Informe y ficha al mes septiembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		11/10/2022		Sí	0.3
47	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	07/11/2022		07/11/2022		Sí	0.3
48	Ejecución:Informe de cobertura mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2022		10/11/2022		Sí	0.3
49	Ejecución:Informe y ficha al mes octubre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2022		10/11/2022		Sí	0.3
50	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	22/11/2022		09/11/2022		Sí	0.3
51	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	22/11/2022		09/11/2022		Sí	0.3
52	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	05/12/2022		05/12/2022		Sí	0.3
53	Ejecución:Informe de cobertura mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	12/12/2022		12/12/2022		Sí	0.3
54	Ejecución:Informe y ficha al mes noviembre de la gerencia	5-Entregables Intermedios	12/12/2022		12/12/2022		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	sobre la ejecución del proyecto entregado							
55	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.3
56	Ejecución:Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.3
57	Ejecución:Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.3
58	Ejecución:Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.3
59	Ejecución:Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.3
60	Ejecución:Informe de cobertura mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.3
61	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.3
62	Ejecución:Informe y ficha al mes diciembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.3
63	Ejecución: Fichas de Costos, entregadas	5-Entregables Intermedios	05/01/2023		05/01/2023		Sí	0.33
64	Ejecución: Matriz de Microplanificación, entregado	5-Entregables Intermedios	13/01/2023		13/01/2023		Sí	0.33
65	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2023, entregado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.34
66	Ejecución: Informe de cobertura mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2023		10/02/2023		Sí	0.3
67	Ejecución: Informe y ficha al mes enero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2023		10/02/2023		Sí	0.3
68	Ejecución; Informe de ejecución presupuestaria enero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/02/2023		10/02/2023		Sí	0.3
69	Ejecución: Informe de caracterización mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/02/2023		16/02/2023		Sí	0.3
70	Ejecución: Informe de alertas mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/02/2023		16/02/2023		Sí	0.3
71	Ejecución: Informe de cobertura mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2023		10/03/2023		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
72	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2023		10/03/2023		Sí	0.3
73	Ejecución: Informe y ficha al mes febrero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	10/03/2023		10/03/2023		Sí	0.3
74	Ejecución: Informe de caracterización mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2023		16/03/2023		Sí	0.3
75	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2023		16/03/2023		Sí	0.3
76	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2023		16/03/2023		Sí	0.3
77	Ejecución: Informe de alertas mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2023		16/03/2023		Sí	0.3
78	Ejecución:Informe de ejecución presupuestaria marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	10/04/2023		10/04/2023		Sí	0.3
79	Ejecución; Informe y ficha al mes marzo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/04/2023		10/04/2023		Sí	0.3
80	Ejecución: Informe de cobertura mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	11/04/2023		11/04/2023		Sí	0.3
81	Ejecución: Informe de caracterización mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	17/04/2023		17/04/2023		Sí	0.3
82	Ejecución:Informe de alertas mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	17/04/2023		17/04/2023		Sí	0.3
83	Ejecución: Informe de cobertura mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2023		10/05/2023		Sí	0.3
84	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria abril, entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2023		10/05/2023		Sí	0.3
85	Ejecución: Informe y ficha al mes abril de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/05/2023		10/05/2023		Sí	0.3
86	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	12/05/2023		12/05/2023		Sí	0.3
87	Ejecución: Informe de alertas mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2023		16/05/2023		Sí	0.3
88	Ejecución:Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2023		16/05/2023		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
89	Ejecución:Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2023		16/05/2023		Sí	0.3
90	Ejecución:Informe de caracterización mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2023		16/05/2023		Sí	0.3
91	Ejecución: Informe y ficha al mes mayo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	09/06/2023		09/06/2023		Sí	0.3
92	Ejecución: Informe de cobertura mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	12/06/2023		12/06/2023		Sí	0.3
93	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	12/06/2023		12/06/2023		Sí	0.3
94	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria junio, entregado	5-Entregables Intermedios	10/07/2023		10/07/2023		Sí	0.3
95	Ejecución: Informe y ficha al mes junio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/07/2023		10/07/2023		Sí	0.3
96	Ejecución:Informe de cobertura mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	10/07/2023		10/07/2023		Sí	0.3
97	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2023		13/07/2023		Sí	0.3
98	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2023		13/07/2023		Sí	0.3
99	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2023		16/07/2023		Sí	0.3
100	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2023		16/07/2023		Sí	0.3
101	Ejecución: Informe de alertas mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2023		16/07/2023		Sí	0.3
102	Ejecución:Informe de caracterización mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2023		16/07/2023		Sí	0.3
103	Ejecución: Informe de alertas mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		17/07/2023		Sí	0.3
104	Ejecución: Informe de caracterización mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		17/07/2023		Sí	0.3
105	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria julio, entregado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
106	Ejecución: Informe de cobertura mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.3
107	Ejecución: Informe y ficha al mes julio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.3
108	Ejecución: Informe de alertas mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2023		16/08/2023		Sí	0.3
109	Ejecución: Informe de caracterización mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2023		16/08/2023		Sí	0.3
110	Ejecución: Informe y ficha al mes agosto de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	11/09/2023		11/09/2023		Sí	0.3
111	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	11/09/2023		11/09/2023		Sí	0.3
112	Ejecución: Informe de cobertura mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	12/09/2023		12/09/2023		Sí	0.3
113	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.3
114	Ejecución: Informe de alertas mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.3
115	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.3
116	Ejecución: Informe consolidado del segundo cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.3
117	Ejecución: Informe de caracterización mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.3
118	Ejecución: Informe de cobertura mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.33
119	Ejecución: Informe y ficha al mes septiembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.3
120	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.3
121	Ejecución: Informe de alertas mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/10/2023		16/10/2023		Sí	0.3
122	Ejecución: Informe de caracterización mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/10/2023		16/10/2023		Sí	0.3
123	Ejecución: Informe de cobertura mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
124	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.3
125	Ejecución: Informe y ficha al mes octubre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.3
126	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.3
127	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.3
128	Ejecución: Informe de alertas mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.3
129	Ejecución: Informe de caracterización mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.3
130	Ejecución: Informe y ficha al mes noviembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	08/12/2023		08/12/2023		Sí	0.3
131	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	11/12/2023		11/12/2023		Sí	0.3
132	Ejecución: Informe de cobertura mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	11/12/2023		11/12/2023		Sí	0.3
133	Ejecución: Informe de alertas mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	15/12/2023		15/12/2023		Sí	0.3
134	Ejecución: Informe de caracterización mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	15/12/2023		15/12/2023		Sí	0.3
135	Ejecución: Matriz proforma presupuestaría 2023, entregada	5-Entregables Intermedios	15/12/2023		15/12/2023		Sí	0.3
136	Ejecución: 2025	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	5.93
137	Ejecución: Informe consolidado del tercer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
138	Ejecución: Informe de alertas mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
139	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
140	Ejecución: Informe de caracterización mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
141	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
142	Ejecución: 2024	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	30.0
143	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
144	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
145	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
146	Ejecución: Informe de cobertura mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
147	Ejecución: Informe y ficha al mes diciembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.3
148	Ejecución: Fichas de Costos, entregadas	5-Entregables Intermedios	30/01/2024		30/01/2024		Sí	0.25
149	Ejecución: Matriz de Microplanificación, entregado	5-Entregables Intermedios	30/01/2024		30/01/2024		Sí	0.25
150	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2024, entregado	5-Entregables Intermedios	30/01/2024		30/01/2024		Sí	0.25
151	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria enero, entregado	5-Entregables Intermedios	02/02/2024		02/02/2024		Sí	0.25
152	Ejecución: Informe y ficha al mes enero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	13/02/2024		13/02/2024		Sí	0.25
153	Ejecución: Informe de cobertura mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	14/02/2024		14/02/2024		Sí	0.25
154	Ejecución: Informe de alertas mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/02/2024		16/02/2024		Sí	0.25
155	Ejecución: Informe de caracterización mes de enero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/02/2024		16/02/2024		Sí	0.25
156	Ejecución: Informe y ficha al mes febrero de la gerencia sobre la ejecución del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	13/03/2024		13/03/2024		Sí	0.25
157	Ejecución: Informe de cobertura mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	14/03/2024		14/03/2024		Sí	0.25
158	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	15/03/2024		15/03/2024		Sí	0.25
159	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014	5-Entregables Intermedios	16/03/2024		16/03/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	al 2023 a nivel nacional, entregado							
160	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2024		16/03/2024		Sí	0.25
161	Ejecución: Informe de alertas mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2024		16/03/2024		Sí	0.25
162	Ejecución: Informe de caracterización mes de febrero, entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2024		16/03/2024		Sí	0.25
163	Ejecución: Informe y ficha al mes marzo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/04/2024		13/04/2024		Sí	0.25
164	Ejecución: Informe de cobertura mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	14/04/2024		14/04/2024		Sí	0.25
165	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	15/04/2024		15/04/2024		Sí	0.25
166	Ejecución: Informe de alertas mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/04/2024		16/04/2024		Sí	0.25
167	Ejecución: Informe de caracterización mes de marzo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/04/2024		16/04/2024		Sí	0.25
168	Ejecución: Informe y ficha al mes abril de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/05/2024		13/05/2024		Sí	0.25
169	Ejecución: Informe de cobertura mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	14/05/2024		14/05/2024		Sí	0.25
170	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria abril, entregado	5-Entregables Intermedios	15/05/2024		15/05/2024		Sí	0.25
171	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2023 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2024		16/05/2024		Sí	0.25
172	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2024		16/05/2024		Sí	0.25
173	Ejecución: Informe de alertas mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2024		16/05/2024		Sí	0.25
174	Ejecución: Informe de caracterización mes de abril, entregado	5-Entregables Intermedios	16/05/2024		16/05/2024		Sí	0.25
175	Ejecución: Informe consolidado del primer cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	17/05/2024		17/05/2024		Sí	0.25
176	Ejecución: Informe y ficha al mes mayo de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/06/2024		13/06/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
177	Ejecución: Informe de cobertura mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	14/06/2024		14/06/2024		Sí	0.25
178	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	15/06/2024		15/06/2024		Sí	0.25
179	Ejecución: Informe de alertas mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/06/2024		16/06/2024		Sí	0.25
180	Ejecución: Informe de caracterización mes de mayo, entregado	5-Entregables Intermedios	16/06/2024		16/06/2024		Sí	0.25
181	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2024		13/07/2024		Sí	0.25
182	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2024		13/07/2024		Sí	0.25
183	Ejecución: Informe y ficha al mes junio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/07/2024		13/07/2024		Sí	0.25
184	Ejecución: Informe de cobertura mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	14/07/2024		14/07/2024		Sí	0.25
185	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria junio, entregado	5-Entregables Intermedios	15/07/2024		15/07/2024		Sí	0.25
186	Ejecución: Informe de alertas mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2024		16/07/2024		Sí	0.25
187	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2024 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2024		16/07/2024		Sí	0.24
188	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2024 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2024		16/07/2024		Sí	0.25
189	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2024		16/07/2024		Sí	0.25
190	Ejecución: Informe de caracterización mes de junio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/07/2024		16/07/2024		Sí	0.25
191	Ejecución: Informe y ficha al mes julio de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/08/2024		13/08/2024		Sí	0.25
192	Ejecución: Informe de cobertura mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	14/08/2024		14/08/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
193	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria julio, entregado	5-Entregables Intermedios	15/08/2024		15/08/2024		Sí	0.25
194	Ejecución: Informe de alertas mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2024		16/08/2024		Sí	0.25
195	Ejecución: Informe de caracterización mes de julio, entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2024		16/08/2024		Sí	0.25
196	Ejecución: Informe y ficha al mes agosto de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/09/2024		13/09/2024		Sí	0.25
197	Ejecución: Informe de cobertura mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	14/09/2024		14/09/2024		Sí	0.25
198	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	15/09/2024		15/09/2024		Sí	0.25
199	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2021 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/09/2024		16/09/2024		Sí	0.25
200	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco, entregado	5-Entregables Intermedios	16/09/2024		16/09/2024		Sí	0.25
201	Ejecución: Informe de caracterización mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	16/09/2024		16/09/2024		Sí	0.25
202	Ejecución:Informe de alertas mes de agosto, entregado	5-Entregables Intermedios	16/09/2024		16/09/2024		Sí	0.25
203	Ejecución: Informe consolidado del segundo cuatrimestre de desembolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	17/09/2024		17/09/2024		Sí	0.25
204	Ejecución: Informe y ficha al mes septiembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/10/2024		13/10/2024		Sí	0.25
205	Ejecución:Informe de cobertura mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	14/10/2024		14/10/2024		Sí	0.25
206	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	15/10/2024		15/10/2024		Sí	0.25
207	Ejecución: Informe de caracterización mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/10/2024		16/10/2024		Sí	0.25
208	Ejecución:Informe de alertas mes de septiembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/10/2024		16/10/2024		Sí	0.25
209	Ejecución: Informe y ficha al mes octubre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/11/2024	13/11/2024			No	0.25
210	Ejecución: Informe de cobertura mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	14/11/2024	14/11/2024			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
211	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	15/11/2024	15/11/2024			No	0.25
212	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2024	16/11/2024			No	0.25
213	Ejecución: Informe de alertas mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2024	16/11/2024			No	0.25
214	Ejecución: Informe de caracterización mes de octubre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/11/2024	16/11/2024			No	0.25
215	Ejecución:Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	16/11/2024	16/11/2024			No	0.25
216	Ejecución: Informe y ficha al mes noviembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	13/12/2024	13/12/2024			No	0.25
217	Ejecución: Informe de cobertura mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	14/12/2024	14/12/2024			No	0.25
218	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	15/12/2024	15/12/2024			No	0.25
219	Ejecución: Informe bimensual consolidado de actas de cierre y liquidación de los convenios suscritos desde el año 2014 al 2022 a nivel nacional, entregado	5-Entregables Intermedios	16/12/2024	16/12/2024			No	0.25
220	Ejecución: Informe de alertas mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/12/2024	16/12/2024			No	0.25
221	Ejecución: Informe de caracterización mes de noviembre, entregado	5-Entregables Intermedios	16/12/2024	16/12/2024			No	0.25
222	Ejecución: Informe bimensual de seguimiento de ingreso de información al Aplicativo Alfresco	5-Entregables Intermedios	29/12/2024	29/12/2024			No	0.25
223	Ejecución: Informe consolidado del tercer cuatrimestre de desebbolsos a cooperantes de convenios en territorio, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024	29/12/2024			No	0.25
224	Ejecución: Informe de alertas mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024	29/12/2024			No	0.25
225	Ejecución: Informe de avance a la implementación a las modalidades orientas a la vida independiente de personas con discapacidad, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024	29/12/2024			No	0.25
226	Ejecución: Informe de avance a la implementación de la modalidad de cuidado de personas responsables	5-Entregables Intermedios	29/12/2024	29/12/2024			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
227	Ejecución: Informe de caracterización mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024	29/12/2024			No	0.25
228	Ejecución: Informe de cobertura mes de diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024	29/12/2024			No	0.25
229	Ejecución: Informe de ejecución presupuestaria diciembre, entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024	29/12/2024			No	0.25
230	Ejecución:Informe y ficha al mes diciembre de la gerencia sobre la ejecución del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	29/12/2024	29/12/2024			No	0.25

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Unidades en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad		75.13 %	390	293	01/01/2022	Ene-Jun
2	Número de personas con discapacidad que acceden a la modalidad de "ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD" (inversión)		88.22 %	11,700	10,322	01/01/2022	Septiembre
3	Número de convenios de cooperación técnico - económico suscritos en la modalidad "ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD"		71.19 %	118	84	01/01/2022	Ene-Jun

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,975,535.87 **
Costo Total:	42,164,298.74
Total Devengado:	10,998,745.83
% Costo Total Devengado:	26.09 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 26.09 %

Perfil Económico 2024				
	Años Previos	**Año Actual (2024)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	84,328,597.48	0.00	0.00	**84,328,597.48**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	10,615,000.00	0.00	0.00	**10,615,000.00**
Ppto. Codificado	5,115,000.00	0.00	0.00	**5,115,000.00**
Ppto. Comprometido	5,115,000.00	0.00	0.00	**5,115,000.00**
Planeado - Codificado (2024)		0.00		
Programado a Devengar	8,580,247.47	3,855,828.93	0.00	**12,436,076.40**
Ppto. Devengado	8,119,706.94	2,879,038.89	0.00	**10,998,745.83**
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 8,119,706.94	0.00	0.00	**8,119,706.94**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	460,540.53	3,855,828.93	0.00	**4,316,369.46**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 94.63 %	74.67 %	0.00 %	**88.44 %**
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2024

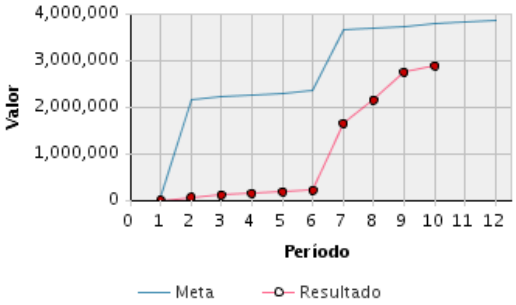

Presupuesto Mensual 2024							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	41,047.77	0.00	41,047.77	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2024							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	2,124,184.33	62,721.48	2,165,232.10	62,721.48	2.90 %		1.63 %
Mar	41,047.77	41,104.45	2,206,279.87	103,825.93	4.71 %		2.69 %
Abr	43,478.57	36,398.98	2,249,758.44	140,224.91	6.23 %		3.64 %
May	43,478.57	35,643.18	2,293,237.01	175,868.09	7.67 %		4.56 %
Jun	43,478.57	33,969.10	2,336,715.58	209,837.19	8.98 %		5.44 %
Jul	1,306,582.12	1,426,898.89	3,643,297.70	1,636,736.08	44.92 %		42.45 %
Ago	43,478.57	509,167.48	3,686,776.27	2,145,903.56	58.21 %		55.65 %
Sep	43,478.57	588,120.04	3,730,254.84	2,734,023.60	73.29 %		70.91 %
Oct	43,478.57	145,015.29	3,773,733.41	2,879,038.89	76.29 %		74.67 %
Nov	41,047.76		3,814,781.17				
Dic	41,047.76		3,855,828.93				
Total	**3,855,828.93**	**2,879,038.89**					

OBJETIVOS ALINEADOS

	Objetivos Operativos
11	Incrementar la eficiencia en la prestación del servicio a las personas con discapacidad y sus familias MEDIANTE la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las modalidades de atención en el marco del enfoque social e inclusivo.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO_01	A.1.pdf	04/09/2022
2	ASOCIACIÓN HITO_10	A.10.pdf	04/09/2022
3	ASOCIACIÓN HITO_100	K.6.pdf	21/07/2023
4	ASOCIACIÓN HITO_101	K.7.pdf	18/07/2023
5	ASOCIACIÓN HITO_103	K.9.pdf	20/07/2023
6	ASOCIACIÓN HITO_104	L.1.pdf	04/09/2023
7	ASOCIACIÓN HITO_105	L.2.pdf	04/09/2023
8	ASOCIACIÓN HITO_106	L.3.pdf	15/08/2023
9	ASOCIACIÓN HITO_107	L.4.pdf	15/08/2023
10	ASOCIACIÓN HITO_107	L.4.1.pdf	15/08/2023
11	ASOCIACIÓN HITO_108	L.5.pdf	04/09/2023
12	ASOCIACIÓN HITO_109	L.6.pdf	28/09/2023
13	ASOCIACIÓN HITO_11	A.11.pdf	04/09/2022
14	ASOCIACIÓN HITO_11.1	A.11.1.pdf	04/09/2022
15	ASOCIACIÓN HITO_110	L.7.pdf	27/09/2023
16	ASOCIACIÓN HITO_110	L.7.1.pdf	27/09/2023
17	ASOCIACIÓN HITO_111	L.8.pdf	27/09/2023
18	ASOCIACIÓN HITO_112	L.9.pdf	27/09/2023
19	ASOCIACIÓN HITO_113	M.1.pdf	28/09/2023
20	ASOCIACIÓN HITO_114	M.2.pdf	27/09/2023
21	ASOCIACIÓN HITO_115	M.3.pdf	28/09/2023
22	ASOCIACIÓN HITO_116	M.4.pdf	28/09/2023
23	ASOCIACIÓN HITO_117	M.5.pdf	28/09/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	ASOCIACIÓN HITO_118	M.6.pdf	12/10/2023
25	ASOCIACIÓN HITO_119	M.7.pdf	11/10/2023
26	ASOCIACIÓN HITO_119	M.7.1.pdf	11/10/2023
27	ASOCIACIÓN HITO_12	A.12.pdf	04/09/2022
28	ASOCIACIÓN HITO_120	M.8.pdf	16/10/2023
29	ASOCIACIÓN HITO_121	M.9.pdf	17/10/2023
30	ASOCIACIÓN HITO_122	N.1.pdf	17/10/2023
31	ASOCIACIÓN HITO_123	N.2.pdf	23/11/2023
32	ASOCIACIÓN HITO_124	N.3.pdf	27/11/2023
33	ASOCIACIÓN HITO_125	N.4.pdf	23/11/2023
34	ASOCIACIÓN HITO_125	N.4.1.pdf	23/11/2023
35	ASOCIACIÓN HITO_126	N.5.pdf	23/11/2023
36	ASOCIACIÓN HITO_127	N.6.pdf	23/11/2023
37	ASOCIACIÓN HITO_128	N.7.pdf	23/11/2023
38	ASOCIACIÓN HITO_129	N.8.pdf	23/11/2023
39	ASOCIACIÓN HITO_13	B.1.pdf	04/09/2022
40	ASOCIACIÓN HITO_130	N.9.1.pdf	18/12/2023
41	ASOCIACIÓN HITO_130	N.9.pdf	18/12/2023
42	ASOCIACIÓN HITO_131	O.1.pdf	18/12/2023
43	ASOCIACIÓN HITO_132	O.2.pdf	18/12/2023
44	ASOCIACIÓN HITO_133	O.3.pdf	20/12/2023
45	ASOCIACIÓN HITO_134	O.4.pdf	04/01/2024
46	ASOCIACIÓN HITO_136	Matriz_Microplanificacion_2024_SD_CON__FORMATO_21-12-2023.xlsm	04/01/2024
47	ASOCIACIÓN HITO_137	O.7.pdf	15/01/2024
48	ASOCIACIÓN HITO_138	O.8.pdf	16/01/2024
49	ASOCIACIÓN HITO_139	O.9.pdf	04/01/2024
50	ASOCIACIÓN HITO_14	B.2.pdf	04/09/2022
51	ASOCIACIÓN HITO_140	P.1.pdf	16/01/2024
52	ASOCIACIÓN HITO_141	P.2.pdf	16/01/2024
53	ASOCIACIÓN HITO_143	P.4.pdf	15/01/2024
54	ASOCIACIÓN HITO_144	P..5	16/01/2024
55	ASOCIACIÓN HITO_145	P.6.pdf	08/01/2024
56	ASOCIACIÓN HITO_146	P.7.pdf	16/01/2024
57	ASOCIACIÓN HITO_147	P8.pdf	11/01/2024
58	ASOCIACIÓN HITO_147	P.8.1.pdf	11/01/2024
59	ASOCIACIÓN HITO_148	A.1.rar	15/03/2024
60	ASOCIACIÓN HITO_149	A.2.zip	15/03/2024
61	ASOCIACIÓN HITO_15	B.3.pdf	04/09/2022
62	ASOCIACIÓN HITO_15	B.3.1.pdf	04/09/2022
63	ASOCIACIÓN HITO_150	A.3.rar	15/03/2024
64	ASOCIACIÓN HITO_151	A.4.pdf	15/03/2024
65	ASOCIACIÓN HITO_152	A.5.pdf	15/03/2024
66	ASOCIACIÓN HITO_152	A.5.1.pdf	15/03/2024
67	ASOCIACIÓN HITO_153	A.6.pdf	15/03/2024
68	ASOCIACIÓN HITO_154	A.7.pdf	25/03/2024
69	ASOCIACIÓN HITO_155	A.8.pdf	15/03/2024
70	ASOCIACIÓN HITO_156	A.9.pdf	15/03/2024
71	ASOCIACIÓN HITO_156	A.9.1.pdf	15/03/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
72	ASOCIACIÓN HITO_157	B.1.pdf	15/03/2024
73	ASOCIACIÓN HITO_158	B.2.pdf	15/03/2024
74	ASOCIACIÓN HITO_159	B.3.pdf	15/03/2024
75	ASOCIACIÓN HITO_16	B.4.pdf	04/09/2022
76	ASOCIACIÓN HITO_16	B.5.pdf	04/09/2022
77	ASOCIACIÓN HITO_160	B.4.pdf	15/03/2024
78	ASOCIACIÓN HITO_161	B.5.pdf	25/03/2024
79	ASOCIACIÓN HITO_162	B.6.pdf	28/03/2024
80	ASOCIACIÓN HITO_163	B.7.pdf	15/04/2024
81	ASOCIACIÓN HITO_163	B.7.1.pdf	15/04/2024
82	ASOCIACIÓN HITO_164	B.8.pdf	10/04/2024
83	ASOCIACIÓN HITO_165	B.9.pdf	30/04/2024
84	ASOCIACIÓN HITO_166	C.1.pdf	30/04/2024
85	ASOCIACIÓN HITO_167	C.2.pdf	30/04/2024
86	ASOCIACIÓN HITO_168	C.3.pdf	15/05/2024
87	ASOCIACIÓN HITO_168	C.3.1.pdf	15/05/2024
88	ASOCIACIÓN HITO_169	C.4.pdf	15/05/2024
89	ASOCIACIÓN HITO_17	B.6.pdf	04/09/2022
90	ASOCIACIÓN HITO_170	C.5.pdf	15/05/2024
91	ASOCIACIÓN HITO_171	ASOCIACIÓN_HITO_171.pdf	17/05/2024
92	ASOCIACIÓN HITO_172	ASOCIACIÓN_HITO_172.pdf	17/05/2024
93	ASOCIACIÓN HITO_173	ASOCIACIÓN_HITO_173.pdf	20/05/2024
94	ASOCIACIÓN HITO_174	ASOCIACIÓN_HITO_174.pdf	22/05/2024
95	ASOCIACIÓN HITO_175	D.1.pdf	19/06/2024
96	ASOCIACIÓN HITO_176	D.2.pdf	19/06/2024
97	ASOCIACIÓN HITO_176	D.2.1.pdf	19/06/2024
98	ASOCIACIÓN HITO_177	D.3.pdf	25/06/2024
99	ASOCIACIÓN HITO_178	D.4.pdf	19/06/2024
100	ASOCIACIÓN HITO_179	D.5.pdf	19/06/2024
101	ASOCIACIÓN HITO_180	D.6.pdf	15/07/2024
102	ASOCIACIÓN HITO_181	D.7.pdf	23/07/2024
103	ASOCIACIÓN HITO_182	D.8.pdf	15/07/2024
104	ASOCIACIÓN HITO_183	D.9.pdf	23/07/2024
105	ASOCIACIÓN HITO_183	D.9.1.pdf	23/07/2024
106	ASOCIACIÓN HITO_184	E.1.pdf	23/07/2024
107	ASOCIACIÓN HITO_185	E.2.pdf	30/07/2024
108	ASOCIACIÓN HITO_186	E.3.pdf	23/07/2024
109	ASOCIACIÓN HITO_187	E.4.pdf	31/07/2024
110	ASOCIACIÓN HITO_188	E.5.pdf	31/07/2024
111	ASOCIACIÓN HITO_189	E.6.pdf	24/07/2024
112	ASOCIACIÓN HITO_19	B.7.pdf	04/09/2022
113	ASOCIACIÓN HITO_190	E.7.pdf	17/07/2024
114	ASOCIACIÓN HITO_191	E.8.1.pdf	02/09/2024
115	ASOCIACIÓN HITO_191	E.8.pdf	02/09/2024
116	ASOCIACIÓN HITO_192	E.9.pdf	28/08/2024
117	ASOCIACIÓN HITO_193	F.1.pdf	02/09/2024
118	ASOCIACIÓN HITO_194	F.2.pdf	28/08/2024
119	ASOCIACIÓN HITO_195	F.3.pdf	28/08/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
120	ASOCIACIÓN HITO_196	F.4.pdf	27/09/2024
121	ASOCIACIÓN HITO_196	F.4.1.pdf	27/09/2024
122	ASOCIACIÓN HITO_197	F.5.pdf	10/10/2024
123	ASOCIACIÓN HITO_198	F.6.pdf	27/09/2024
124	ASOCIACIÓN HITO_199	F.7.pdf	18/10/2024
125	ASOCIACIÓN HITO_2	A.2.rar	04/09/2022
126	ASOCIACIÓN HITO_20	B.8.pdf	04/09/2022
127	ASOCIACIÓN HITO_200	F.8.pdf	18/10/2024
128	ASOCIACIÓN HITO_201	D_6.pdf	11/01/2024
129	ASOCIACIÓN HITO_201	F.9.pdf	27/09/2024
130	ASOCIACIÓN HITO_202	G.1.pdf	27/09/2024
131	ASOCIACIÓN HITO_203	G.2.pdf	27/09/2024
132	ASOCIACIÓN HITO_204	G.3.pdf	15/10/2024
133	ASOCIACIÓN HITO_204	G.3.1.pdf	15/10/2024
134	ASOCIACIÓN HITO_205	G.4.pdf	18/10/2024
135	ASOCIACIÓN HITO_206	G.5.5	28/10/2024
136	ASOCIACIÓN HITO_207	G.6.pdf	18/10/2024
137	ASOCIACIÓN HITO_208	G.7.pdf	18/10/2024
138	ASOCIACIÓN HITO_21	B.9.pdf	04/09/2022
139	ASOCIACIÓN HITO_21	B.9.1.pdf	04/09/2022
140	ASOCIACIÓN HITO_22	C.1.pdf	04/09/2022
141	ASOCIACIÓN HITO_23	C.2.pdf	04/09/2022
142	ASOCIACIÓN HITO_24	C.3.pdf	04/09/2022
143	ASOCIACIÓN HITO_24	C.3.1.pdf	04/09/2022
144	ASOCIACIÓN HITO_25	C.4.pdf	04/09/2022
145	ASOCIACIÓN HITO_26	C.5.pdf	04/09/2022
146	ASOCIACIÓN HITO_27	C.6.pdf	04/09/2022
147	ASOCIACIÓN HITO_28	C.7.pdf	04/09/2022
148	ASOCIACIÓN HITO_29	C.8.pdf	04/09/2022
149	ASOCIACIÓN HITO_3	A.3.zip	04/09/2022
150	ASOCIACIÓN HITO_30	C.9.pdf	04/09/2022
151	ASOCIACIÓN HITO_31	D.1.pdf	04/09/2022
152	ASOCIACIÓN HITO_32	D.2.pdf	04/09/2022
153	ASOCIACIÓN HITO_32	D.2.1.pdf	04/09/2022
154	ASOCIACIÓN HITO_33	D.3.pdf	04/09/2022
155	ASOCIACIÓN HITO_34	D.4.pdf	04/09/2022
156	ASOCIACIÓN HITO_35	D.5.pdf	04/09/2022
157	ASOCIACIÓN HITO_35	D.5.1.pdf	04/09/2022
158	ASOCIACIÓN HITO_36	D.6.pdf	19/09/2022
159	ASOCIACIÓN HITO_37	D.7.pdf	19/09/2022
160	ASOCIACIÓN HITO_38	D.8.pdf	13/10/2022
161	ASOCIACIÓN HITO_39	D.9.pdf	13/10/2022
162	ASOCIACIÓN HITO_4	A.4.rar	04/09/2022
163	ASOCIACIÓN HITO_40	E.1.pdf	19/09/2022
164	ASOCIACIÓN HITO_40	E.1.1.pdf	19/09/2022
165	ASOCIACIÓN HITO_41	E.2.pdf	13/10/2022
166	ASOCIACIÓN HITO_42	E.3.pdf	07/11/2022
167	ASOCIACIÓN HITO_43	E.3.pdf	07/11/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
168	ASOCIACIÓN HITO_44	E.4.zip	07/11/2022
169	ASOCIACIÓN HITO_44	E.4.1.pdf	07/11/2022
170	ASOCIACIÓN HITO_45	E.5.pdf	07/11/2022
171	ASOCIACIÓN HITO_46	E.6.pdf	07/11/2022
172	ASOCIACIÓN HITO_46	E.6.1.pdf	07/11/2022
173	ASOCIACIÓN HITO_47	E.7.pdf	15/11/2022
174	ASOCIACIÓN HITO_48	E.8.pdf	15/11/2022
175	ASOCIACIÓN HITO_49	E.9.pdf	15/11/2022
176	ASOCIACIÓN HITO_49	E.9.1.pdf	15/11/2022
177	ASOCIACIÓN HITO_5	A.5.pdf	04/09/2022
178	ASOCIACIÓN HITO_50	F.1.pdf	25/11/2022
179	ASOCIACIÓN HITO_51	F.2.pdf	30/11/2022
180	ASOCIACIÓN HITO_52	F.3.pdf	20/12/2022
181	ASOCIACIÓN HITO_53	F.4.pdf	20/12/2022
182	ASOCIACIÓN HITO_54	F.5.pdf	14/12/2022
183	ASOCIACIÓN HITO_54.1	F.5.1.pdf	14/12/2022
184	ASOCIACIÓN HITO_55	F.6.pdf	22/03/2023
185	ASOCIACIÓN HITO_56	F.7.pdf	22/03/2023
186	ASOCIACIÓN HITO_57	F.8.pdf	18/01/2023
187	ASOCIACIÓN HITO_58	F.9.pdf	22/03/2023
188	ASOCIACIÓN HITO_59	G.1.pdf	18/01/2023
189	ASOCIACIÓN HITO_6	A.6.pdf	04/09/2022
190	ASOCIACIÓN HITO_6.1	A.6.1.pdf	04/09/2022
191	ASOCIACIÓN HITO_60	G.2.pdf	18/01/2023
192	ASOCIACIÓN HITO_61	G.3.pdf	22/03/2023
193	ASOCIACIÓN HITO_62	G.4.pdf	18/01/2023
194	ASOCIACIÓN HITO_62.1	G.4.1.pdf	18/01/2023
195	ASOCIACIÓN HITO_63	G.5.rar	22/03/2023
196	ASOCIACIÓN HITO_64	G.6.rar	22/03/2023
197	ASOCIACIÓN HITO_65	G.7.zip	22/03/2023
198	ASOCIACIÓN HITO_66	G.8.pdf	22/03/2023
199	ASOCIACIÓN HITO_67	G.9.pdf	22/03/2023
200	ASOCIACIÓN HITO_67	G.9.1.pdf	22/03/2023
201	ASOCIACIÓN HITO_68	H.1.pdf	22/03/2023
202	ASOCIACIÓN HITO_7	A.7.pdf	04/09/2022
203	ASOCIACIÓN HITO_70	H.3.pdf	14/04/2023
204	ASOCIACIÓN HITO_71	H.4.pdf	14/04/2023
205	ASOCIACIÓN HITO_72	H.5.pdf	22/03/2023
206	ASOCIACIÓN HITO_73	H.6.pdf	22/03/2023
207	ASOCIACIÓN HITO_73	H.6.1.pdf	22/03/2023
208	ASOCIACIÓN HITO_75	H.8.pdf	22/03/2023
209	ASOCIACIÓN HITO_76	H.9.pdf	14/04/2023
210	ASOCIACIÓN HITO_77	I.1.pdf	30/05/2023
211	ASOCIACIÓN HITO_78	I.2.pdf	30/05/2023
212	ASOCIACIÓN HITO_79	I.3.pdf	30/05/2023
213	ASOCIACIÓN HITO_79	I.3.1.pdf	30/05/2023
214	ASOCIACIÓN HITO_8	A.8.pdf	04/09/2022
215	ASOCIACIÓN HITO_80	I.4.pdf	30/05/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
216	ASOCIACIÓN HITO_82	I.6.pdf	30/05/2023
217	ASOCIACIÓN HITO_83	I.7.pdf	30/05/2023
218	ASOCIACIÓN HITO_84	I.8.pdf	30/05/2023
219	ASOCIACIÓN HITO_85	I.9.pdf	30/05/2023
220	ASOCIACIÓN HITO_85	I.9.1.pdf	30/05/2023
221	ASOCIACIÓN HITO_86	J.1.pdf	30/05/2023
222	ASOCIACIÓN HITO_87	J.2.pdf	30/05/2023
223	ASOCIACIÓN HITO_88	J.3.pdf	30/05/2023
224	ASOCIACIÓN HITO_89	J.4.pdf	30/05/2023
225	ASOCIACIÓN HITO_9	A.9.pdf	04/09/2022
226	ASOCIACIÓN HITO_91	J.6.pdf	18/07/2023
227	ASOCIACIÓN HITO_91	J.6.1.pdf	18/07/2023
228	ASOCIACIÓN HITO_92	J.7.pdf	18/07/2023
229	ASOCIACIÓN HITO_93	J.8.pdf	18/07/2023
230	ASOCIACIÓN HITO_94	J.9.pdf	18/07/2023
231	ASOCIACIÓN HITO_95	K.1.pdf	18/07/2023
232	ASOCIACIÓN HITO_95	K.1.1.pdf	18/07/2023
233	ASOCIACIÓN HITO_96	K.2.pdf	18/07/2023
234	ASOCIACIÓN HITO_97	K.3.pdf	20/07/2023
235	ASOCIACIÓN HITO_98	K.4.pdf	18/07/2023
236	ASOCIACIÓN HITO_99	K.5.pdf	18/07/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
GONZALEZ, ANDREA	Analista	Analista	andrea.gonzalez@inclusion.gob.ec	6020
Pozo Fierro, Gabriela Alexandra	Analista	Analista	gabriela.pozo@inclusion.gob.ec	
RON ARIAS, DIEGO JAVIER	Gerente de Proyecto	GERENTE DE PROYECTO	diego.ron@inclusion.gob.ec	6045
Vinces Sanchez, Shedany Esthela	Analista	Analista	shedany.vinces@inclusion.gob.ec	6045
